




สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบกลาง)
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) ทน. ขออนุมัติงบกลาง		(2) สำนักงบประมาณอนุมัติ		(3) งบประมาณลงนามตามสัญญา		(4) ผลเบิกจ่ายจากงบกลาง			แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ				
	รวม	35	551.0232	35	496.6441	35	458.3768	35	383.6326	84%	19	16	0	
1	สทภ.1	2	48.2000	2	44.9065	2	29.8390	2	15.1295	50.70%	1	1	0	ดำเนินการเอง 1 โครงการ
2	สทภ.2	2	38.0000	2	32.0885	2	32.0785	2	32.0785	100%	2	0	0	
3	สทภ.3	3	110.0000	3	83.7384	3	69.1835	3	61.8916	89.46%	2	1	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 2 โครงการ
4	สทภ.4	4	178.0000	4	168.9816	4	168.9816	4	168.8789	99.94%	4	0	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 4 โครงการ
5	สทภ.6	1	2.0000	1	1.7343	1	1.1021	1	1.1021	100%	1	0	0	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
6	สทภ.7	8	90.0132	8	84.5760	8	84.5760	8	61.5581	72.78%	6	2	0	ดำเนินการเอง 2 โครงการ
7	สทภ.9	15	84.8100	15	80.6188	15	72.6161	15	42.9939	59.21%	3	12	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 1 โครงการ

- หมายเหตุ : 1. สำนักงบประมาณอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 35 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 496.6441 ล้านบาท
2. กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการ โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 266.4825 ล้านบาท (งานดำเนินการเอง) (ปัจจุบัน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ)
3. งานดำเนินการเอง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จำนวน 1 โครงการ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จำนวน 2 โครงการ
4. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ (สทภ.1 , สทภ.2 , สทภ.6 , สทภ.7 , สทภ.9)
5. จะดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 14 โครงการ และเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 โครงการ

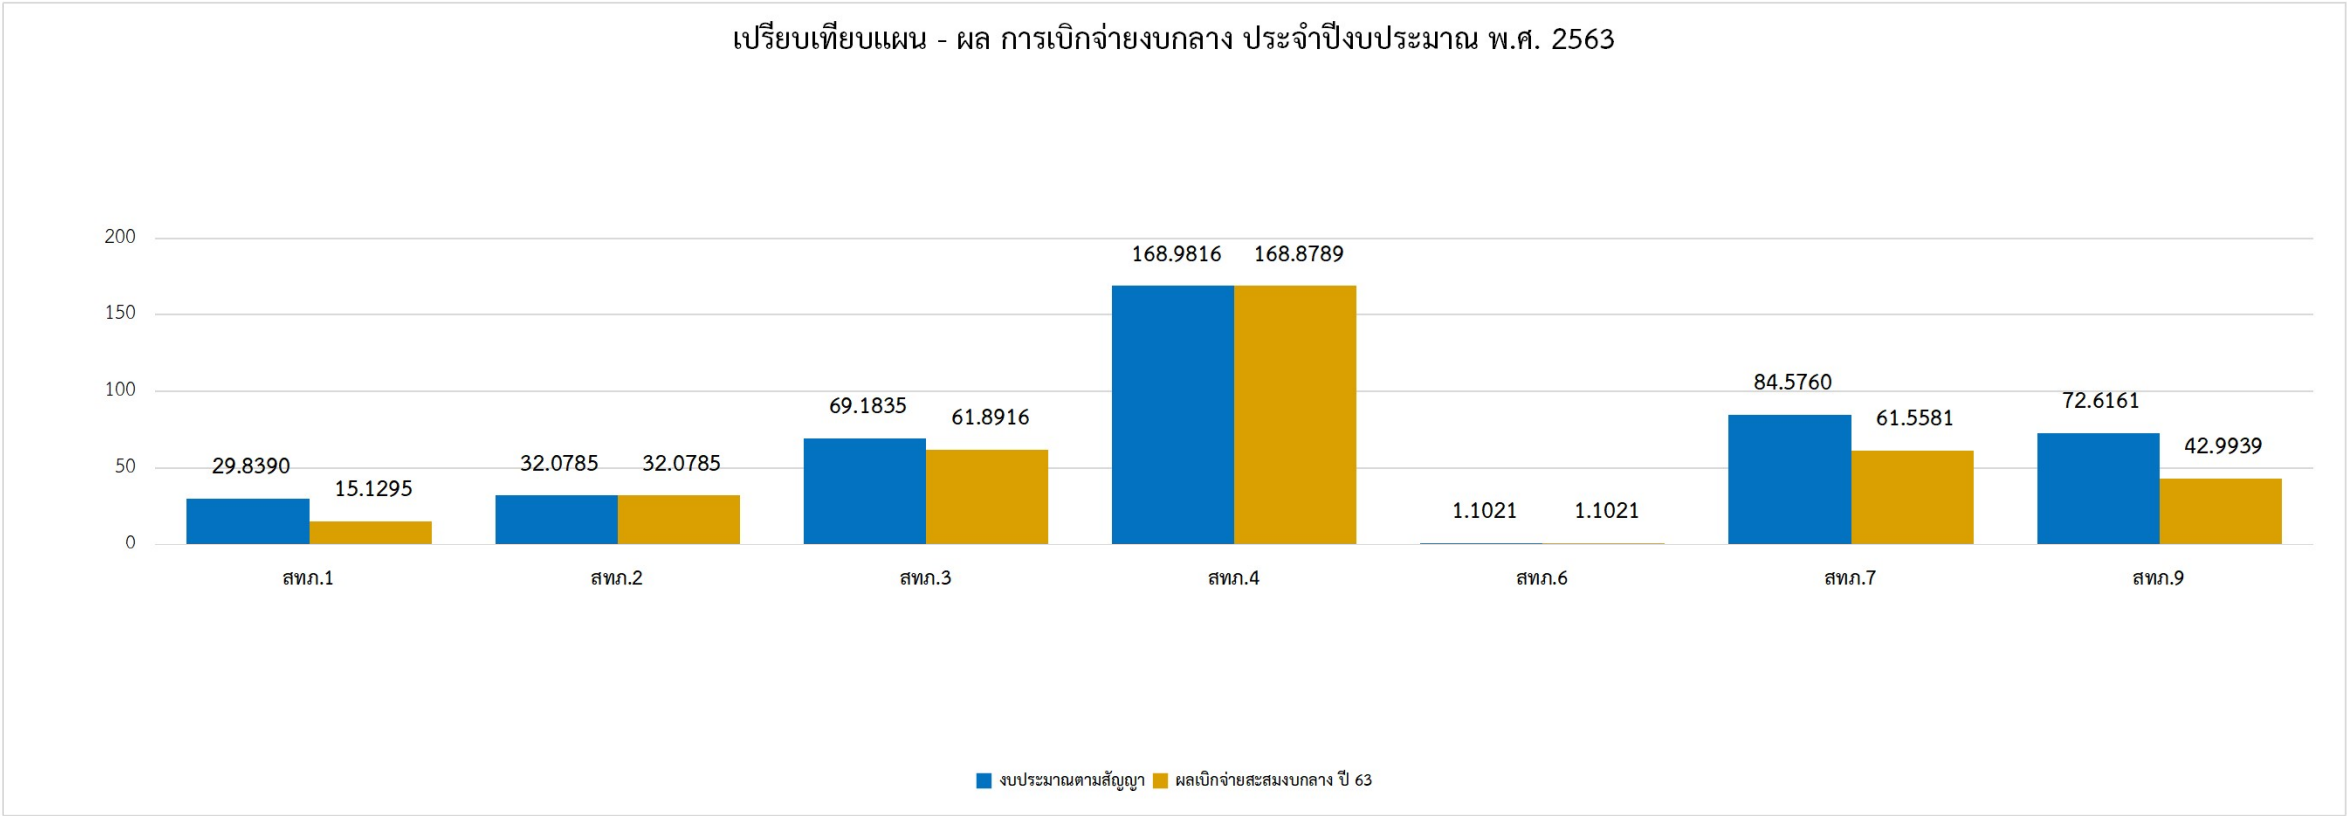

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[illegible]
