




สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบกลาง) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) ท. ขออนุมัติงบกลาง		(2) สำนักงบประมาณอนุมัติ		(3) งบประมาณลงนามตามสัญญา/ ดำเนินการเอง		(4) ผลเบิกจ่าย จากงบกลาง		ร้อยละ	แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ																	
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)						ก.ค. 63	ส.ค. 63	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64								
	รวม	35	551.0232	35	496.6441	35	458.3768	35	404.4723	88.24%	23	12	0		จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)		
															1	1	11	2	3	1	4	1	10	1								
1	สทก.1	2	48.2000	2	44.9065	2	29.8390	2	17.9115	60.03%	1	1	0	ดำเนินการเอง 1 โครงการ																	1	
2	สทก.2	2	38.0000	2	32.0885	2	32.0785	2	32.0785	100%	2	0	0	ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ		1			1													
3	สทก.3	3	110.0000	3	83.7384	3	69.1835	3	64.6368	93.43%	2	1	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 2 โครงการ			2								1							
4	สทก.4	4	178.0000	4	168.9816	4	168.9816	4	168.8789	99.94%	4	0	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 4 โครงการ			4															
5	สทก.6	1	2.0000	1	1.7343	1	1.1021	1	1.1021	100%	1	0	0	ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ	1																	
6	สทก.7	8	90.0132	8	84.5760	8	84.5760	8	76.8706	90.89%	8	0	0	ดำเนินการเอง 2 โครงการ			4	1	1		2											
7	สทก.9	15	84.8100	15	80.6188	15	72.6161	15	42.9939	59.21%	5	10	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 1 โครงการ			1	1	1		2				10							

- หมายเหตุ : 1. สำนักงบประมาณอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 35 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 496.6441 ล้านบาท
 2. กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการ โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 266.4825 ล้านบาท (งานดำเนินการเอง) (ปัจจุบัน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ)
 3. งานดำเนินการเอง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จำนวน 1 โครงการ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จำนวน 2 โครงการ
 4. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ (สทก.1 , สทก.2 ,สทก.3,สทก.4, สทก.6 , สทก.7 , สทก.9)
 5. จะดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 โครงการ , เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 10 โครงการ และ เดือนเมษายน 2564 จำนวน 1 โครงการ
 6. ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย 1 โครงการ

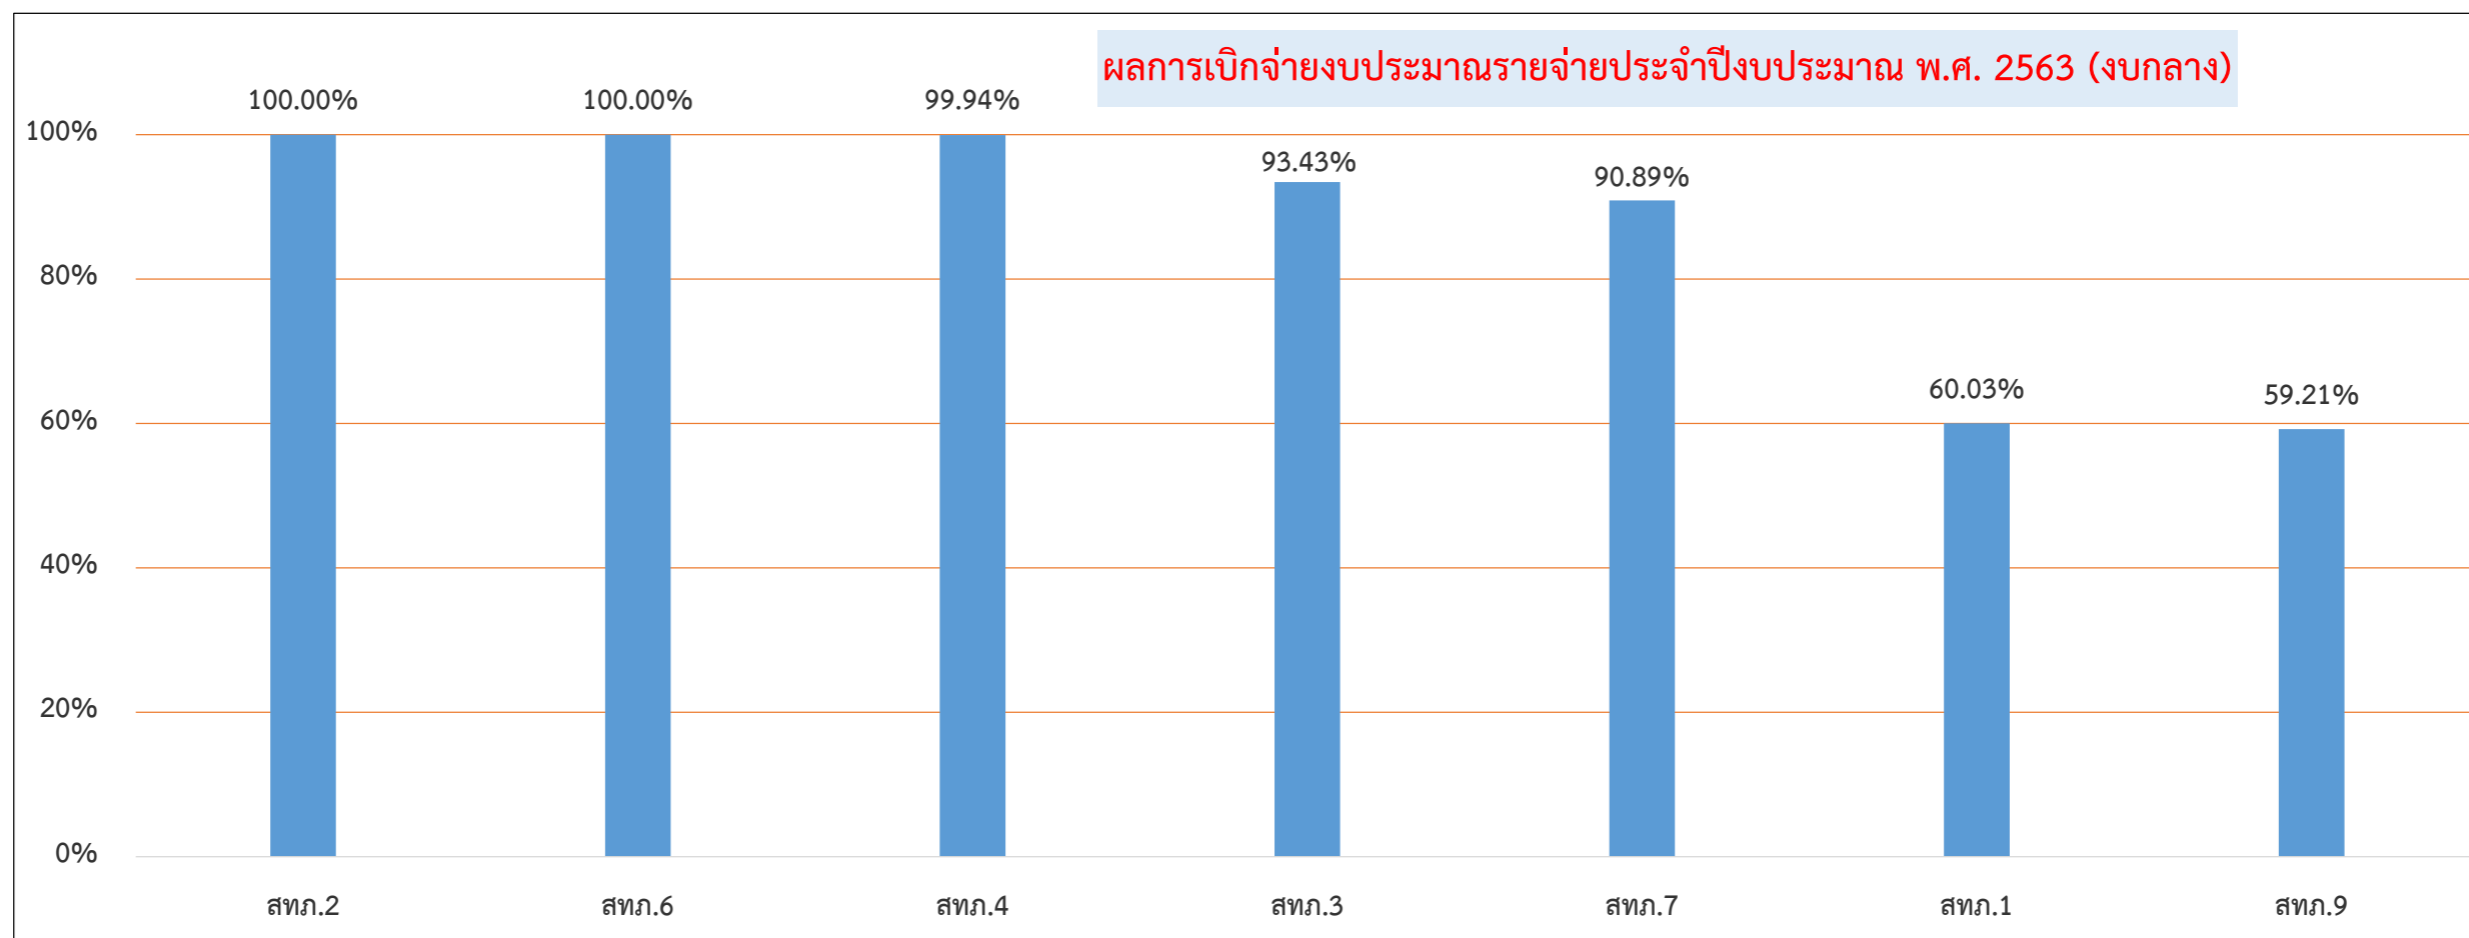

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อดำเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 64

ที่	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จัดสรรจากสำนัก งบประมาณ		ขอยกเลิกโครงการ		คงเหลือวงเงินที่ได้รับ อนุมัติจัดสรรจากสำนัก งบประมาณ		จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ					วงเงินตามสัญญา/ ดำเนินการเอง		คงค้าง ที่อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	ผลการเบิกจ่าย			ดำเนินการแล้วเสร็จ										
		จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ก.ย. 63	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ร้อยละ	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64				
	รวมทั้งสิ้น	144	1,719.0595	2	4.6144	142	1,714.4451	22	40	49	12	8	131	1,455.5379	11	56	251.5891	17%	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	โครงการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	6	679.0160	-	-	6	679.0160		-	4	-	-	4	635.8609	2	1	69.4350	11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	สอน.	6	679.0160	-	-	6	679.0160			4			4	635.8609	2	1	69.4350	10.92%											
	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ และปรับปรุงแหล่งน้ำ	138	1,040.0435	2	4.6144	136	1,035.4291	22	40	45	12	8	127	819.6770	9	55	182.1541	22%	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	สทก.1	4	77.6529	1	2.4341	3	75.2188		1	2			3	75.1975	-	3	21.4723	28.55%											
2	สทก.2	5	34.8646	-	-	5	34.8646			4	1		5	34.7610	-	2	5.8400	16.80%											
3	สทก.3	20	49.4304	-	-	20	49.4304		15		5		20	49.3591	-	8	2.4265	4.92%											
4	สทก.4	26	58.3733	-	-	26	58.3733		4	22			26	57.4625	-	6	4.4242	7.70%											
5	สทก.5	14	252.6292	-	-	14	252.6292			7			7	89.2540	7	3	10.4637	11.72%											
6	สทก.6	4	35.9281	-	-	4	35.9281			1	1	2	4	34.3927	-	1	1.0138	2.95%											
7	สทก.7	7	137.9756	-	-	7	137.9756			2		4	6	99.4446	1	1	5.1615	5.19%											
8	สทก.8	25	206.1119	-	-	25	206.1119	22	3				25	205.9749	-	24	112.3250	54.53%	5										
9	สทก.9	18	60.4301	-	-	18	60.4301		14	4			18	59.6307	-	1	6.2823	10.54%											
10	สทก.10	4	30.4654	1	2.1803	3	28.2851			2			2	18.3200	1	1	5.4198	29.58%											
11	สทก.11	11	96.1820	-	-	11	96.1820		3	1	5	2	11	95.8799	-	5	7.3250	7.64%											

หมายเหตุ : 1. สำนักงบประมาณอนุมัติงบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 144 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,719.0595 ล้านบาท

- ยกเลิก 2 โครงการ สทก.1 จำนวน 1 โครงการ, สทก.10 จำนวน 1 โครงการ
- สทก.5 อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 6 รายการ อยู่ระหว่างประกวดราคา 1 รายการ
- สทก.7 อยู่ระหว่างประกวดราคา 1 รายการ
- สทก.10 อยู่ระหว่างประกวดราคา 1 รายการ
- สอน. อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2 รายการ

