



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๗๘๒๖
วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๖๐๕

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ ๐๔๔๙๐
วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐:๔๒

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑
ที่ ทส ๐๖๒๑ /๒๓๔ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ และ ๗

๑ เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติ หน.ผด. เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ และ ๗ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

หน.ผด. ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ (นายประสิทธิ์ พัททวี) ในฐานะ คณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้านเทคนิควิศวกรรม (AE) มาบูรณาการการทำงานร่วมกับการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ สทน.๖ และ สทน.๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การเบิกจ่ายในภาพรวมของ สทน.๖ และ สทน.๗ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคมและวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันรายงานตามประเด็นการตรวจฯ และคาดการณ์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ดังนี้

สทน.๖ ขณะตรวจฯ มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๙.๒๑ และ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ ๖๕.๑๑ ซึ่งเหตุผลที่ทำให้การเบิกจ่ายได้ต่ำเพียงร้อยละ ๖๕.๑๑ เนื่องจากโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง มีการขยายสัญญา และสิ้นสุดสัญญาในช่วงเดือนตุลาคม บางโครงการไปถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ทำให้ต้องขอ กู้เงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


ประกอบด้วย ๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแพพรหมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรแปลงใหญ่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ และ ๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฝ. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีการขยายสัญญาและสิ้นสุดสัญญาในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ และมีวงเงินคงเหลือ ๑๓.๑๔๒๙ , ๓๑.๕๗๘ และ ๔๓.๘๘๘ ล้านบาท ตามลำดับ

สทน.๗ ขณะตรวจฯ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๗.๗๕ และ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ ๙๗.๖๗

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทน.๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๓๙ โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๓๕ โครงการ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาจำนวน ๔ โครงการ และคาดว่าจะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จะแล้วเสร็จเพิ่มอีก ๒ โครงการ รวมเป็นทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ อีกจำนวน ๒ โครงการ ที่ไม่แล้วเสร็จ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฝ.

อ.สัตหีบ...

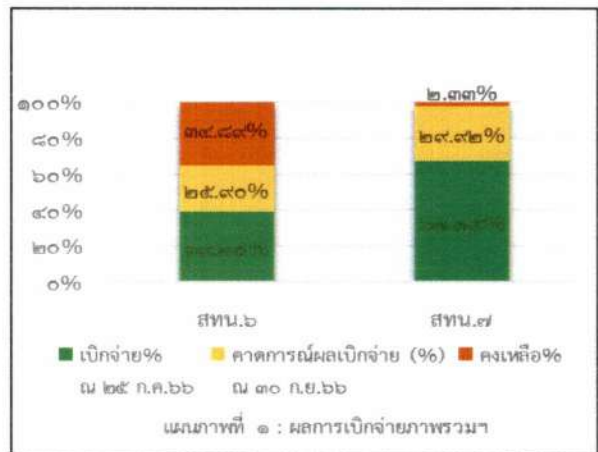


เรื่องกลับ กสน.
วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑:๒๗

เรื่องกลับ กสน.
วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๑:๒๗

อ.สัทหีบ จ.ชลบุรี เนื่องจากการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกองทัพเรือล่าช้าประมาณ ๓ เดือน หลังจากการลงนามในสัญญา จึงต้องมีการขยายสัญญา และสิ้นสุดสัญญาในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ๒๕๖๖


สท.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๑๒ โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๕ โครงการ อีกจำนวน ๗ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน

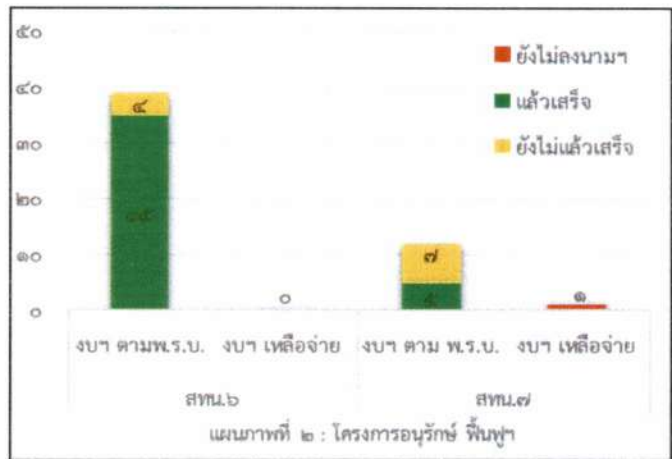

๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ ที่เหลืออีก ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นโครงการร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และกรมป่าไม้ไม่ได้มีหนังสืออนุมัติการทำโครงการร่วมแล้ว ทำให้ต้องมีการขยายสัญญาจากเดิมสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่ได้รับงบเหลือจ่ายจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำหนองสาหร่าย อ.บางพลาม จ.สุพรรณบุรี เป็นงานทำเองและคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๒.๓ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สท.๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ โดยแล้วเสร็จจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวัง พร้อมระบบกระจายน้ำ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี วงเงิน ๖.๔๙๐๙ ล้านบาท (อยู่ระหว่างรอศาลตัดสินจึงจะเบิกจ่ายได้) อีก ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแพบ พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

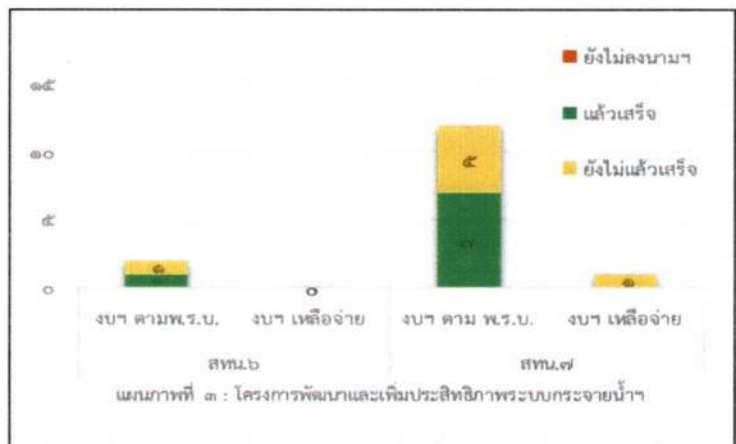

สท.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๒ โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๗ โครงการ อีกจำนวน ๕ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ที่เหลืออีก ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สระเก็บน้ำบ้านรวมไทย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่ได้รับงบเหลือจ่ายจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บริเวณเกาะพลับพลา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

๒.๔ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สทพ.๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด งบประมาณ ๐.๕๐๑๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงานทำเอง และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

สทพ.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำซอนต้า ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณโครงการละ ๐.๕๐๑๐ ล้านบาท ขณะตรวจติดตามฯ อยู่ระหว่างดำเนินงานและจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

๒.๕ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

สทพ.๖ มีโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๗ โครงการ และคาดว่าจะ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จะแล้วเสร็จเพิ่มจำนวน ๒ โครงการ สำหรับอีกจำนวน ๔ โครงการที่จะไม่แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และมีผลทำให้เงินตกพับ ประกอบด้วย

๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว - คลองหนองหวีด - แก้มลิงคู้ทะปาว อ.เขาฉกรรจ์ จ.ตราด งบประมาณ ๓๙.๙๗๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๓๖๖๑ ล้านบาท เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณโครงการ ประกอบกับพื้นที่โดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา แต่ สทพ.๖ จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานและเบิกจ่ายให้มากที่สุด เพื่อให้มีเงินตกพับเป็นภาระน้อยที่สุด

๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองโพรง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี งบประมาณ ๖.๓๘๘๐ ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างศาลพิจารณาคดีการลักลอบขนย้ายมูลดินไปจำหน่าย

๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขามันเทศ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา งบประมาณ ๕๐.๐๗๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๗.๕๑๑๙ ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่จากกรมป่าไม้

๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว งบประมาณ ๑๑.๔๗๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๗๒๐๗ ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่จากกรมป่าไม้ สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

สทพ.๗ มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ


๒.๗ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

(๑) ประสิทธิภาพของระบบ

เตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)


จากแผนภาพที่ ๔ สทพ.๖

มีสถานีเตือนภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน ๖๗ สถานี มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลจำนวน ๕๙ สถานี หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ และมีสถานีที่ต้องติดตามข้อมูลจากผู้รู้จำนวน ๘ สถานี หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒ นั้น หากดูในรายละเอียดจะพบว่า จากจำนวน ๘ สถานี มีจำนวน ๖ สถานีที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้เลย สำหรับ สทพ.๗ มีสถานี...

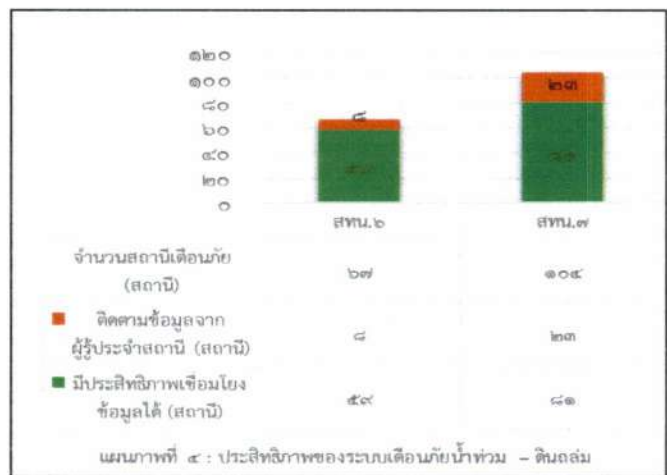

มีสถานี่เดือนกัยที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน ๑๐๔ สถานี่ มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลจำนวน ๘๑ สถานี่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๘ และมีสถานี่ที่ต้องติดตามข้อมูลจากผู้รู้จำนวน ๒๓ สถานี่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๒

(๒) ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานี่เดือนกัย

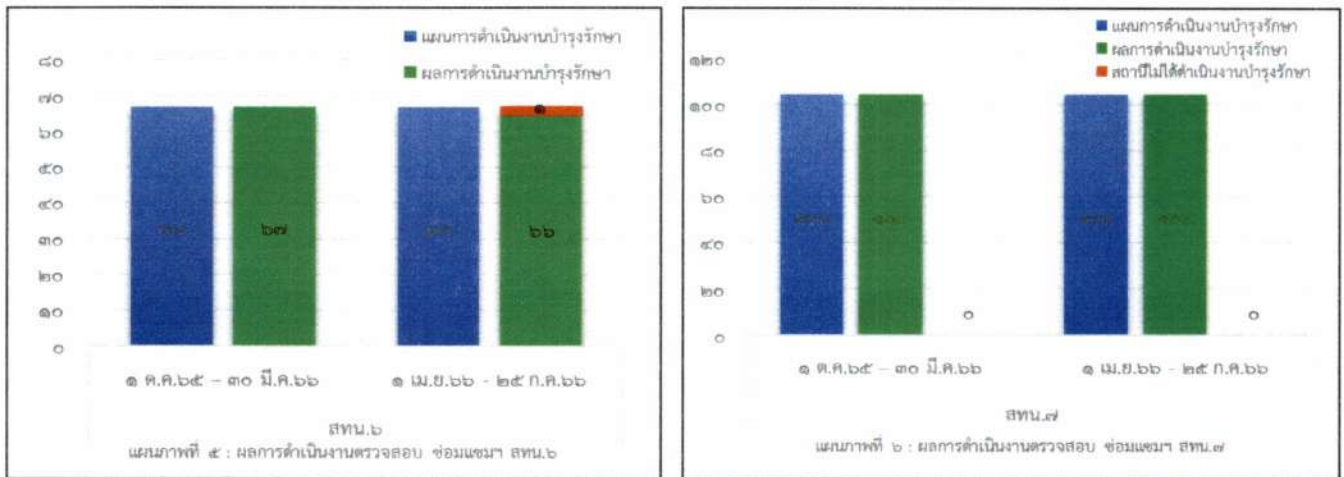

จากแผนภาพที่ ๕ และแผนภาพที่ ๖ แสดงให้เห็นถึงในส่วนการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาฯ กล่าวคือ สทท.๖ ในครั้งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) สามารถดำเนินการได้ครบใน ทุกสถานี่ (๖๗ สถานี่) และในครั้งปีหลัง (เมษายน - วันตรวจฯ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖) มีเพียง ๑ สถานี่ที่ยังไม่ดำเนินการ บกุงรักษา และสามารถดำเนินการได้ครบก่อนสิ้นปีงบประมาณ สำหรับ สทท.๗ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดำเนินการได้ครบในทุกสถานี่ (๑๐๔ สถานี่) ทั้งนี้ เหตุที่สามารถตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานี่เดือนกัย ได้ครบ เนื่องจากได้นำงบประมาณจากแผนงานพื้นฐาน : ระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำในส่วนอื่น ๆ (ซึ่งจะได้ นำเสนอในย่อหน้าถัดไป) มารวมกันและบริหารจัดการและจัดลำดับความจำเป็นและเร่งด่วน

นอกจากนี้ สทท. ๗ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า ในแผนงานพื้นฐานดังกล่าว ยังมีระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำในความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินงานตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ประกอบด้วย

รายการ	จำนวนทั้งหมด	พร้อมใช้งาน	สถานี่ชำรุด/ไม่ใช้งาน		หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	คำชี้แจง	
๑. สถานี่อุตุณิยมวิทยา - อุทกวิทยา	๑๐ สถานี่	๙ สถานี่	๑ สถานี่	มีการรื้อถอน ๑ สถานี่ เนื่องจาก อบต. ต้องการใช้พื้นที่ โดย สทท.๗ ได้รื้อถอน และเก็บอุปกรณ์ของสถานี่ไว้ และได้มี หนังสือแจ้ง กวป. เพื่อทราบและหากยังมีความจำเป็นให้ดำเนินการจัดหาสถานี่ที่ และติดตั้งต่อไป	กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ (กวป.)
๒. สถานี่โทรมาตร(แบ่งเป็น ทำจิ้น ๑๒ สถานี่ แม่กลอง ๑๕ สถานี่)	๒๗ สถานี่	๑๘ สถานี่	๙ สถานี่ อยู่ในแม่น้ำทำจิ้นทั้งหมด	- ปีระบบส่งข้อมูล ๓ สถานี่ (ท่าฉลอม/ทำจิ้นที่สะพานข้ามแม่น้ำทำจิ้น บ้านเกาะ/ทำจิ้นที่สะพานข้ามแม่น้ำทำจิ้น บางเลน) - สถานี่ท่าฉลอมอยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอน - จำนวน ๖ สถานี่อุปกรณ์ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน	กวป.
๓. สถานี่กล้อง CCTV (ทำจิ้น๗สถานี่ แม่กลอง๖ สถานี่ เพชรบุรี และประจวบ-คีรีขันธ์ จังหวัดละ๑สถานี่)	๑๕ สถานี่	๘ สถานี่	๗ สถานี่	- CCTV ทำจิ้น จำนวน ๔ สถานี่ (ท่าฉลอม/ทำจิ้นที่สะพานข้ามแม่น้ำทำจิ้น บ้านเกาะ/ทำจิ้นที่สะพานข้าม แม่น้ำทำจิ้น บางเลน/ทำจิ้นที่สะพาน วัดรูป)	กวป.

รายการ	จำนวน ทั้งหมด	พร้อมใช้ งาน	สถานีชำรุด/ไม่ใช้งาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			จำนวน	สาเหตุ	
๓. สถานีกล้อง CCTV (ต่อ)				- CCTV แม่กลอง จำนวน ๒ สถานี (สะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์/ท่าเรือ) - CCTV บางสะพาน ๑ สถานี	
๔. สถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก	๒๘ แหล่งน้ำ	๑๙ แหล่งน้ำ	๙ แหล่งน้ำ	ใน ๙ แหล่งน้ำมีการชำรุดของอุปกรณ์ เช่น เสาติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำ แผ่นวัดระดับน้ำ และป้ายแสดงรายละเอียด ถึงแม้เสาติดตั้ง/แผ่นวัดระดับน้ำชำรุด ก็มีการลงข้อมูลระบบตรวจวัดปริมาณ ใน ๒๘ แหล่งน้ำ	กวป.

๒.๘ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สทท.๖ และ สทท.๗ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ณ วันตรวจติดตามฯ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม สรุปได้ดังนี้

สทท.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่าย น้ำ (ลบ.ม.)	น้ำดื่ม (ขวด)	ประโยชน์ที่ได้รับ	
	ภัยแล้ง	น้ำท่วม			ประชาชน (ครัวเรือน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๖	๙,๖๓๖,๐๐๐	-	-	๒๑,๐๔๘	๒,๗๘๘	๑๑,๙๙๐
๗	๑,๗๙๒,๒๖๐	๑๓,๘๙๑,๓๘๐	-	-	๒๐,๙๗๔	๙๐,๕๙๒
รวม	๑๑,๔๒๘,๒๖๐	๑๓,๘๙๑,๓๘๐	-	๒๑,๐๔๘	๒๓,๗๖๒	๑๐๒,๕๘๒

๒.๙ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

หน.ผด. และ ผชช. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะต่อช่างควบคุมงาน กรรมการตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ดังนี้

สทท.๖ ประกอบด้วย

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแพ้วพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ม.๒ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐.๕๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ๑) เศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือให้เก็บรวบรวมนำไปทิ้งนอกโครงการฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ๒) ควรปรับแต่ง Slope ให้มีความเสมอทั้งสี่ด้าน ๓) มีการขุดพบหินบริเวณกันสระ ให้ปรับแก้ไขแบบแปลน และปรับค่างาน ๔) นำดินไปทิ้งในจุดที่ทิ้งดิน และปรับแต่งมวลดินทิ้งให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสะดวกต่อการคำนวณ ๕) บริเวณโครงการที่ติดถนนคอนกรีตควรปรับแต่งดินให้เป็นร่องน้ำ เพื่อป้องกันการไหลของดินลงไปในพื้นที่ถนน และ ๖) บริเวณอาคารสูบน้ำควรเพิ่ม staff gate เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำรู้ปริมาณน้ำคงเหลือในสระ เอกสารแนบ ๑

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๒.๘๔ และได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ๑) การวางแนวรั้วรอบระบบกระจายน้ำให้ตรงกัน ๒) ปรับแต่งรอบโครงการฯ ให้สวยงาม และ ๓) นำหินไปทดสอบคุณภาพ ก่อนนำมาเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย เอกสารแนบ ๒

(๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฝ. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕ และได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ให้เพิ่มความสูงแนวคันกันน้ำ เพื่อป้องกันคลื่นน้ำกัดเซาะ เอกสารแนบ ๓

(๔) โครงการ...

(๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๒ และจะแล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา (วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖) โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ๑) เสไฟฟ้าที่ อบต. ดำเนินการปักไว้บริเวณแหล่งน้ำในโครงการ ขอให้ช่างควบคุมชี้แจง ทำความเข้าใจและความห่วงใยให้ระมัดระวังการเกิดภัยทางกระแสไฟฟ้าไว้ด้วย ๒) เศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือให้เก็บรวบรวมนำไปทิ้งนอกโครงการฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ๓) กำจัดวัชพืชรอบโครงการให้เรียบร้อยก่อนการตรวจรับงานในงวดสุดท้าย และ ๔) ซ่อมเสาดอหม้อของอาคารสูบน้ำให้ตรง เนื่องจากไม่ได้มาตรฐาน เหล็กในเสาไม่ได้ศูนย์กลาง *เอกสารแนบ ๔*

(๕) สถานีเตือนภัยล่วงหน้าบ้านหินกอง (Early warning) หมู่ ๙ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ผู้รู้ประจำสถานี นายสมศักดิ์ เลขการ โดยสถานีดังกล่าวมีระบบเตือนภัยและวัดปริมาณน้ำได้ ซึ่งสถานีมีความพร้อมในการใช้งาน แต่สภาพภายนอกของสถานีมีสนิมและเสื่อมโทรม *เอกสารแนบ ๕*

สทน.๗ ประกอบด้วย

(๑) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังยาง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี แม้ว่าดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขในโครงการต่อไป คือ ๑) แผลสูบน้ำเอียง เนื่องจากการติดตั้งท่อสูบน้ำไม่มีการถ่วงดุล ๒) ปรับสลิ้งให้เหมาะสมกับระดับ เพื่อไม่ให้สลิ้งมีการจมอยู่ในน้ำนานเกิดสนิม รวมทั้งให้ความรู้กับผู้ดูแลในการปรับสลิ้งให้เกิดความเหมาะสม ๓) พื้นยางมะตอยคอนกรีตตัดไม่สวยงาม ความห่างของรอยต่อไม่เหมาะสม ๔) มีรอยแตกของแผ่นปูน ๕) เสาดอหม้อเอียง ๖) เศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือให้เก็บรวบรวมนำไปทิ้งนอกโครงการฯ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม และ ๗) การออกแบบควรจะเป็นเรื่องหินยาแนว เพื่อให้เกิดความมั่นคงและสวยงาม *เอกสารแนบ ๖*

(๒) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย ม.๑๔, ๕, ๑๓, ๑ ต.พลับพลาไชย อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี แม้ว่าดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขในโครงการต่อไป คือ ๑) แหล่งน้ำสำหรับสูบน้ำเพื่อการทำน้ำอุปโภคบริโภคควรมีรั้วรอบ เพื่อป้องกันขยะมูลฝอย บริเวณรอบที่เป็นตลาดและชุมชนหล่นลงมาในแหล่งน้ำ ๒) ถังกรองควรใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ๓) นำตัวอย่างน้ำไปทดสอบ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความสะอาด *เอกสารแนบ ๗*

(๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซับใหญ่ ม.๑๓ ต.พลับพลาไชย อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี แม้ว่าดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขในโครงการต่อไป คือ ๑) การเรียงหินควรจะมีผิวหน้าเรียบ และสวยงาม เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดการก่อสร้าง ๒) ปรับแต่งมวลดินทิ้งให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสะดวกต่อการคำนวณ และ ๓) มีการขุดพบหินแข็งบริเวณกันอ่าง และประชาชนไม่ให้ขุดบริเวณคันไม้ ต้องปรับแก้ไขแบบแปลน และคำนวณปรับลดค่างานประกอบแนบท้ายไว้ด้วย *เอกสารแนบ ๘*

(๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.๒ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๒ และได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ๑) มีการขุดพบหินบริเวณโครงการฯ เห็นควรเก็บตัวอย่างหินไปทดสอบเพื่อบันทึกไว้ในรายงาน และปรับแก้ไขแบบแปลน และคำนวณปรับลดค่างานประกอบแนบท้าย ๒) ปรับแต่งมวลดินทิ้งให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสะดวกต่อการคำนวณ ๓) บริเวณโครงการที่ติดถนนสาธารณะควรปรับแต่งดินให้เป็นร่องน้ำ เพื่อป้องกันการไหลของดินลงไปในพื้นถนน ๔) ปรับแต่ง Slope ด้านในและด้านนอกให้มีความเสมอเรียบร้อย และสวยงาม และ ๕) การระมัดระวังและควบคุมมวลดินทิ้งให้อยู่ในบริเวณโครงการ *เอกสารแนบ ๙*

(๕) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม พร้อมระบบกระจายน้ำ ม.๕, ๗, ๘ ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี แม้ว่าดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขในโครงการต่อไป คือ ๑) จุดปล่อยน้ำมีตะกอนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้เปิดใช้งานมานาน ควรให้ความรู้กับผู้ดูแลแต่ละจุดให้หมั่นเปิดเพื่อลดตะกอนในท่อ และ ๒) ป้ายโครงการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักฯ ที่อยู่ในบริเวณโครงการฯ อยู่ในความรับผิดชอบของ กวป.

พบว่า...

พบว่า QR Code สำหรับประชาชน เพื่อดูข้อมูลปริมาณน้ำเก็บกักมีการ Error ควรจัดได้แจ้งเพื่อแก้ไขปัญหา เอกสารแนบ ๑๐

(๖) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาชี บ้านหินดั้น ม.๓ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี แม้ว่าดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขในโครงการต่อไป คือ การเรียงหินในลวดตาข่ายให้แน่น เต็มกล่อง และมีผิวหน้าเรียบ เป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดการก่อสร้าง เอกสารแนบ ๑๑

(๗) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านห้วยสวนพลู ม.๖ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๐ และได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ๑) น้ำซึมบริเวณรอบหลุมโครงการฯ ควรปิดจุดรั่วซึม และสูบน้ำเพื่อให้บริเวณก่อสร้างแห้ง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างปฏิบัติงาน ๒) จุดการเชื่อมระหว่างทาง เทปูน ควรกำหนดจุดให้ชัดเจนเมื่อถอดแบบจะได้เป็นเส้นตรง สวยงาม เอกสารแนบ ๑๒

(๘) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำสถานีเตือนภัย บ้านหินดั้น ม.๓ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ผู้รู้ประจำสถานี นางสาวสุวรรณ หงษ์ฮั่ว โดยสถานียังกล่าวมีระบบเตือนภัยและวัดปริมาณน้ำด้วยการยิงเลเซอร์บนผิวน้ำ ซึ่งสถานีมีความพร้อมในการใช้งานได้เป็นอย่างดี เอกสารแนบ ๑๓

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ทน.ผต. และ ผชช. ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สทน. รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามมีข้อค้นพบอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดย ทน.ผต. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	แม้ว่าสัดส่วนของสถานีที่ต้องติดตามข้อมูลจากผู้จำนวน ๘ สถานีหรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒ แต่ในรายละเอียดจำนวน ๘ สถานี มีจำนวน ๖ สถานีที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้เลยของ สทน.๖ และจำนวน ๒๓ สถานี หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๒ ของ สทน.๗ จะไม่มาก แต่เมื่อนำมามองในภาพรวมสถานีพร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ใน “ตัวชี้วัด” ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ และน้ำป่าไหลหลาก” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ก็ยังไม่ผ่านเป้าหมายขั้นต้น หากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม ยังได้รับจัดสรรลดลง ซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต้องจัดทำเป็นข้อมูลเพื่อให้สำนักงบประมาณได้ทราบและประกอบการพิจารณา	กยผ. และ กวพ.
๒.	โครงการอนุรักษ์ พื้นฟูฯ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ สทน. จำนวน ๔๑ โครงการและ สทน.๗ จำนวน ๒๖ โครงการ ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพราะขาดงบประมาณ และหากรวมย้อนไปตั้งแต่ไม่ได้รับงบประมาณในส่วนนี้ก็มีเป็นจำนวนมาก	กยผ. และ กอน.
๓.	จำนวนของสถานีอุตุนิยมวิทยา – อุทกวิทยา สถานีโทรมาตร สถานีกล้อง CCTV สถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก และ QR Code ในป้ายโครงการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักฯ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กวป. มีการชำรุด/ไม่ใช้งาน เห็นควรที่ กวป. ต้องเร่งตรวจสอบ และแก้ไขในเรื่องนี้โดยด่วน เพราะหากอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีความชำรุด จะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ต้องรายงาน และการบริหารจัดการได้	กวป.
๔.	เศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือ ให้เก็บรวบรวมและขนออกไปทิ้งนอกโครงการ เพื่อคืนกลับสู่สภาพเดิม	สทน.๖ และ สทน.๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแพ้วพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ม.๒ ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี



เศษวัสดุก่อสร้างให้นำไปทิ้งนอกโครงการฯ

ปรับแต่ง Slope ให้มีความเสมอ เรียบร้อย
และสวยงาม



พบหินบริเวณกันสระ ให้ปรับแก้ไขแบบ

นำดินไปทิ้งในจุดที่ทิ้งดิน และปรับแต่งมวล
ดินทิ้งให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต



ปรับเกลี่ยดิน และทดสอบความหนาแน่นของดิน

ปรับแต่งดินให้เป็นร่องน้ำ



บริเวณอาคารสูบน้ำเพิ่ม staff gate เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำรู้ปริมาณน้ำคงเหลือในสระ

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ ต.พุดตาลอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี



การวางแนวรั้วตรงกัน



ปรับแต่งรอบโครงการฯ ให้สวยงาม



นำหินไปทดสอบคุณภาพ

(๓) โครงการอนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฟ. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี



เพิ่มความสูงแนวคันกันน้ำ



(๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังงาย ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี



เสาไฟทำให้เกิดความมั่นคง



เศษวัสดุก่อสร้างให้นำไปทิ้งนอกโครงการฯ



วัชพืชกำจัดก่อนแล้วเสร็จ เพื่อความเรียบร้อย



ซ่อมเสาต่อหม้อของอาคารสูบน้ำให้ตรง

(๕) สถานีเตือนภัยล่วงหน้าบ้านหินกอง (Early warning) หมู่ ๙ ต.วังโตนด อ.นายายอาม

จ.จันทบุรี



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

(๑) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังยาง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี



ปรับสลิ้งให้เหมาะสมกับระดับ

แพสูบน้ำเอียง



พื้นยางมะตอยคอนกรีตตัดไม่สวยงาม
ความห่างของรอยต่อไม่เหมาะสม

เกิดรอยแตกของแผ่นปูน



เชื่อมต่อหม้อเอียง

เศษวัสดุก่อสร้างนำออกไปทิ้งนอกโครงการฯ



การออกแบบควรจะเป็นเรียงหินยาแนว

(๒) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย ม.๑๔, ๕, ๑๓, ๑ ต.พลับพลาไชย อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี



แหล่งน้ำสำหรับสูบน้ำควรมีรั้วรอบ เพื่อป้องกันขยะมูลฝอย
เนื่องจากบริเวณด้านข้างเป็นตลาดและชุมชน



ถังกรองควรใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ

(๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซับใหญ่ ม.๑๓ ต.พลับพลาไชย อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี



การเรียงหินควรมีผิวหน้าเรียบ และสวยงาม



ปรับแต่งเกลี่ยมวลดินให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต



จุดพบหินแข็งบริเวณก้นอ่าง

(๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.๒ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี



เก็บตัวอย่างหินไปทดสอบ และคำนวณค่าปริมาณหิน



ปรับแต่งเกลี่ยมวลดินให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต



ปรับแต่งดินให้เป็นร่องน้ำบริเวณถนนสาธารณะ



มวดดิน



ปรับแต่ง Slope ด้านในให้มีความเสมอ เรียบร้อย และสวยงาม



ปรับแต่ง Slope ด้านนอกให้มีความเสมอ เรียบร้อย และสวยงาม

(๕) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม พร้อมระบบกระจายน้ำ
ม.๕, ๗, ๘ ต.ลุ่มสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี



QR Code สำหรับประชาชน Error



จุดปล่อยน้ำมีตะกอนเยอะ

(๖) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาชี บ้านหินแต่น ม.๓ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย
จ.กาญจนบุรี



การเรียงหินในลวดตาข่ายให้แน่นและเต็มกล่อ่ง มีผิวหน้าเรียบ



(๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านห้วยสวนพลู ม.๖ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี



น้ำซึมบริเวณรอบหลุมโครงการฯ



จุดการเชื่อมระหว่างการเทปูน

(๘) โครงการเพิ่มศักยภาพพระบพพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำสถานีเตือนภัย บ้านหินแต้น ม.๓ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี





บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๖๑๐๒
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๖
ใน

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ ๐๔๐๔๔
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๑๕

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๔๑
ที่ ทส ๐๖๒๑/๖๕๗ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ และ ๑๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติ หน.ผต. เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ และ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง


หน.ผต. ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ (นายประสิทธิ์ พัทวี) ในฐานะ คณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้านเทคนิควิศวกรรม (AE) มาบูรณาการการทำงานร่วมกับการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ สทน.๘ และ สทน.๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การเบิกจ่ายในภาพรวมของ สทน.๘ และ สทน.๑๐ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันตรวจติดตามฯ และคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้ ดังนี้

สทน.๘ ขณะตรวจฯ มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๖๖.๒๓ และ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ ๙๓


สทน.๑๐ ขณะตรวจฯ มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๕.๔๕ และ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ ๘๙.๓๐

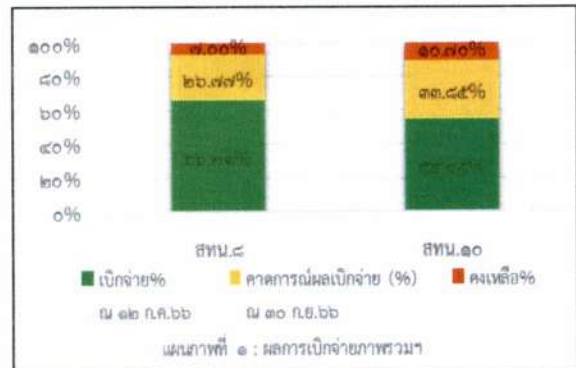

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทน.๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๒๘ โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๙ โครงการ อีกจำนวน ๙ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการ บริหารสัญญา โดยมีผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายในกันยายน ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่ได้รับงบเหลือจ่ายจำนวน ๔ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว

สทน.๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๖ โครงการ แบ่งเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ มีจำนวน ๓ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และอีกจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลิก อ.ปลายพระยา

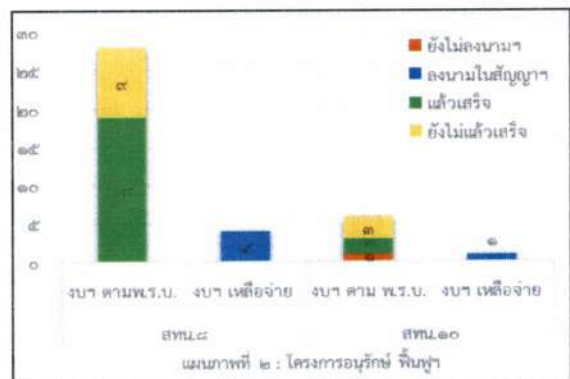

เรื่องกลับ ศกษ
วันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๖
เวลา ๖๕-๖๖ น.


เรื่องกลับ กษ
วันที่ 30 ส.ค. ๖๖
เวลา 10:๕๕

จ.กระบี่

จ.กระบี่ อยู่ระหว่างการรอผลอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง ซึ่งขณะตรวจติดตามได้รับรายงานว่า กรมบัญชีกลาง ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างการแจ้งผลการพิจารณากลับมายัง สทท.๑๐ โดย สทท.๑๐ คาดว่าเมื่อรับการแจ้งผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางแล้วจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน ๑ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๓ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทท.๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการฯ จำนวน ๒๔ โครงการ ขณะตรวจติดตามฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ โครงการ ที่ยังไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๒ โครงการอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ดังนี้ (๑) จำนวน ๙ โครงการ มีผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ ๖๐ (๒) จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำศูนย์ราชการ อบ.พิต้า จ.นครศรีธรรมราช และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก - ห้วยกำ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง แม้จะมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๓.๓๓ และ ร้อยละ ๑๙.๒๒ ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๖

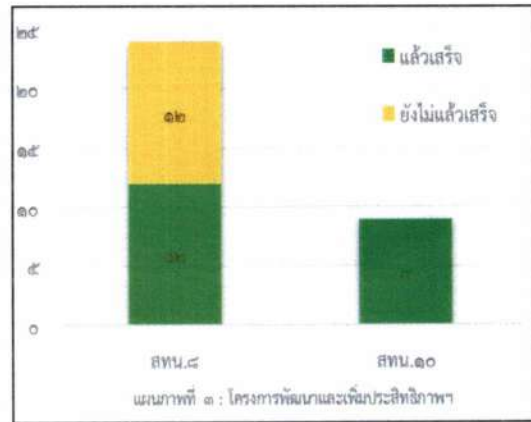

(๓) จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ จังหวัดยะลา - ปัตตานี ยังไม่มีผลการดำเนินงานแต่อย่างใด เนื่องจากมีการขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยที่จะให้ดำเนินงาน ทั้งนี้ สทท.๘ พิจารณาและมีแนวโน้มที่จะขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

สทท.๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำจำนวน ๙ โครงการ **ดำเนินการแล้วเสร็จ**

๒.๔ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒


สทท.๑๐ มีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ โครงการ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ และ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ **ดำเนินการแล้วเสร็จ**

สทท.๘ มีโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ **ดำเนินการแล้วเสร็จ**

๒.๕ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

(๑) ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)



ตามที่ได้รายงานผลการตรวจติดตามฯ รอบที่ ๑ ไปแล้วว่า การได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม ลดลงไม่สอดคล้องกับจำนวนสถานีที่นับวันจะเพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถบำรุงรักษาสถานี และ/หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามรอบที่ควรจะเป็น เป็นสาเหตุให้เกิดการชำรุดของอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้ง มีผลต่อประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูล และจากการตรวจติดตามฯ รอบที่ ๒ พบว่า สถานีเตือนภัยของ สทท.๘ จำนวน ๑๙๗ สถานี มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลจำนวน ๑๖๕ สถานี หรือร้อยละ ๘๓.๘๕ และ

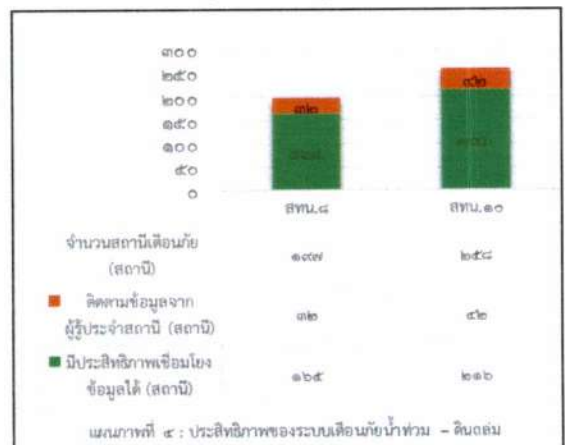

มีสถานี...

มีสถานที่ที่ต้องติดตามข้อมูลจากผู้รู้จำนวน ๓๒ สถานที่ หรือร้อยละ ๑๖.๑๖ สำหรับสถานที่เตือนภัยของ สทพ.๑๐ จำนวน ๒๕๘ สถานที่ มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลจำนวน ๒๑๖ สถานที่ หรือร้อยละ ๘๓.๗๖ และมีสถานที่ที่ต้องติดตามข้อมูลจากผู้รู้จำนวน ๔๒ สถานที่ หรือ ร้อยละ ๑๖.๒๔

(๒) ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานที่เตือนภัย

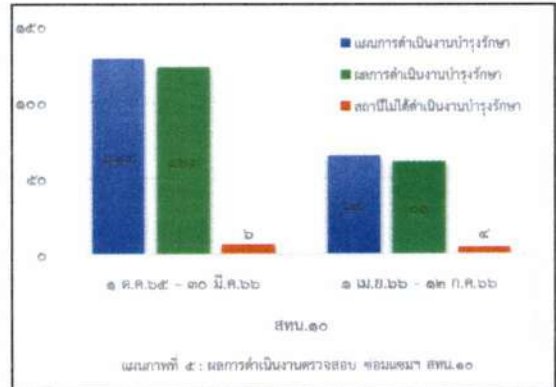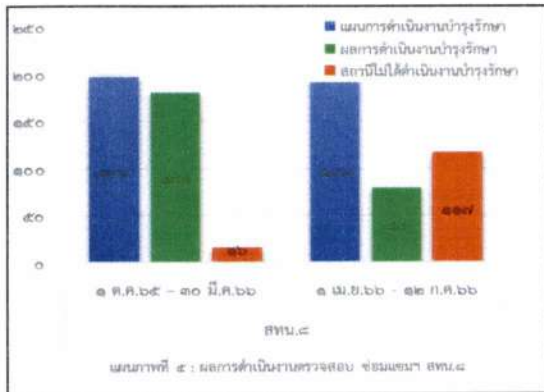

จากแผนภาพที่ ๕ ในส่วนการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา แสดงให้เห็นว่า มีการดำเนินการลดลงจากในครึ่งปีแรก ดังนี้

สทพ.๔ ครึ่งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) มีแผนดำเนินการบำรุงรักษา สถานที่ทั้งหมด ๑๙๗ สถานที่ สามารถดำเนินการได้ ๑๘๑ สถานที่ และมีสถานที่ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ สถานที่

ครึ่งปีหลัง (เมษายน - วันตรวจฯ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) มีแผนดำเนินการบำรุงรักษา สถานที่ทั้งหมด ๑๘๑ สถานที่ สามารถดำเนินการได้ ๘๐ สถานที่ และมีสถานที่ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๐๑ สถานที่

สทพ.๑๐ ครึ่งปีแรก (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) มีแผนดำเนินการบำรุงรักษา สถานที่ ๑๒๙ สถานที่ จากจำนวนสถานที่ทั้งหมด ๒๕๘ สถานที่ สามารถดำเนินการได้ ๑๒๓ สถานที่ และมีสถานที่ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๖ สถานที่

ครึ่งปีหลัง (เมษายน - วันตรวจฯ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) มีแผนดำเนินการบำรุงรักษา สถานที่ ๑๒๓ สถานที่ จากจำนวนสถานที่ทั้งหมด ๒๕๘ สถานที่ สามารถดำเนินการได้ ๖ สถานที่ และมีสถานที่ที่ไม่ได้ดำเนินการ ๑๙๒ สถานที่

จากผลการตรวจติดตามฯ รอบที่ ๑ ต่อเนื่องผลการตรวจติดตามฯ รอบที่ ๒ เป็นปัญหาที่เห็นเป็นเชิงประจักษ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันสถานะการดำเนินงาน **“ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ และน้ำป่าไหลหลาก”** ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ **ที่ไม่ผ่านเป้าหมายขั้นต่ำ** คือ ร้อยละ ๑๐๐ และสถานที่จำนวน ๑,๗๙๖ สถานที่ พร้อมใช้งาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีข้อสังเกตว่า ผลการดำเนินงานเป็นการดำเนินงานระหว่างปี ซึ่งข้อมูลยังไม่ครบถ้วนตามปีงบประมาณ ประกอบกับส่วนราชการควรบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำให้มีความพร้อมใช้งานตามเป้าหมาย

๒.๖ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สทพ.๔ และ สทพ.๑๐ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึง ณ วันตรวจติดตามฯ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม สรุปได้ดังนี้

สทน.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่าย น้ำ (ลิตร)	น้ำดื่ม (ขวด)	ประโยชน์ที่ได้รับ	
	ภัยแล้ง	น้ำท่วม			ประชาชน (ครัวเรือน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๘	๓,๓๘๕,๖๒๐	๖๒๙,๑๙๖	-	-	๖,๘๓๕	๖๘,๖๙๐
๑๐	๑,๗๑๗,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑,๑๘๖,๐๐๐	-	๑๓,๔๕๙	๑๗,๒๕๗
รวม	๕,๑๐๒,๖๒๐	๘๑๓,๑๙๖	๑,๑๘๖,๐๐๐	-	๒๐,๒๙๔	๘๕,๙๔๗

นอกจากนี้ สทน.๘ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๗ เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อรักษาระดับน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ป่าพรุ ไม่ให้ระดับน้ำลดต่ำซึ่งเป็นระดับที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

๒.๗ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

หน.ผต. และ ผชช. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ พื้นที่ป่า โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และสถานีเตือนภัยฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้วย ดังนี้

สทน.๘ ประกอบด้วย

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำพรุชะเมา จังหวัดยะลา-ปัตตานี อ.รามัน จ.ยะลา ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๓ เอกสารแนบ ๑

(๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านบูเกะกุง ช่วง ๒ เพื่อการถ่ายโอนให้อปท. อ.มายอ จ.ปัตตานี ดำเนินการแล้วเสร็จ เอกสารแนบ ๒

(๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำแม่เปี้ยะ พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๗ เอกสารแนบ ๓

(๔) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก - ห้วยกำ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๘ เอกสารแนบ ๔

(๕) สถานีเตือนภัย สถานีบ้านคลองต่อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ผู้รู้ประจำสถานี นางสาวดาริน หมดอะดัม เอกสารแนบ ๕

(๖) สถานีเตือนภัย สถานีบ้านนอก อ.กงหรา จ.พัทลุง ผู้รู้ประจำสถานี นายศักรชัย เพชรโชติ เอกสารแนบ ๕

สทน.๑๐ ประกอบด้วย

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบนนายแจ่ม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๖ เอกสารแนบ ๖

(๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองไหล อ.เขาพนม จ.กระบี่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เอกสารแนบ ๗

(๓) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำบึงนามะพร้าว อ.บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๕ เอกสารแนบ ๘

(๔) โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองเหล็ด สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๓ เอกสารแนบ ๙

(๕) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นบางยูง อ.กะปง จ.พังงา ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๘ เอกสารแนบ ๑๐

(๖) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำพยุยานิน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๕ เอกสารแนบ ๑๑

(๗) โครงการ...

(๗) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทอง (ลำน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ๒) อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๙ เอกสารแนบ ๑๒

(๘) สถานีเตือนภัย สถานี STN๑๗๗๘ บ้านบางบอน อ.ลำทับ จ.กระบี่ ผู้รู้ประจำสถานี นายสำราญ นวลสมศรี เอกสารแนบ ๑๓

(๙) สถานีเตือนภัย สถานี STN๑๗๒๙ บ้านควนหวายแดง อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ผู้รู้ประจำสถานี นายสุทน บุญช่วย เอกสารแนบ ๑๓

(๑๐) สถานีเตือนภัย สถานี STN๑๕๖๓ บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล อ.บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้รู้ประจำสถานี นางสาวใจ ลีสง่า เอกสารแนบ ๑๓

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ทน.ผต. และ ผชช. ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สทน. รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามมีข้อค้นพบอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดย ทน.ผต. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม ได้รับจัดสรรลดลง ส่งผลกระทบให้การซ่อมแซม/บำรุงรักษาสถานีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ อุปกรณ์บางชนิดชำรุด งบประมาณซ่อมแซมไม่เพียงพอ แม้จะมีข้อเสนอแนะให้ใช้เงินเหลือนำไปแก้ไขปัญหานี้ไปพลางก่อนก็ไม่ได้ รับการพิจารณา/สั่งการแก้ไขในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรม แม้จะเห็นเป็นประจักษ์ประจักษ์จากสถานะการดำเนินงาน “ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการประกาศ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ และน้ำป่าไหลหลาก” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ไม่ผ่านเป้าหมายขั้นต่ำ ดังนั้น เห็นควรที่ ทน. ต้องให้ความสำคัญ ติดตาม และสั่งการให้ กยผ. ทหารร่วมกับ กวพ. เป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งประสานชี้แจงสำนักงบประมาณ ถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ ทั้งนี้ หากไม่เร่งแก้ไขการได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม ให้สอดคล้องกับจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งความเชื่อมั่นขององค์กรต่อภาคประชาสังคม	กยผ. และ กวพ.
๒.	งบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มาตั้งแต่มีการจัดตั้ง สทนช. แม้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะได้ใช้งบเหลือนำไปดำเนินงาน บูรณาการฯ มาดำเนินการ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ก็ยังไม่เพียงพอ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กยผ. ได้จัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการเป็นลำดับต้น รวมถึงได้ประสานงานกับสำนักงบประมาณ เพื่อชี้แจงถึงความสำคัญในการขอรับการจัดสรรของรายการดังกล่าวแล้ว แต่พิจารณาเห็นว่า วิธีการเขียนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ควรเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการก่อสร้างฯ ที่กรมทรัพยากรน้ำไปดำเนินการ ซึ่งจะมีความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการในระบบลุ่มน้ำ เมื่อครั้งที่สำนักส่งเสริมและประสานมวลชนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อนที่จะมี พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยอาจใช้กระบวนการเดียวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งจะทำให้จำนวนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำควบคู่ไปกับจำนวนโครงการก่อสร้างฯ ที่ดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ	กยผ. และ กอน.

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.	รูปแบบของระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning) แต่ละปีแตกต่างกัน เช่น รูปแบบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แตกต่างกับของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และรูปแบบที่มีอยู่เดิม ซึ่งหากมีรูปแบบเดิมและเป็นมาตรฐานเดียวกันจะสามารถนำอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่มาซ่อมแซม และ/หรือบริหารจัดการร่วมกันได้ แต่หากมีรูปแบบที่แตกต่างกันนอกจากจะไม่สามารถบริหารจัดการได้แล้ว เพิ่มความซับซ้อนในการดูแล บำรุงรักษาด้วย เห็นควรที่ กวพ. จักได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ และให้มีรูปแบบของระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน	กวพ.
๔.	เศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือ ให้เก็บรวบรวมและขนออกไปทิ้งนอกโครงการ เพื่อคืนกลับสู่สภาพเดิม	สทน.๘ และ สทน.๑๐
๕.	การควบคุมดินทิ้งให้นำดินไปทิ้ง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและปรับแต่งมวลดินให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสามารถคำนวณปริมาณดินทิ้งได้ง่าย พร้อมทำหนังสือมอบดินทิ้งให้ อบท. รับมอบไว้ใช้ประโยชน์	สทน.๘ และ สทน.๑๐
๖.	การเรียงหินในกล่องลวดตาข่ายต้องเรียงหินให้แน่นและเต็มกล่อง มีผิวหน้าเรียบและสวยงามเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกัดเซาะเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงการ	สทน.๘ และ สทน.๑๐
๗.	การจัดทำรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานต้องจัดทำเป็นประจำทุกวัน โดยกรอกรายละเอียดข้อมูล เช่น รายการงานที่ทำ ปริมาณงานที่ทำได้ ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น และเป็นปัจจุบัน	สทน.๘ และ สทน.๑๐

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะในรายละเอียดเชิงเทคนิควิศวกรรมของแต่ละโครงการ ผชช. ในฐานะคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้านเทคนิควิศวกรรม จักได้นำเรียน อทน. เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป ในการนี้ หน.ผด. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทน. ได้พิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ หน.ผด. เพื่อจักได้สรุปนำเรียน อทน. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ


(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
๑๖/๑๒/๒๕๖๖ ๑๕:๓๐ น. ณ.๘๓


๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖
(นายภาตล ทวารภักดิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำพรุชะเมา จังหวัดยะลา-ปัตตานี
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา



ปรับแต่งมวลดินทิ้งให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต
เพื่อการคำนวณดินทิ้งได้ง่าย



(๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านบุเกะกุง ช่วง ๒ เพื่อการถ่ายโอนให้ อปท.
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี



เศษวัสดุก่อสร้างให้นำไปทิ้งนอกโครงการฯ



การเรียงหินในลวดตาข่ายให้แน่นและเต็มกล่อง มีผิวหน้าเรียบ

(๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำแม่เปี้ยะ พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



(๔) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก - ห้วยก้า ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัด

พัทลุง

ปรับแต่งมวลดินทิ้งให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต



(๕) สถานีเตือนภัยน้ำหลาก – ดินถล่ม (Early warning) สถานีบ้านคลองต่อ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา ผู้รู้ประจำสถานี นางสาวดารณ หมัดอะดัม



(๖) สถานีเตือนภัยน้ำหลาก – ดินถล่ม (Early warning) สถานีบ้านนอก อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ผู้รู้ประจำสถานี นายศักรชัย เพชรโชติ



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๐

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบนนายแจ่ม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่



จังหวัดกระบี่

(๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองไหล อำเภอเขาพนม



(๓) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำบึงนามะพร้าว อำเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี



(๔) โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองเหลิด สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี



กองดินที่กองอยู่ริมตลิ่งให้ต้นหรือขนกองดินไป ณ สถานที่กำหนด และปรับแต่งมวลดินทิ้งให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสไลด์ของกองดินลงไปลำน้ำเกิดการตื้นเขิน



(๕) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นบางยูง อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา



นำดินมาถมอัดเพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่โครงการฯ



(๖) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำพรุยายนิน อำเภอยายเมือง
จังหวัดพังงา



(๗) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทอง (ลำน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ ๒) อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา



การเรียงหินในลวดตาข่ายให้แน่นและเต็มกล่อง มีผิวหน้าเรียบ

(๘) สถานีเตือนภัยน้ำหลาก – ดินถล่ม (Early warning) สถานี STN๑๗๗๘ บ้านบางบอน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่



(๙) สถานีเตือนภัยน้ำหลาก – ดินถล่ม (Early warning) สถานี STN๑๗๒๔ บ้านควนหวายแดง อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่



(๑๐) สถานีเตือนภัยน้ำหลาก – ดินถล่ม (Early warning) สถานี STN๑๕๖๓ บ้านกอบแก้ว วัฒนาภิบาล อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี





สพท.

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๗๔๐๗
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑.๐๙

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ ๐๔๒๓๖
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๘.๕๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๖๕๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม


อทน. ได้อนุมัติ หน.ผต. เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

หน.ผต. ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ (นายประสิทธิ์ พัวทวี) ในฐานะคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้านเทคนิควิศวกรรม (AE) มาบูรณาการการทำงานร่วมกับการตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ สทท.๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเบิกจ่ายในภาพรวมของ สทท.๑๑ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันรายงานข้อมูลการตรวจฯ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๙.๔๓ และคาดการณ์ว่า ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายเพิ่มอีกร้อยละ ๔๐.๕๗ รวมเป็นเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ ๑๐๐

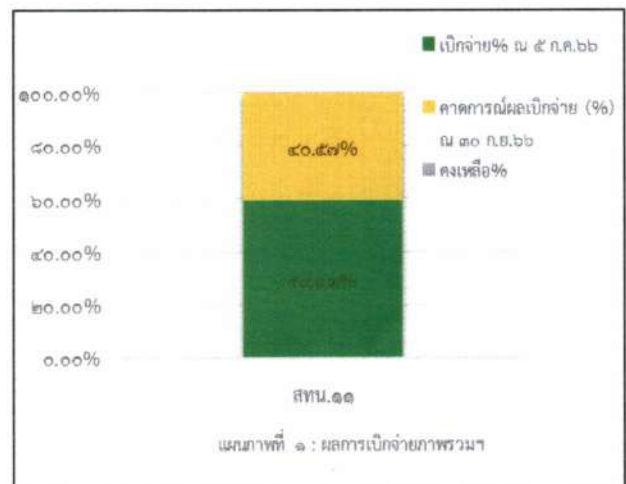

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทท.๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยละโอง (ตอนล่าง) ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาและคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒.๓ แผนงาน...

เรื่องกลับ สทท.
วันที่ ๑๕.๘.๖๖
เวลา ๑๕.๔๕


เรื่องกลับ กสน
วันที่ ๒๕.๘.๖๖
เวลา ๑๔.๔๐

๒.๓ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สท.๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๒๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ ยังไม่แล้วเสร็จจำนวน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ดังนี้

(๑) จำนวน ๑๐ โครงการ มีผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ ๗๐

(๒) จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองตอง อ.พนา และ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ข้าว ม.๓,๑๐,๑๑ อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑ และ ๓ ตามลำดับ เนื่องจากเป็นโครงการที่ โอนเปลี่ยนแปลง แต่ทั้ง ๑๒ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จก็คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

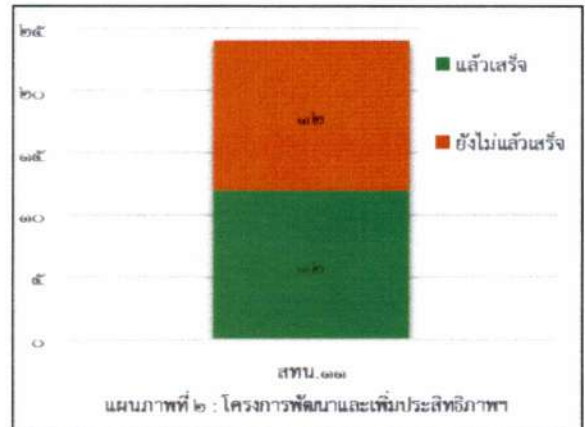

๒.๔ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สท.๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คือ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ งบประมาณ ๐.๕๐๕๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงานทำเอง ขณะตรวจติดตามฯ อยู่ระหว่างดำเนินงานและจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

๒.๕ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

สท.๑๑ มีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๖ โครงการ **ดำเนินการแล้วเสร็จ**

๒.๖ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้าน

(๑) ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning)

จำนวน สถานีเตือนภัย (สถานี)	มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง ข้อมูลได้ (สถานี)		ติดตามข้อมูลจากผู้รู้ ประจำสถานี (สถานี)		สถานีชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ (สถานี)		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ค่าชี้แจง
๖	๓	๕๐	๓	๕๐	๓	๕๐	

สท.๑๑ มีสถานีเตือนภัยในความรับผิดชอบจำนวน ๖ สถานี มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูล จำนวน ๓ สถานี หรือร้อยละ ๕๐ และอีกจำนวน ๓ สถานี ที่มีอุปกรณ์ชำรุดรอซ่อมแซม ซึ่งผู้รู้ประจำสถานียังรายงาน ปริมาณน้ำฝนให้ส่วนอุทกวิทยาและส่วนกลางผ่านโทรศัพท์มือถือ/ผ่านกลุ่มไลน์ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประมวลผล เพื่อให้การรายงานของข้อมูลเกิดความต่อเนื่อง

(๒) ผลการดำเนินงานตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีเตือนภัย

สท.๑๑ สามารถดำเนินการได้ตามแผน ๓ แห่ง และมีจำนวนสถานีเตือนภัยชำรุด รอซ่อมแซมจำนวน ๓ สถานี คือ (๑) สถานี Early warning บ้านสันติสุข ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

(๒) สถานี...

(๒) สถานี Early warning บ้านกลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (๓) สถานี Early warning บ้านศรีเมืองใหม่ ต.สิริเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ สถานีที่เชื่อมโยงข้อมูลไม่ได้ สทท.๑๑ ได้กำกับให้ผู้รู้ประสานงานกับส่วนอุทกวิทยา ในกรณีที่มีเหตุฝนตกหนักและให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประสานกับผู้รู้ในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิด

๒.๗ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สทท.๑๑ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการ ปฏิบัติงาน โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันรายงานข้อมูลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม สรุปได้ดังนี้

สทท.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่าย น้ำ (ลิตร)	น้ำดื่ม (ขวด)	ประโยชน์ที่ได้รับ	
	ภัยแล้ง	น้ำท่วม			ประชาชน (ครัวเรือน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๑๑	๙๖,๐๐๐	๖๕๔,๑๕๐		๓,๖๐๐	๑,๘๓๗	๒๒๐

๒.๘ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

หน.ผด. และ ผชช. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูฯ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และสถานีเตือนภัยฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในพื้นที่ด้วย ดังนี้

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกะหลาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ ต.โพ้นหิน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ บริเวณฐานที่ตั้งถังเก็บน้ำของระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ทั้ง ๔ ด้าน ให้ปรับปรุงการลาดเอียงของดินถมฐานที่ตั้งถังเก็บน้ำทั้งสี่ด้านและคันดินถมให้เรียบมีความมั่นคงแข็งแรง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จให้กลุ่มผู้ใช้น้ำบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่า โดยการแบ่งพื้นที่พิจารณาปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงและใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง และควรมีการเก็บค่าใช้น้ำตามความเหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการดูแลบำรุงรักษา เอกสารแนบ ๑

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกป่าจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ ๖,๗,๑๐,๑๑ ต.ยอ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๕ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ งานขุดลอกดำเนินการแล้วเสร็จ มีปริมาณดินทิ้งจำนวนมาก คันดินถมที่ผู้รับจ้างทำร่องไว้ป้องกันน้ำฝนชะให้ดำเนินการเกลี่ยดินถมให้เรียบ งานฐานที่ตั้งระบบกระจายน้ำแล้วเสร็จ รอกการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เอกสารแนบ ๒

(๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยละโง (ตอนล่าง) สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ ๘ ต.นาวัง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ การเรียงหินในร่องลวดตาข่ายป้องกันกักตุนบริเวณด้านข้างและด้านหลังฝายน้ำล้นให้เรียงหินให้แน่นและเต็มร่อง เอกสารแนบ ๓

(๔) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านกุงชัย หมู่ ๑๐,๑๑,๑๓ ต.ดงบัง อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ให้สนับสนุน กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็ง เพื่อบริหารจัดการน้ำในโครงการฯให้เกิดการใช้ประโยชน์ เอกสารแนบ ๔

๕) สถานีอุตุ...

(๕) สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสสถานี ๑๕๐๑๑๗ เสาแผ่นไม้วัดระดับน้ำเดิมมีความเสียหายและขาดงบประมาณ ทำให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาต้องซ่อมแซมเอง เพื่อให้ใช้งานได้ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ยังมีจุดวัดระดับน้ำที่ยื่นออกไปบริเวณริมแม่น้ำอาจถูกกระแสน้ำพัดพาได้ง่าย อีกทั้งไม่ห่างจากสถานีดังกล่าวมีสถานีวัดระดับน้ำของกรมชลประทานตั้งอยู่ด้วย ซึ่งแตกต่างทั้งมาตรฐานและความมั่นคงแข็งแรง เอกสารแนบ ๕

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ทน.ผต. และ ผชช. ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สทน. รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามมีข้อค้นพบอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดย ทน.ผต. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.	งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม ได้รับจัดสรรลดลง ส่งผลกระทบให้การซ่อมแซม/บำรุงรักษาสถานีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ อุปกรณ์บางชนิดชำรุด งบประมาณซ่อมแซมไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนของประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลจะลดลง ซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต้องจัดทำเป็นข้อมูลเพื่อให้สำนักงานงบประมาณได้ทราบและประกอบการพิจารณา ดังนั้น เห็นควรที่ ทน. ต้องให้ความสำคัญติดตาม และสั่งการให้ กยผ. หรือร่วมกับ กวพ. เป็นการเร่งด่วน	กยผ. และ กวพ.
๒.	การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการก่อสร้างฯ ที่กรมทรัพยากรน้ำไปดำเนินการมีความจำเป็นและเร่งด่วนอย่างมาก เพราะหากไม่หาทางแก้ไข อีกไม่นานโครงการก่อสร้างฯ ที่กรมทรัพยากรน้ำไปดำเนินการไว้จะใช้งานไม่ได้ ถูกปล่อยทิ้งร้างและจักเป็นอนุสาวรีย์ที่ลดความเชื่อมั่นขององค์กรได้	กยผ. และ กอน.
๓.	สทน.๑๑ มีการจ้างเหมาบริการจำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๙ ของอัตรากำลังทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยใช้งบดำเนินงานที่มีจำนวนจำกัด เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร เห็นควรที่ อทน. ต้องให้ความสำคัญและเร่งแก้ไขในเรื่องนี้ ให้สำนักงานเลขาธิการกรม โดยส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณาหาแนวทางสนับสนุนบุคลากรให้กับ สทน.๑๑ ให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน	สลก.
๔.	สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสสถานี ๑๕๐๑๑๗ เสาแผ่นไม้วัดระดับน้ำเดิมมีความเสียหายและขาดงบประมาณ ทำให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาต้องซ่อมแซมเองเพื่อให้ใช้งานได้ไปพลางก่อน ทั้งนี้ ยังมีจุดวัดระดับน้ำที่ยื่นออกไปบริเวณริมแม่น้ำอาจถูกกระแสน้ำพัดพาได้ง่าย เห็นควรที่ กวพ. จักได้สำรวจ ตรวจสอบสถานีในความรับผิดชอบทั้งหมด และออกแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มีมาตรฐานความมั่นคง แข็งแรง และ กยผ. ได้รับทราบเป็นข้อมูลเพื่อให้สำนักงานงบประมาณได้ทราบและประกอบการพิจารณา ซึ่งทั้งหมดที่ต้องเร่งดำเนินการมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งความเชื่อมั่นขององค์กรด้วย	กยผ. และ กวพ.

๕.	เศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือ ให้เก็บรวบรวมและขนออกไปทิ้งนอกโครงการ เพื่อคืนกลับสู่สภาพเดิม	สทท.๑๑
๖.	การควบคุมดินทิ้งให้นำดินไปทิ้ง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในแบบแปลนและปรับแต่งมวลดินให้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เพื่อสามารถคำนวณปริมาณดินทิ้งได้ง่าย พร้อมทำหนังสือมอบดินทิ้งให้ อปท. รับมอบไว้ใช้ประโยชน์	สทท.๑๑
๗.	การเรียงหินในกล่องลวดตาข่ายต้องเรียงหินให้แน่นและเต็มกล่อง มีผิวหน้าเรียบ และสวยงามเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงการ	สทท.๑๑
๘.	การจัดทำรายงานประจำวันของช่างควบคุมงานต้องจัดทำเป็นประจำทุกวัน โดยกรอรายละเอียดข้อมูล เช่น รายการงานที่ทำ ปริมาณงานที่ทำได้ ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น และเป็นปัจจุบัน	สทท.๑๑

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะในรายละเอียดเชิงวิศวกรรมของแต่ละโครงการ ผชช. ในฐานะคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้านเทคนิควิศวกรรม จักได้นำเรียน อทท. เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป ในการนี้ ทน.ผต. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ ทน.ผต. เพื่อจักได้สรุปนำเรียน อทท. เพื่อทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ขอรับทราบและพิจารณา
๑๕ เม.ย. ๒๕๖๖



๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖
(นายภาตล ถาวรเกียรติ)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกระหลาวพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ ตำบลโพนทัน อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดยะลา



ปรับปรุงการลาดเอียงของดินถมฐานที่ตั้ง
ถังเก็บน้ำทั้งสี่ด้านและคันดินถมให้มั่นคงแข็งแรง

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกป่าจิกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกป่าจิก หมู่ ๖,๗,๑๐,๑๑ ตำบลยอ อำเภอดำเนินแก้ว จังหวัดยโสธร

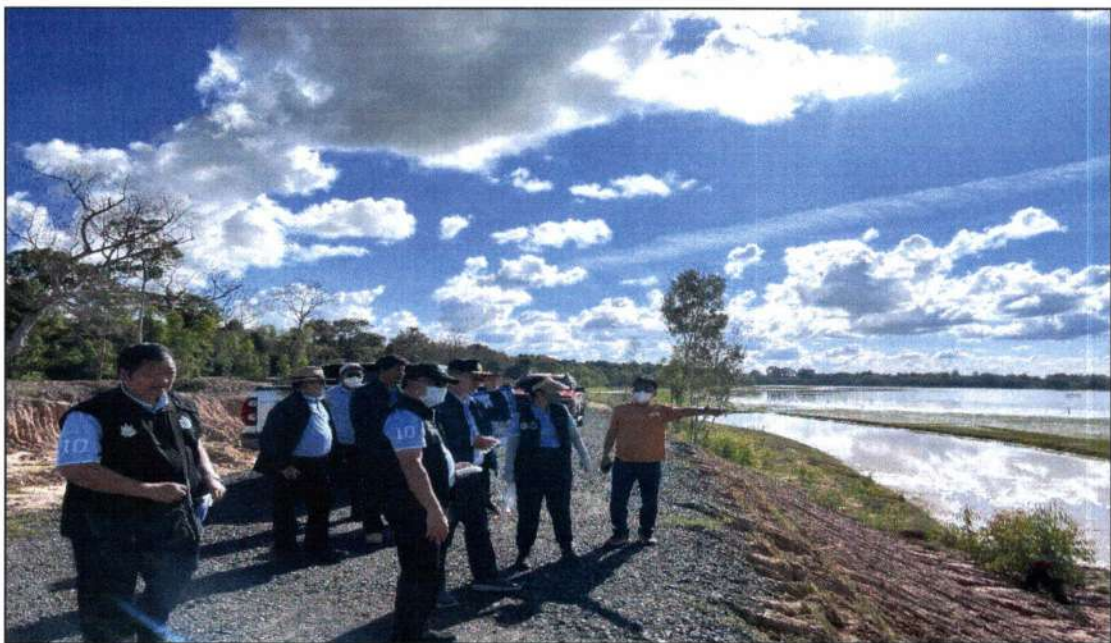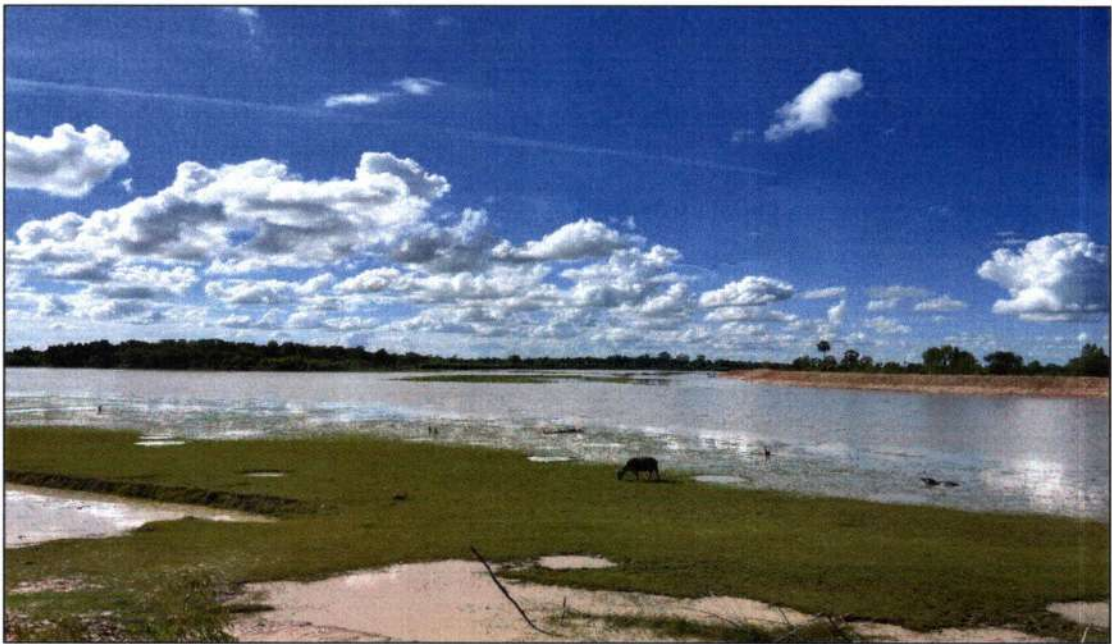

(๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยละโง (ตอนล่าง) สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ ๘ ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ




การเรียงหินในกล่องลวดตาข่ายเรียงหินให้แน่นและเต็มกล่อง



(๔) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านทุ่งชัย หมู่ ๑๐,๑๑,๑๓ ตำบลดงบัง อำเภอสืออานาจ จังหวัดอำนาจเจริญ



(๕) สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสสถานี ๐๕๐๑๑๗

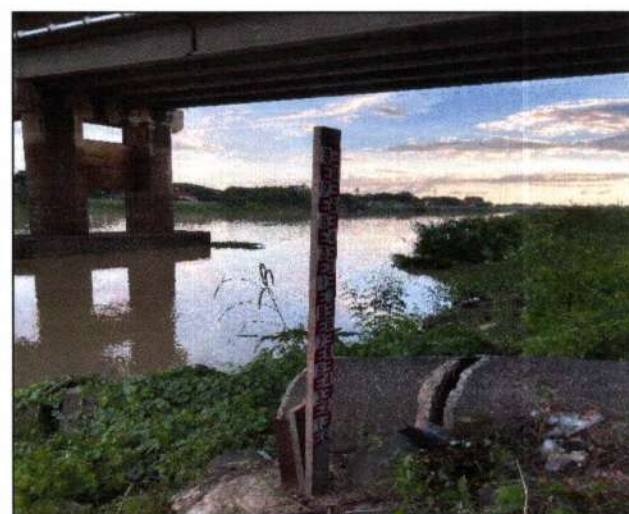

สถานีของกรมชลประทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๔๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๒๖๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ พื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัย Early Warning โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ และ ๕ ผู้อำนวยการส่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ปัญหาอุปสรรค สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ สทน. ๓ และ สทน. ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเบิกจ่ายในภาพรวมของ สทน. ๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๙.๔๓ และผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของ สทน. ๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๗.๑๓ ช่วงวันตรวจราชการอยู่ในระหว่างไตรมาสที่ ๓ ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๕ ผลการเบิกจ่ายของ สทน. ๓ และ สทน. ๕ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕.๕๗ และ ๑๗.๘๗ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาส ๑ : ๓๒% ไตรมาส ๒ : ๕๒% ไตรมาส ๓ : ๗๕% ไตรมาส ๔ ๙๓%)

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

(๑) สทน. ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ โครงการที่ลงนามสิ้นสุดสัญญาภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ส่วนโครงการที่ลงนามสิ้นสุดสัญญาหลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

(๒) สทน. ๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ เป็นโครงการที่ลงนามสิ้นสุดสัญญาหลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

๒.๓ แผนงาน...

เรื่องกลับ กสย
วันที่ ๑๕.๙.๖๖
เวลา ๑๕.๖๖ น.

เรื่องกลับ กสย
วันที่ 15.9.66
เวลา 13.25

๒.๓ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทน.๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำจำนวน ๓๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีโครงการที่ลงนามสิ้นสุดสัญญาหลัง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามสัญญาและตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

๒.๔ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

(๑) สทน.๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำจำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ผลการดำเนินงาน ๙๕ % จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๖

(๒) สทน.๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำจำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ

๒.๕ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอگانไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

(๑) สทน. ๓ มีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอگانไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ

(๒) สทน. ๕ มีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอگانไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ และส่งคืนงบประมาณ ๑ โครงการ (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่าเขากระป๋อง) จ.บุรีรัมย์

๒.๖ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑ มติ ครม. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

สทน. ๓ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๗ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒ มติ ครม. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(๑) สทน.๓ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๒) สทน.๕ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ

๒.๘ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓ มติ ครม. ๖ กันยายน ๒๕๖๕)

สทน. ๓ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๖

๒.๙ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้าน

(๑) ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)

หน่วยงาน	จำนวน สถานีเตือน ภัย	มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลได้ (สถานี)		ติดตามข้อมูลจากผู้รู้ ประจำสถานี (สถานี)		สถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ (สถานี)		
	(สถานี)	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ค่าชี้แจง
สทท. ๓	๑๐๐	๗๗	๗๗.๐๐	๒๓	๒๓.๐๐	๒๓	๒๓.๐๐	
สทท. ๕	๓๗	๓๖	๙๗.๓๐	๑	๒.๗๐	๑	๒.๗๐	อยู่ระหว่าง ซ่อมแซม ๑ แห่ง

สถานีที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ สทท.๓ และ สทท.๕ กำชับให้ผู้รู้ประจำสถานี รายงานปริมาณน้ำฝนให้ส่วนอุทกวิทยาและส่วนกลางผ่านโทรศัพท์มือถือ/ผ่านกลุ่มไลน์ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับ ประมวลผล เพื่อให้การรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนเกิดความต่อเนื่อง

(๒) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย (Early Warning)

หน่วยงาน	ผลการแจ้งเตือนภัย			
	ข้อมูลสะสม (ถึงปัจจุบัน) ๑ ต.ค. ๖๕ - ๑๒ มิ.ย. ๖๖ จำนวน (ครั้ง)	สีเขียว (เฝ้าระวัง)	สีเหลือง (เตรียมพร้อม)	อพยพ (สีแดง)
สทท. ๓	๔๙	๒๓	๒๑	๙
สทท. ๕	๑	๑	-	-

สทท.๓ และ สทท.๕ โดยส่วนอุทกวิทยาของแต่ละหน่วยงาน ได้ประสานการแจ้งเตือนภัย กับกองวิจัยพัฒนา และอุทกวิทยา (กพว.) อย่างต่อเนื่อง กรณีข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอยู่ในระดับสีแดง (อพยพ) เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยเกิดความเที่ยงตรงสอดคล้องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

๒.๑๐ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สทท.๓ และ สทท.๕ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม โดยสรุปตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันรายงานข้อมูลได้ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม สรุปได้ดังนี้

สทท.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	น้ำดื่ม (ขวด)	ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ภัยแล้ง	ระบายน้ำท่วม			ประชาชน (คน)	ประชาชน (ครัวเรือน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๓	๙,๓๑๖,๐๖๐	๑,๑๗๓,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๓๗,๘๙๑	๑๔,๙๒๑	๘,๕๕๓
๕	๖๖,๐๐๐	๗,๖๐๐	๖๖,๐๐๐	๗,๖๐๐	๔๘,๖๕๕	๑๔,๙๒๓	๔,๘๐๐

๒.๑๑ การลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ผต.นายไกรวัล ไทยบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และได้ตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัย Early Warning สรุปดังนี้

(๑) โครงการ...

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไข่นกพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านถ่อนโพธิ์ศรี หมู่ ๗ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอบำบือ จังหวัดหนองคาย (สท.๓) : ข้อมูลวันตรวจราชการฯ มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๗ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๕๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑๕๐ ไร่ ความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น ๗๘,๕๗๐ ลบ.ม. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๖ โดยขอให้ สท.๓ และประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๒) โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายนายอำเภอ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านसानตม หมู่ ๑ ตำบลसानตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย (งบกลาง) (สท.๓) : ดำเนินการแล้วเสร็จ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๘๐ ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๕๕ ครัวเรือน ประชาชนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำปลูกพืชผัก และดอกไม้ตัดดอก โครงการดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ โดยขอให้ สท.๓ และประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม บ้านชาด ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (สท.๕) : ดำเนินการแล้วเสร็จ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑,๘๐๐ ไร่ ความจุเก็บกักน้ำ ๙๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๔๗ ครัวเรือน มีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วจึงขอให้ สท.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม บ้านชาด ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (สท.๕) : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๒ อยู่ระหว่างติดตั้งระบบกระจายน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๖ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒,๓๐๐ ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๙๗๗ ครัวเรือน โดยขอให้ สท.๓ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการน้ำในโครงการฯ และช่วยดูแลอุปกรณ์ของระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ของกรมต่อไป

(๕) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัย จำนวน ๒ สถานี (สท.๕) : โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) คลองเพล หมู่ที่ ๓๗ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีสถิติแจ้งเตือน สีเขียว (เฝ้าระวัง) ๓ ครั้ง ผู้รู้ประจำสถานีฯ ต้องการให้ติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำบริเวณลำธารด้านข้างสถานีเตือนภัย โดยขอเปลี่ยนอันใหม่เนื่องจากอันที่ติดตั้งเดิมอักษรเลือนไม่สามารถอ่านได้ชัดเจน และต้องการให้ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม ส่วนโครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าช้างเหนือ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สถานีดังกล่าวอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

๒.๑๒ ปัญหาที่พบจากการตรวจเยี่ยม สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ อุดรธานี

ผอ.สท.๓ (นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา) แจ้งว่ากำแพงรั้วของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ด้านทิศเหนือมีสภาพชำรุดเป็นแนวยาว หากพังลงจะสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานข้างเคียง เช่น กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุดรธานี ที่ ๑ และอาจทำให้หน่วยงานขาดความปลอดภัยด้านทรัพย์สินในสำนักงาน

ภาพถ่ายประกอบการลงพื้นที่โครงการฯตามเอกสารแนบ

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สทน.๓ และ สทน.๕ รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน มีข้อค้นพบ อุปสรรคในการดำเนินงาน ที่สำคัญและควรเร่งดำเนินการแก้ไข โดย ผต. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อความไม่ประมาท ถึงแม้ว่าจะกันเงินไว้ เบิกจ่ายเหลือมิได้ตามระเบียบฯ ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำในการบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง	สทน.๓ และ สทน.๕
๒.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ควรมีการจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำหรือที่มีกลุ่มเดิมอยู่แล้ว ให้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อ บริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และโครงการระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ปัจจุบันทุกโครงการมี ประชาชนช่วยดูแลการเปิดและปิดระบบและดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และรณรงค์ให้ ประชาชนในพื้นที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้ปริมาณน้ำเพียงพอ และกลุ่มดังกล่าวยังสามารถช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ สทน. ๓ หรือ สทน.๕ หรือ อบต.กรณีระบบกระจายน้ำเกิดขัดข้องหรือมีอุปกรณ์ชำรุด โดย ให้ กอน. พิจารณาดังงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ สอดคล้องกับจำนวนโครงการแหล่งน้ำที่กรมฯ ดำเนินการ	กอน. สทน. ๓ หรือ สทน.๕
๓.	สทน.๓ และ สทน.๕ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่น เรือดูดโคลน ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการ ใช้งานและสะสมความชำนาญ เช่น พนักงานบังคับเครื่องจักรกลหนัก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาอัตรากำลังหรืองบประมาณให้ สทน.๓ และ สทน.๕ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีเครื่องมือประเภทนี้ เพื่อให้การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และมีอายุการใช้ งานที่นานขึ้น ทั้งนี้ ให้หน่วยงานส่วนกลาง (กพน.๒) ส่วนวิศวกรรมและ เครื่องจักรกล เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานและประสาน งบประมาณเพื่อให้การบริหารจัดการเครื่องจักรกลขนาดใหญ่เกิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป	สลก. และ กพน.๒
๔.	การขออนุญาตการใช้น้ำ ส่วนจัดสรรน้ำซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในการออก ใบอนุญาตการใช้น้ำในแต่ละหน่วยงาน สทน.๓ และสทน.๕ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ ซึ่งหากกฎหมายมี ผลบังคับใช้จะส่งผลให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความล่าช้า จึงขอให้หน่วยงาน ส่วนกลาง (กจน.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเสริมสร้างความรู้หรือฝึก การปฏิบัติในการขออนุญาตการใช้น้ำให้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อกฎหมายหรือกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับในการปฏิบัติงานอาจมีกรอบ	กจน.

15 ก.ย. 2566
(นายภาดล ถาวรภุชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัล ไทยपाल)ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไข่นก พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านถ่อนโพธิ์ศรี หมู่ ๗ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอบำบือ จังหวัดหนองคาย มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๗



๒. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายนายอำเภอ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านสานตม หมู่ ๑ ตำบลสานตม อำเภอกุเรือ จังหวัดเลย (งบกกลาง) ดำเนินการแล้วเสร็จ



กำแพงรั้วของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ด้านทิศเหนือมีสภาพชำรุดเป็นแนวยาว หากพังลงจะสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานข้างเคียง เช่น กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุดรธานี ที่ ๑ และทำให้หน่วยงานขาดความปลอดภัยด้านทรัพย์สินในสำนักงานฯ



ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัลด ไทยपाल)ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ วันที่ ๓ - ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) คลองเพล หมู่ที่ ๓๗ ตำบลหมูสี อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา



- ๒) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) หมู่ที่ ๑๖ บ้านท่าช้างเหนือ ตำบลหมูสี อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา



ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัลด ไทยपाल)ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ วันที่ ๓ - ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม บ้านชาด ตำบลดงใหญ่ อำเภอยะผา จังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐



- ๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำ ฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม บ้านชาด ตำบลดงใหญ่ อำเภอยะผา จังหวัดนครราชสีมา ผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๒






กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน.
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทน.๓

วันที่ ๑๙ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ได้เดินทางมาประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดย ผอ.สทน.๓ (นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา) ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไข่นก พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านดอนโพธิ์ศรี หมู่ ๗ ตำบลบ้านดอน อำเภอบำเหน็จ จังหวัดหนองคาย ซึ่งปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๗ ถ้าโครงการแล้วเสร็จจะมีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๕๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑๕๐ ไร่

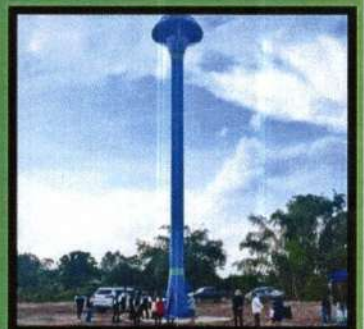

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี



กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน.
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทน.๕

วันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ได้เดินทางมาประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดย ผอ.สทน.๕ (นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา) ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม และได้ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย (๑) ลงพื้นที่สถานี Early Warning คลองเพล ม.๓๗ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (๒) ลงพื้นที่สถานี Early Warning หมู่ ๑๖ บ้านท่าช้างเหนือ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้น ลำน้ำเค็ม บ้านขาด ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผลการดำเนินงาน ๑๐๐% มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๔๗ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ได้รับประโยชน์ ๑,๘๐๐ ไร่ ปริมาณเก็บกักเก็บน้ำ ๐.๙ ล้าน ลบ.ม. (๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบน้ำจาก ฝายน้ำล้นลำน้ำเค็มบ้านขาด ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ผลการดำเนินงาน ๖๒% เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๙๗๗ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒,๓๐๐ ไร่



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี



สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 8457
วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา 14.50

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 04932
วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา 14.20

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๒๖๗

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัย Early Warning โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ และ ๙ ผู้อำนวยการส่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ปัญหาอุปสรรค สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ สทน. ๑ และ สทน. ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเบิกจ่ายในภาพรวมของ สทน. ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๖.๕๕ และผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของ สทน. ๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๖.๑๘ ช่วงวันตรวจราชการอยู่ในระหว่างไตรมาสที่ ๔ ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓ ผลการเบิกจ่ายของ สทน. ๑ และ สทน. ๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๖.๔๕ และ ๓๖.๘๒ ตามลำดับ (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาส ๑ : ๓๒% ไตรมาส ๒ : ๕๒% ไตรมาส ๓ : ๗๕% ไตรมาส ๔ ๙๓%)

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

(๑) สทน. ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ และคาดว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลง ๑ โครงการ (โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำ ล้นห้วยยะอุ อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจนไม่สามารถ ดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพได้ตามแบบแปลน)

(๒) สทน. ๙...

เรื่องกลับ สท.๑
วันที่ ๑๔.๙.๖๖
เวลา ๑๔.๑๖.๖๖

เรื่องกลับ กสน
วันที่ 15.๙.๖๖
เวลา 14.45

(๒) สทน. ๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ และคาดว่าทุกโครงการจะแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒.๓ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

(๑) สทน.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๓๘ โครงการ ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ

(๒) สทน.๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๙๕ โครงการ โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๖ โครงการ

๒.๔ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

(๑) สทน.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ

(๒) สทน.๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ

๒.๕ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอเกินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) สทน. ๑ มีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอเกินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๒) สทน. ๙ มีโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอเกินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒.๖ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑ มติ ครม. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

(๑) สทน. ๑ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๙๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๒) สทน. ๙ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ

๒.๗ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒ มติ ครม. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)

สทน. ๑ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒.๘ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓ มติ ครม. ๖ กันยายน ๒๕๖๕)

(๑) สทน. ๑ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ

(๒) สทน. ๙...

(๒) สทน. ๙ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒.๙ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้าน

(๑) ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning)

หน่วย งาน	จำนวน สถานีเตือน ภัย	มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลได้ (สถานี)		ติดตามข้อมูลจากผู้รู้ ประจำสถานี (สถานี)		สถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ (สถานี)		
	(สถานี)	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ค่าชี้แจง
สทน. ๑	๖๔๗	๔๖๓	๗๑.๕๖	๕๕๘	๘๖.๒๔	๘๙	๑๓.๗๕	
สทน. ๙	๒๖๔	๒๔๐	๙๐.๙๐	๑๗	๖.๔๔	๗	๒.๖๕	อยู่ระหว่าง ซ่อมแซม ๑ แห่ง

สถานีที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ สทน.๑ และ สทน.๙ กำชับให้ผู้รู้ประจำสถานี รายงานปริมาณน้ำฝนให้ส่วนอุทกวิทยาและส่วนกลางผ่านโทรศัพท์มือถือ/ผ่านกลุ่มไลน์ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับ ประมวลผล เพื่อให้การรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนเกิดความต่อเนื่อง

(๒) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย (Early Warning)

	ผลการแจ้งเตือนภัย			
หน่วยงาน	ข้อมูลสะสม (ถึงปัจจุบัน) ๑ ต.ค. ๖๕ – ๑๒ มิ.ย. ๖๖ จำนวน (ครั้ง)	สีเขียว (เฝ้าระวัง)	สีเหลือง (เตรียมพร้อม)	อพยพ (สีแดง)
สทน. ๑	๔๘	๒๖	๑๙	๓
สทน. ๙	๔๒	๓๐	๘	๔

สทน.๑ และ สทน.๙ โดยส่วนอุทกวิทยาของหน่วยงาน ได้ประสานการแจ้งเตือนภัยกับกองวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา (กพว.) อย่างต่อเนื่อง กรณีข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอยู่ในระดับสีแดง (อพยพ) เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยเกิดความเที่ยงตรงสอดคล้องสถานการณ์ในพื้นที่

๒.๑๐ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สทน.๑ และ สทน.๙ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันรายงานข้อมูลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม สรุปได้ดังนี้

สทน.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	น้ำดื่ม (ขวด)	ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ภัยแล้ง	ระบายน้ำท่วม			ประชาชน (คน)	ประชาชน (ครัวเรือน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๑	๒,๐๔๘,๑๐๐	๑๐,๔๖๒,๐๐๐	๓,๐๗๑,๗๔๗	-	๑,๐๔๑,๗๑๔	๓๕๗,๘๐๐	๔,๗๐๐
๙	๓,๑๕๒,๘๒๐	๓,๑๐๑,๒๒๐	๕,๙๒๖,๗๐๐	-	๔๑,๔๗๒	๑๗,๒๔๗	๔,๙๔๐

๒.๑๑ การลงพื้นที่...

๒.๑๑ การลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ผต.นายไกรวัล ไทยपाल ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และได้ตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัย Early Warning สรุปดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำแม่ยาวสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๑๐,๑๑ ตำบลท่าผา อำเภอกะเคา จังหวัดลำปาง (สท.๑) : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๒ (สัญญาสิ้นสุด ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๓๕๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่ โดยขอให้ สท.๑ ควบคุมผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด และเมื่อโครงการแล้วเสร็จให้ส่งเสริมประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ระยะ ๒ บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก อำเภอมะหา จังหวัดลำพูน (สท.๑) : ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๐ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๔๕ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑๒๐ ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(๓) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลผลิตการเกษตรบ้านปาง (แปลงใหญ่มะม่วง) ระยะ ๒ บ้านปาง หมู่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอยะปริงการ จังหวัดเชียงใหม่ (สท.๑) : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๒ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๕๒ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่ โครงการฯ ดังกล่าวสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลผลิตการเกษตรบ้านปาง จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตส่งผลให้รายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น

(๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ - บึงขดน้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังวน อำเภอยะปริงการ จังหวัดพะเยา (สท.๙) : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๕๒ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ ความจุเก็บกักน้ำ ๓๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. ขอให้ สท.๙ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้กลุ่มผู้ใช้น้ำช่วยดูแลระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

(๕) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำ - หนองทราย บ้านประดาดทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลาย อำเภอยะปริงการ จังหวัดพิจิตร (สท.๙) : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๒๔๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑๕๐ ไร่ ความจุเก็บกักน้ำ ๓๐๘,๐๐๐ ลบ.ม. ขอให้ สท.๙ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้กลุ่มผู้ใช้น้ำช่วยดูแลอุปกรณ์ของระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

(๖) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (สท.๙) : ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๙.๐๗ อยู่ระหว่างติดตั้งระบบกระจายน้ำและเดินท่อส่งน้ำ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๕๘๙ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๓,๒๐๐ ไร่ โดยขอให้ สท.๙ เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

(๗) การลงพื้นที่...

(๗) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัย สท. ๑ จำนวน ๒ สถานี สท. ๙ จำนวน ๑ สถานี

ได้แก่

(๗.๑) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ ๖ ตำบลทาปลาดุก อำเภอมะนัง จังหวัดลำพูน และ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดลพบุรี

(๗.๒) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านนาพูนพัฒนา ตำบลนาพูน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
สถานีเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) ที่ลงตรวจเยี่ยมทั้ง ๓ สถานี ผู้รู้ประจำสถานีร่วมให้ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยปัจจุบันสถานีฯ ดังกล่าว อยู่ในสภาพดี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางได้แบบ Real time

๒.๑๒ ตรวจเยี่ยม ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑

ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๖ โดยมี ผอ.ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ เชียงใหม่ (ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลิ่นเขียว) บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดยได้สะท้อนปัญหาของงบประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย (Early warning) จำนวนสถานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีสถานีที่ชำรุดรอการซ่อมแซม แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับจำนวนสถานีที่รับผิดชอบ และปัญหายานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีสภาพเก่า มีความเสี่ยงต่อชีวิตในการใช้ลงพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ภูเขาสูงหรือเชิงเขา ต้องการรับการสนับสนุนยานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอ ภาพถ่ายประกอบการลงพื้นที่โครงการฯ ตามเอกสารแนบ

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สท.๑ และ สท.๙ รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน มีข้อค้นพบ อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและควรเร่งดำเนินการแก้ไข โดย ผต. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อความไม่ประมาท ถึงแม้ว่าจะกันเงินไว้เบิกจ่าย เหลือปีได้ตามระเบียบฯ ก็ตาม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง	สท.๑ สท.๙
๒.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ควรมีการจัดตั้งกลุ่ม ผู้ใช้น้ำหรือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิม เพื่อบริหารจัดการน้ำใน โครงการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ปัจจุบันทุกโครงการมีประชาชนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยดูแลการเปิดและปิดระบบและดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ จึงควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็ง อาจช่วยป้องกันอุปกรณ์สูญหายได้ใน อนาคต ควรให้ กอน. จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มให้เพียงพอ สอดคล้องกับจำนวนโครงการที่ดำเนินงาน	กอน. สท.๑ สท.๙

ลำดับ	ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.	ระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning) ที่ติดตั้งในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๑ และ สทท.๙ มีจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนมาก ระบบดังกล่าวมีชำรุดและมีสร้างเพิ่มเติมแต่งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับการซ่อมแซมหรือดูแลบำรุงรักษา ลดลงไม่สัมพันธ์กับจำนวนระบบที่มีเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการรายงานผลในระบบต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กยผ. และ กวพ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมหรือดูแลบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning) อย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำ และควรมีการอบรมเสริมความเข้มแข็งให้กับผู้รู้ประจำสถานีนีตามความเหมาะสม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานในการแจ้งเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กยผ. กวพ.
๔.	การขออนุญาตการใช้น้ำ เป็นภารกิจใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำ โดย ทน. ต้องดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ ซึ่งส่วนจัดสรรน้ำ สทท. ๑ ต้องการให้กองการจัดสรรน้ำ (กจน.) เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานหรือจ้างที่ปรึกษาเพื่อแนะนำในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้น้ำเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กจน.) เร่งเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรของกรมที่มีหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้น้ำ	กจน.
๕.	รถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติราชการใน สทท.๑ มีอายุการใช้งานนาน (เกิน ๒๐ ปี) จำนวนหลายคัน หากทางเจ้าหน้าที่ตามระเบียบพัสดุจะมีรถใช้งานไม่เพียงพอและโดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานในส่วนอุทกวิทยา ควรเป็นรถยนต์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ การขอรับการสนับสนุนยานพาหนะดังกล่าว ให้ สทท.๑ รวบรวมเสนอ สลก.จำนวนตามความจำเป็นและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่	สลก.
๖.	ลูกจ้างประจำของ สทท.๑ และ สทท.๙ ที่เกษียณอายุราชการ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับอัตราพนักงานราชการใหม่มาทดแทน ทำให้ส่วนต่างๆ ภายในหน่วยงานขาดบุคลากร เช่น ส่วนอุทกวิทยา ส่วนจัดสรรน้ำ หรือส่วนต่างๆ ที่ตั้งขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวงฯ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาบุคลากรไปทดแทน หรือจัดสรรงบดำเนินงานเพื่อให้สามารถจ้างลูกจ้าง TOR เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ดังกล่าว	สลก.


ผู้ตรวจราชการกรม

ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัล ไทยपाल) ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงขุดใหญ่ - บึงขุดน้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังวน อำเภอฟรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐



- ๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองลี - หนองทราย บ้านประดาทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐

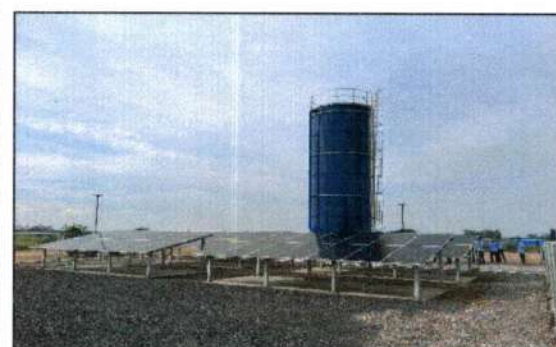

ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัล ไทยपाल) ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๙.๐๗



๒) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านนาพูน พัฒนาตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่



ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัล ไทยบาล) ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำแม่ยาวสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๑๐,๑๑ ตำบลเกาะคา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๒



- ๒) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านสวนป่าทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง




ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัล ไทยपाल)ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) ตรวจเยี่ยมส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ เชียงใหม่ โดยมี ผอ.ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ (ว่าที่ร้อยโท สายรุ้ง กลุ่มเขียว) และเจ้าหน้าที่ภายในส่วนฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน



- ๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาผลผลิตเกษตรบ้านปาง (แปลงใหญ่มะม่วง) ระยะ ๒ บ้านปาง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอยางป่ากร จังหวัดเชียงใหม่ ผลการดำเนินงาน ๙๕

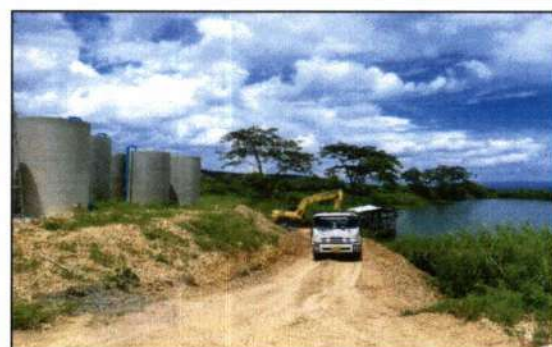

กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ผต.ทน. (นายไกรวัล ไทยपाल)

ลงพื้นที่ตรวจราชการ ทน. เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทน. 9



วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) พร้อมคณะ ได้ประชุมตรวจติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ โดยมี ผอ.สทน.๙ (นายนิมิตร โคตรบัว) ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงขนาดใหญ่ - บึงขคน้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บ้านหนองห้าง ม.๓ ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มีปริมาณกักเก็บน้ำ ๓๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ๓๐๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๕๒ ครัวเรือน

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสี - หนองทราย บ้านประดาทอง ม.๖ ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร มีปริมาณกักเก็บน้ำ ๓๐๘,๐๐๐ ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์มากกว่า ๑๕๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๒๔๐ ครัวเรือน



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี



ผต.ทน.(นายไกรวัล ไทยपाल) ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ พื้นที่ สทน. ๙



วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๙.๐๗ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร จำนวน ๕๘๙ ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ ๓,๒๐๐ ไร่ และโครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม สถานีเตือนภัยบ้านนาพูนพัฒนา ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ นำลงพื้นที่และบรรยายผลการดำเนินการโครงการ



กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ผต.ทน. (นายไกรวัล ไทยपाल)

ลงพื้นที่ตรวจราชการฯ พื้นที่ สทน. ๑



วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) พร้อมคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ โดยมี ผู้อำนวยการส่วนสำรวจออกแบบ รักษาการแทน ผอ.สทน.๑ (นายธวัช รัตนกิจ) ผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำแม่ยาวสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ม.๑, ๒, ๓, ๔, ๑๐, ๑๑ ต.เกาะคา ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๒



(๒) โครงการฝักระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม สถานีเตือนภัยบ้านสวนป่าทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง



(๓) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวระยะ ๒ บ้านท่าป่าเปา ม.๖ ต.ท่าปลาดูก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๐



(๔) โครงการฝักระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม สถานีเตือนภัยบ้านท่าป่าเปา ม.๖ ต.ท่าปลาดูก อ.แม่ทา จ.ลำพูน






ผต.ทน. (นายไกรวัล ไทยपाल)

ลงพื้นที่ตรวจราชการ
พื้นที่ สทน. ๑

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ เชียงใหม่ โดยมี ผอ.ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ เชียงใหม่ (ว่าที่ร้อยโท สายรุ้ง กลุ่นเขียว) และเจ้าหน้าที่ ภายในส่วนฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนนิสิตสหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนา ผลผลิตการเกษตรบ้านปาง (แปลงใหญ่มะม่วง) ระยะ ๒ บ้านปาง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๕ เมื่อโครงการแล้ว เสร็จ ราษฎรได้รับผลประโยชน์ ๕๒ ครัวเรือน พื้นที่เกษตร ได้รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่

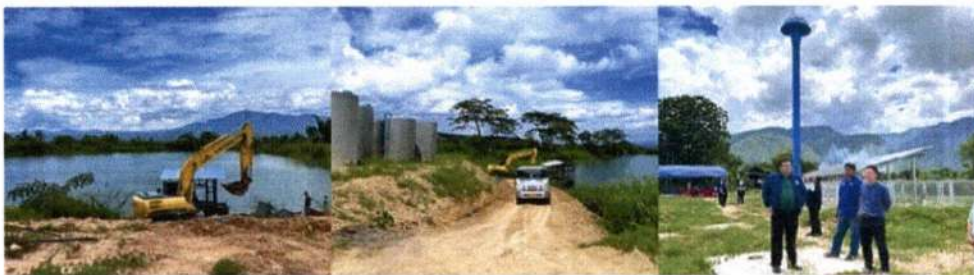

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๒๖๖

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ พื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยปาล) เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยปาล) ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัย Early Warning โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ผู้อำนวยการส่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ปัญหาอุปสรรค สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ สทน. ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเบิกจ่ายในภาพรวมของ สทน. ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๘.๙๙ ช่วงวันตรวจราชการอยู่ในระหว่างไตรมาสที่ ๔ ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓ ผลการเบิกจ่ายของ สทน. ๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๔.๐๑

(เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาส ๑ : ๓๒% ไตรมาส ๒ : ๕๒% ไตรมาส ๓ : ๗๕% ไตรมาส ๔ ๙๓%)

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สทน. ๒ ไม่ได้บริหารจัดการงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ

๒.๓ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทน.๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าจำปีสิรินธร) ตำบลชัยจำปา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลพบุรี ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๕ (สัญญาสิ้นสุด ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖)

เรื่องกลับ
วันที่ ๑๕.๙.๖๖
เวลา ๑๕.๙.๖๖

เรื่องกลับ กสน.
วันที่ 15 ก.ย. ๖๖
เวลา 14.45

๒.๔ แผนงาน...

๒.๔ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สท.๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๕ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

สท. ๒ ขอเบิกไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาน้อย (ฝ่ายพระเทพ) อ่างเก็บน้ำบ่อแม่ อ่างเก็บน้ำหนองกรด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ กลางเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๒.๖ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑ มติ ครม. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

สท. ๒ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๗ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒ มติ ครม. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)

สท. ๒ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๘ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓ มติ ครม. ๖ กันยายน ๒๕๖๕)

สท. ๒ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๙ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

(๑) ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning)

หน่วยงาน	จำนวน สถานีเตือน ภัย	มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลได้ (สถานี)		ติดตามข้อมูลจากผู้รู้ ประจำสถานี (สถานี)		สถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ (สถานี)		
	(สถานี)	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ค่าชี้แจง
สท. ๒	๑๒๒	๑๑๑	๙๐.๙๘	๑๑	๙.๐๑	๑๑	๙.๐๑	

สถานีที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ สท.๒ กำชับให้ผู้รู้ประจำสถานีรายงานปริมาณน้ำฝนให้ส่วนอุทกวิทยาและส่วนกลางผ่านโทรศัพท์มือถือ/ผ่านกลุ่มไลน์ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประมวลผล เพื่อให้การรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนเกิดความต่อเนื่อง

(๒) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย (Early Warning)

หน่วยงาน	ผลการแจ้งเตือนภัย			
	ข้อมูลสะสม (ถึงปัจจุบัน) ๑ ต.ค. ๖๕ - ๑๒ มิ.ย.๖๖ จำนวน (ครั้ง)	สีเขียว (เผื่อระวัง)	สีเหลือง (เตรียมพร้อม)	อพยพ (สีแดง)
สท. ๒	๑๙	๗	๑๑	๑

สท.๒ โดยส่วนอุทกวิทยาของหน่วยงาน ได้ประสานการแจ้งเตือนภัยกับกองวิจัยพัฒนา และอุทกวิทยา (กพว.) อย่างต่อเนื่องกรณีข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอยู่ในระดับสีแดง (อพยพ) เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยเกิดความเที่ยงตรงสอดคล้องสถานการณ์ในพื้นที่

๒.๑๐ การช่วยเหลือ...

๒.๑๐ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สท.๒ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันรายงานข้อมูลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม สรุปได้ดังนี้

สท.๒	ปริมาณการสูบน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)		แจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	น้ำดื่ม (ขวด)	ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ภัยแล้ง	ระบายน้ำท่วม			ประชาชน (คน)	ประชาชน (ครัวเรือน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๒	๓.๒๙๘๖	๗.๗๕๘๐	๑๔๒,๘๐๐	-	๔๔,๕๐๔	๑๔,๔๖๕	๕,๘๓๐

๒.๑๑ การลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ผด.นายไกรวัล ไทยपाल ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัยฯ สรุป ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุ์ธรรมชาติเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าจำปาสรินธร) ตำบลชัยจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (งบประมาณเหลือจ่ายปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๕ สัญญาสิ้นสุด ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ เมื่อโครงการแล้วเสร็จพื้นที่การเกษตรรวมพื้นที่ป่าไม้ได้รับประโยชน์ ๙๐๐ ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๙๕ ครัวเรือน โครงการดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาภัยแล้งของป่าสรินธรเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำพุใต้ดิน ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวที่กรมดำเนินการจะช่วยให้ป่าสรินธรไม่ขาดน้ำหรือยืนต้นตาย และประชาชนที่ทำการเกษตร บริเวณข้างเคียงได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำปลูกข้าวโพด อ้อย มัน และเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ผด.ได้ให้คำแนะนำ เมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จให้ สท.๒ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับใช้ ในพื้นที่ป่าสรินธรและใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

(๒) โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำสาธารณะบ้านสันตะลุง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (งบกลางปี ๒๕๖๕) ดำเนินการแล้วเสร็จ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๙๕ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๗๕๐ ไร่ ผด.ได้ขอให้ สท.๒ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

(๓) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเตือนภัย จำนวน ๒ สถานี ได้แก่

(๓.๑) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านถ้ำมั่งกุฎ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาวง อำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีสถิติแจ้งเตือนภัย (๒๕๖๐-๒๕๖๕) สีเขียว (เฝ้าระวัง) ๓ ครั้ง และสีเหลือง (เตรียมพร้อม) ๑ ครั้ง

(๓.๒) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านพุ่มหวง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี สถิติการแจ้งเตือนภัย มีสถิติแจ้งเตือน (๒๕๖๐-๒๕๖๕) สีเขียว (เฝ้าระวัง) ๓ ครั้ง และสีเหลือง (เตรียมพร้อม) ๒ ครั้ง

ปัจจุบันสถานีฯ ดังกล่าว อยู่ในสภาพดี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าส่วนกลางได้แบบ Real time ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและมีความประสงค์ให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการ แจ้งเตือนภัยให้เกิดความเข้มแข็ง

๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สทน.๒ รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน มีข้อค้นพบ อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและ ควรเร่งดำเนินการแก้ไข โดย ผต. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ควรมีการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีอยู่เดิมเพื่อบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า และโครงการระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ควรมีเจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชน รับผิดชอบดูแลเป็นประจำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เพียงพอและสอดคล้องกับจำนวนแหล่งน้ำที่กรม ดำเนินการ	กอน.
๒.	สทน.๒ มีเรือจำนวนหลายลำ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ขับเรือโดยตรง ควรมี เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ หรือจัดหาพนักงานราชการในตำแหน่ง นายท้ายเรือ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบ เกี่ยวกับการเดินเรือ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย หรือสนับสนุน หน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	สลก. และ สทน.๒
๓.	การขออนุญาตการใช้น้ำ ส่วนจัดสรรน้ำซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติในการออก ใบอนุญาตการใช้น้ำ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริง และขาด งบประมาณ เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ ซึ่งหากกฎหมายมีผลบังคับใช้จะส่งผล ให้การปฏิบัติงานอาจล่าช้า จึงขอให้หน่วยงานส่วนกลาง (กจน.) จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติการขออนุญาตการใช้น้ำให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งในการ ปฏิบัติงานอาจมีกรอบระยะเวลากำหนด จึงควรเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ของกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง ทั้งนี้ สทน.๒ ได้เสนอให้มีตำแหน่งนิติกรประจำในหน่วยงาน สทน. ๑-๑๑ ด้วย เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความสะดวกและให้ คำปรึกษาด้านกฎหมายในแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิด หรือช่วยแก้ไขข้อ ขัดแย้งด้านกฎหมาย ซึ่งอาจช่วยให้ปริมาณงานในกลุ่มนิติการลดลง	กนก. กจน.
๔	กรณีเกิดน้ำป่าไหลหลากซึ่งเกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมจากพื้นที่ป่าไม้ ด้านบนเขาลงสู่ลำตกลางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แบบฉับพลันจำนวนหลายครั้ง ทั้งที่บริเวณด้านล่างไม่มีฝนตกหรือปริมาณ น้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์ ทำให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก สทน.๒ เสนอแนวคิดให้ หน่วยงานติดตั้งระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ระบบ Sola Sell หรือพัฒนาระบบให้	กวพ.

ลำดับ	ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	สามารถเก็บสำรองไฟฟ้าได้ เพื่อช่วยเก็บปริมาณน้ำฝนรายงานเข้าส่วนกลาง (กwp.) และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อเตรียมอพยพประชาชนหรือยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทั้งนี้ เห็นควรให้ กwp.พิจารณาสำรวจความเหมาะสม และหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป โดยบูรณาการกับกรมอุทยานแห่งชาติในการใช้พื้นที่ติดตั้งระบบ และขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้รู้ประจำสถานที่ หรือเสนอแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไป	
๕.	ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการของ สทท.๒ ไม่มีอัตราพนักงานราชการมาทดแทน ทำให้ส่วนต่างๆ ที่แบ่งตามกฎกระทรวงฯ เกิดปัญหาขาดแคลนอัตรากำลัง จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สทท.) พิจารณาหาแนวทางจัดหาอัตรากำลังให้กับหน่วยงานเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สทท.

ในการนี้ จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มตรวจราชการทราบ เพื่อ กตร. จักได้สรุปนำเรียน อทท. เพื่อทราบผลการปรับปรุงฯ ต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นายไกรวัล ไทยपाल)

ผู้ตรวจราชการกรม

นายสม / สทท.๒
ที่ สทท.๒ สทท.๒ สทท.๒
เรื่อง: ทท. สทท.๒

- มคอ.๒๒๒๒๒๒
สทท.๒ สทท.๒ สทท.๒
สทท.๒

(นายไกรวัล ไทยपाल)
ผู้ตรวจราชการกรม

15 ก.ย. 2566
(นายภาณุ ภาณุภักดี)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัล ไทยपाल)ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านถ้ำมงกุฏ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาวง อำเภอฟุทธบาท จังหวัดสระบุรี



- ๒) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านพุ่มวง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเพลิง อำเภอกอสนี จังหวัดลพบุรี



ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัลด ไทยपाल)ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าจำปีสิรินธร) ตำบลชัยจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๕ (งบเหลือจ่ายปี ๒๕๖๖) สัญญาสิ้นสุด ๑ ธ.ค.๒๕๖๖



- ๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำสาธารณะบ้านสันตะลุง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐





กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัลด ไทยपाल) ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ สทท.๒



วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม(นายไกรวัลด ไทยपाल) พร้อมคณะได้ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค โดย ผอ.สทท.๒ (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ) พร้อมด้วยผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมรับข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติจากผู้ตรวจราชการกรม มาปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ในการนี้ หลังจากสิ้นสุดการประชุมคณะผู้ตรวจได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ ดังนี้

๑) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านถ้ำมังกฎ หมู่ ๘ ต.เขาวง อ.พุทธบาท จ.สระบุรี



๒) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (Early warning) บ้านพุ่มวง หมู่ ๕ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี



กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกววัล ไทยपाल) ลงพื้นที่ตรวจราชการฯพื้นที่ สทพ.๒

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกววัล ไทยपाल) พร้อมคณะได้ลงตรวจพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ ประกอบด้วย

๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าจำปีสิรินธร) ตำบลชะจำปา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลพบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๕ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะมีพื้นที่การเกษตรพื้นที่ป่าไม่ได้รับประโยชน์ ๙๐๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๙๕ ครัวเรือน



๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำสาธารณะบ้านสันตะลุง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ามะนาว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดลพบุรี ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๗๕๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๙๕ ครัวเรือน



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 8584
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา 14.4๗

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 05023
วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา 14.14

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๔๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๒๗๐

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ ผู้อำนวยการส่วน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ และปัญหาอุปสรรค สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของ สทน. ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเบิกจ่ายในภาพรวมของ สทน. ๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๔.๓๗ ช่วงวันตรวจราชการอยู่ในระหว่างไตรมาสที่ ๔ ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๓ ผลการเบิกจ่ายของ สทน. ๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘.๖๓ (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ไตรมาส ๑ : ๓๒% ไตรมาส ๒ : ๕๒% ไตรมาส ๓ : ๗๕% ไตรมาส ๔ ๙๓%)

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทน.๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๖ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ

๒.๓ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทน.๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๔๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ

๒.๔ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สทน.๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๕ โครงการ...

เรื่องกลับ กสน
วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๖
เวลา ๑๘.๓๗

เรื่องกลับ กสน
วันที่ 21 ก.ย. ๖๖
เวลา 13.20

๒.๕ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

สทท.๔ ขอเบิกไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ ก.ย. ๖๖

๒.๖ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑ มติ ครม. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

สทท.๔ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒.๗ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒ มติ ครม. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)

สทท.๔ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ และคืบเงินงบประมาณ ๒ โครงการ

๒.๘ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓ มติ ครม. ๖ กันยายน ๒๕๖๕)

สทท.๔ ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ คืบเงินงบประมาณ ๑ โครงการ

๒.๙ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพพระบพพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

(๑) ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning)

หน่วย งาน	จำนวน สถานีเตือน ภัย	มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลได้ (สถานี)		ติดตามข้อมูลจากผู้รู้ ประจำสถานี (สถานี)		สถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ (สถานี)		
	(สถานี)	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ค่าชี้แจง
สทท.๔	๔๐	๓๙	๙๗.๕๐	๓๙	๙๗.๕๐	๑	๒.๕	

สถานีที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ สทท.๔ กำชับให้ผู้รู้ประจำสถานีรายงานปริมาณน้ำฝนให้ส่วนอุทกวิทยาและส่วนกลางผ่านโทรศัพท์มือถือ/ผ่านกลุ่มไลน์ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประมวลผล เพื่อให้การรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนเกิดความต่อเนื่อง

(๒) ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย (Early Warning)

หน่วยงาน	ผลการแจ้งเตือนภัย			
	ข้อมูลสะสม (ถึงปัจจุบัน) ๑ ต.ค. ๖๕ - ๑๒ มิ.ย.๖๖ จำนวน (ครั้ง)	สีเขียว (เผื่อระวัง)	สีเหลือง (เตรียมพร้อม)	อพยพ (สีแดง)
สทท.๔	๑๐	๖	๒	๒

สทท.๔ โดยส่วนอุทกวิทยาของหน่วยงาน ได้ประสานการแจ้งเตือนภัยกับกองวิจัยพัฒนา และอุทกวิทยา (กวพ.) อย่างต่อเนื่องกรณีข้อมูลการแจ้งเตือนภัยอยู่ในระดับสีแดง (อพยพ) เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยเกิดความเที่ยงตรงสอดคล้องสถานการณ์ในพื้นที่

๒.๑๐ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สท.๔ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันรายงานข้อมูลได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม สรุปได้ดังนี้

สท.๔	ปริมาณการสูบน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)		แจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	น้ำดื่ม (ขวด)	ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ภัยแล้ง	น้ำท่วม			ประชาชน (คน)	ประชาชน (ครัวเรือน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๔	๑.๒๕๘	๔.๔๘๘	-	-	๓๑,๕๒๘	๖๑,๙๘๐	๖๐๐

๒.๑๑ การลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ผต.นายไกรวัล ไทยपाल ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ สรุป ดังนี้

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงกระชาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการแล้วเสร็จ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๔๒๘ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่ โดยขอให้ สท.๔ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

(๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขามน้อย หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการแล้วเสร็จ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๕ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒๖ ไร่ โดยขอให้ สท.๔ จัดอบรมขั้นตอนการใช้งานและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ก่อนส่งมอบงาน และติดตามการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด

(๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรูแซ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันต อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๕ ติดตั้งระบบกระจายน้ำเรียบร้อยแล้ว คงเหลือปริมาณงานชุดลอกเนื่องจากก้นน้ำไว้ใช้ในการเกษตรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๙๓ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่ โดยขอให้ สท.๔ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

(๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพงพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแพง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแพง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการแล้วเสร็จ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐๐ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑,๒๐๐ ไร่ โดยขอให้ สท.๔ เสริมทักษะการใช้งานและวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ก่อนส่งมอบงาน และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด

(๕) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบญจครี หมู่ที่ ๕,๙ ตำบลท่าแจ้ง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการแล้วเสร็จ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๒๓๕ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑,๒๕๐ ไร่ โดยขอให้ สท.๔ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถบริหารจัดการน้ำในโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สทน. ๔ รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน มีข้อค้นพบ อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและควรเร่งดำเนินการแก้ไข โดย ผต. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้บริการจัดการน้ำในโครงการเกิดประโยชน์คุ้มค่าและกลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถช่วยดูแลรักษาแหล่งน้ำของกรมฯ ส่วนโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มีอุปกรณ์ที่มีราคาสูง และผู้ดูแลระบบฯ ต้องมีทักษะในการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำดังกล่าวจะเป็นกลไกในการบริหารจัดการน้ำในโครงการ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เพียงพอและสัมพันธ์กับจำนวนแหล่งน้ำที่ดำเนินการ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมด้วย	กอน. สทน. ๔
๒.	สทน.๔ แจ้งปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการแล้วไม่มีพนักงานราชการมาทดแทน และจะมีลูกจ้างประจำลาออก ซึ่งยังขาดความชัดเจนว่าจะได้อัตราตำแหน่งคืนหรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาอัตราค่าจ้างหรืองบประมาณ สำหรับการบรรจุพนักงานในอัตราดังกล่าวหรือจ้างลูกจ้าง TOR ให้ สทน. ๔ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในลักษณะเดียวกันเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สลก.
๓.	การขออนุญาตการใช้น้ำ ส่วนจัดสรรน้ำ (สทน.๔) เป็นหน่วยปฏิบัติในการออกใบอนุญาตการใช้น้ำ เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ จึงขอให้หน่วยงานส่วนกลาง (กจน.) และ สทน. ๔ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งในการปฏิบัติงานอาจมีกรอบระยะเวลา กำหนด จึงควรเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ของกรมเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อกำหนดหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	กจน. สทน.๔
๔.	กรณี อุปกรณ์ของโครงการแหล่งน้ำเกิดการสูญหายจากการโจรกรรม หน่วยงาน (สทน.๔) ไม่สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำไม่ได้มีการมอบอำนาจในประเด็นนี้ไว้ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการมอบอำนาจในการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายให้ สทน.๑-๑๐ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ไม่ต้องรอการอนุมัติหรือมอบอำนาจในแต่ละครั้งจากส่วนกลาง ซึ่งอาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ในการสืบค้นหรือเรียกคืนทรัพย์สินราชการ	กนก.

ลำดับ	ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕.	กรมทรัพยากรน้ำ โดยส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล กยผ. มีการติดตามประเมินผลโครงการแหล่งน้ำฯ เป็นประจำทุกๆปี โดยสุ่มตัวอย่างโครงการฯ จากพื้นที่ สทน.๑-๑๑ และส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานของ สทน. ๑-๑๑ ได้มีการติดตามประเมินโครงการฯ ด้วยเช่นกัน อย่างน้อย ๑ โครงการ (ประเมินเชิงลึก) โดยเจียดจ่ายจากงบดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีจำนวนจำกัด ดังนั้น เห็นควรให้ กยผ. จัดสรร “งบดำเนินงาน สำหรับใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการฯ ให้ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน สทน.๑-๑๑ ” เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถติดตามประเมินผลโครงการฯ เพื่อสะท้อนความเห็นจากประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สำหรับนำมาปรับปรุงการดำเนินงานของกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	กยผ.

ในการนี้ จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทน. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มตรวจราชการทราบ เพื่อ กตร. จักได้สรุปนำเรียน อทน. เพื่อทราบผลการปรับปรุงฯ ต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นายไกรวัล ไทยपाल)

ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาว/นาย/นางสาว/นาย
เกิดที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๖
เลขที่ ๑๑๑ ๑๑๑

- ส่วนกฎหมาย
สำนักงานกยผ.
๒๐๒๑



(นายไกรวัล ไทยपाल)

ผู้ตรวจราชการกรม



๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖


นายภาค อารกฤษณ์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัล ไทยบาล) ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงกระชาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐




- ๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขามน้อย หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลโนนท่อน อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐

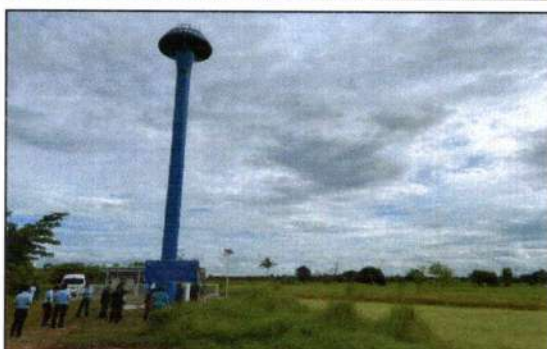

ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัล ไทยบาล) ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรูแช่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันต อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๕

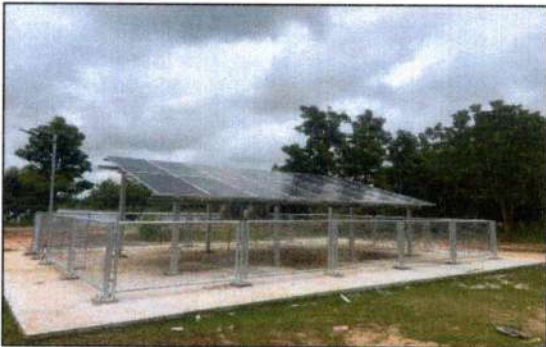

- ๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพงพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแพง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแพง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐



ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ (นายไกรวัลด ไทยपाल) ผู้ตรวจราชการกรม ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔
วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๓) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็ญเครือ หมู่ที่ ๕,๙ ตำบลท่าแจ้ง
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐





กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ สทพ.๔



วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม(นายไกรวัล ไทยपाल) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พื้นที่เขตความรับผิดชอบของ สทพ.๔ ดังนี้

๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงกระชาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแห้ว ตำบลบ้านโนน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๔๒๘ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่

๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขามน้อย หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลโนนท่อน อำเภอมะนัง จังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๕ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒๖ ไร่



กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ



www.dwr.go.th



๐๒-๒๗/๑-๖๑๙๑

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี



กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัลด ไทยपाल)
ลงพื้นที่ตรวจราชการฯพื้นที่ สทพ.๔



วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม(นายไกรวัลด ไทยपाल) พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ทพ. รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ พื้นที่เขตความรับผิดชอบของ สทพ.๔ ดังนี้

๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรูแค้นพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสันต อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๕ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๙๓ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่



๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพงพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแพง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐๐ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑,๒๐๐ ไร่



๓) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบญจเครือ หมู่ที่ ๕,๙ ตำบลท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐๐ มีครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๒๗๕ ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑,๒๕๐ ไร่



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี



กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัลด ไทยपाल) ลงพื้นที่ตรวจราชการฯพื้นที่ สทน.๔

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ตรวจราชการกรม(นายไกรวัลด ไทยपाल) พร้อมคณะได้ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ โดยมี ผอ.สทน.๔ (นายชูชาติ นารอง) พร้อมด้วยผอ.ส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน. พร้อมรับข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติจากผู้ตรวจราชการกรมมาปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่อไป



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี



กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ



www.dwr.go.th



๐๒-๒๗๑-๖๑๙๑
