



กรมทรัพย์ากรน้ำ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล GF ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

หมวดรายจ่าย	(1) งบประมาณตาม พ.ร.บ.งปม. 2563		(2) งบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปี 2563		(3) ผลเบิกจ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563		(2) - (3) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	738.5515	18.27%	738.5515	100.00%	746.5530	101.08%	-	8.0015
งบดำเนินงาน	105.7232	2.62%	105.7232	100.00%	92.5893	87.58%	13.1339	12.42%
งบลงทุน	2,812.6698	69.57%	2,291.6731	81.48%	1,225.0759	53.46%	1,066.5972	46.54%
งบรายจ่ายอื่น	385.8244	9.54%	379.8951	98.46%	156.6716	41.24%	223.2235	58.76%
รวม	4,042.7689	100.00%	3,515.8429	86.97%	2,220.8898	63.17%	1,294.9531	36.83%

หมายเหตุ : 1. งบลงทุนตาม พ.ร.บ. 63 จากเดิม 3,200.5006 ลบ. คงเหลือ 2,979.9136 ลบ. เนื่องจากเป็นโครงการมอบให้ทหาร (เบิกจ่ายแทนกัน) จำนวนรวม 4 รายการ งบประมาณรวม 220.5870 ลบ.

2. พ.ร.บ.โอน 63 ปรับลดรวม 197.8214 ลบ. ดังนี้ 1) งบดำเนินงานปรับลด จากเดิม 109.7314 ลบ. ลดลง 4.0082 ลบ. คงเหลือ 105.7232 ลบ. 2) งบลงทุนปรับลด จากเดิม 2,979.9136 ลบ.


ลดลง 167.2438 ลบ. คงเหลือ 2,812.6698 ลบ. 3) งบรายจ่ายอื่นปรับลด จากเดิม 412.3938 ลบ. ลดลง 26.5694 ลบ. คงเหลือ 385.8244 ลบ.

ดังนั้น งบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. เดิม 4,461.1773 ลบ. คงเหลืองบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. 4,042.7689 ลบ.

สัดส่วนงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2563



เปรียบเทียบแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา ปี 2563

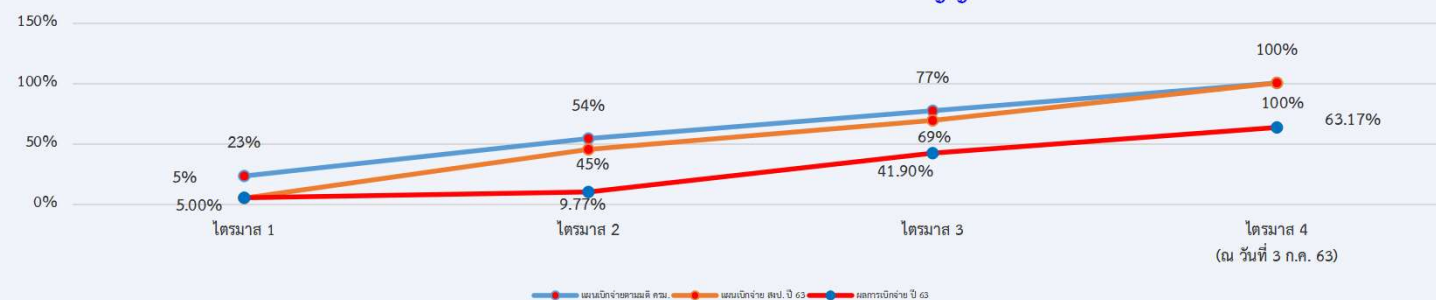



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน, ค่าครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าจ้างที่ปรึกษา)

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล GF ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2563		(2) งบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563		(3) ผลเบิกจ่ายจากงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ปี 2563			ผลเบิกจ่าย ปี 2563 ณ วันที่ 18 ก.ย. 63		(1) - (3) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ปี 2563		คงเหลือยังไม่ลงนาม		แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	รวม	370	2,812.6698	369	2,291.6731	342	1,225.0759	43.56%	1,204.5667	42.83%	1,587.5939	56.44%	0	-	237	134	0	
1	สทภ.1	76	712.6950	76	548.7637	69	353.7798	49.64%	345.6421	48.50%	358.9152	50.36%	0	-	40	36		
2	สทภ.2	36	71.3953	36	69.4064	36	66.1475	92.65%	66.1475	92.65%	5.2478	7.35%	0	-	32	4		
3	สทภ.3	17	26.2555	17	24.4627	17	16.0696	61.20%	16.0696	61.20%	10.1859	38.80%	0	-	15	2		
4	สทภ.4	26	166.3050	26	116.1937	26	68.9139	41.44%	66.4059	39.93%	97.3911	58.56%	0	-	20	6		
5	สทภ.5	15	128.2171	14	100.4388	14	47.9438	37.39%	45.3209	35.35%	80.2733	62.61%	0	-	6	9		
6	สทภ.6	23	65.9649	23	46.3356	22	25.9121	39.28%	25.9121	39.28%	40.0528	60.72%	0	-	15	8		
7	สทภ.7	14	126.6995	14	103.4062	14	80.6999	63.69%	80.6999	63.69%	45.9996	36.31%	0	-	10	4		
8	สทภ.8	23	107.3520	23	111.1569	21	92.8841	86.52%	92.8841	86.52%	14.4679	13.48%	0	-	18	5		
9	สทภ.9	35	326.2987	35	255.6915	34	124.4101	38.13%	124.4101	38.13%	201.8886	61.87%	0	-	12	23		
10	สทภ.10	17	51.9338	17	45.1151	15	16.4798	31.73%	16.4798	31.73%	35.4540	68.27%	0	-	14	3		
11	สทภ.11	14	76.4192	14	67.3974	14	53.2856	69.73%	49.7927	65.16%	23.1336	30.27%	0	-	11	3		
12	สทภ.	6	26.0780	6	19.4404	5	13.5312	51.89%	13.5312	51.89%	12.5468	48.11%	0	-	5	1		
13	สทภ.	3	177.1160	3	97.7056	2	89.1613	50.34%	85.4135	48.22%	87.9547	49.66%	0	-	0	3		
14	สทภ.	48	553.3765	48	494.4738	35	121.1803	21.90%	121.1803	21.90%	432.1962	78.10%	0	-	24	24		
15	สทภ.	1	136.2000	1	135.0000	1	31.7250	23.29%	31.7250	23.29%	104.4750	76.71%	0	-	0	1		
16	สทภ.	16	60.3633	16	56.6854	17	22.9519	38.02%	22.9519	38.02%	37.4114	61.98%	0	-	15	2		

หมายเหตุ: 1. งบลงทุนตาม พ.ร.บ. 63 จากเดิม 3,200.5006 ลบ. คงเหลือ 2,979.9136 ลบ. เนื่องจากเป็นโครงการมอบให้ทหาร (เบิกจ่ายแทนกบ) จำนวนรวม 4 รายการ งบประมาณรวม 220.5870 ลบ.

2. พ.ร.บ. 63 ปรับลดรวม 197.8214 ลบ. ดังนี้ 1) งบดำเนินงานปรับลด จากเดิม 109.7314 ลบ. ลดลง 4.0082 ลบ. คงเหลือ 105.7232 ลบ. 2) งบลงทุนปรับลด จากเดิม 2,979.9136 ลบ. ลดลง 167.2438 ลบ. คงเหลือ 2,812.6698 ลบ.

3) งบรายจ่ายอื่นปรับลด จากเดิม 412.3938 ลบ. ลดลง 26.5694 ลบ. คงเหลือ 385.8244 ลบ. ดังนั้น งบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. เดิม 4,461.1773 ลบ. คงเหลืองบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. 4,042.7689 ลบ.

เปรียบเทียบแผน - ผล การเบิกจ่ายงบลงทุนตาม พ.ร.บ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563





สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบรายจ่ายอื่น)

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ข้อมูล GF ณ วันที่ 22 กันยายน 2563


ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ปี 2563		(2) งบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563		(3) ผลเบิกจ่ายจากงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ปี 2563			ผลเบิกจ่าย ปี 2563 ณ วันที่ 18 ก.ย. 63		(1) - (3) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ปี 2563		แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ				
	รวม	26	385.8244	26	379.8951	25	156.6716	41%	145.1021	38%	229.1528	59%	2	24	0	
1	สทท.1	1	2.5500	1	2.5500	1	2.4578	96%	2.4149	95%	0.0922	4%	0	1		
2	สลก.	1	4.9862	1	4.9862	1	2.9116	58%	2.9116	58%	2.0746	42%	0	1		
3	สลก./กพร.	1	4.3874	1	4.3874	1	0.0862	2%	0.0862	2%	4.3012	98%	0	1		
4	สวพ.	7	121.2785	7	115.8162	7	58.7287	48%	47.2540	39%	62.5498	52%	0	7		
5	สปท.	1	2.2000	1	2.2000	1	0.0342	2%	0.0342	2%	2.1658	98%	0	1		
6	สบจ.	3	2.4490	3	2.4490	2	0.9752	40%	0.9752	40%	1.4738	60%	1	2		
7	สสป.	2	2.8000	2	2.8000	2	0.2870	10%	0.2877	10%	2.5130	90%	0	2		
8	ตสท.	2	19.0514	2	18.9500	2	4.7850	25%	4.7850	25%	14.2664	75%	0	2		
9	ศปว.	8	226.1219	8	225.7563	8	86.4059	38%	86.3533	38%	139.7160	62%	1	7		
10	กนก.	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	0	0		

หมายเหตุ : 1. บอกรวมตาม พ.ร.บ. 63 จากเดิม 3,200.5006 ลบ. คงเหลือ 2,979.9136 ลบ. เนื่องจากเป็นโครงการมอบให้ทหาร (เบิกจ่ายแทนกัน) จำนวนรวม 4 รายการ งบประมาณรวม 220.5870 ลบ.

2. พ.ร.บ.โอน 63 ปรับลดรวม 197.8214 ลบ. ดังนี้ 1) งบดำเนินงานปรับลด จากเดิม 109.7314 ลบ. ลดลง 4.0082 ลบ. คงเหลือ 105.7232 ลบ. 2) งบลงทุนปรับลด จากเดิม 2,979.9136 ลบ. ลดลง 167.2438 ลบ. คงเหลือ 2,812.6698 ลบ.

3) งบรายจ่ายอื่นปรับลด จากเดิม 412.3938 ลบ. ลดลง 26.5694 ลบ. คงเหลือ 385.8244 ลบ. ดังนั้น งบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. เดิม 4,461.1773 ลบ. คงเหลืองบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. 4,042.7689 ลบ.

เปรียบเทียบแผน - ผล การเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

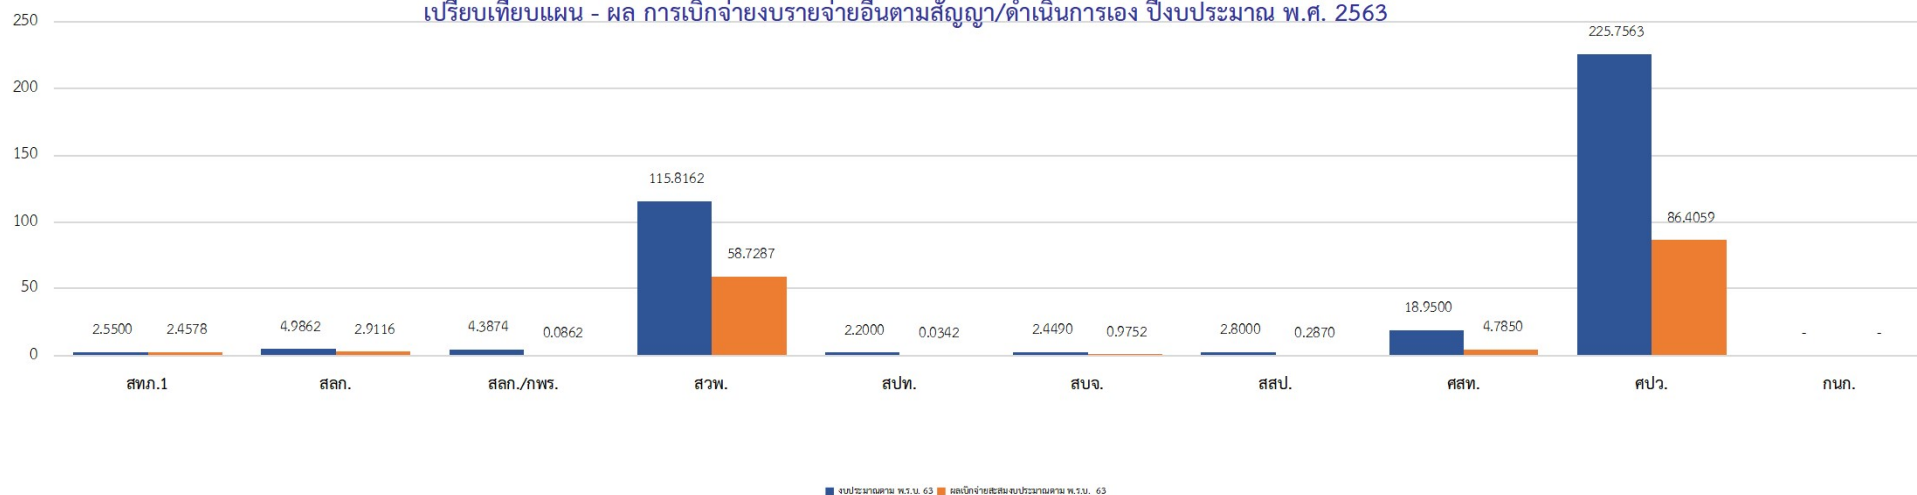



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบลงทุน, ค่าครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าจ้างที่ปรึกษา)
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ข้อมูล GF ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2563		(2) งบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563		(3) ผลเบิกจ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563			ผลเบิกจ่าย ปี 2563 ณ วันที่ 18 ก.ย. 63		(2) - (3) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณ ตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปี 2563		คงเหลือยังไม่ลงนาม		แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	รวม	370	2,812.6698	369	2,291.6731	342	1,225.0759	53%	1,204.5667	53%	1,066.5972	47%	0	-	237	134	0	
1	สทภ.1	76	712.6950	76	548.7637	69	353.7798	64%	345.6421	63%	194.9838	36%	0	-	40	36		
2	สทภ.2	36	71.3953	36	69.4064	36	66.1475	95%	66.1475	95%	3.2589	5%	0	-	32	4		
3	สทภ.3	17	26.2555	17	24.4627	17	16.0696	66%	16.0696	66%	8.3931	34%	0	-	15	2		
4	สทภ.4	26	166.3050	26	116.1937	26	68.9139	59%	66.4059	57%	47.2799	41%	0	-	20	6		
5	สทภ.5	15	128.2171	14	100.4388	14	47.9438	48%	45.3209	45%	52.4951	52%	0	-	6	9		
6	สทภ.6	23	65.9649	23	46.3356	22	25.9121	56%	25.9121	56%	20.4235	44%	0	-	15	8		
7	สทภ.7	14	126.6995	14	103.4062	14	80.6999	78%	80.6999	78%	22.7062	22%	0	-	10	4		
8	สทภ.8	23	107.3520	23	111.1569	21	92.8841	84%	92.8841	84%	18.2728	16%	0	-	18	5		
9	สทภ.9	35	326.2987	35	255.6915	34	124.4101	49%	124.4101	49%	131.2814	51%	0	-	12	23		
10	สทภ.10	17	51.9338	17	45.1151	15	16.4798	37%	16.4798	37%	28.6353	63%	0	-	14	3		
11	สทภ.11	14	76.4192	14	67.3974	14	53.2856	79%	49.7927	74%	14.1118	21%	0	-	11	3		
12	สทภ.	6	26.0780	6	19.4404	5	13.5312	70%	13.5312	70%	5.9092	30%	0	-	5	1		
13	สทภ.	3	177.1160	3	97.7056	2	89.1613	91%	85.4135	87%	8.5443	9%	0	-	0	3		
14	สทภ.	48	553.3765	48	494.4738	35	121.1803	25%	121.1803	25%	373.2935	75%	0	-	24	24		
15	สทภ.	1	136.2000	1	135.0000	1	31.7250	24%	31.7250	24%	103.2750	77%	0	-	0	1		
16	สทภ.	16	60.3633	16	56.6854	17	22.9519	40%	22.9519	40%	33.7335	60%	0	-	15	2		

หมายเหตุ : 1. งบลงทุนตาม พ.ร.บ. 63 จากเดิม 3,200.5006 ลบ. คงเหลือ 2,979.9136 ลบ. เนื่องจากเป็นโครงการมอบให้ทหาร (เบิกจ่ายแทนกัน) จำนวนรวม 4 รายการ งบประมาณรวม 220.5870 ลบ.

2. พ.ร.บ.โอน 63 ปรับลดรวม 197.8214 ลบ. ดังนี้ 1) งบดำเนินงานปรับลด จากเดิม 109.7314 ลบ. ลดลง 4.0082 ลบ. คงเหลือ 105.7232 ลบ. 2) งบลงทุนปรับลด จากเดิม 2,979.9136 ลบ. ลดลง 167.2438 ลบ. คงเหลือ 2,812.6698 ลบ.

3) งบรายจ่ายอื่นปรับลด จากเดิม 412.3938 ลบ. ลดลง 26.5694 ลบ. คงเหลือ 385.8244 ลบ. ดังนั้น งบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. เดิม 4,461.1773 ลบ. คงเหลืองบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. 4,042.7689 ลบ.

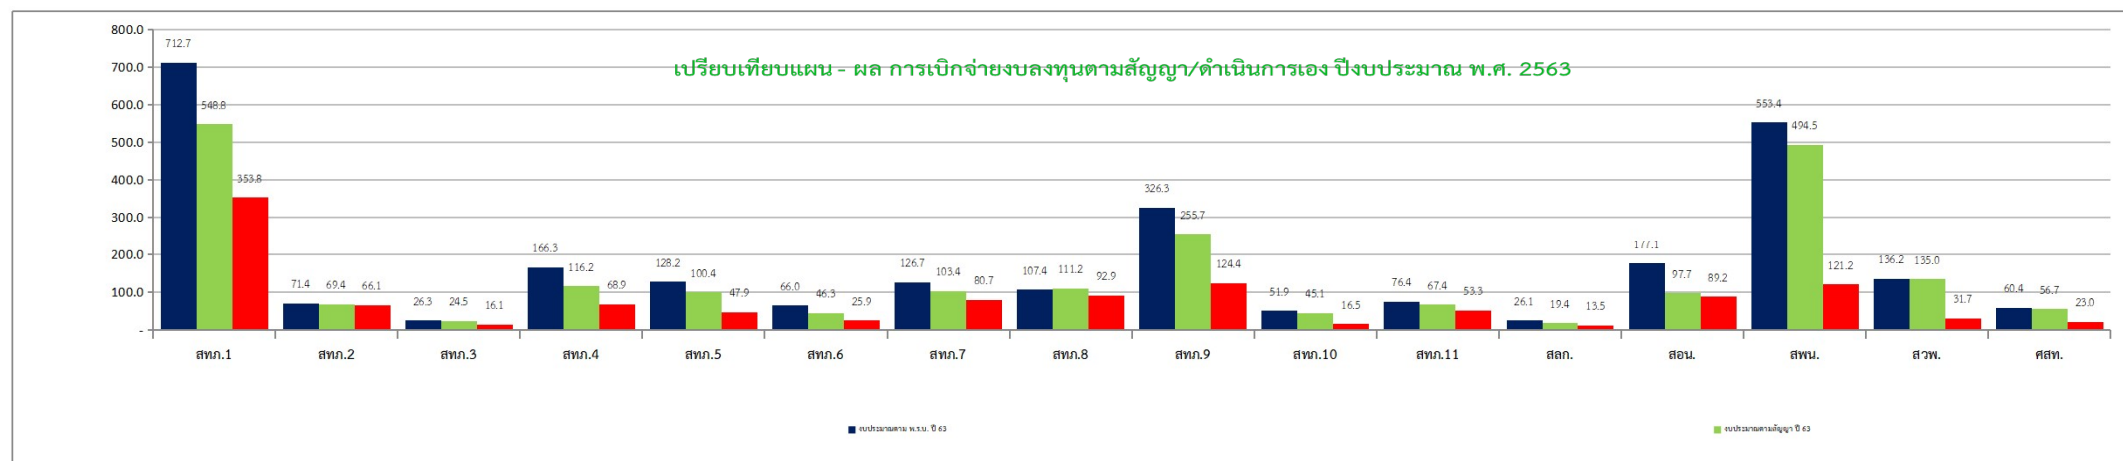




สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบรายจ่ายอื่น)

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล GF ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ปี 2563		(2) งบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563		(3) ผลเบิกจ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563			ผลเบิกจ่าย ปี 2563 ณ วันที่ 18 ก.ย. 63		(2) - (3) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณ ตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปี 2563		แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ				
	รวม	26	385.8244	26	379.8951	25	156.6716	41%	145.1021	38%	223.2235	59%	2	24	0	
1	สทท.1	1	2.5500	1	2.5500	1	2.4578	96%	2.4149	95%	0.0922	4%	0	1		
2	สลก.	1	4.9862	1	4.9862	1	2.9116	58%	2.9116	58%	2.0746	42%	0	1		
3	สลก./กพร.	1	4.3874	1	4.3874	1	0.0862	2%	0.0862	2%	4.3012	98%	0	1		
4	สวพ.	7	121.2785	7	115.8162	7	58.7287	51%	47.2540	41%	57.0875	49%	0	7		
5	สปท.	1	2.2000	1	2.2000	1	0.0342	2%	0.0342	2%	2.1658	98%	0	1		
6	สบจ.	3	2.4490	3	2.4490	2	0.9752	40%	0.9752	40%	1.4738	60%	1	2		
7	สสป.	2	2.8000	2	2.8000	2	0.2870	10%	0.2877	10%	2.5130	90%	0	2		
8	ศสท.	2	19.0514	2	18.9500	2	4.7850	25%	4.7850	25%	14.1650	75%	0	2		
9	ศปว.	8	226.1219	8	225.7563	8	86.4059	38%	86.3533	38%	139.3504	62%	1	7		
10	กนก.	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	0	0		

หมายเหตุ : 1. งบลงทุนตาม พ.ร.บ. 63 จากเดิม 3,200.5006 ลบ. คงเหลือ 2,979.9136 ลบ. เนื่องจากเป็นโครงการมอบให้ทหาร (เบิกจ่ายแทนกัน) จำนวนรวม 4 รายการ งบประมาณรวม 220.5870 ลบ.
2. พ.ร.บ.โอน 63 ปรับลดรวม 197.8214 ลบ. ดังนี้ 1) งบดำเนินงานปรับลด จากเดิม 109.7314 ลบ. ลดลง 4.0082 ลบ. คงเหลือ 105.7232 ลบ. 2) งบลงทุนปรับลด จากเดิม 2,979.9136 ลบ. ลดลง 167.2438 ลบ. คงเหลือ 2,812.6698 ลบ.
3) งบรายจ่ายอื่นปรับลด จากเดิม 412.3938 ลบ. ลดลง 26.5694 ลบ. คงเหลือ 385.8244 ลบ. ดังนั้น งบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. เดิม 4,461.1773 ลบ. คงเหลืองบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. 4,042.7689 ลบ.

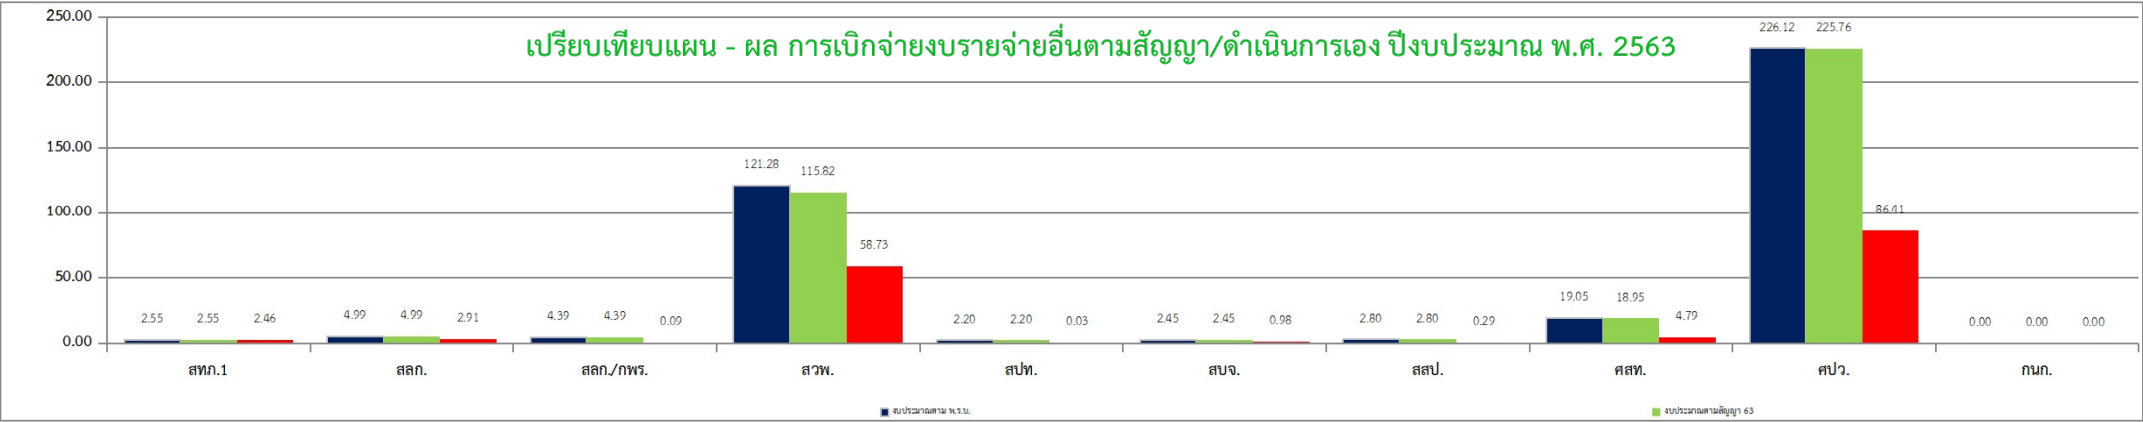



กรมทรัพยากรน้ำ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูล GF ณ วันที่ 22 กันยายน 2563


หมวดรายจ่าย	(1) งบประมาณตามพรบ.งปม. 2563		(2) งบประมาณตามสัญญา ปี 2563 (PO)		(3) ผลเบิกจ่ายสะสมจากงบ.ตามสัญญา ปี 2563		(2) - (3) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	918.0561	22.71%	918.0561	100.00%	891.8296	97.14%	26.2265	2.86%
รายจ่ายลงทุน	3,124.7128	77.29%	2,598.4843	83.16%	1,329.0601	51.15%	1,269.4242	48.85%
รวม	4,042.7689	100.00%	3,516.5404	86.98%	2,220.8897	63.16%	1,295.6507	36.84%

หมายเหตุ : 1. รายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.บ. 63 จากเดิม 3,512.5436 ลบ. คงเหลือ 3,291.9566 ลบ. เนื่องจากเป็นโครงการมอบให้ทหาร (เบิกจ่ายแทนกัน) จำนวนรวม 4 รายการ

2. พ.ร.บ.โอน 63 ปรับลดรวม 197.8214 ลบ. ดังนี้ 1) รายจ่ายประจำปรับลด จากเดิม 948.6337 ลบ. ลดลง 30.5776 ลบ. คงเหลือ 918.0561 ลบ. 2) รายจ่ายลงทุนปรับลด จากเดิม 3,291.9566 ลบ.

ลดลง 167.2438 ลบ. คงเหลือ 3,124.7128 ลบ. ดังนั้น งบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. เดิม 4,461.1773 ลบ. คงเหลืองบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. 4,042.7689 ลบ.

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

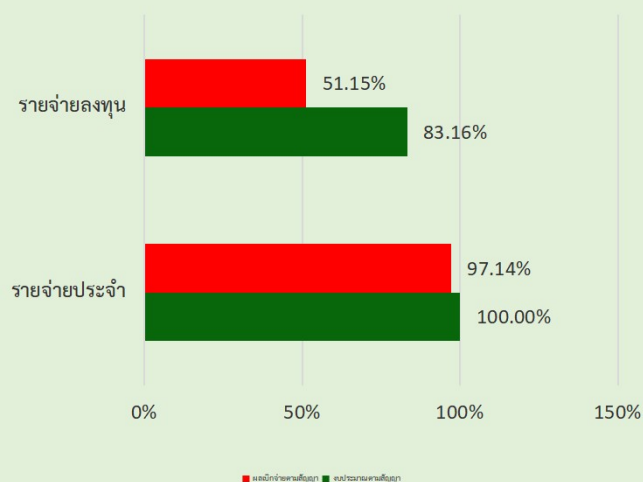

สรุปแผน - ผล การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563





กรมทรัพยากรน้ำ

สรุปแผน - ผล การเบิกจ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ข้อมูล GF ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

ประเภทรายจ่าย	แผน - ผล การใช้จ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปี พ.ศ. 2563										
	รวมงบประมาณปี 63			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	งบประมาณ		%	งบประมาณ		%		งบประมาณ		%	
รวมทั้งสิ้น	แผน	3,516.5404	100.00%	209.2381	5.95%	1,797.8216	51.12%	774.5140	22.02%	734.9667	20.90%
	ผล	2,220.8897	63.16%	204.8068	5.82%	230.2980	6.55%	1,038.1910	29.52%	747.5939	21.26%
1. รายจ่ายประจำ	แผน	918.0561	100.00%	202.9702	22.11%	261.7984	28.52%	244.5140	26.63%	208.7735	22.74%
	ผล	891.8296	97.14%	201.4223	21.94%	214.2313	23.34%	233.8031	25.47%	242.3729	26.40%
2. รายจ่ายลงทุน	แผน	2,598.4843	100.00%	6.2679	0.24%	1,536.0232	59.11%	530.0000	20.40%	526.1932	20.25%
	ผล	1,329.0601	51.15%	3.3845	0.13%	16.0667	0.62%	804.3879	30.96%	505.2210	19.44%


หมายเหตุ : 1. รายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.บ. 63 จากเดิม 3,512.5436 ลบ. คงเหลือ 3,291.9566 ลบ. เนื่องจากเป็นโครงการมอบให้ทหาร (เบิกจ่ายแทนกัน) จำนวนรวม 4 รายการ

2. พ.ร.บ.โอน 63 ปรับลดรวม 197.8214 ลบ. ดังนี้ 1) รายจ่ายประจำปรับลด จากเดิม 948.6337 ลบ. ลดลง 30.5776 ลบ. คงเหลือ 918.0561 ลบ. 2) รายจ่ายลงทุนปรับลด จากเดิม 3,291.9566 ลบ.

ลดลง 167.2438 ลบ. คงเหลือ 3,124.7128 ลบ. ดังนั้น งบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. เดิม 4,461.1773 ลบ. คงเหลืองบประมาณรวมตาม พ.ร.บ. 4,042.7689 ลบ.

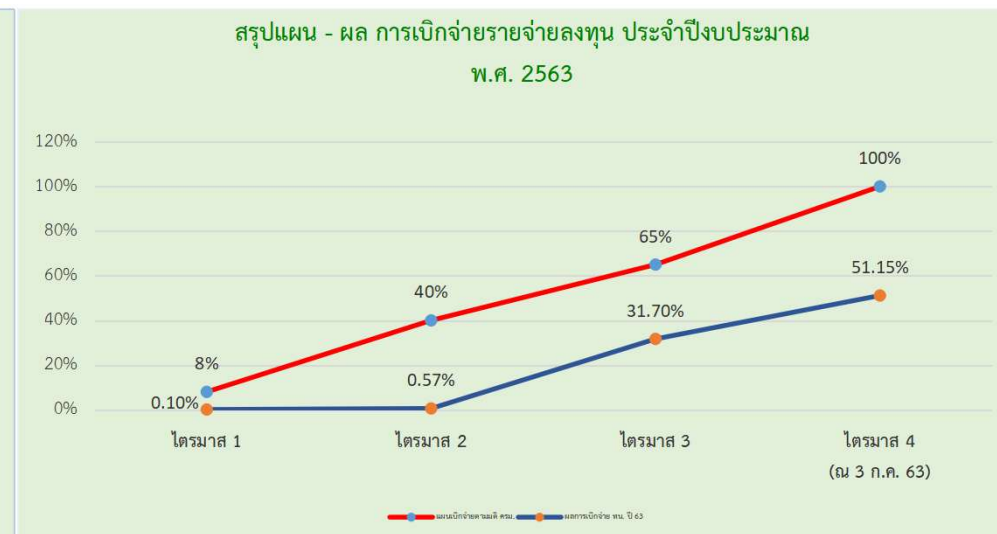

ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน งบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปี 2563 กรมทรัพยากรน้ำ จากระบบ GFMIS ณ 22 กันยายน 2563

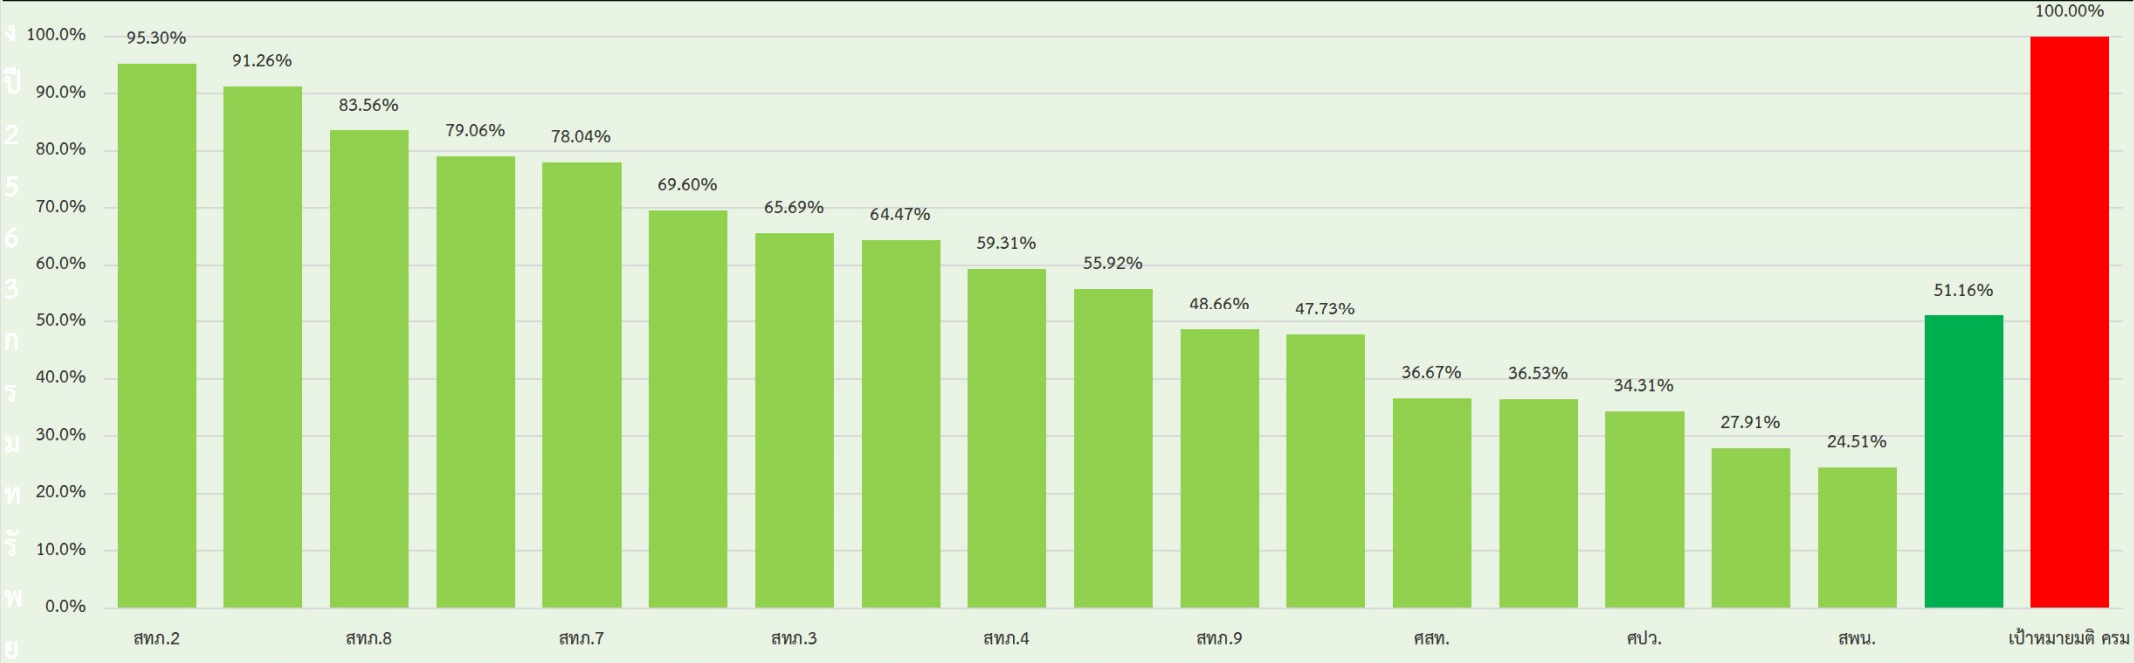

ลำดับที่		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	รวมทั้งสิ้น
หน่วยงาน		สทภ.2	สธอ.	สทภ.8	สทภ.11	สทภ.7	สธก.	สทภ.3	สทภ.1	สทภ.4	สทภ.6	สทภ.9	สทภ.5	ศสท.	สทภ.10	ศปว.	สวพ.	สพท.	
งปม. ตามสัญญา/ ดำเนินงานเอง	ล้านบาท	69.41	97.71	111.16	67.40	103.41	19.44	24.46	548.76	116.19	46.34	255.69	100.44	75.64	45.12	204.54	217.63	494.47	2,597.7868
ผลเบิกจ่าย	ล้านบาท	66.15	89.16	92.88	53.29	80.70	13.53	16.07	353.78	68.91	25.91	124.41	47.94	27.74	16.48	70.18	60.74	121.18	1,329.0601
	ร้อยละ	95.30%	91.26%	83.56%	79.06%	78.04%	69.60%	65.69%	64.47%	59.31%	55.92%	48.66%	47.73%	36.67%	36.53%	34.31%	27.91%	24.51%	51.16%




สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เหลือจ่าย (งบลงทุน, ค่าครุภัณฑ์, ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ค่าจ้างที่ปรึกษา,งบรายจ่ายอื่น)
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล GF ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2563		(2) งบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563		(3) ผลเบิกจ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2563			ผลเบิกจ่าย ปี 2563 ณ วันที่ 18 ก.ย. 63		(2) - (3) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณ ตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปี 2563		คงเหลือยังไม่ลงนาม		แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)				
	รวม	78	437.6606	72	340.9829	50	186.0607	55%	181.3679	53%	247.3290	73%	6	94.1026	37	39	0	
1	สทภ.1	19	81.4993	19	80.9743	14	32.8542	41%	30.4595	38%	48.1200	59%	0	-	6	13		
2	สทภ.2	1	0.4980	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	1	0.4980	0	1		
3	สทภ.3	11	38.5082	11	37.1007	4	5.7314	15%	3.4334	9%	31.3692	85%	0	-	3	8		
4	สทภ.4	2	4.4100	2	4.4000	0	-	0%	-	0%	4.4000	0%	0	-	0	2		
5	สทภ.5	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	0	-	0	0		
6	สทภ.6	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	0	-	0	0		
7	สทภ.7	6	28.5023	6	28.3678	3	6.5326	23%	6.5326	23%	21.8351	77%	0	-	1	5		
8	สทภ.8	20	146.8850	20	146.4270	19	137.8344	94%	137.8344	94%	8.5926	6%	0	-	18	1		
9	สทภ.9	3	18.7978	2	17.5600	2	1.9859	11%	1.9859	11%	15.5741	89%	1	1.1978	1	2		
10	สทภ.10	6	0.6615	6	0.6615	6	0.6613	0%	0.6613	0%	0.0002	0%	0	-	6	0		
11	สทภ.11	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	0	-	0	0		
12	สลก.	3	14.8533	3	14.8533	0	-	0%	-	0%	14.8533	0%	0	-	0	2		
13	สอน.	3	47.4068	0	-	0	-	0%	-	0%	47.4068	0%	3	47.4068	0	3		
14	สพท.	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	0	-	0	0		
15	สวท.	0	-	0	-	0	-	0%	-	0%	-	0%	0	-	0	0		
16	คสท.	1	45.0000	0	-	0	-	0%	-	0%	45.0000	0%	1	45.0000	0	1		
17	กนก.	1	10.1776	1	10.1776	0	-	0%	-	0%	10.1776	0%	0	-	0	1		
18	ศปว.	1	0.4523	1	0.4523	1	0.4523	0%	0.4523	0%	-	0%	0	-	1	0		
19	สบจ.	1	0.0085	1	0.0085	1	0.0085	0%	0.0085	0%	-	0%	0	-	1	0		

เปรียบเทียบผลเบิกจ่าย งบประมาณเหลือจ่าย ปี 2563

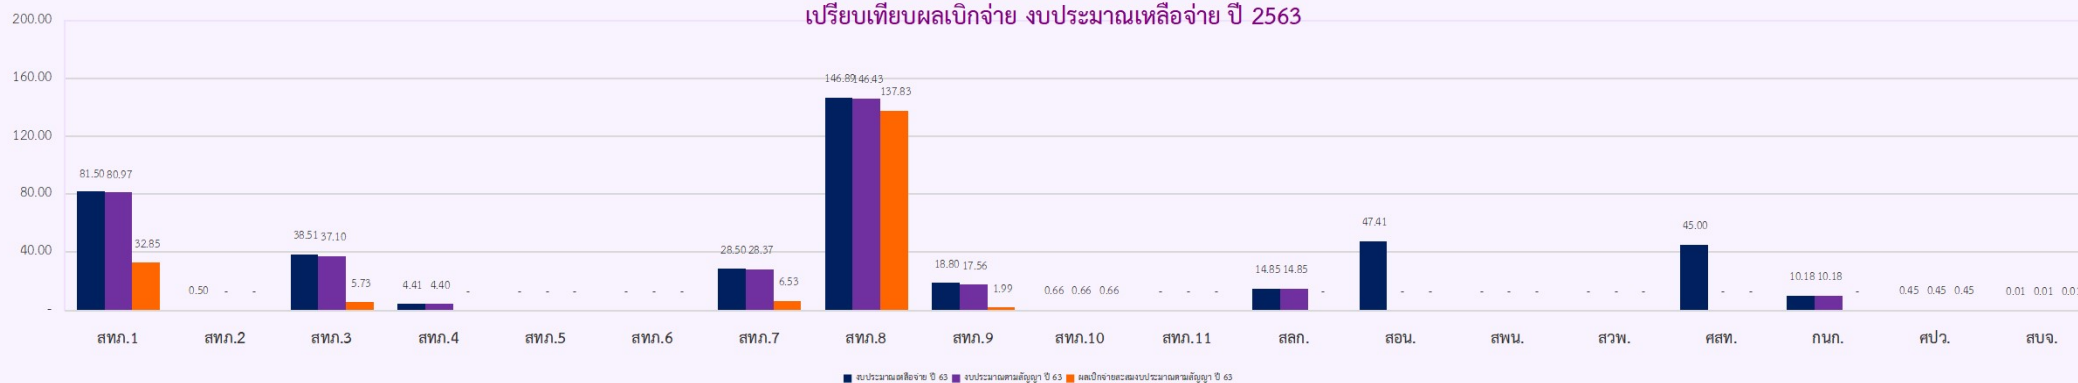



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบกลาง)

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) ทน. ขออนุมัติงบกลาง		(2) สำนักงบประมาณอนุมัติ		(3) งบประมาณลงนามตามสัญญา		(4) ผลเบิกจ่ายจากงบกลาง			แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ				
	รวม	35	551.0232	35	496.6441	35	206.4492	27	60.3767	29.25%	5	29	0	
1	สทภ.1	2	48.2000	2	44.9065	2	29.8390	2	2.99862	10.05%	0	2	0	ดำเนินการเอง 1 โครงการ
2	สทภ.2	2	38.0000	2	32.0885	2	32.0785	1	5.9360	18.50%	0	2	0	
3	สทภ.3	3	110.0000	3	83.7384	3	8.6602	1	2.00045	23.10%	0	3	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 2 โครงการ
4	สทภ.4	4	178.0000	4	168.9816	4	-	0	-		1	2	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 4 โครงการ
5	สทภ.6	1	2.0000	1	1.7343	1	1.1021	1	1.10211	100%	1	0	0	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
6	สทภ.7	8	90.0132	8	84.5760	8	84.5760	8	40.5479	47.94%	3	5	0	ดำเนินการเอง 2 โครงการ
7	สทภ.9	15	84.8100	15	80.6188	15	50.1934	14	7.7917	15.52%	0	15	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 1 โครงการ

- หมายเหตุ : 1. สำนักงบประมาณอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 35 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 496.6441 ล้านบาท
2. กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการ โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 266.4825 ล้านบาท (งานดำเนินการเอง) และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงานโครงการ รวมทั้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัด ให้กรมทรัพยากรน้ำทราบ เพื่อรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต่อไป (อยู่ระหว่างประสานรายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 63 จำนวน 7 โครงการ ปัจจุบัน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
3. งานดำเนินการเอง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จำนวน 1 โครงการ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จำนวน 2 โครงการ
4. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ (สทภ.6 , สทภ.7)
5. โครงการคงค้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 26 โครงการ จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 3 โครงการ เดือนกันยายน 2563 จำนวน 18 โครงการ และเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 5 โครงการ

