


สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2555 - 2562

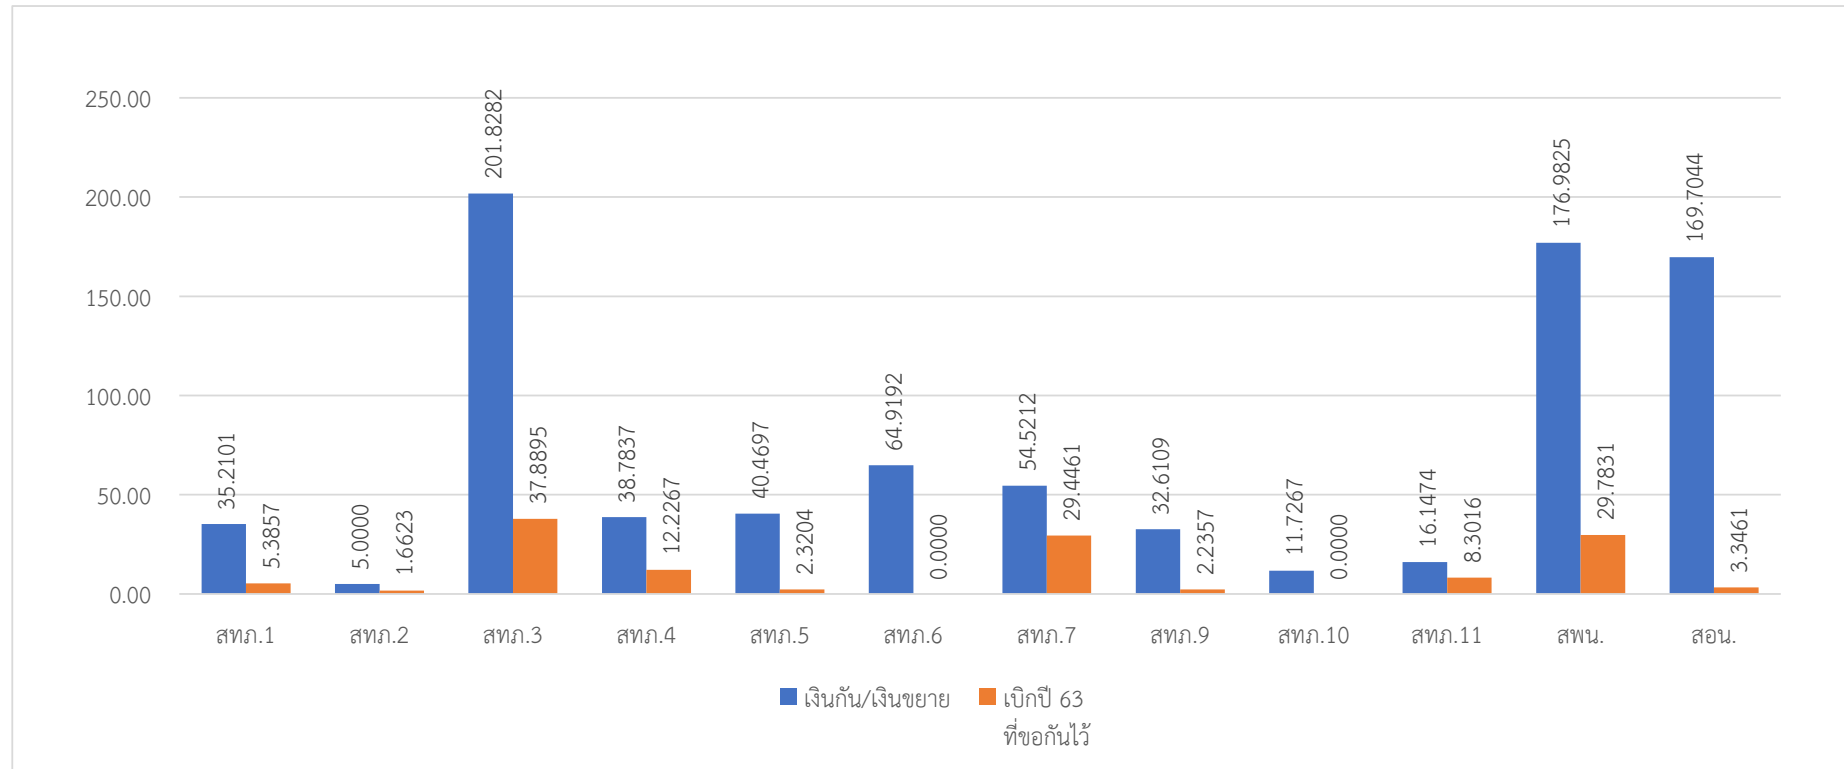

หน่วยงาน	สทก.1	สทก.2	สทก.3	สทก.4	สทก.5	สทก.6	สทก.7	สทก.9	สทก.10	สทก.11	สพณ.	สอน.	รวม
จำนวนโครงการ	5	1	18	8	4	5	3	9	3	1	5	8	70
เงินกัน/เงินขยาย	35.2101	5.0000	201.8282	38.7837	40.4697	64.9192	54.5212	32.6109	11.7267	16.1474	176.9825	169.7044	847.9041
เบิกปี 63 ที่ขอขึ้นไว้	5.3857	1.6623	37.8895	12.2267	2.3204	0.0000	29.4461	2.2357	0.0000	8.3016	29.7831	3.3461	132.5971
ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งหมด	15.30%	33.25%	18.77%	31.53%	5.73%	0.00%	54.01%	6.86%	0.00%	51.41%	16.83%	1.97%	15.64%

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 - 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เฉพาะงบประมาณที่ขอเกินเหลือปี / ขอยยเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)

ที่	รายการ	1. งบประมาณที่ขอเกินเหลือปี/ ขอยยเวลาเบิกจ่าย (ล้านบาท) คงเหลือ		2. เบิกจ่าย		คงเหลือ (1.) - (2.) (ล้านบาท)	หมายเหตุ (หน่วยงาน / จำนวนโครงการ)
		จำนวน โครงการ (คงเหลือ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		
1	ปี 2555 พรบ.	1	21.8594	0.0000	0%	21.8594	สอน. (1)
2	ปี 2556 พรบ.	1	13.0033	0.0000	0%	13.0033	สอน. (1)
3	ปี 2558 พรบ.	1	28.9534	0.0000	0%	28.9534	สอน. (1)
4	ปี 2559 พรบ.	3	40.8488	5.9181	14%	34.9307	สทภ.3 (2) สอน. (1)
5	ปี 2559 งบกลาง	1	8.5312	0.0000	0%	8.5312	สทภ.6 (1)
6	ปี 2560 พรบ.	7	102.2446	1.1095	1%	101.1351	สทภ.1 (1) สทภ.4 (1) สทภ.6 (1) สทภ.9 (3) สอน. (1)
7	ปี 2560 งบกลาง	1	19.8070	0.0000	0%	19.8070	สพ. (1)
8	ปี 2561 พรบ.	17	142.4424	42.0399	30%	100.4024	สทภ.1 (1) สทภ.3 (2) สทภ.4 (6) สทภ.6 (1) สทภ.7 (3) สทภ.10 (2) สอน. (2)
9	ปี 2561 เหลือจ่าย	3	8.1381	1.0307	13%	7.1073	สทภ.1 (1) สทภ.3 (1) สอน. (1)
10	ปี 2562 พรบ.	28	424.3615	75.2587	18%	349.1028	สทภ.1 (1) สทภ.3 (11) สทภ.4 (1) สทภ.5 (2) สทภ.6 (2) สทภ.9 (5) สทภ.10 (1) สทภ.11 (1) สพ. (4)
11	ปี 2562 เหลือจ่าย	7	37.7145	7.2401	19%	30.4743	สทภ.1 (1) สทภ.2 (1) สทภ.3 (2) สทภ.5 (2) สทภ.9 (1)
รวมทั้งสิ้น		70	847.9041	132.5971	16%	715.3069	

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				5						35.2101	5.3857	29.8244	15%	80%	
1	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทท.1	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการขยาย ผลโครงการหลวงวาวี ระยะ 2	ปางกลาง	แม่พริก	แม่สรวย	เชียงราย	2.3700	0.0000	2.3700	0%	85%	- แจ้งการปรับเกิน 10 % แล้ว - สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 - อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้าง หากผู้ รับจ้างไม่เข้าภายใน 15 เม.ย 63 จะพิจารณาบอกเลิกโครงการ
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.1	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จากฝายแม่น้ำลาว		แม่พริก	แม่สรวย	เชียงราย	20.2700	0.0000	20.2700	0%	20%	- อยู่ระหว่างขยายระยะเวลา ผู้รับ จ้างขอเข้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
3	2561 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทท.1	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงผาหิ้ง-ศรีศรีรักษ์	ศรีศรีรักษ์ หมู่ ที่ 11	เชียงของ	วังเจ้า	ตาก	0.5081	0.2829	0.2252	56%	98%	- ทำโครงการร่วมกับอุทยานฯ รอ การอนุญาตจากกรมอุทยานฯ - ขยายสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญา ใหม่วันที่ 12 พค. 63 - หยุด งานเนื่องจากรอการตอบกลับงาน ปลูกป่าทดแทน
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.1	1	ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ห้วยก้อด พร้อมระบบ กระจายน้ำ	ห้วยก้อด หมู่ที่ 2	ร่องเคาะ	วังเหนือ	ลำปาง	0.2520	0.0000	0.2520	0%	96%	- แก้ไขแบบแปลนค่างานลด 35,405 บาท - หยุดงานเนื่องจาก ติดขอ อนุญาตกรมทางหลวงเพื่อวางท่อ ลอด
5	2562 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทท.1	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงเลอตอ ระยะ 2		แม่ตืน,แม่แหละ	แม่ระมาด	ตาก	11.8100	5.1028	6.7072	43%	99%	- ขยายสัญญาจ้างสิ้นสุดสัญญา ใหม่วันที่ 14 มิ.ย.63

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				1						5.0000	1.6623	3.3377	33%	58%	
1	2562 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทภ.2	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำใน พื้นที่คทช.พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	หมู่ที่ 7	หนองปลาไหล	เมือง	สระบุรี	5.0000	1.6623	3.3377	33%	58%	อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จประมาณ สิงหาคม 2563 ขยายสัญญาถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				18						201.8282	37.8895	163.9387	19%	63%	
1	2559 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปฏีรูป พร้อมระบบกระจายน้ำ	ปฏีรูป	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	3.1178	0.0000	3.1178	0%	0%	อยู่ระหว่างหาผู้จัดซื้อจัดจ้างราย ใหม่
2	2559 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ น้ำพาน	ไทยสวรรค์ หมู่ที่ 12	สร้างคอม	สร้างคอม	อุดรธานี	9.4866	5.9181	3.5685	62%	85%	อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยถ่อน	สาวแล หมู่ที่ 4	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2550	0.0000	2.2550	0%	30%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาย คางฮุ้ง	ขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ 3,11	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	5.2707	0.0000	5.2707	0%	98%	• โครงการไม่เป็นไปตามรูปแบบ ที่กำหนด • คณะกรรมการสั่งให้แก้ไขงาน
5	2561 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทท.3	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยน้ำหมัน สนับสนุน โครงการรักษน้ำเพื่อพระ แม่ของแผ่นดิน	บ้านหมากแข้ง หมู่ 4	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.6440	0.0000	2.6440	0%	100%	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
6	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย จำปา	บ้านจำปา หมู่ 9	ก้านเหลือง	นาแก	นครพนม	1.3291	0.0000	1.3291	0%	100%	อยู่ระหว่างส่งมอบงาน
7	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองยาวหนองเต่า	บ้านดอนแดง หมู่ 3	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	21.9000	2.0002	19.8998	9%	30%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกุดเป่ง	บ้านม่วง หมู่ 1	นาคุณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	19.6993	0.0000	19.6993	0%	17%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
9	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหล่ม	บ้านคำเตย หมู่ 4	คำเตย	เมือง	นครพนม	18.8559	2.0008	16.8550	11%	32%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
10	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแอ	บ้านนาหนอง ยาว หมู่ 7	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	30.9467	16.8012	14.1455	54%	85%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
11	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเบ็น	บ้านสามขา หมู่ 7	สามัคคีพัฒนา	อากาศอำนวย	สกลนคร	31.0779	0.0000	31.0779	0%	100%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
12	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย บ้าน	บ้านไทย ประสงค์	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	16.8000	0.0000	16.8000	0%	6%	แก้ไขแบบ
13	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย ลึก	บ้านโสกโพธิ์ หมู่ 4	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	2.3785	1.2610	1.1175	53%	85%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ แก้ไขแบบ
14	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองอีเลิง	บ้านนาเยี่ย หมู่ 6	เซียงยืน	เมือง	อุดรธานี	15.6423	6.6851	8.9572	43%	85%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
15	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย ดาน	บ้านหนองไผ่ หมู่ 8	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	14.5725	3.2231	11.3494	22%	67%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
16	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยน้ำหมันสนับสนุน โครงการรักษน้ำเพื่อพระ แม่ของแผ่นดิน	บ้านหมากแข้ง หมู่ 4	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	2.4800	0.0000	2.4800	0%	45%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
17	2562 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทภ.3	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองผือ	บ้านนาห้วยบ่อ หมู่ที่ 3	นาห้วยบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1.6860	0.0000	1.6860	0%	85%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
18	2562 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทภ.3	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยด้าย	บ้านด้าย หมู่ ที่ 4	โพนจาน	โพนสวรรค์	นครพนม	1.6860	0.0000	1.6860	0%	85%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				8						32.3662	11.1051	21.2611	34%	74%	
1	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแปลน	กุดลอบ	โพธิ์ชัย	โคกโพธิ์ชัย	ขอนแก่น	3.0019	1.1095	1.8924	37%	100%	ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไผ่		ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	5.4400	1.0847	4.3553	20%	93%	บอกละเลิสัญญาแล้ว
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบึงใหญ่	ริมบึง	เมืองเตา	พยัคภูมิ	มหาสารคาม	4.2383	2.2573	1.9810	53%	86%	ส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 24 เม.ย.63
4	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	5.3240	0.0000	5.3240	0%	10%	บอกละเลิสัญญาแล้ว
5	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพระบุ	พระบุ	พระบุ	พระยืน	ขอนแก่น	6.6490	5.7007	0.9483	86%	96%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสะอาด		สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	4.6670	0.9530	3.7140	20%	34%	บอกละเลิสัญญาแล้ว
7	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย แสง	โคกเพิ่ม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	3.0460	0.0000	3.0460	0%	71%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แจ้ง ปรับเกิน 10 %
8	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสาย หนัง	หมู่ที่ 4,7,10	สีชมพู	สีชมพู	ขอนแก่น	6.4175	1.1216	5.2959	17%	99%	อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				4						40.4697	2.3204	38.1494	6%	85%	
1	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.5	1	อนุรักษ์พันพุห้วยจริง	หมู่ที่ 2,3,12,13	คาสะมะ	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	19.4800	2.3204	17.1597	12%	40%	หยุดงานเพื่อแก้ไขแบบแปลนคาดว่าจะแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 63
2	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.5	1	อนุรักษ์พันพุห้วยระหาร	ตาถูก,โพธิ์คู, ตากแดด,อาไร หมู่ที่ 1,10,6,7	ตาถูก	เขวาสินรินทร์	สุรินทร์	6.3124	0.0000	6.3124	0%	100%	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
3	2562 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทภ.5	1	อนุรักษ์พันพุหนองปะอาว		กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	6.6773	0.0000	6.6773	0%	100%	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
4	2562 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทภ.5	1	อนุรักษ์พันพุหนองขังพัน์ หนองหัวช้าง - หนองถนน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		กันทรารมย์	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	8.0000	0.0000	8.0000	0%	100%	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				5						64.9192	0.0000	64.9192	0%	33%	
1	2559 งบกลาง	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ คลองบางไผ่		ห้วยใหญ่	บางละมุง	ชลบุรี	8.5312	0.0000	8.5312	0%	96%	ขยายสัญญาถึงวันที่ 1 ก.ย. 61 (นิติ การกรมแจ้งผลการหารือแล้ว) อนุมัติ หยุดงานตามหนังสือที่ ทส 0616/400 ลว 11กุมภาพันธ์ 2563ตั้งแต่ 20 ต.ค. 61 (งดและลดค่าปรับ)
2	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ UN	หมู่ที่ 9	ทัพไทย	ตาพระยา	สระแก้ว	23.3930	0.0000	23.3930	0%	0%	หยุดงานตั้งแต่ 2 ก.พ. 60 ทส 0616/0799 ลว 3 ก.พ. 61 เนื่องจาก ติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการอยู่ในแนว เขตป่าสงวนแห่งชาติตาพระยา และ อยู่ระหว่างรอกกรมป่าไม้อนุญาตใช้พื้นที่ หลังจากปรับลดขนาดพื้นที่ 157 ไร่ เหลือ 43 ไร่ ** หนังสือ ที่ ทส. 1602.53/14287 ลว. 10 ก.ค. 62 เพื่อขอข้อมูลและเอกสารประกอบการ พิจารณาเพิ่มเติม ทาง สทภ.6 ได้ ประสาน ทสจ.สระแก้ว รวบรวมข้อมูล ให้กรมป่าไม้แล้ว โดยทาง ทสจ. สระแก้ว จะดำเนินการจัดส่งเอกสาร **กรมป่าไม้ตรวจสอบแล้วพื้นที่ขอ อนุญาตบางส่วนอยู่ในเขตจำแนกการ ใช้ประโยชน์ และที่ดินป่าไม้เขตป่า เพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ต้องจัดทำ รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (environmental checklist)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 8	วังโตนด	นายายอาม	จันทบุรี	7.9100	0.0000	7.9100	0%	70%	ปฏิบัติตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 61 บันทึกข้อตกลงเร่งรัดงานโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวาง พร้อมระบบ กระจายน้ำครั้งที่ 3 (สุดท้าย) ลงวันที่ 14 มกราคม 2563
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอน พูน	5	ดอนยอ	เมือง	นครนายก	21.4500	0.0000	21.4500	0%	0%	ขอหยุดงานตั้งแต่ 1 ก.พ. 62 (ทส 0616/373 ลว 8 ก.พ. 62) เนื่องจาก อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ และ เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก กระทรวงมหาดไทย
5	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	เครื่องมือทดสอบแรงดึง ของเหล็กพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6		หน้าเมือง	เมือง	ปราจีนบุรี	3.6350	0.0000	3.6350	0%	0%	สิ้นสัญญาวันที่ 14 ก.พ. 63 อยู่ ระหว่างการปรับ ส่งของแล้วแต่ยัง ตรวจรับไม่ผ่าน

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				3						54.5212	29.4461	25.0751	54%	94%	
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.7	1	ก่อสร้างระบบผันน้ำจาก แม่น้ำแควน้อย - บ้านไทร รัตน์	หมู่ที่ 9	ลุ่มลุ่ม	ไทรโยค	กาญจนบุรี	43.6500	24.4219	19.2281	56%	96%	อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหม้อ แปลงไฟฟ้าในขนาดที่เหมาะสมกับ ระบบสูบน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2563
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.7	1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภายในค่ายสุรสีห์ (มทบ.17)	หมู่ที่ 1	ลาดหญ้า	เมือง	กาญจนบุรี	5.3152	0.0000	5.3152	0%	87%	เร่งดำเนินการยกเลิกสัญญา
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.7	1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโป่งลึก - บ้านบาง กลอย	บ้านบางกลอย	ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	5.5560	5.0242	0.5318	90%	100%	

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				9						26.1657	1.7607	24.4050	7%	63%	
1	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำครกผาแท่น	หมู่ที่ 1	กลางเวียง	เวียงสา	น่าน	1.7102	0.0000	1.7102	0%	89%	1) ห้างฯแจ้งเข้า 10 เม.ย. 60 2) พบปัญหาปริมาณน้ำมาก,سوبน้ำ 3) หยุดงานตั้งแต่ 18 ก.ค. 60 4) แจ้งเข้าทำงานครั้งที่ 2 ลว 29 ม.ค. 61 ขยายระยะเวลาสัญญาสิ้นสุด 26 ก.พ. 61 5) แจ้งค่าปรับเกิน 10% 15 มิ.ย. 61 6) ขอหยุดงานน้ำท่วมโครงการ คาดว่าแล้วเสร็จ ม.ค. 62 7) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก
2	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกระจับ	วังปลาทดหมู่ที่ 4	ไผ่ท่าโพ	โพธิ์ประทับช้าง	พิจิตร	3.3328	0.0000	3.3328	0%	86%	1) ห้างฯแจ้งเข้า 1 เม.ย. 60 2) พบปัญหาน้ำท่วมโครงการ 22 พ.ค. 60 3) หยุดงานตั้งแต่ 19 พ.ค. 60 ทส 0624/1781 4) สทภ.9ให้ห้างฯเข้าทำงานตั้งแต่ 9 มิ.ค. 61 5) ห้างแจ้งเข้าทำงาน 12 มิ.ค. 61 ขยายระยะเวลา 4 ก.ค. 61 6) แจ้งค่าปรับเกิน 10% 22 ต.ค. 61 7) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทพบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
3	2560 พ.ร.บ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสามปีงบ	สามปี บ.บ. หมู่ที่ 3	วังสำโรง	ตะพานหิน	พิจิตร	9.8322	0.0000	9.8322	0%	44%	1) ปัญหาหนี้รวมโครงการ 2) ยุทธศาสตร์ 2 ก.ค. 60 ทส 0624/2367 ลว 6 ต.ค. 60 3) หนังสือ ทส.0624/1884 ลว 12 ก.ค. 60 สทท.9 ขออนุญาต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐกิจ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเกษตรกรรมที่ 6 ตามหนังสือที่ กษ 0309.11/1582 ลว 18 ก.ย. 60 แจ้งมายัง สทท.9 โครงการฯ เป็นที่ดินของกรมชลประทาน อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร สำนักงานจัดรูปที่ดินเป็นผู้ดูแล ซึ่งดินจะต้องทิ้งในเขตชลประทานเท่านั้น ให้ สทท.9 ประสานเรื่องแหล่งที่ดินกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐกิจ และส่งแผนการที่ดินมายังจัดรูปที่ดินเพื่อพิจารณาต่อไป 5) ตามหนังสือที่ ทส.0624/0129 ลว 15 ม.ค. 61 สทท.9 ส่งแบบแปลนและผังที่ดินเพื่อขออนุญาตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐกิจ 6) หนังสือ กษ 0312.11/95 ลว 9 ก.พ. 61 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเศรษฐกิจแจ้งกำหนดจุดที่ดิน บริเวณโครงการ 7) หนังสือที่ กษ 0312.13/42 ลว 23 มี.ค. 61 เห็นสมควรให้ดำเนินการและให้ที่ดินตามที่กำหนด การอนุญาตเป็นอำนาจของจัดรูปที่ดินที่ 6 8) ดัดปัญหาที่ราชพัสดุ ขออนุญาตที่ดินจากสำนักงานธนารักษ์จังหวัดพิจิตร 9) แก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จวันที่ 25 พ.ค. 63 10) แจ้งเข้าทำงานวันที่ 3 มิ.ย.63 (ขยายสัญญาสิ้นสุด วันที่ 24 มิ.ย. 63)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
4	2562 พ.ร.บ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองยม	ดงพริกแจว หมู่ที่ 9	ท่าชัย	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	2.5160	0.5457	1.9703	22%	60%	1) 3 ม.ค. 62 สทท.9 แจ้งให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงาน 2) 4 ม.ค. 62 ผู้รับจ้างเสนอแผนงาน 3) 15 ม.ค. 62 สทท.9 นัดประชุมเพื่อหารือ แนวทางเนื่องจากติดพื้นที่กรมเจ้าท่า 4) แจ้งหยุดงาน เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ที่กรมเจ้า ท่าและกรมชลประทาน 5) เอกสารขออนุญาต สนง.เจ้าท่าภูมิภาค พิษณุโลก.อยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาต (เจ้าท่า ตรวจพื้นที่โครงการ 10 พ.ค. 62) 6) หยุดงานเพื่อรอการอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 7) ได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้ดำเนินการ 24 มี.ค. 63 8) แจ้งเข้างาน วันที่ 14 เม.ย. 63 9) ขยายสัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 ส.ค. 63
5	2562 พ.ร.บ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคู	โป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4	ท่านางงาม	บางระกำ	พิษณุโลก	3.7440	0.0000	3.7440	0%	0%	1) แจ้งหยุดงาน เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ที่กรมเจ้า ท่าและชลประทานจัดรูปที่ดินเขตชลประทาน 2) กรมเจ้าท่าอนุญาตเฉพาะงานขุดลอกยังไม่ สามารถเข้าดำเนินการได้ 3) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุญาตจากสำนักงาน จัดรูปที่ดินและเขตชลประทาน
6	2562 พ.ร.บ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแปลงช้าง	ปากดง หมู่ ที่ 11	ซากเหล็ก	ซากเหล็ก	พิจิตร	2.6230	0.0000	2.6230	0%	100%	1) หยุดงาน 23 ม.ค. 62 เนื่องจากพื้นที่ที่ดินไม่ สามารถรับมวลดินได้ 2) แก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ 3) ขยายระยะเวลา สิ้นสุด 3 ต.ค. 62 4) แจ้งเข้าทำงานครั้งที่ 2 ลว 27 มค 63 ขยาย ระยะเวลาสิ้นสุด 19 กพ 63 5) อยู่ระหว่างส่งงาน

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
7	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองด้านซ้ายเอี้ยะ	ใหม่เขาน้อย หมู่ที่ 13	แก่งโสภา	วังทอง	พิษณุโลก	2.4075	1.2150	1.1925	50%	62%	1) ขออนุญาต สนง.เจ้าท่าภูมิภาคพิษณุโลก 2) ป่าไม้ ได้อนุญาตให้เข้าดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 17 เม.ย. 61 อบต.ส่งเอกสารให้ สทภ.9 5 มิ.ย. 62 3) เจ้าท่า สนง.เจ้าท่าภูมิภาคพิษณุโลก อนุญาตให้ เข้าดำเนินการได้ 17 มิ.ย. 62 4) ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 21 ต.ค. 62 5) เร่งรัดงานครั้งที่ 1 ลว 21 ส.ค. 62 6) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
8	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.9	1	เครื่องมือทดสอบแรงดึงของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9		วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	3.5900	0.0000	3.5900	0%	0%	1) สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค. 2563 2) รายละเอียดงานไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะ (TOR) ของสัญญาจ้าง 3) อยู่ระหว่างหารือ กวพ.
9	2562 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทภ.9	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพร้อมฝาย เสริมระบบนิเวศห้วยกอก บ้านห่าง ทางหลวง หมู่ที่ 2 (โครงการภูฟ้า พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี)	บ้านห่าง ทางหลวง หมู่ที่ 2	ภูฟ้า	บ่อเกลือ	น่าน	2.8552	0.4750	2.3802	17%	85%	1) ห้างแจ้งเข้าดำเนินการ ลว 10 ก.ค. 62 2) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				3						11.7267	0.0000	11.7267	0%	22%	
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.10	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองค้ำคว (ช่วง 2)	หมู่ที่ 2	เหมาะ	กะปง	พังงา	6.6340	0.0000	6.6340	0%	5%	เป็นโครงการที่มีการยกเลิกสัญญา (ทส 0625/27/2561 ลว.20 ก.พ. 2561) และแจ้งดำเนินการเป็นผู้ตั้ง งาน และดำเนินการจัดจ้างใหม่ (e-bidding) /สัญญาปัจจุบัน อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.10	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่าง น้ำห้วยลูกรัง	หมู่ที่ 6	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	2.1637	0.0000	2.1637	0%	19%	เป็นโครงการที่มีการยกเลิกสัญญา (ทส 0625/39/2561 ลว.12 มี.ค. 2561) และแจ้งดำเนินการเป็นผู้ตั้ง งาน และดำเนินการจัดจ้างใหม่ (e-bidding) /สัญญาปัจจุบัน อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
3	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.10	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำโคกแม่คาค	หมู่ที่ 8	ฉวาง	ฉวาง	นครศรีธรรมรา ช	2.9290	0.0000	2.9290	0%	42%	เป็นโครงการที่มีการยกเลิกสัญญา (ทส 0625/04/2562 ลว.3 ธ.ค. 2561) และแจ้งดำเนินการเป็นผู้ตั้ง งาน และดำเนินการจัดจ้างใหม่ (e-bidding) /สัญญาปัจจุบัน อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				1						16.1474	8.3016	7.8458	51%	91%	
1	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.11	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อ บากฮูก	โนนผักหวาน หมู่ที่ 7	จิกดู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	16.1474	8.3016	7.8458	51%	91%	

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				5						176.9825	29.7831	147.1994	17%	52%	
1	2560 งบกลาง	งบลงทุน	สพน.	1	พัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล			ท่าหลวง	ลพบุรี	19.8070	0.0000	19.8070	0%	89%	- ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาด สภาพคล่อง - มาตรการ กรมทรัพยากรน้ำมี หนังสือแจ้งเตือนบอกเลิกสัญญา มาแล้ว 3 ครั้ง และแจ้งเตือนบอก เลิกสัญญาครั้งสุดท้าย ตามหนังสือ ที่ ทส 0604/1309 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 - มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวนเงิน 29,745,000 บาท)
2	2562 พรบ.	งบลงทุน	สพน.	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปึง อินทนิล 2 หนองจุเห่า ต่อเชื่อมหนองจิกปม และ ระบบกระจายน้ำ	คลองอุดม	ปามะคาบ	เมือง	พิจิตร	12.5575	12.5575	0.0000	100%	100%	โครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวด สุดท้ายแล้ว มีอ เมษายน 2563 และอยู่ระหว่าง สลก. เบิกจ่าย เงินงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
3	2562 พ.ร.บ.	งบลงทุน	สพท.	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จากฝายน้ำล้นท่า เสากระโดง		นาบ่อคำ	เมือง	กำแพงเพชร	28.8150	0.0000	28.8150	0%	6%	ปัญหาอุปสรรค องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีหนังสือร้องขอให้ ปรับปรุงแบบแปลน ทำให้ต้องสั่ง หยุดงานและแก้ไข แบบแปลนให้ตรงกับความต้องการ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ และกรมมีหนังสือ ให้หยุดงานก่อสร้าง คลองส่งน้ำสาย RMC ช่วง กม. 0+025 ถึง กม 04325 และคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ช่วง กม. 11+500 ถึง กม 11+750 ตามหนังสือ ที่ ทส 0607/4119 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มตรกร 1. แก้ไขสัญญา ตามหนังสือ ที่ ทส 0607.3/484 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 และ 2. เร่งรัดการ ดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน หมายเหตุ (มีการเบิกจ่ายเงิน ล่วงหน้า 15% จำนวนเงิน 5,085,000 บาท)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
4	2562 พ.ร.บ.	งบลงทุน	สพท.	1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บ น้ำกุดนาแซง		บ้านโคก	โคกโพธิ์ชัย	ขอนแก่น	64.6602	9.3733	55.2869	14%	34%	ปัญหาอุปสรรค ไม่มี ผลการ ดำเนินงานเร็วกว่าแผน 14.93% (แผนงาน 18.63%, ผลงาน 33.56%) มาอกร กำกับติดตามให้เป็นไปตาม แผนงานโครงการ โดยปัจจุบันอยู่ ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1,ติดตั้ง ท่อ HDPE PE80 PN6 ขนาด 630 มม. และ 2. งานขุดปรับระดับอ่างเก็บน้ำ พร้อมขนทิ้ง หมายเหตุ มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวนเงิน 13,142,955 บาท งบประมาณผูกพัน 2562 - 2564 ประกอบด้วย ปี 2562 = 22,995,500 บาท ปี 2563 = 45,442,900 บาท และ ปี 2564 = 19,181,300 บาท

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
5	2562 พรบ.	งบลงทุน	สพน.	1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บ น้ำหนองหาร		ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	51.1428	7.8523	43.2905	15%	33%	ปัญหาอุปสรรค ผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าแผน 4.02% (แผนงาน 37.34%, ผลงาน 33.32%) มาตรการ เร่งรัดงานและกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามแผนงานโคร การ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. งานทำดินกันน้ำรอบแนวขุดลอก ฝั่งขวา 2 งานดินขุดและถมท่อยด้วย เครื่องจักร ชนิด HDPE ขนาด 400, 315 มม. และ 3. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ระยะขนส่ง 1,2 กิโลเมตร หมายเหตุ มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวนเงิน 9,990,000 บาท งบประมาณผูกพัน 2562 - 2564 ประกอบด้วย ปี 2562 = 16,459,700 บาท ปี 2563 = 36,383,700 บาท และ ปี 2564 = 13,756,600 บาท

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				8						164.7184	2.5982	162.1202	2%	79%	
1	2555 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	ก่อสร้างระบบส่งน้ำผืนน้ำ น้ำมุ่น-ห้วยส้มป่อย		ในเมือง	เมือง	น่าน	21.8594	0.0000	21.8594	0%	70%	ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลน ในเขตกองทัพอากาศ จ.น่าน เพราะกองทัพอากาศต้องการให้กรมฯ เปลี่ยนวิธีการดำเนินการจากการ ขุดคลองเปิดเพื่อผันน้ำ เป็นวางท่อ GRP และให้ก่อสร้างถนนตรวจการ และไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวการ วางท่อ เป็นผลทำให้วงเงินค่า ก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 95 ล้าน บาท ซึ่งเพิ่มเกิน 10% ของเงิน งบประมาณก่อสร้าง หากนำเข้า กรม. พิจารณางบประมาณ จะทำ ให้ล่าช้า แนวทางแก้ไข 1. คกก.และผู้รับจ้างได้ตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้างโดยให้ผู้รับจ้าง รายงานผลสำรวจค่าระดับงาน ก่อสร้าง งานวางท่อและบ่อพักน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนิน โครงการฯ 2.-ปรับปรุงแบบแปลนให้ สอดคล้องกับความเป็นจริง เฉพาะ นอกเขตทหารอากาศ และ

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
2	2556 พ.ร.บ.	งบลงทุน	สอ.น.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำลำน้ำอิง			แม่ใจ,เมือง	พะเยา	13.0033	0.0000	13.0033	0%	100%	ปัญหาอุปสรรค คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายงวดสุดท้าย งวดที่ 6และผู้รับจ้างได้ฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายตามสิทธิต่อศาล ปกครองกลาง แนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างหาหรือกรมบัญชีกลาง กรณีเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย และ รอการตัดสินจากศาลปกครอง
3	2558 พ.ร.บ.	งบลงทุน	สอ.น.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองแขง	หนองหัววัว	โคกสี	เมือง	ขอนแก่น	28.9534	0.0000	28.9534	0%	72%	ปัญหาอุปสรรค โครงการได้สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 59 คกก.เสนอขอขยาย อายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ ตาม บันทึกที่ทส 0610.5/812 ลว 6 มิ.ย. 62 ซึ่งรอง อท.น.(อธิวัฒน์) มี ข้อสั่งการให้ สอ.น.พิจารณาตามที่ สลก.เสนอ เนื่องจาก สลก. ตรวจสอบพบว่าขาดเอกสาร หนังสือสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานและ หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข กรมทรัพยากรน้ำได้ทำหนังสือ เร่งรัดและแจ้งค่าปรับ อยู่ระหว่างการหยุดงานและแก้ไข แบบแปลน ครั้งที่ 1 คกก.ดำเนินการตรวจสอบตามที่ สลก. เสนอ แล้ว


ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
4	2559 พ.ร.บ.	งบลงทุน	สอ.น.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองเปืญเครือ	โนนเมือง หมู่ที่ 5	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	28.2445	0.0000	28.2445	0%	74%	ปัญหาอุปสรรค '- ผู้รับจ้างมีเครื่องมือเครื่องจักร จำนวนน้อย ไม่สมดุลกับปริมาณที่ คงเหลืออยู่ - โครงการฯ ได้สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่ วันที่ 2 ส.ค. 62 แล้ว - ช่วงเวลาที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่ โครงการฯยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้าง - ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่น เกิด ภาวะน้ำท่วม อีกทั้งโครงการฯเป็น พื้นที่รองรับการระบายน้ำจากพื้นที่ โดยรอบ เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของราษฎร แนวทางแก้ไข '- เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง - อท.น.มีหนังสือแจ้งการเรียก ค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 เนื่องจากโครงการฯ มีกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 ส.ค. 62 แต่ผู้รับจ้าง ทำงานไม่แล้วเสร็จจะต้องชำระ ค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
5	2560 พ.ร.บ.	ลงทุน	สอ.น.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองเบญจเรือ (ผูกพันเก่า)	โนนเมือง หมู่ที่ 5	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	58.6045	0.0000	58.6045	0%	47%	ปัญหาอุปสรรค '- ผู้รับจ้างมีเครื่องมือเครื่องจักร จำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ คงเหลืออยู่ - โครงการฯ ได้สิ้นสุดสัญญาตั้งแต วันที่ 2 ส.ค. 62 แล้ว - ช่วงเวลาที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่ โครงการฯ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ก่อสร้าง - ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากอิทธิพลพายุโพดุล เกิด ภาวะน้ำท่วม อีกทั้งโครงการฯ เป็น พื้นที่รองรับการระบายน้ำจากพื้นที่ โดยรอบ เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของราษฎร แนวทางแก้ไข '- เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง - อท.น.มีหนังสือแจ้งการเรียก ค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 เนื่องจากโครงการฯ มีกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 ส.ค. 62 แต่ผู้รับจ้าง ทำงานไม่แล้วเสร็จจะต้องชำระ ค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
6	2561 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อเสริมระบบนิเวศ และ สำรองน้ำเพื่อเสริมระบบ การอุปโภค-บริโภค ภายในพื้นที่วนอุทยานไม้ กลายเป็นหิน		ตากออก	บ้านตาก	ตาก	6.3448	0.0000	6.3448	0%	87%	ปัญหาอุปสรรค กลุ่มผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน เดียวกับโครงการฯ มีความกังวลว่า ปริมาณน้ำใน แหล่งน้ำต้นทุนจะมีไม่เพียงพอต่อ การใช้ในฤดูแล้งการอนุมัติใช้พื้นที่ จากกรมป่าไม้ สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แนวทางแก้ไข จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำใน พื้นที่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อม รับฟังแนวทางการแก้ไขจากกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ เมื่อเดือน มิ.ย. 62 /เร่งรัด การดำเนินการของผู้รับจ้าง ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเร่งดำเนินการ เสนอขออนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
7	2561 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำคลองท่าดี		กำโลน	ลานสกา	นครศรีธรรมรา ช	7.7086	2.5982	5.1104	34%	100%	ปัญหาอุปสรรค มีการแจ้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในบริเวณโครงการ ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงาน แนวทางแก้ไข '- ตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน - แก้ไขแบบแปลนให้สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่ - เร่งรัดการดำเนินการ

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วยงาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
8	2561 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำห้วยเชือก-ห้วย รวงไซ		น้ำอ้อม	กระนวน	ขอนแก่น	4.9859	0.7478	4.2381	15%	100%	ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสองข้างลำห้วยประชาชน ได้เริ่มเพาะปลูกข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งมีการขุดพื้นที่ เกษตรกรรม ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่มี เส้นทางในการลำเลียงวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรเข้าไปทำงาน หาก จะดำเนินการอาจจะส่งผลกระทบต่อความ เสียหายของพืชที่เพาะปลูกได้ เนื่องจากผลกระทบโควิด ทำให้ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างใหญ่และโรงไม้ ปิด ผู้รับจ้างไม่สามารถซื้อสินค้า บางชนิดได้ และมีผลกระทบด้าน การขนส่ง แนวทางแก้ไข มอบหมายผู้ควบคุมงานและผู้ รับจ้างติดตามสภาพพื้นที่ การเกษตร หากมีความพร้อมที่จะ ดำเนินการให้รายงานกรม ทรัพยากรน้ำ ทราบต่อไป

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด

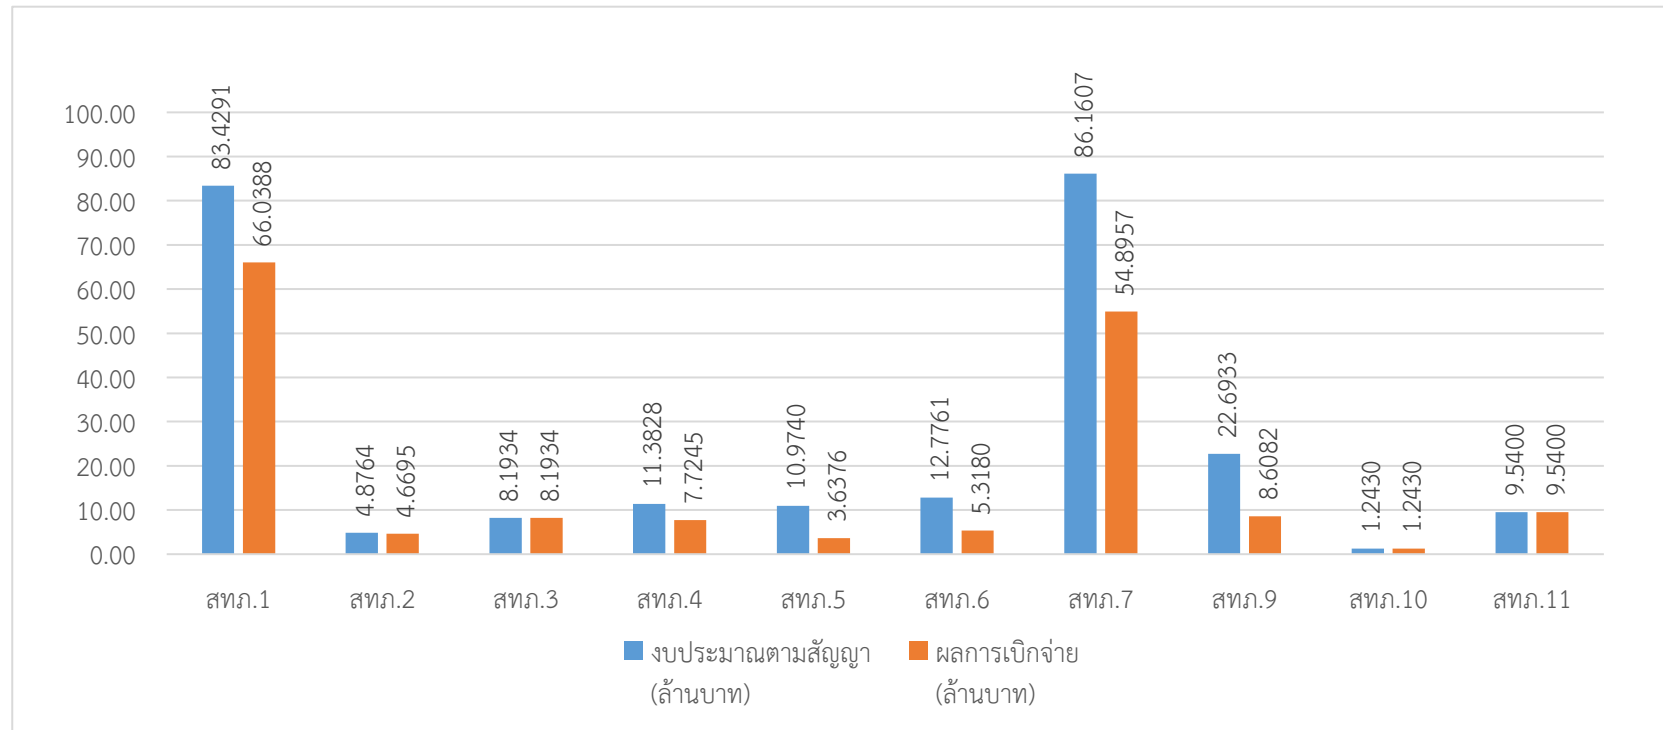

หน่วยงาน	สทก.1	สทก.2	สทก.3	สทก.4	สทก.5	สทก.6	สทก.7	สทก.9	สทก.10	สทก.11
จำนวนโครงการ	25	3	3	4	4	7	38	8	4	3
งบประมาณตามสัญญา (ล้านบาท)	83.4291	4.8764	8.1934	11.3828	10.9740	12.7761	86.1607	22.6933	1.2430	9.5400
ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	66.0388	4.6695	8.1934	7.7245	3.6376	5.3180	54.8957	8.6082	1.2430	9.5400
ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งหมด	79.16%	95.76%	100.00%	67.86%	33.15%	41.62%	63.71%	37.93%	100.00%	100.00%
หมายเหตุ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด
 ชลบทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ
 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563)

หน่วยงาน	อนุมัติ		งบประมาณตามสัญญา		ทสจ. เป็นหน่วย ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการเอง	ประเภทโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด				ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)			ก่อสร้าง แหล่งน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ	ระบบประปา หมู่บ้าน	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	ยกเลิก	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	
รวมทั้งสิ้น	116	358.0275	99	251.2689	26	87	48	53	7	2	78	22	13	169.8687	47.45%	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1	25	93.1000	25	83.4291	0	25	22	0	3	0	20	4	1	66.0388	79%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ - หยุดงาน อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน 1 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2	3	8.5280	3	4.8764	0	3	0	3	0	0	3	0	0	4.6695	96%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3	10	27.5000	3	8.1934	10	0	10	0	0	0	3	0	7	8.1934	100%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - งบประมาณตกพับ จำนวน 7 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4	7	23.6959	4	11.3828	4	0	0	4	0	0	2	2	3	7.7245	68%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ - งบประมาณตกพับ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5	4	14.4300	4	10.9740	0	4	0	2	0	2	3	0	1	3.6376	33%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6	14	34.1760	7	12.7761	6	8	12	2	0	0	3	10	1	5.318	42%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ - งบประมาณตกพับ จำนวน 1 โครงการ - ทสจ. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7	38	110.1883	38	86.1607	3	35	4	34	0	0	32	3	0	54.8957405	64%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 27 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 3 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ - ทสจ. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	- สทก.8 เสนอโครงการไม่ทันงบประมาณจึงตกพับไป
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9	8	32.2917	8	22.693326	3	5	0	5	0	0	5	3	0	8.6082	38%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	4	1.2490	4	1.2430	0	4	0	0	4	0	4	0	0	1.2430	100%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11	3	12.8686	3	9.54	0	3	0	3	0	0	3	0	0	9.5400	100%	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
