


สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันหล่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2555 - 2562

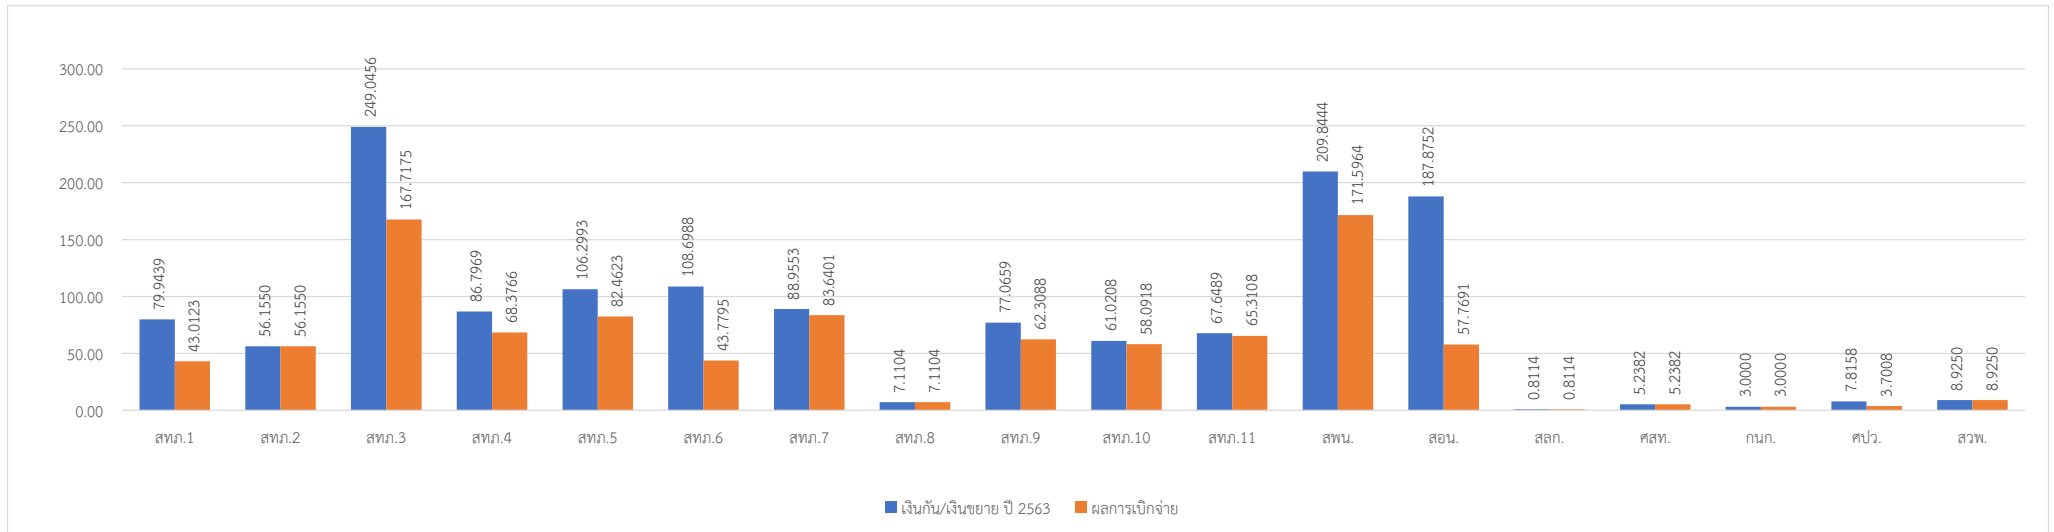

หน่วยงาน	สทก.1	สทก.2	สทก.3	สทก.4	สทก.5	สทก.6	สทก.7	สทก.8	สทก.9	สทก.10	สทก.11	สทพ.	สอณ.	สลก.	คสท.	กนก.	ศปว.	สวพ.	รวม
จำนวนโครงการทั้งหมด ณ วันที่ 21 ม.ค. 63	11	12	35	23	17	11	15	1	20	8	21	5	9	1	2	1	1	1	194
เงินกัน/เงินขยาย ปี 2563	79.9439	56.1550	249.0456	86.7969	106.2993	108.6988	88.9553	7.1104	77.0659	61.0208	67.6489	209.8444	187.8752	0.8114	5.2382	3.0000	7.8158	8.9250	1,412.2508
ผลการเบิกจ่าย	43.0123	56.1550	167.7175	68.3766	82.4623	43.7795	83.6401	7.1104	62.3088	58.0918	65.3108	171.5964	57.7691	0.8114	5.2382	3.0000	3.7008	8.9250	989.0059
ร้อยละผลการเบิกจ่าย	53.80	100.00	67.34	78.78	77.58	40.28	94.02	100.00	80.85	95.20	96.54	81.77	30.75	100.00	100.00	100.00	47.35	100.00	70.03
จำนวนโครงการคงเหลือ	5	0	9	5	2	5	1	0	5	1	1	2	5	0	0	0	1	0	42
เงินกัน/เงินขยาย คงเหลือ	36.9317	0.0000	81.3281	18.4204	23.8370	64.9192	5.3152	0.0000	14.7572	2.9290	2.3381	38.2480	130.1061	0.0000	0.0000	0.0000	3.2183	0.0000	422.3482

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 - 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เฉพาะงบประมาณที่ขอเกินเหลือปี / ขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563)

ที่	รายการ	1. งบประมาณที่ขอเกินเหลือปี/ ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (ล้านบาท)		(2) ผลการเบิกจ่ายของเงินเกิน เหลือปี/ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (ล้านบาท)		(3) คงเหลือ (ล้านบาท)		หมายเหตุ (หน่วยงาน / จำนวนโครงการ)
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวน โครงการ (คงเหลือ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
1	ปี 2555 งบกลาง เงินกัน/เงินขยาย	1	21.8594	0.0000	0%	1	21.8594	สอน. (1)
2	ปี 2556 พรบ. เงินกัน/เงินขยาย	1	13.0033	0.0000	0%	1	13.0033	สอน. (1)
3	ปี 2557 พรบ. เงินกัน/เงินขยาย	1	17.3173	17.3173	100%	0	0.0000	
3	ปี 2558 พรบ. เงินกัน/เงินขยาย	1	28.9534	0.0000	0%	1	28.9534	สอน. (1)
4	ปี 2559 พรบ. เงินกัน/เงินขยาย	8	77.6706	74.5528	63%	1	3.1178	สทก.3 (1)
5	ปี 2559 งบกลาง เงินกัน/เงินขยาย	1	8.5312	0.0000	0%	1	8.5312	สทก.6 (1)
6	ปี 2560 พรบ. เงินกัน/เงินขยาย	10	129.3159	38.5647	27%	5	90.7513	สทก.1 (1) สทก.6 (1) สทก.9 (2) สอน. (1)
7	ปี 2560 งบกลาง เงินกัน/เงินขยาย	1	40.7788	20.9718	51%	1	19.8070	สทก. (1)
7	ปี 2560 เหลือจ่าย เงินกัน/เงินขยาย	1	0.8114	0.8114	100%	0	0.0000	
8	ปี 2561 พรบ. เงินกัน/เงินขยาย	25	180.3614	100.7609	31%	12	79.6006	สทก.1 (2) สทก.3 (2) สทก.4 (5) สทก.6 (1) สทก.7 (1) สอน. (1)
9	ปี 2561 เหลือจ่าย เงินกัน/เงินขยาย	5	18.2411	18.0159	22%	1	0.2252	สทก.1 (1)
10	ปี 2562 พรบ. เงินกัน/เงินขยาย	76	653.2337	509.0103	56%	15	144.2234	สทก.1 (1) สทก.3 (6) สทก.5 (1) สทก.6 (2) สทก.9 (2) สทก.10 (1) สทก.11 (1) สทก. (1)
11	ปี 2562 เหลือจ่าย เงินกัน/เงินขยาย	63	222.1733	209.8976	73%	3	12.2757	สทก.5 (1) สทก.9 (1) สปว. (1)
รวมทั้งสิ้น		194	1,412.2508	989.9026	70.09%	42	422.3482	

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				5						111.4867	83.5718	46.3572	37.2146	0.2829	36.9317	1%	76%	
1	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.1	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการขยาย ผลโครงการหลวงวาวี ระยะ 2	ปางกลาง	แม่พริก	แม่สรวย	เชียงราย	9.9403	9.9000	7.5300	2.3700	0.0000	2.3700	0%	86%	คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน สิงหาคม 2563
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.1	1	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำจากฝายแม่ น้ำลาว		แม่พริก	แม่สรวย	เชียงราย	46.0624	28.9000	8.6300	20.2700	0.0000	20.2700	0%	28%	คาดว่าจะดำเนินงานป้องกันการกัดเซาะแล้วเสร็จ ในเดือน สิงหาคม 2563 - ติดปัญหาการขออนุญาตที่ นสล. เพื่อก่อสร้างโรง สูบน้ำ - ติดปัญหาแนวท่อส่งน้ำเนื่องจากราษฎรไม่ยินยอม ให้ผ่านพื้นที่ - แจ้ง อบต. แม่พริกจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้ว
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.1	1	ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้น โฮ้งหลวง	โฮ้ง หมู่ที่ 2	บ้านโฮ้ง	บ้านโฮ้ง	ลำพูน	40.5205	30.0833	16.2688	13.8145	0.0000	13.8145	0%	71%	- ยกเลิกสัญญา - อยู่ระหว่างของงบประมาณเพิ่มเติม
4	2561 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทภ.1	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงผาผึ้ง-ศรี คีรีรักษ์	ศรีคีรีรักษ์ หมู่ ที่ 11	เชียงของ	วังเจ้า	ตาก	9.1500	8.8750	8.3669	0.5081	0.2829	0.2252	56%	98%	- หยุดงานติดปัญหาการปลูกป่าชดเชยจาก อุทยานคลองวังเจ้า - ได้แจ้งเร่งรัดอุทยานแล้ว
5	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.1	1	ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ห้วยก้อด พร้อมระบบ กระจายน้ำ	ห้วยก้อด หมู่ที่ 2	ร่องเคาะ	วังเหนือ	ลำปาง	5.8135	5.8135	5.5615	0.2520	0.0000	0.2520	0%	96%	หยุดงานตั้งแต่วันที่ 8 สค.62 เนื่องจากกรการได้รับ อนุญาตกันที่ตลอดคนจากกรมทางหลวง

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				9						240.2550	125.1847	20.5019	104.8496	23.5215	81.3281	22%	56%	
1	2559 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปฏิรูป พร้อมระบบกระจายน้ำ	ปฏิรูป	ศรีสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	15.0000	5.7513	2.8002	3.1178	0.0000	3.1178	0%	80%	ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา วันที่ 5 สิงหาคม 2563 / คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยถ่อน	สาวแล หมู่ที่ 4	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	2.2550	2.2550	0.0000	2.2550	0.0000	2.2550	0%	30%	อนุมัติหยุดงานวันที่ 5 มิ.ย. 63 เนื่องจากน้ำท่วม บริเวณรอบๆ โครงการ ปัจจุบันยังไม่สามารถเข้า ดำเนินการได้
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สายคางฮูง	ขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ 3,11	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	40.0000	20.0000	14.7293	5.2707	0.0000	5.2707	0%	99%	โครงการไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด • คณะกรรมการสั่งให้แก้โครงการ • มีมติบอกเลิกสัญญา
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองยาวหนองเต่า	บ้านดอนแดง หมู่ 3	ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	45.0000	21.9000	0.0000	21.9000	11.0002	10.8998	50%	55%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
5	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกุดเป่ง	บ้านม่วง หมู่ 1	นาคุณใหญ่	นาหว้า	นครพนม	48.0000	20.5000	0.8007	19.6993	0.0000	19.6993	0%	10%	บอกเลิกสัญญา
6	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหล่ม	บ้านคำเตย หมู่ 4	คำเตย	เมือง	นครพนม	30.0000	19.4000	0.5442	18.8559	2.0008	16.8550	11%	33%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
7	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยบ้าน	บ้านไทย ประสงค์	โนนสะอาด	บ้านม่วง	สกลนคร	30.0000	16.8000	0.0000	16.8000	0.0000	16.8000	0%	6%	อยู่ระหว่างพิจารณาขอขุดที่ดิน
8	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยลึก	บ้านโสกโพธิ์ หมู่ 4	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	5.0000	2.3785	0.0000	2.3785	1.2610	1.1175	53%	92%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง / แก้ไขแบบ
9	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยदान	บ้านหนองไม้ หมู่ 8	นาทราย	พิบูลย์รักษ์	อุดรธานี	25.0000	16.2000	1.6275	14.5725	9.2594	5.3130	64%	100%	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				5						49.6400	24.4763	1.7610	22.5222	4.1018	18.4204	18%	60%	
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไผ่		ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	9.9000	5.4400	0.0000	5.4400	1.0847	4.3553	20%	93%	บอกลิกสัญญาแล้ว
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบึงใหญ่	ริมบึง	เมืองเตา	พยัคภูมิ	มหาสารคาม	9.9000	4.9863	0.7480	4.2383	2.2573	1.9810	53%	91%	มีเบิกล่วงหน้า 15 %
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	9.9000	5.3240	0.0000	5.3240	0.0000	5.3240	0%	10%	บอกลิกสัญญาแล้ว
4	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสะอาด		สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	9.9700	5.6800	1.0130	4.4739	0.7598	3.7140	17%	34%	บอกลิกสัญญาแล้ว
5	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยแสง	โคกเพิ่ม	หัวดง	นาดูน	มหาสารคาม	9.9700	3.0460	0.0000	3.0460	0.0000	3.0460	0%	71%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แจ้งปรับเงิน 10 %

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				2						39.9500	26.1573	0.0000	26.1573	2.3204	23.8370	9%	58%	
1	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.5	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง	หมู่ที่ 2,3,12,13	คาละแมะ	ศีขรภูมิ	สุรินทร์	30.0000	19.4800	0.0000	19.4800	2.3204	17.1597	12%	40%	หยุดงานเพื่อแก้ไขแบบแปลนคาดว่าจะแก้ไขแบบ แปลนแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 63
2	2562 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทภ.5	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปะอ่าว		กันทรารมย์	ซุซันต์	ศรีสะเกษ	9.9500	6.6773	0.0000	6.6773	0.0000	6.6773	0%	75%	แจ้งเข้า 19/12/62

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				5						151.5282	114.8350	4.6631	64.9192	0.0000	64.9192	0%	40%	
1	2559 งบกลาง	งบลงทุน	สทท.6	1	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ คลองบางไผ่		ห้วยใหญ่	บางละมุง	ชลบุรี	81.6961	58.4470	4.6631	8.5312	0.0000	8.5312	0%	100%	ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 กค. 63 อยู่ระหว่างหารือนิติกร กรมในเรื่องของค่าปรับ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้
2	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทท.6	1	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ UN	หมู่ที่ 9	ทัพไทย	ตาพระยา	สระแก้ว	34.9971	23.3930	0.0000	23.3930	0.0000	23.3930	0%	0%	หยุดงานตั้งแต่ 2 ก.พ. 60 ทส 0616/0799 ลว 3 ก.พ. 61 เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ดำเนินการอยู่ใน แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตาพระยา และอยู่ระหว่าง รอกรมป่าไม้อนุญาตใช้พื้นที่ หลังจากปรับลดขนาด พื้นที่ 157 ไร่ เหลือ 43 ไร่ ** หนังสือ ที่ ทส. 1602.53/14287 ลว. 10 ก.ค. 62 เพื่อขอข้อมูลและ เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทาง สทท.6 ได้ประสาน ทสจ.สระแก้ว รวบรวมข้อมูลให้กรมป่า ไม้แล้ว โดยทาง ทสจ.สระแก้ว จะดำเนินการจัดส่ง เอกสาร **กรมป่าไม้ตรวจสอบแล้วพื้นที่อนุญาต บางส่วนอยู่ในเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ และที่ดิน ป่าไม้เขตป่า เพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ต้องจัดทำ รายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (environmental checklist)
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.6	1	อนุรักษ์พื้นที่หนองควาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 8	วังโดนด	นายายอาม	จันทบุรี	9.7500	7.9100	0.0000	7.9100	0.0000	7.9100	0%	100%	ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 กค. 63 อยู่ระหว่างรอการ เบิกจ่าย (มีปัญหาเรื่องการโอนสิทธิ์)
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.6	1	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ ดอนพูน		5ดอนยอ	เมือง	นครนายก	21.4500	21.4500	0.0000	21.4500	0.0000	21.4500	0%	0%	1. ขอหยุดงานตั้งแต่ 12 ก.ค.62 (ทส0616/2429 ลว.1 ส.ค.62) 2. อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ จากกรมที่ดิน
5	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.6	1	เครื่องมือทดสอบแรงดึง ของเหล็กพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6		หน้าเมือง	เมือง	ปราจีนบุรี	3.6350	3.6350	0.0000	3.6350	0.0000	3.6350	0%	0%	บริษัท ส่งของวันที่ 17 ก.พ. 63 คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ไม่ตรวจรับเนื่องจากรายละเอียดงาน ไม่ตรงกับสัญญา ส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณา

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				1						7.8000	5.3152	0.0000	5.3152	0.0000	5.3152	0%	26%	
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.7	1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภายในค่ายสุรสีห์ (มทบ. 17)	หมู่ที่ 1	ลาดหญ้า	เมือง	กาญจนบุรี	7.8000	5.3152	0.0000	5.3152	0.0000	5.3152	0%	26%	เนื่องจากขณะดำเนินงานดินถม ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะนำ วัสดุกันซึม แผ่นGTL เข้ามาในโครงการฯ จึงได้ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้า รวมเนื่องจากวัสดุเข้าไปด้วย ภายหลังผู้รับจ้างไม่ สามารถนำเงินไปชำระค่าวัสดุได้ ทำให้ผู้แทน จำหน่ายระงับการส่งมอบวัสดุให้กับผู้รับจ้าง เปอร์เซ็นต์ผลการดำเนินงานจริงที่ 26% จากเดิมที่รายงานรวมเนื่องงานแผ่น GTL 87% ปัจจุบัน มติที่ประชุม ให้มีการยกเลิกสัญญา เตรียม แจ้งทาง สอก. เพื่อยกเลิกสัญญา

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				5						39.9106	24.0086	8.7764	15.2322	0.4750	14.7572	3%	55%	
1	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ครกผาแทน	หมู่ที่ 1	กลางเวียง	เวียงสา	น่าน	9.9960	6.5490	4.8388	1.7102	0.0000	1.7102	0%	89%	1) ท้างฯแจ้งเข้า 10 เม.ย. 60 2) พบปัญหาปริมาณ น้ำมาก,สูบน้ำ 3) หยุดงานตั้งแต่ 18 ก.ค. 60 4) แจ้งเข้าทำงาน ครั้งที่ 2 ลว 29 ม.ค. 61 ขยายระยะเวลาสัญญา สิ้นสุด 26 ก.พ. 61 5) แจ้งค่าปรับเกิน 10% 15 มี.ย. 61 6) ขอลหยุดงานน้ำท่วมโครงการ คาดว่าแล้ว เสร็จ ม.ค. 62 7) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก
2	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกระจับ	วังปลากด หมู่ ที่ 4	ไผ่ท่าโพ	โพธิ์ประทับช้าง	พิจิตร	16.9606	6.7666	3.4338	3.3328	0.0000	3.3328	0%	86%	1) ท้างฯแจ้งเข้า 1 เม.ย. 60 2) พบปัญหาน้ำท่วม โครงการ 22 พ.ค. 60 3) หยุดงานตั้งแต่ 19 พ.ค. 60 ทส 0624/1781 4) สทท.9ให้ท้างฯเข้าทำงาน ตั้งแต่ 9 มี.ค. 61 5) ท้างฯแจ้งเข้าทำงาน 12 มี.ค. 61 ขยายระยะเวลา 4 ก.ค. 61 6) แจ้งค่าปรับเกิน 10% 22 ต.ค. 61 7) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก
3	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคู	โป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4	ท่านางงาม	บางระกำ	พิษณุโลก	5.0000	3.7440	0.0000	3.7440	0.0000	3.7440	0%	0%	1) แจ้งหยุดงาน เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่กรมเจ้าท่า และชลประทานจัดรูปที่ดินเขตชลประทาน 2) กรมเจ้าท่าอนุญาตเฉพาะงานขุดลอกยังไม่สามารถ เข้าดำเนินการได้ 3) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุญาตจากสำนักงาน จัดรูปที่ดินและเขตชลประทาน มีแนวโน้มจะยกเลิกโครงการ
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.9	1	เครื่องมือทดสอบแรงดึง ของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9		วังทอง	วังทอง	พิษณุโลก	4.1000	3.5900	0.0000	3.5900	0.0000	3.5900	0%	0%	1) สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค. 2563 2) รายละเอียดงานไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติ (TOR) ของสัญญาจ้าง 3) อยู่ระหว่างหารือ กวพ.

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
5	2562 เหลือ จ่าย	งบลงทุน	สทภ.9	1	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำพร้อมฝายเสริมระบบ นิเวศห้วยกอก บ้านท่า ทางหลวง หมู่ที่ 2 (โครงการรื้อฟ้าพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี)	บ้านท่าทาง หลวง หมู่ที่ 2	ภูฟ้า	บ่อเกลือ	น่าน	3.8540	3.3590	0.5039	2.8552	0.4750	2.3802	17%	100%	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				1						5.0000	4.2455	1.0049	2.9290	0.0000	2.9290	0%	65%	
1	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.10	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำโคกแม่ควด	หมู่ที่ 8	ฉวาง	ฉวาง	นครศรีธรรมรา ช	5.0000	4.2455	1.0049	2.9290	0.0000	2.9290	0%	65%	เป็นโครงการที่มีการยกเลิกสัญญา (ทส 0625/04/2562 ลว.3 ธ.ค. 2561) และแจ้ง ดำเนินการเป็นผู้ทำงาน และดำเนินการจัดจ้างใหม่ (e-bidding) /สัญญาปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				1						30.0000	18.6800	2.5326	16.1474	13.8093	2.3381	86%	100%	
1	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.11	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อ บักฮุก	โนนผักหวาน หมู่ที่ 7	จิกคู่	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	30.0000	18.6800	2.5326	16.1474	13.8093	2.3381	86%	100%	อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทขบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				2						321.9202	232.2000	183.5780	48.6220	10.3740	38.2480	21%	72%	
1	2560 งบกกลาง	งบลงทุน	สพน.	1	พัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล		ท่าหลวง	ลพบุรี		276.3558	198.3000	178.4930	19.8070	0.0000	19.8070	0%	89%	1. จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด 2. ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง - กรมทรัพยากรน้ำมีหนังสือแจ้งเตือนบอกเลิกสัญญามาแล้ว 3 ครั้ง และแจ้งเตือนบอกเลิกสัญญา (ครั้งสุดท้าย) ตามหนังสือ ที่ ทส 0604/1309 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
2	2562 พรบ.	งบลงทุน	สพน.	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นท่าเสากระโดง		นาบ่อคำ	เมือง	กำแพงเพชร	45.5644	33.9000	5.0850	28.8150	10.3740	18.4410	36%	54%	1. จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด 2. ฝนตกในพื้นที่โครงการ 3. มีการเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกตามแนวก่อสร้าง 4. กลุ่มผู้ใช้น้ำร้องขอให้แก้แบบแปลน


ลำดับ ที่	ปี	ประเภท	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				5						259.9476	193.4489	64.6836	130.1061	0.0000	130.1061	0%	82%	
1	2555 งบกกลาง	งบลงทุน	สอน.	1	ก่อสร้างระบบส่งน้ำผิวน้ำ น้ำผิวน้ำ-ห้วยลัมป่อย		ในเมือง	เมือง	น่าน	85.3330	21.8594	0.0000	21.8594	0.0000	21.8594	0%	70%	ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนในเขต กองทัพอากาศ จ.น่าน เพราะกองทัพต้องการให้ กรมฯ เปลี่ยนวิธีการดำเนินการจากการขุดคลองเปิด เพื่อผิวน้ำ เป็นวางท่อGRP และให้ก่อสร้างถนน ตรวจการและไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวการวางท่อ เป็นผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% ของเงินงบประมาณ ก่อสร้าง หากนำเข้า ครม. พิจารณางบประมาณ จะ ทำให้ล่าช้า แนวทางแก้ไข 1. คกก.และผู้รับจ้างได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโดย ให้ผู้รับจ้างรายงานผลสำรวจค่าระดับงานก่อสร้าง งานวางท่อและบ่อกักน้ำ เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาดำเนินโครงการฯ 2.-ปรับปรุงแบบแปลนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เฉพาะนอกเขตทหารอากาศ และดำเนินการก่อสร้าง ตามวงเงินในสัญญา โดยหาแนวทางในการระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ทหารอากาศ 3.อทน.สั่งเข้างานวันที่ 25 พ.ค.63
2	2556 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์พื้นที่พืชน้ำแหล่งน้ำลำน้ำอิง			แม่ใจ,เมือง	พะเยา	41.5385	41.5385	28.5352	13.0033	0.0000	13.0033	0%	100%	ปัญหาอุปสรรค คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายงวดสุดท้าย งวดที่ 6และ ผู้รับจ้างได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายตามสิทธิต่อศาล ปกครองกลาง แนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง กรณีเบิกจ่าย เงินงวดสุดท้าย และรอการตัดสินใจจากศาลปกครอง

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทพบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
3	2558 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองแขง	หนองหัววัว	โคกสี	เมือง	ขอนแก่น	45.0000	45.0000	16.0466	28.9534	0.0000	28.9534	0%	72%	ปัญหาอุปสรรค โครงการได้สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 59 คกก.เสนอขอขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ ตามบันทึกที่ทส 0610.5/812 ลว 6 มิ.ย. 62 ซึ่งรอง อทน.(อธิวัฒน์) มีข้อสั่งการให้ สอน.พิจารณาตามที่ สกก.เสนอ เนื่องจาก สกก.ตรวจสอบพบว่าขาด เอกสาร หนังสือสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานและหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข กรมทรัพยากรน้ำได้ทำหนังสือเร่งรัดและแจ้งค่าปรับ อยู่ระหว่างการหยุดงานและแก้ไขแบบแปลน ครั้งที่ 1 คกก.ดำเนินการตรวจสอบตามที่ สกก. เสนอ แล้ว
4	2560 พรบ.	ลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองเบ็ญเครือ (ผูกพัน เก่า)	โนนเมือง หมู่ที่ 5	ยางท่าแจ้ง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	64.3600	64.3600	5.7555	59.9453	0.0000	59.9453	0%	80%	ปัญหาอุปสรรค - ผู้รับจ้างมีเครื่องมือเครื่องจักรจำนวนน้อย ไม่ สมดุลกับปริมาณที่คงเหลืออยู่ - โครงการฯ ได้สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 62 แล้ว - ช่วงเวลาที่ผ่านมานครในพื้นที่โครงการยังคงมี น้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว เนื่องจาก อิทธิพลพายุไต้ฝุ่น เกิดภาวะน้ำท่วม อีกทั้งโครงการฯ เป็นพื้นที่รองรับการระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร แนวทางแก้ไข - เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง - อทน.มีหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับตามเงื่อนไข สัญญา เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 เนื่องจากโครงการฯ มี กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ส.ค. 62 แต่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จจะต้องชำระค่าปรับ เป็นจำนวนเงินวันละ164,000บาท - อทน.อนุมัติลดค่าปรับจำนวน 237 วัน ตามที่ค กกพิจารณาการบริหารสัญญาจ้างฯและคกกตรวจสอบ การจ้างเสนอ

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
5	2561 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อเสริมระบบนิเวศ และสำรองน้ำเพื่อเสริม ระบบการอุปโภค-บริโภค ภายในพื้นที่วนอุทยาน ไม้กลายเป็นหิน		ตากออก	บ้านตาก	ตาก	23.7161	20.6910	14.3462	6.3448	0.0000	6.3448	0%	90%	ปัญหาอุปสรรค กลุ่มผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนเดียวกับโครงการฯ มีความกังวลว่าปริมาณน้ำใน แหล่งน้ำต้นทุนจะไม่เพียงพอต่อการใช้ในฤดูแล้ง การอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แนวทางแก้ไข จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่มีความเข้าใจที่ ถูกต้อง พร้อมรับฟังแนวทางการแก้ไขจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อเดือน มิ.ย. 62 /เร่งรัดการดำเนินการของผู้ รับจ้างดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเร่งดำเนินการเสนอขออนุมัติ ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

ลำดับ ที่	ปี	ประเภทงบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 62	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ
รวม				1						9.2000	9.1950	1.3793	7.8158	4.5975	3.2183	59%	100%	
1	2562	รายจ่ายอื่น	ศพว.	1	โครงการศึกษาประเมิน ศักยภาพ และพัฒนา ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ เก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ในพื้นที่สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ					9.2000	9.1950	1.3793	7.8158	4.5975	3.2183	59%	100%	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 2 งวดสุดท้าย คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 10 กันยายน 2563

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด

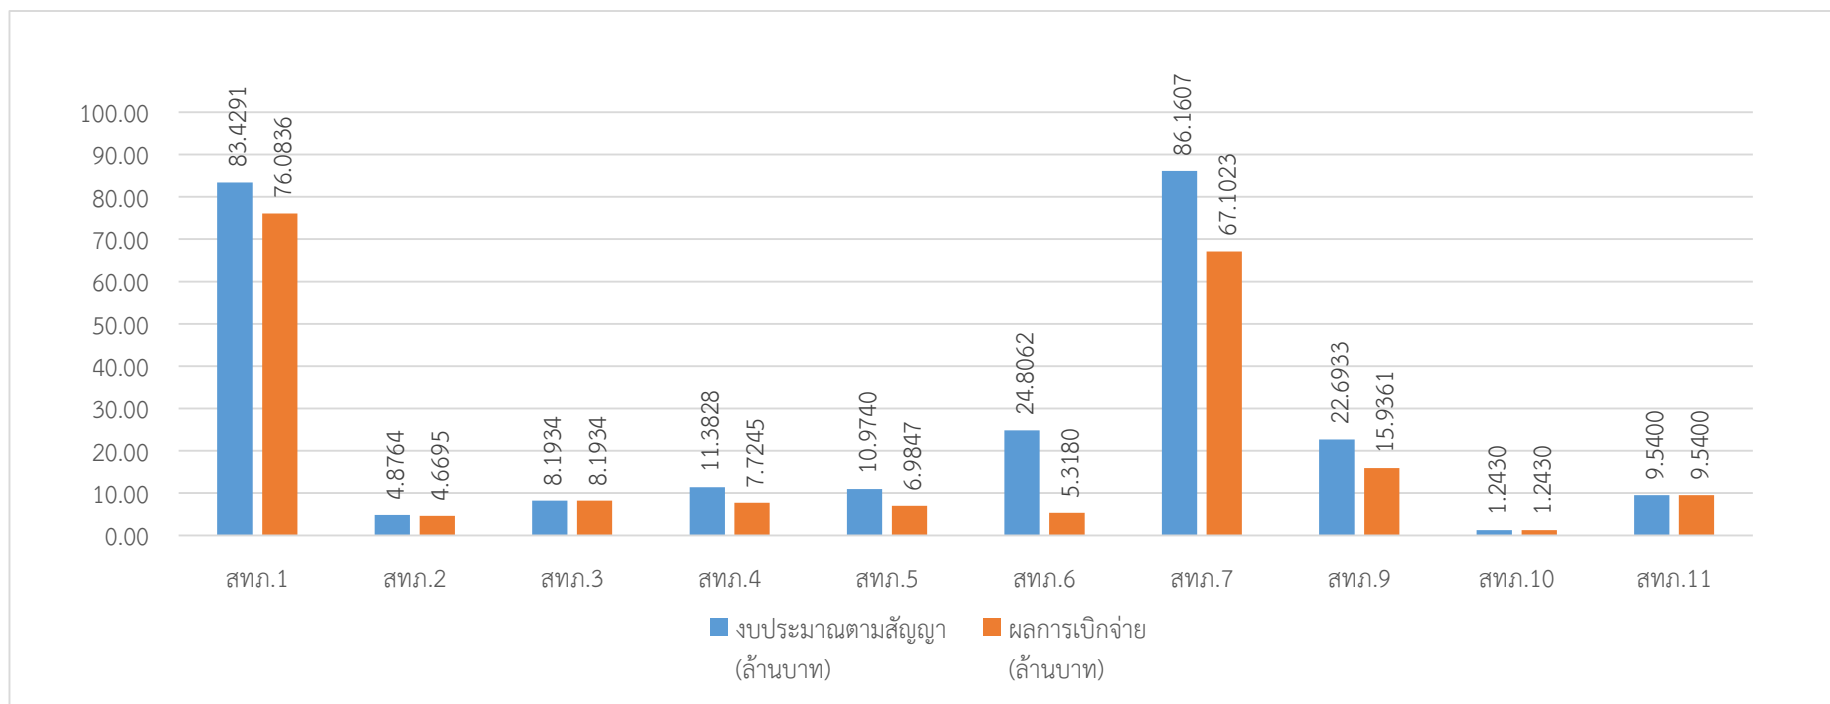

หน่วยงาน	สทภ.1	สทภ.2	สทภ.3	สทภ.4	สทภ.5	สทภ.6	สทภ.7	สทภ.9	สทภ.10	สทภ.11
จำนวนโครงการ	25	3	3	4	4	13	38	8	4	3
งบประมาณตามสัญญา (ล้านบาท)	83.4291	4.8764	8.1934	11.3828	10.9740	24.8062	86.1607	22.6933	1.2430	9.5400
ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	76.0836	4.6695	8.1934	7.7245	6.9847	5.3180	67.1023	15.9361	1.2430	9.5400
ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งหมด	91.20%	95.76%	100.00%	67.86%	63.65%	21.44%	77.88%	70.22%	100.00%	100.00%
หมายเหตุ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด
 บลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ
 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563)

หน่วยงาน	อนุมัติ		งบประมาณตามสัญญา		ทสจ. เป็นหน่วย ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการเอง	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)			แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	ยกเลิก	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	
รวมทั้งสิ้น	116	358.0275	105	263.2989	29	87	88	15	13	202.7951	56.64%	15	60.5038	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1	25	93.1000	25	83.4291	0	25	23	1	1	76.0836	91%	1	7.35	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ - หยุดงาน อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน 1 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2	3	8.5280	3	4.8764	0	3	3	0	0	4.6695	96%	0	0.21	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3	10	27.5000	3	8.1934	10	0	3	0	7	8.1934	100%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - งบประมาณตกพับ จำนวน 7 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4	7	23.6959	4	11.3828	7	0	3	1	3	7.7245	68%	1	3.66	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ - งบประมาณตกพับ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5	4	14.4300	4	10.9740	0	4	3	0	1	6.9847	64%	0	3.99	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6	14	34.1760	13	24.8062	6	8	8	5	1	5.318	21%	5	19.49	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระเบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ - ทสจ. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ - งบประมาณตกพับ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7	38	110.1883	38	86.1607	3	35	33	5	0	67.1023205	78%	5	19.06	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 31 โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ - ยกเลิกสัญญา จำนวน 2 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน จำนวน 1 โครงการ - ทสจ. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ จำนวน 2 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	- สทท.8 เสนอโครงการไม่ทันงบประมาณจึงตกพับไป
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9	8	32.2917	8	22.693326	3	5	5	3	0	15.9361	70%	3	6.76	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	4	1.2490	4	1.2430	0	4	4	0	0	1.2430	100%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11	3	12.8686	3	9.54	0	3	3	0	0	9.5400	100%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
