


สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2562

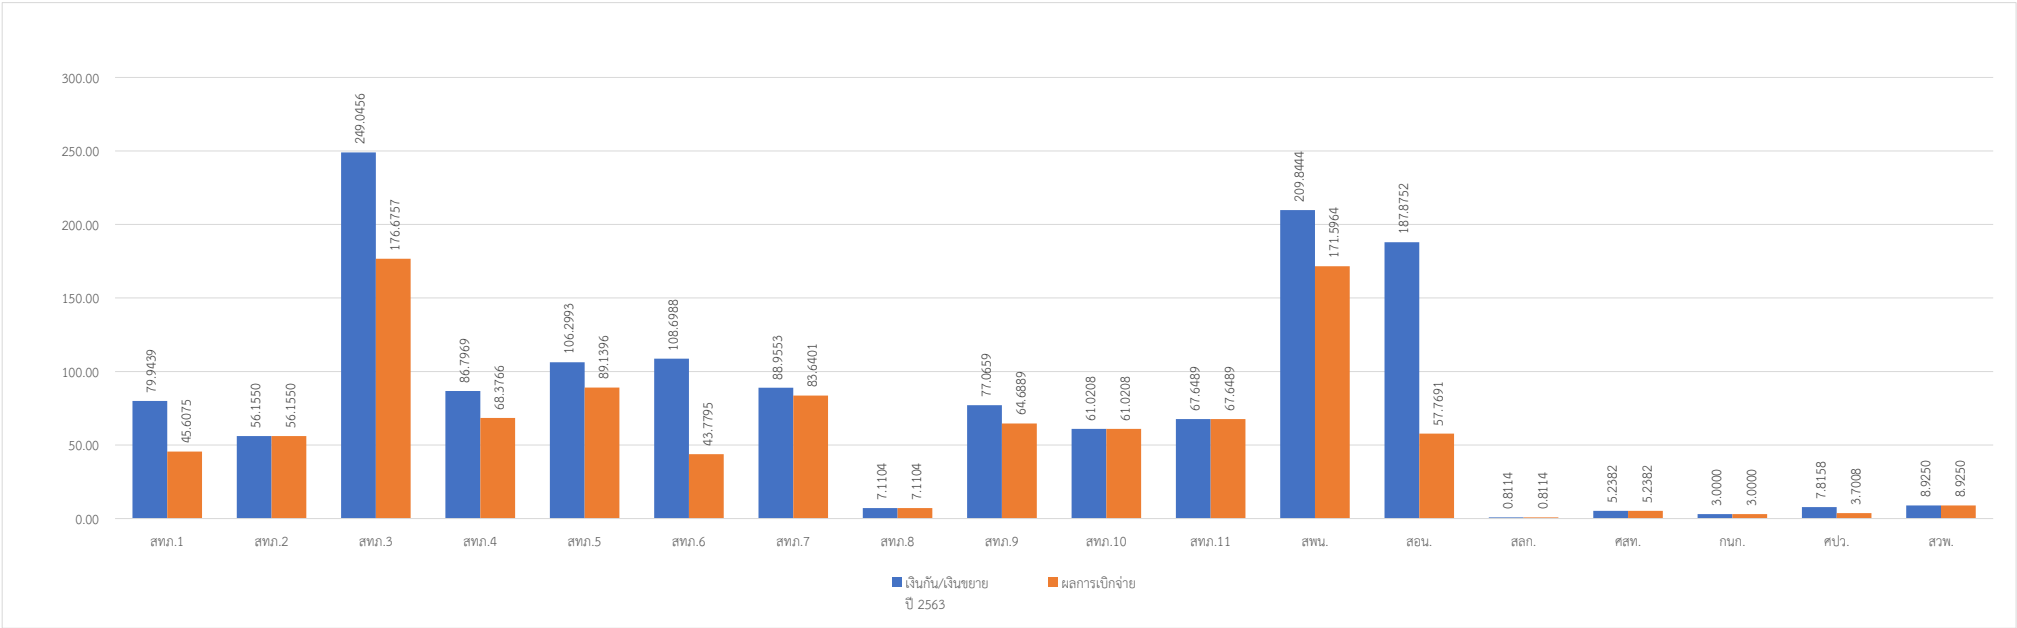

หน่วยงาน	สทภ.1	สทภ.2	สทภ.3	สทภ.4	สทภ.5	สทภ.6	สทภ.7	สทภ.8	สทภ.9	สทภ.10	สทภ.11	สพท.	สอท.	สลท.	คสท.	กนท.	คปท.	สวท.	รวม
เงินกัน/เงินขยาย ปี 2563	79.9439	56.1550	249.0456	86.7969	106.2993	108.6988	88.9553	7.1104	77.0659	61.0208	67.6489	209.8444	187.8752	0.8114	5.2382	3.0000	7.8158	8.9250	1,412.2508
ผลการเบิกจ่าย	45.6075	56.1550	176.6757	68.3766	89.1396	43.7795	83.6401	7.1104	64.6889	61.0208	67.6489	171.5964	57.7691	0.8114	5.2382	3.0000	3.7008	8.9250	1,014.8839
ร้อยละผลการเบิกจ่าย	57.05	100.00	70.94	78.78	83.86	40.28	94.02	100.00	83.94	100.00	100.00	81.77	30.75	100.00	100.00	100.00	47.35	100.00	71.86
จำนวนโครงการคงเหลือ	3	0	7	5	1	5	1	0	4	0	0	2	5	0	0	0	1	0	34
เงินกัน/เงินขยาย คงเหลือ	34.3365	0.0000	72.3698	18.4204	17.1597	64.9192	5.3152	0.0000	12.3770	0.0000	0.0000	38.2480	130.1061	0.0000	0.0000	0.0000	3.2183	0.0000	396.4702

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 - 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เฉพาะงบประมาณที่ขอเกินหลัอมปี / ขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือนกันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563)

ที่	รายการ	1. งบประมาณที่ขอเกินหลัอมปี/ ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (ล้านบาท)		(2) ผลการเบิกจ่ายของเงินกัน หลัอมปี/ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (ล้านบาท)		(3) คงเหลือ (ล้านบาท)		หมายเหตุ (หน่วยงาน / จำนวนโครงการ)
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวน โครงการ (คงเหลือ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
1	ปี 2555 งบกลาง	1	21.8594	0.0000	0%	1	21.8594	สอน. (1)
2	ปี 2556 พรบ.	1	13.0033	0.0000	0%	1	13.0033	สอน. (1)
3	ปี 2557 พรบ.	1	17.3173	17.3173	100%	0	0.0000	
3	ปี 2558 พรบ.	1	28.9534	0.0000	0%	1	28.9534	สอน. (1)
4	ปี 2559 พรบ.	8	77.6706	76.9204	65%	1	0.7502	สทภ.3 (1)
5	ปี 2559 งบกลาง	1	8.5312	0.0000	0%	1	8.5312	สทภ.6 (1)
6	ปี 2560 พรบ.	10	129.3159	40.9347	28%	4	88.3813	สทภ.6 (1) สทภ.9 (2) สอน. (1)
7	ปี 2560 งบกลาง	1	40.7788	20.9718	51%	1	19.8070	สพน. (1)
7	ปี 2560 เหลือจ่าย	1	0.8114	0.8114	100%	0	0.0000	
8	ปี 2561 พรบ.	25	180.3614	100.7609	31%	12	79.6006	สทภ.1 (2) สทภ.3 (2) สทภ.4 (5) สทภ.6 (1) สทภ.7 (1) สอน. (1)
9	ปี 2561 เหลือจ่าย	5	18.2411	18.2411	22%	0	0.0000	
10	ปี 2562 พรบ.	76	653.2337	520.8681	57%	11	132.3656	สทภ.1 (1) สทภ.3 (4) สทภ.5 (1) สทภ.6 (2) สทภ.9 (2) สพน. (1)
11	ปี 2562 เหลือจ่าย	63	222.1733	218.9550	77%	1	3.2183	ศปว. (1)
รวมทั้งสิ้น		194	1,412.2508	1015.7806	71.93%	34	396.4702	

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				3				92.3964	64.7968	34.3365	0.0000	34.3365	0%	58%		
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.1	1	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำจากฝายแม่น้ำลาว		เชียงราย	46.0624	28.9000	20.2700	0.0000	20.2700	0%	31%	- ติดปัญหาขออนุญาตใช้ พื้นที่ นสล. และพื้นที่ของ ราษฎร - อบต. ยินยอมให้ชะลอการ ก่อสร้างและยินดีให้คืนเงิน ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - ขยายเวลาสิ้นสุดสัญญา ใหม่วันที่ 15 ธ.ค. 63	จะขอยกเลิกโครงการ (=ตกพับ)
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.1	1	ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้น โฮ่องหลวง	โฮ่อง หมู่ที่ 2	ลำพูน	40.5205	30.0833	13.8145	0.0000	13.8145	0%	46%	ติดปัญหาสภาพการเงินของผู้รับจ้าง ปัจจุบันได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมฯ เพื่อจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการ (บอกเลิกสัญญาและหาผู้รับจ้างรายใหม่ ขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะเสร็จไม่ทัน)	ยกเลิกสัญญาและหาผู้ รับจ้างรายใหม่ (=ตกพับ+ กรมฯ จัดหางบใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
3	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.1	1	ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บ น้ำห้วยก้อด พร้อม ระบบกระจายน้ำ	ห้วยก้อด หมู่ ที่ 2	ลำปาง	5.8135	5.8135	0.2520	0.0000	0.2520	0%	96%	อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบ รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				7				210.2550	106.6063	85.5311	13.5452	71.9859	16%	47%		
1	2559 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนอง ปฏิรูป พร้อมระบบ กระจายน้ำ	ปฏิรูป	นครพนม	15.0000	5.7513	0.7502	0.0000	0.7502	0%	80%	มีการแก้ไขแบบแปลนได้ผู้ รับจ้างรายใหม่ สัญญา 0.7502 ลบ. อยู่ระหว่าง ดำเนินการคาดว่าจะแล้ว เสร็จ 100% ภายใน ก.ย. 63 และเงินจำนวน 1.6748 ลบ. จะถูกตกพับ	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยถ่อน	สาวแล หมู่ที่ 4	หนองคาย	2.2550	2.2550	2.2550	0.0000	2.2550	0%	30%	อนุมัติหยุดงานวันที่ 5 มิ.ย. 63 เนื่องจากน้ำท่วมบริเวณ รอบๆ โครงการ ปัจจุบันยัง ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้	(=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบ ใหม่)
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สายคางสูง	ขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ 3,11	นครพนม	40.0000	20.0000	5.2707	0.0000	5.2707	0%	99%	• โครงการไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด • คณะกรรมการสั่งให้แก้ไข งาน • มีมติบอกเลิกสัญญา	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองยาวหนองเต่า	บ้านดอนแดง หมู่ 3	นครพนม	45.0000	21.9000	21.9000	11.0002	10.8998	50%	67%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบ ใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
5	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกุดเป่ง	บ้านม่วง หมู่ 1	นครพนม	48.0000	20.5000	19.6993	0.0000	19.6993	0%	10%	บอกเลิกสัญญา	(=ตกพับ)
6	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหล่ม	บ้านคำเตย หมู่ 4	นครพนม	30.0000	19.4000	18.8559	2.5450	16.3109	13%	35%	ยกเลิกสัญญา	(=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบ ใหม่)
7	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยบ้าน	บ้านไทย ประสงค์	สกลนคร	30.0000	16.8000	16.8000	0.0000	16.8000	0%	6%	อยู่ระหว่างพิพาทแนวเขต ที่ดิน	จะขอยกเลิกโครงการ (=ตกพับ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท ทบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				5				49.6400	24.4763	22.5222	4.1018	18.4204	18%	62%		
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไผ่		ขอนแก่น	9.9000	5.4400	5.4400	1.0847	4.3553	20%	93%	บอกเลิกสัญญาแล้ว / อยู่ ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่	(=ตกพับ+กรมนา จัดหางบ ใหม่)
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบึง ใหญ่	ริมบึง	มหาสารคาม	9.9000	4.9863	4.2383	2.2573	1.9810	53%	100%	มีเบิกล่วงหน้า 15 %	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	ขอนแก่น	9.9000	5.3240	5.3240	0.0000	5.3240	0%	10%	บอกเลิกสัญญาแล้ว / อยู่ ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่	(=ตกพับ+กรมนา จัดหางบ ใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
4	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสะอาด		ขอนแก่น	9.9700	5.6800	4.4739	0.7598	3.7140	17%	34%	บอกเลิกสัญญาแล้ว / อยู่ ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่	(=ตกปั๊บ+กรมา จัดหางบ ใหม่)
5	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยแสง	โคกเพิ่ม	มหาสารคาม	9.9700	3.0460	3.0460	0.0000	3.0460	0%	71%	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง แจ้งปรับเกิน 10 %	(=ตกปั๊บ+กรมา จัดหางบ ใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท ทบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				1				30.0000	19.4800	19.4800	2.3204	17.1597	12%	40%		
1	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.5	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง	หมู่ที่ 2,3,12,13	สุรินทร์	30.0000	19.4800	19.4800	2.3204	17.1597	12%	40%	หยุดงานเพื่อแก้ไขแบบ แปลนคาดว่าจะแก้ไขแบบ แปลนแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 63	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				5				151.5282	114.8350	64.9192	0.0000	64.9192	0%	60%		
1	2559 งบกลาง	งบลงทุน	สทท.6	1	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ คลองบางไผ่		ชลบุรี	81.6961	58.4470	8.5312	0.0000	8.5312	0%	100%	ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 กค. 63 อยู่ระหว่างหาวิธีดำเนินการเรื่อง ของค่าปรับ ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ (สทท.ทำหนังสือ ถึงกรมเรื่องผู้รับจ้างขอปรับลด ค่าปรับ 30 ลบ. อยู่ระหว่าง การพิจารณา)	(=ตกปั๊บ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)
2	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทท.6	1	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ UN	หมู่ที่ 9	สระแก้ว	34.9971	23.3930	23.3930	0.0000	23.3930	0%	0%	หยุดงานตั้งแต่ 2 ก.พ. 60 ทส. 0616/0799 ลว 3 ก.พ. 61 เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ ดำเนินการอยู่ในแนวเขตป่า สงวนแห่งชาติตาพระยา และ อยู่ระหว่างรอกกรมป่าไม้ อนุญาตใช้พื้นที่ หลังจากปรับ ลดขนาดพื้นที่ 157 ไร่ เหลือ 43 ไร่ ** หนังสือ ที่ ทส. 1602.53/14287 ลว. 10 ก.ค. 62 เพื่อขอข้อมูลและเอกสาร ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทาง สทท.6 ได้ประสาน ทสจ.สระแก้ว รวบรวมข้อมูล ให้กรมป่าไม้แล้ว โดยทาง ทสจ.สระแก้ว จะดำเนินการ จัดส่งเอกสาร **กรมป่าไม้ ตรวจสอบแล้วพื้นที่ขออนุญาต บางส่วนอยู่ในเขตจำแนกการ ใช้ประโยชน์ และที่ดินป่าไม้ เขตป่า เพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ต้องจัดทำรายการข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental checklist)	(=ตกปั๊บ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 8	จันทบุรี	9.7500	7.9100	7.9100	0.0000	7.9100	0%	100%	ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 กค. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย (มี ปัญหาเรื่องการโอนสิทธิ์) มี ค่าปรับจากโครงการ 7 ลบ.	รอคำสั่งศาลฯ (=ตกปั๊บ+กรมฯ จัดหางบใหม่)
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ดอนพูน		นครนายก	21.4500	21.4500	21.4500	0.0000	21.4500	0%	0%	1. ขอยุติงานตั้งแต่ 12 ก.ค. 62 (ทส0616/2429 ลว.1 ส.ค.62) 2. อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้ ที่ดินสาธารณะประโยชน์จาก กรมที่ดิน *อยู่ระหว่างเสนอเรื่องการขอ อนุญาตต่อกระทรวงมหาดไทย*	(=ตกปั๊บ+กรมฯ จัดหางบใหม่)
5	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	เครื่องมือทดสอบแรงดึง ของเหล็กพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6		ปราจีนบุรี	3.6350	3.6350	3.6350	0.0000	3.6350	0%	100%	บริษัทฯ ส่งของวันที่ 17 ก.พ. 63 คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ไม่ตรวจรับเนื่องจาก รายละเอียดงานไม่ตรงกับ สัญญา ส่งเรื่องให้ กรมบัญชีกลางพิจารณา ภายใน 15 ก.ย. 63	*ประสานส่วนคลังและส่วน พัสดุ

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				1				7.8000	5.3152	5.3152	0.0000	5.3152	0%	26%		
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.7	1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภายในค่ายสุรสีห์ (มทบ.17)	หมู่ที่ 1	กาญจนบุรี	7.8000	5.3152	5.3152	0.0000	5.3152	0%	26%	อทน.อนุมัติยกเลิกสัญญา ภาคียืนยันไม่ดำเนินการต่อ เงินที่กันมาคืนคลัง	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				4				36.0566	20.6496	12.3770	0.0000	12.3770	0%	69%		
1	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ครกผาแทน	หมู่ที่ 1	น่าน	9.9960	6.5490	1.7102	0.0000	1.7102	0%	89%	1) หางฯแจ้งเข้า 10 เม.ย. 60 2) พบปัญหาปริมาณน้ำ มาก,สูบน้ำ 3) หยุดงานตั้งแต่ 18 ก.ค. 60 4) แจ้งเข้าทำงาน ครั้งที่ 2 ลว 29 ม.ค. 61 ขยาย ระยะเวลาสัญญาสิ้นสุด 26 ก.พ. 61 5) แจ้งค่าปรับเงิน 10% 15 มิ.ย. 61 6) ขอ หยุดงานน้ำท่วมโครงการ คาดว่าแล้วเสร็จ ม.ค. 62 7) อยู่ระหว่างการพิจารณา ยกเลิก	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
2	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนอง กระจับ	วังปลากด หมู่ที่ 4	พิจิตร	16.9606	6.7666	3.3328	0.0000	3.3328	0%	86%	1) ห้างฯแจ้งเข้า 1 เม.ย. 60 2) พบปัญหาน้ำท่วม โครงการ 22 พ.ค. 60 3) หยุดงานตั้งแต่ 19 พ.ค. 60 ทส 0624/1781 4) สทท.9 ให้ห้างฯเข้าทำงานตั้งแต่ 9 มี.ค. 61 5) ห้างแจ้งเข้า ทำงาน 12 มี.ค. 61 ขยาย ระยะเวลา 4 ก.ค. 61 6) แจ้งค่าปรับเกิน 10% 22 ต.ค. 61 7) อยู่ระหว่างการพิจารณา ยกเลิก	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
3	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคู	โป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4	พิษณุโลก	5.0000	3.7440	3.7440	0.0000	3.7440	0%	0%	1) แจ้งหยุดงาน เนื่องจาก ติดปัญหาพื้นที่กรมเจ้าท่า และชลประทานจัดรูปที่ดิน เขตชลประทาน 2) กรมเจ้าท่าอนุญาต เฉพาะงานขุดลอกยังไม่ สามารถเข้าดำเนินการได้ 3) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ขออนุญาตจากสำนักงานจัด รูปที่ดินเนื่องจากอยู่ในเขต พื้นที่ดูแลของกรมชลประทาน	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.9	1	เครื่องมือทดสอบแรง ดึงของเหล็ก พร้อม อุปกรณ์ สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 9		พิษณุโลก	4.1000	3.5900	3.5900	0.0000	3.5900	0%	100%	1) สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค. 2563 2) รายละเอียดงานไม่ ถูกต้องตามคุณลักษณะ (TOR) ของสัญญาจ้าง 3) อยู่ระหว่างหาหรือ กวพ.	*ประสานส่วนคลังและส่วน พัสดุ

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				1				9.2000	9.1950	7.8158	4.5975	3.2183	59%	100%		
1	2562	ายจ่ายอื่น	ศปว.	1	โครงการศึกษา ประเมินศักยภาพ และ พัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็ก ใน พื้นที่สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพฯ			9.2000	9.1950	7.8158	4.5975	3.2183	59%	100%	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 2 งวดสุดท้าย คาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 10 กันยายน 2563	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				2				321.9202	232.2000	48.6220	10.3740	38.2480	21%	72%		
1	2560 งบกลาง	งบลงทุน	สพท.	1	พัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล		ลพบุรี	276.3558	198.3000	19.8070	0.0000	19.8070	0%	89%	1. จากปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างตามแผนงานที่ กำหนด 2. ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง - กรมทรัพยากรน้ำมีหนังสือ แจ้งเตือนบอกเลิกสัญญา มาแล้ว 3 ครั้ง และแจ้ง เตือนบอกเลิกสัญญา (ครั้ง สุดท้าย) ตามหนังสือ ที่ ทส 0604/1309 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 *ผวจ.ดำเนินการล่าช้า มี แนวโน้มจะตกพับ*	(=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบ ใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
2	2562 พรบ.	งบลงทุน	สพท.	1	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำจากฝายน้ำล้นท่า เสากระโดง		กำแพงเพชร	45.5644	33.9000	28.8150	10.3740	18.4410	36%	54%	1. จากปัญหาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างตามแผนงานที่ กำหนด 2. ฝนตกในพื้นที่โครงการ 3. มีการเริ่มเตรียมพื้นที่ เพาะปลูกตามแนวก่อสร้าง 4. กลุ่มผู้ใช้น้ำร้องขอให้แก้ แบบแปลน	(=ตกปั๊บ+กรมฯ จัดหางบ ใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				5				259.9476	193.4489	130.1061	0.0000	130.1061	0%	82%		
1	2555 งบกลาง	งบลงทุน	สอน.	1	ก่อสร้างระบบส่งน้ำผัน น้ำ น้ามุ่น-ห้วยส้มป่อย		น่าน	85.3330	21.8594	21.8594	0.0000	21.8594	0%	70%	ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบ แปลนในเขตกองทัพอากาศ จ.น่าน เพราะกองทัพอากาศ ต้องการให้กรมฯ เปลี่ยน วิธีการดำเนินการจากการ ขุดคลองเปิดเพื่อผันน้ำ เป็น วางท่อGRP และให้ก่อสร้าง ถนนตรวจการและไฟฟ้าส่อง สว่างตามแนวการวางท่อ เป็นผลทำให้วงเงินค่า ก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% ของเงินงบประมาณก่อสร้าง หากนำเข้า ครม. พิจารณา งบประมาณ จะทำให้ล่าช้า แนวทางแก้ไข 1. คกก.และผู้รับจ้างได้ ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโดย ให้ผู้รับจ้างรายงานผลสำรวจ ค่าระดับงานก่อสร้าง งาน	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)


ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
2	2556 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำลำน้ำอิง		พะเยา	41.5385	41.5385	13.0033	0.0000	13.0033	0%	100%	ปัญหาอุปสรรค คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายงวด สุดท้าย งวดที่ 6และผู้รับจ้าง ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ตามสิทธิต่อศาลปกครองกลาง แนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างหารือ กรมบัญชีกลาง กรณีเบิกจ่าย เงินงวดสุดท้าย และรอการ ตัดสินจากศาลปกครอง	งวดสุดท้ายอยู่ระหว่าง พิจารณาที่ศาลปกครอง (=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบ ใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
3	2558 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองแขง	หนองหัววัว	ขอนแก่น	45.0000	45.0000	28.9534	0.0000	28.9534	0%	72%	ปัญหาอุปสรรค โครงการได้สิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 59 คกก. เสนอขอขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ ตาม บันทึกที่ทส 0610.5/812 ลว 6 มิ.ย. 62 ซึ่งรอง อทน. (อธิวัฒน์) มีข้อสั่งการให้ สอน.พิจารณาตามที่ สลก. เสนอ เนื่องจาก สลก. ตรวจสอบพบว่าขาดเอกสาร หนังสือสั่งให้ผู้รับจ้างหยุด งานและหนังสือแจ้งให้ผู้รับ จ้างเข้าปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข กรมทรัพยากรน้ำได้ทำ หนังสือเร่งรัดและแจ้งค่าปรับ อยู่ระหว่างการหยุดงาน และแก้ไขแบบแปลน ครั้งที่ 1 คกก.ดำเนินการตรวจสอบ ตามที่ สลก. เสนอ แล้ว	(=ตกปั๊บ+กรมฯ จัดหางบ ใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
4	2560 พรบ.	ลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองเบ็ญเครือ (ผูกพัน เก่า)	โนนเมือง หมู่ ที่ 5	มหาสารคาม	64.3600	64.3600	59.9453	0.0000	59.9453	0%	80%	ปัญหาอุปสรรค '- ผู้รับจ้างมีเครื่องมือ เครื่องจักรจำนวนน้อย ไม่ สอดคล้องกับปริมาณที่คงเหลืออยู่ - โครงการฯ ได้สิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 62 แล้ว - ช่วงเวลาที่ผ่านมามีฝนตกใน พื้นที่โครงการฯ ยังคงมีน้ำ ท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดงาน ชั่วคราว เนื่องจากอิทธิพล พายุไต้ฝุ่น เกิดภาวะน้ำท่วม อีกทั้งโครงการฯ เป็นพื้นที่ รองรับการระบายน้ำจาก พื้นที่โดยรอบ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของราษฎร แนวทางแก้ไข '- เร่งรัดการดำเนินการ ก่อสร้าง - อท.มีหนังสือแจ้งการ เรียกค่าปรับตามเงื่อนไข	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผล การ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการ สอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
5	2561 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำเพื่อเสริมระบบนิเวศ และสำรองน้ำเพื่อ เสริมระบบการ อุปโภค-บริโภค ภายในพื้นที่วนอุทยาน ไม่กลายเป็นหิน		ตาก	23.7161	20.6910	6.3448	0.0000	6.3448	0%	90%	ปัญหาอุปสรรค กลุ่มผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำ ต้นทุนเดียวกับโครงการฯ มี ความกังวลว่าปริมาณน้ำใน แหล่งน้ำต้นทุนจะมีไม่ เพียงพอต่อการใช้ในฤดูแล้ง การอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่า ไม้ สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แนวทางแก้ไข จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ที่มีความเข้าใจที่ ถูกต้อง พร้อมรับฟังแนว ทางการแก้ไขจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อเดือน มิ.ย. 62 /เร่งรัด การดำเนินการของผู้รับจ้าง ดำเนินการให้สอดคล้องกับ แผนงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเร่ง ดำเนินการเสนอขออนุมัติใช้ พื้นที่จากกรมป่าไม้	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด

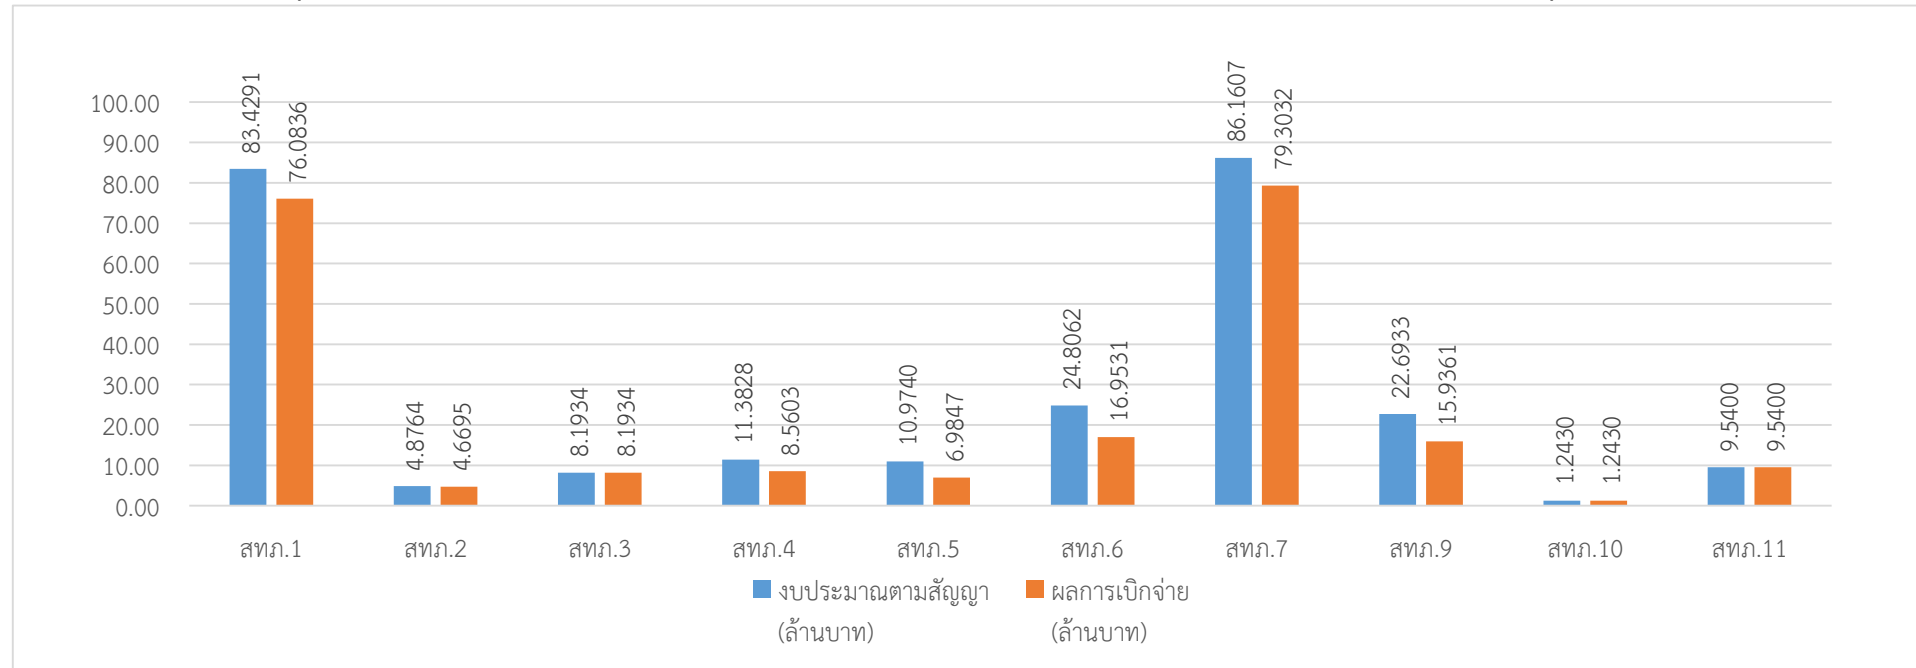

หน่วยงาน	สทภ.1	สทภ.2	สทภ.3	สทภ.4	สทภ.5	สทภ.6	สทภ.7	สทภ.9	สทภ.10	สทภ.11
จำนวนโครงการ	25	3	3	4	4	13	38	8	4	3
งบประมาณตามสัญญา (ล้านบาท)	83.4291	4.8764	8.1934	11.3828	10.9740	24.8062	86.1607	22.6933	1.2430	9.5400
ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	76.0836	4.6695	8.1934	8.5603	6.9847	16.9531	79.3032	15.9361	1.2430	9.5400
ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งหมด	91.20%	95.76%	100.00%	75.20%	63.65%	68.34%	92.04%	70.22%	100.00%	100.00%
โครงการคงเหลือ จำนวน	1	0	0	1	0	4	0	3	0	0
งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	7.3455	0.0000	0.0000	2.8225	0.0000	7.8531	0.0000	6.7572	0.0000	0.0000
หมายเหตุ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด
จบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ
ประจำเดือนกันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563)

หน่วยงาน	อนุมัติ		งบประมาณตามสัญญา		ทสจ. เป็นหน่วย ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการเอง	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)			แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	ยกเลิก	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	
รวมทั้งสิ้น	116	358.0275	105	263.2989	29	87	90	11	15	227.4669	63.53%	9	28.9745	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1	25	93.1000	25	83.4291	0	25	23	1	1	76.0836	91%	1	7.35	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ - หยุดงาน อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน 1 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2	3	8.5280	3	4.8764	0	3	3	0	0	4.6695	96%	0	0.21	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3	10	27.5000	3	8.1934	10	0	3	0	7	8.1934	100%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - งบประมาณตกปับ จำนวน 7 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4	7	23.6959	4	11.3828	7	0	3	1	3	8.5603	75%	1	2.82	- ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - ทสจ. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ - งบประมาณตกปับ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5	4	14.4300	4	10.9740	0	4	3	0	1	6.9847	64%	0	3.99	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6	14	34.1760	13	24.8062	6	8	9	4	1	16.9531	68%	4	7.85	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - บอกลิขสัญญา จำนวน 4 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ - งบประมาณตกปับ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7	38	110.1883	38	86.1607	3	35	34	2	2	79.3032	92%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 33 โครงการ - ยกเลิกสัญญา จำนวน 2 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0.0000	-	0	0.00	- สทท.8 เสนอโครงการไม่ทันงบประมาณจึงตกปับไป
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9	8	32.2917	8	22.693326	3	5	5	3	0	15.9361	70%	3	6.76	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ - ทสจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	4	1.2490	4	1.2430	0	4	4	0	0	1.2430	100%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11	3	12.8686	3	9.54	0	3	3	0	0	9.5400	100%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ

ผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด

งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ

ประจำเดือนกันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563)

สทก.	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ประเภทโครงการ	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ ตามสัญญา	หน่วยงาน ดำเนินการเอง	ทสจ.เป็น หน่วย ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
รวม								3.6898	1	0	0.0000			
สทก.1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นพื้นที่ ตำบลสันทราย		สันทราย	พร้าว	เชียงใหม่	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	4.3469	3.6898	1		0.0000	0.00%	5.00%	หยุดงานติดปัญหาขอใช้พื้นที่อยู่ ระหว่างรอรการอนุญาตจากอุทยาน แห่งชาติศรีลานนา

ผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด

งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ

ประจำเดือนกันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันพุธที่ 16 กันยายน 2563)

สทท.	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ประเภทโครงการ	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ ตามสัญญา	หน่วยงาน ดำเนินการเอง	ทสจ.เป็น หน่วย ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
รวม								2.3831	0	1	0.0000			
สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองผายบ้าน	คำใหญ่	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ	3.5577	2.3831		1	0.0000	0.00%	95.00%	ทสจ.กาฬสินธุ์

ผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด

งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ

ประจำเดือนกันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563)

สทก.	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ประเภทโครงการ	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ ตามสัญญา	หน่วยงาน ดำเนินการเอง	ทสจ.เป็น หน่วย ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
รวม								10.6481	4	1	2.7951			
สทก.6	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองไค่ง	หนองตระ โกรม หมู่ที่ 4	แสลง	เมือง	จันทบุรี	อนุรักษ์พื้นฟู แหล่งน้ำ	2.4000	1.8645	1		0.0000	0.00%	10.00%	ขอเบิกสัญญา ตามหนังสือ ที่ ทส 0616/3030 ลว. 8 ก.ย. 63 เนื่องจากผู้รับจ้างไม่มีศักยภาพ เพียงพอในการบริหารจัดการ โครงการ เป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับ จ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ สทก.6 จึงมีความจำเป็นต้องบอก เลิกสัญญาทั้ง 4 โครงการ
สทก.6	อนุรักษ์พื้นฟูหนอง แพรกหมามเตียน	หมู่ที่ 3	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	อนุรักษ์พื้นฟู แหล่งน้ำ	3.2160	3.1900		1	1.4160	0.00%	100.00%	ส่งงานงวดสุดท้าย 1,776,454 อยู่ ระหว่างรอเบิกจ่าย
สทก.6	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูหนองเข้	หมู่ที่ 12	นนทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	อนุรักษ์พื้นฟู แหล่งน้ำ	2.4000	1.8645	1		0.4597	24.66%	53.00%	ขอเบิกสัญญา ตามหนังสือ ที่ ทส 0616/3020 ลว. 8 ก.ย. 63
สทก.6	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์แก้มลิง หนองกรด	หมู่ที่ 4, 9	คำโดนด	ประจันต คาม	ปราจีนบุรี	อนุรักษ์พื้นฟู แหล่งน้ำ	2.4000	1.8645	1		0.4597	24.66%	40.00%	ขอเบิกสัญญา ตามหนังสือ ที่ ทส 0616/3021 ลว. 8 ก.ย. 63
สทก.6	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บ้านหนอง แสง	หมู่ที่ 11	นาแหม	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	อนุรักษ์พื้นฟู แหล่งน้ำ	2.4000	1.8645	1		0.4597	24.66%	47.00%	ขอเบิกสัญญา ตามหนังสือ ที่ ทส 0616/3028 ลว. 8 ก.ย. 63

ผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด

งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ

ประจำเดือนกันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563)

สทท.	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ประเภทโครงการ	งบประมาณ ตาม พรบ.	งบประมาณ ตามสัญญา	หน่วยงาน ดำเนินการเอง	ทสจ.เป็น หน่วย ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
รวม								8.2022	3	0	1.4450			
สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลอง โกรงเกรง	โกรงเกรง หมู่ที่ 6	นครป่า หมาก	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ	4.4524	3.3711	1		0.0000	0.00%	94.88%	1.หยุดงานครั้งที่ 1 ลว 13พย62 เนื่องจากราษฎรใช้น้ำการเกษตร 2.แจ้งเข้าทำงานครั้งที่ 2 ลว 15 มค 63 ขยายระยะเวลา 26 มิ.ย.63 3.เร่งรัดงานครั้งที่ 1 ลว 27ม.ค.63 4.เร่งรัดงานครั้งที่ 2 ลว 17ก.พ.63 5.เร่งรัดงานครั้งที่ 3 ลว 27พ.ค.63 6.เร่งรัดงานครั้งที่ 4 ลว 8ก.ค.63
สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงจวง	หนองไผ่ หมู่ ที่ 2	หนองกลา	บางระกำ	พิษณุโลก	อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ	3.7440	2.9468	1		0.7945	26.96%	77.59%	1.หยุดงาน 11 ม.ค.63 เนื่องจาก ราษฎรขอใช้น้ำการเกษตร 2.แจ้งเข้าทำงาน 10 ม.ค.63 ขยาย ระยะเวลาดึง 10เมย63 3.เร่งรัดงานครั้งที่ 4 ลว 8ก.ค.63
สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกวาง	ดงกวาง หมู่ ที่ 3	หนองกลา	บางระกำ	พิษณุโลก	อนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ	2.8768	1.8843	1		0.6505	34.52%	81.19%	1.หยุดงาน 11 พ.ย.62 เนื่องจาก น้ำท่วมโครงการ 2. แจ้งเข้าทำงาน 10 ม.ค.63 ขยายระยะเวลาดึง 10เมย63 3.เร่งรัดงานครั้งที่ 3 ลว 7 พ.ค.63 4.เร่งรัดงานครั้งที่ 4 ลว 24 มิย63 5.เร่งรัดงานครั้งที่ 5 ลว 8 กค63
