


สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินกันเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2562

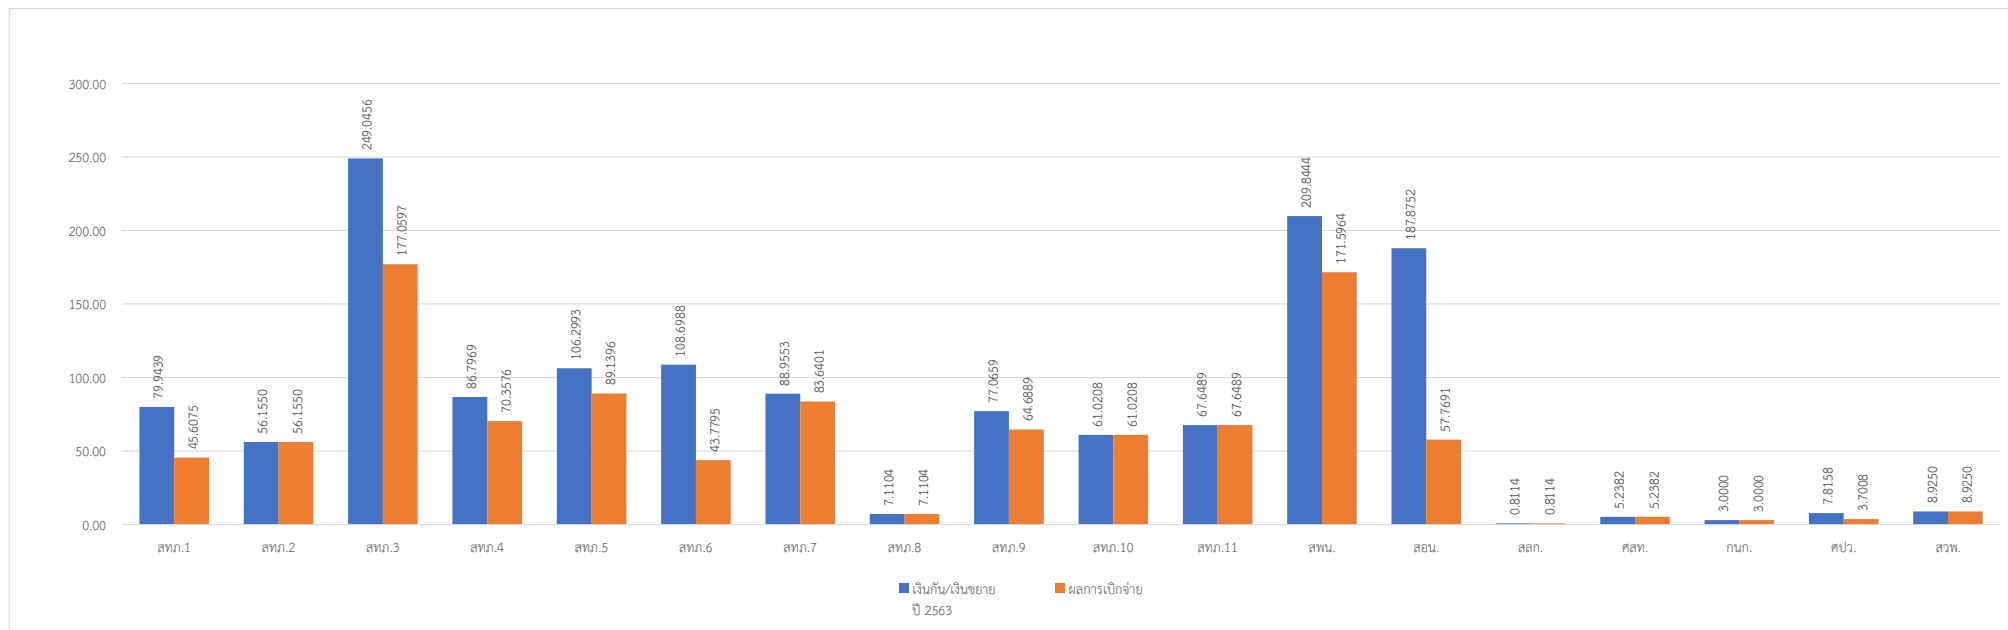

หน่วยงาน	สทภ.1	สทภ.2	สทภ.3	สทภ.4	สทภ.5	สทภ.6	สทภ.7	สทภ.8	สทภ.9	สทภ.10	สทภ.11	สพน.	สอน.	สลก.	คสท.	กนก.	ศปว.	สวพ.	รวม
เงินกัน/เงินขยาย ปี 2563	79.9439	56.1550	249.0456	86.7969	106.2993	108.6988	88.9553	7.1104	77.0659	61.0208	67.6489	209.8444	187.8752	0.8114	5.2382	3.0000	7.8158	8.9250	1,412.2508
ผลการเบิกจ่าย	45.6075	56.1550	177.0597	70.3576	89.1396	43.7795	83.6401	7.1104	64.6889	61.0208	67.6489	171.5964	57.7691	0.8114	5.2382	3.0000	3.7008	8.9250	1,017.2488
ร้อยละผลการเบิกจ่าย	57.05	100.00	71.10	81.06	83.86	40.28	94.02	100.00	83.94	100.00	100.00	81.77	30.75	100.00	100.00	100.00	47.35	100.00	72.03
จำนวนโครงการคงเหลือ	3	0	7	4	1	5	1	0	4	0	0	2	5	0	0	0	1	0	33
เงินกัน/เงินขยาย คงเหลือ	34.3365	0.0000	71.9859	16.4393	17.1597	64.9192	5.3152	0.0000	12.3770	0.0000	0.0000	38.2480	130.1061	0.0000	0.0000	0.0000	3.2183	0.0000	394.1052

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 - 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เฉพาะงบประมาณที่ขอกันเหลือปี / ขอขยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือนกันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)

ที่	รายการ	1. งบประมาณที่ขอกันเหลือปี/ ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (ล้านบาท)		(2) ผลการเบิกจ่ายของเงินกัน เหลือปี/ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (ล้านบาท)		(3) คงเหลือ (ล้านบาท)		หมายเหตุ (หน่วยงาน / จำนวนโครงการ)
		จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวน โครงการ (คงเหลือ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	
1	ปี 2555 งบกลาง	1	21.8594	0.0000	0%	1	21.8594	สอน. (1)
2	ปี 2556 พรบ.	1	13.0033	0.0000	0%	1	13.0033	สอน. (1)
3	ปี 2557 พรบ.	1	17.3173	17.3173	100%	0	0.0000	
3	ปี 2558 พรบ.	1	28.9534	0.0000	0%	1	28.9534	สอน. (1)
4	ปี 2559 พรบ.	8	77.6706	76.9204	65%	1	0.7502	สทภ.3 (1)
5	ปี 2559 งบกลาง	1	8.5312	0.0000	0%	1	8.5312	สทภ.6 (1)
6	ปี 2560 พรบ.	10	129.3159	40.9347	28%	4	88.3813	สทภ.6 (1) สทภ.9 (2) สอน. (1)
7	ปี 2560 งบกลาง	1	40.7788	20.9718	51%	1	19.8070	สพน. (1)
7	ปี 2560 เหลือจ่าย	1	0.8114	0.8114	100%	0	0.0000	
8	ปี 2561 พรบ.	25	180.3614	102.7419	32%	11	77.6195	สทภ.1 (2) สทภ.3 (2) สทภ.4 (4) สทภ.6 (1) สทภ.7 (1) สอน. (1)
9	ปี 2561 เหลือจ่าย	5	18.2411	18.2411	22%	0	0.0000	
10	ปี 2562 พรบ.	76	653.2337	521.2520	58%	11	131.9817	สทภ.1 (1) สทภ.3 (4) สทภ.5 (1) สทภ.6 (2) สทภ.9 (2) สพน. (1)
11	ปี 2562 เหลือจ่าย	63	222.1733	218.9550	77%	1	3.2183	ศปว. (1)
รวมทั้งสิ้น		194	1,412.2508	1018.1456	72.09%	33	394.1052	

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				3				92.3964	64.7968	34.3365	0.0000	34.3365	0%	58%		
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทก.1	1	ก่อสร้างระบบกระจาย น้ำจากฝายแม่น้ำลาว		เชียงใหม่	46.0624	28.9000	20.2700	0.0000	20.2700	0%	31%	- ติดปัญหาขออนุญาตใช้พื้นที่ นสล. และพื้นที่ของราษฎร - อบต. ยินยอมให้ชะลอการ ก่อสร้างและยินดีให้คืนเงินใน ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - ขยายเวลาสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ 15 ธ.ค. 63	จะขอยกเลิกโครงการ (=ตกพับ)
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทก.1	1	ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้น โธ่งหลวง	โธ่ง หมู่ที่ 2	ลำพูน	40.5205	30.0833	13.8145	0.0000	13.8145	0%	46%	ติดปัญหาสภาพการเงินของผู้ รับจ้าง ปัจจุบันได้บอกเลิก สัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง รอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จากกรมฯ เพื่อจ้างผู้รับจ้างราย ใหม่เข้าดำเนินการ (บอกเลิก สัญญาและหาผู้รับจ้างรายใหม่ ขอรับงบประมาณสนับสนุน เพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะเสร็จไม่ ทัน)	ยกเลิกสัญญาและหาผู้รับจ้าง รายใหม่ (=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบใหม่)
3	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทก.1	1	ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ห้วยก้อด พร้อมระบบ กระจายน้ำ	ห้วยก้อด หมู่ที่ 2	ลำปาง	5.8135	5.8135	0.2520	0.0000	0.2520	0%	96%	อยู่ระหว่างรอนั่งสือตอบรับ การอนุญาตให้ใช้พื้นที่	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				7				210.2550	106.6063	85.5311	13.5452	71.9859	16%	47%		
1	2559 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์พื้นที่หนองปรือรูป พร้อมระบบกระจายน้ำ	ปรือรูป	นครพนม	15.0000	5.7513	0.7502	0.0000	0.7502	0%	80%	มีการแก้ไขแบบแปลนได้ผู้ รับจ้างรายใหม่ สัญญา 0.7502 ลบ. อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 100% ภายใน ก.ย. 63 และเงินจำนวน 1.6748 ลบ. จะถูกตัดทอน	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำ ห้วยถ่อน	สาวแล หมู่ที่ 4	หนองคาย	2.2550	2.2550	2.2550	0.0000	2.2550	0%	30%	อนุมัติหยุดงานวันที่ 5 มิ.ย. 63 เนื่องจากน้ำท่วมบริเวณรอบๆ โครงการ ปัจจุบันยังไม่ สามารถเข้าดำเนินการได้	(=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบใหม่)
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ สายคางสูง	ขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ 3,11	นครพนม	40.0000	20.0000	5.2707	0.0000	5.2707	0%	99%	• โครงการไม่เป็นไปตาม รูปแบบที่กำหนด • คณะกรรมการสั่งให้แก้ไขงาน • มีมติบอกเลิกสัญญา	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ หนองยาวหนองเต่า	บ้านดอนแดง หมู่ 3	นครพนม	45.0000	21.9000	21.9000	11.0002	10.8998	50%	67%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	(=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบใหม่)
5	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ หนองกุดเป่ง	บ้านม่วง หมู่ 1	นครพนม	48.0000	20.5000	19.6993	0.0000	19.6993	0%	10%	บอกเลิกสัญญา	(=ตกพับ)
6	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ หนองหล่ม	บ้านคำเตย หมู่ 4	นครพนม	30.0000	19.4000	18.8559	2.5450	16.3109	13%	35%	ยกเลิกสัญญา	(=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
7	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.3	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยบ้าน	บ้านไทย ประสงค์	สกลนคร	30.0000	16.8000	16.8000	0.0000	16.8000	0%	6%	อยู่ระหว่างพิพาทแนวเขตที่ดิน	จะขอยกเลิกโครงการ (=ตกพับ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				4				39.7400	19.4900	18.2839	1.8445	16.4393	10%	52%		
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไผ่		ขอนแก่น	9.9000	5.4400	5.4400	1.0847	4.3553	20%	93%	บอกเลิกสัญญาแล้ว / อยู่ ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่	(=ตกพับ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)
2	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	ขอนแก่น	9.9000	5.3240	5.3240	0.0000	5.3240	0%	10%	บอกเลิกสัญญาแล้ว / อยู่ ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่	(=ตกพับ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสะอาด		ขอนแก่น	9.9700	5.6800	4.4739	0.7598	3.7140	17%	34%	บอกเลิกสัญญาแล้ว / อยู่ ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่	(=ตกพับ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)
4	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.4	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยแสง	โคกเพิ่ม	มหาสารคาม	9.9700	3.0460	3.0460	0.0000	3.0460	0%	71%	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แจ้งปรับเกิน 10 %	(=ตกพับ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				1				30.0000	19.4800	19.4800	2.3204	17.1597	12%	40%		
1	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.5	1	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยจริง	หมู่ที่ 2,3,12,13	สุรินทร์	30.0000	19.4800	19.4800	2.3204	17.1597	12%	40%	หยุดงานเพื่อแก้ไขแบบแปลน คาดว่าจะแก้ไขแบบแปลนแล้ว เสร็จภายในเดือน มิถุนายน 63	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				5				151.5282	114.8350	64.9192	0.0000	64.9192	0%	60%		
1	2559 งบกลาง	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ คลองบางไผ่		ชลบุรี	81.6961	58.4470	8.5312	0.0000	8.5312	0%	100%	ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 กค. 63 อยู่ระหว่างหารือนิติกรเรื่อง ของค่าปรับ ยังไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ (สทภ.ทำหนังสือ ถึงกรมเรื่องผู้รับจ้างขอปรับ ลดค่าปรับ 30 ลบ. อยู่ระหว่าง การพิจารณา)	(=ตกพับ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)
2	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ UN	หมู่ที่ 9	สระแก้ว	34.9971	23.3930	23.3930	0.0000	23.3930	0%	0%	ขยายเวลาก่อสร้างถึงวันที่ 13 เม.ย. 64	(=ตกพับ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)
3	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์พื้นที่หนองกวาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 8	จันทบุรี	9.7500	7.9100	7.9100	0.0000	7.9100	0%	100%	ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 กค. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย (มี ปัญหาเรื่องการโอนสิทธิ์) มี ค่าปรับจากโครงการ 7 ลบ.	รอคำสั่งศาลา (=ตกพับ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ ดอนพูน	5	นครนายก	21.4500	21.4500	21.4500	0.0000	21.4500	0%	0%	อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้ที่ดิน สาธารณะประโยชน์จากกรม ที่ดิน *อยู่ระหว่างเสนอเรื่องการขอ อนุญาตต่อกระทรวงมหาดไทย*	(=ตกพับ+กรมาฯ จัดหางบใหม่)
5	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.6	1	เครื่องมือทดสอบแรงดึง ของเหล็กพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6		ปราจีนบุรี	3.6350	3.6350	3.6350	0.0000	3.6350	0%	100%	บริษัทฯ ส่งของวันที่ 17 ก.พ. 63 คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ ไม่ตรวจรับเนื่องจาก รายละเอียดงานไม่ตรงกับ สัญญา ส่งเรื่องให้ กรมบัญชีกลางพิจารณา ภายใน 15 ก.ย. 63	*ประสานส่วนคลังและส่วน พัสดุ

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				1				7.8000	5.3152	5.3152	0.0000	5.3152	0%	26%		
1	2561 พรบ.	งบลงทุน	สทภ.7	1	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภายในค่ายสุรสีห์ (มทบ. 17)	หมู่ที่ 1	กาญจนบุรี	7.8000	5.3152	5.3152	0.0000	5.3152	0%	26%	อทน.อนุมัติยกเลิกสัญญา ภาค ยืนยันไม่ดำเนินการต่อ เงินที่ กันมาคืนคลัง	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				4				36.0566	20.6496	12.3770	0.0000	12.3770	0%	69%		
1	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทก.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ครกผาแท่น	หมู่ที่ 1	น่าน	9.9960	6.5490	1.7102	0.0000	1.7102	0%	89%	1) ห้างฯแจ้งเข้า 10 เม.ย. 60 2) พบปัญหาปริมาณน้ำมาก, สูบน้ำ 3) หยุดงานตั้งแต่ 18 ก.ค. 60 4) แจ้งเข้าทำงาน ครั้งที่ 2 ลว 29 ม.ค. 61 ขยายระยะเวลา สัญญาสิ้นสุด 26 ก.พ. 61 5) แจ้งค่าปรับเกิน 10% 15 มี.ย. 61 6) ขอหยุดงานน้ำท่วม โครงการ คาดว่าแล้วเสร็จ ม.ค. 62 7) อยู่ระหว่างการพิจารณา ยกเลิก	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)
2	2560 พรบ.	งบลงทุน	สทก.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกระจับ	วังปลาทด หมู่ ที่ 4	พิจิตร	16.9606	6.7666	3.3328	0.0000	3.3328	0%	86%	1) ห้างฯแจ้งเข้า 1 เม.ย. 60 2) พบปัญหาน้ำท่วมโครงการ 22 พ.ค. 60 3) หยุดงานตั้งแต่ 19 พ.ค. 60 ทส 0624/1781 4) สทก.9ให้ห้างเข้าทำงาน ตั้งแต่ 9 มี.ค. 61 5) ห้างแจ้ง เข้าทำงาน 12 มี.ค. 61 ขยาย ระยะเวลา 4 ก.ค. 61 6) แจ้ง ค่าปรับเกิน 10% 22 ต.ค. 61 7) อยู่ระหว่างการพิจารณา ยกเลิก	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
3	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.9	1	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคู	โป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4	พิษณุโลก	5.0000	3.7440	3.7440	0.0000	3.7440	0%	0%	1) แจ้งหยุดงาน เนื่องจากติด ปัญหาพื้นที่กรมเจ้าท่าและ ชลประทานจัดรูปที่ดินเขต ชลประทาน 2) กรมเจ้าท่าอนุญาต เฉพาะงานขุดลอกยังไม่ สามารถเข้าดำเนินการได้ 3) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอ อนุญาตจากสำนักงานจัดรูป ที่ดินเนื่องจากอยู่ในเขตพื้นที่ ดูแลของกรมชลประทาน	ขอยกเลิกสัญญา (=ตกพับ)
4	2562 พรบ.	งบลงทุน	สทท.9	1	เครื่องมือทดสอบแรงดึง ของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9		พิษณุโลก	4.1000	3.5900	3.5900	0.0000	3.5900	0%	100%	1) สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค. 2563 2) รายละเอียดงานไม่ถูกต้อง ตามคุณลักษณะ (TOR) ของ สัญญาจ้าง 3) อยู่ระหว่างหารือ กวพ.	*ประสานส่วนคลังและส่วน พัสดุ

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				2				321.9202	232.2000	48.6220	10.3740	38.2480	21%	72%		
1	2560 งบกลาง	งบลงทุน	สพน.	1	พัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล		ลพบุรี	276.3558	198.3000	19.8070	0.0000	19.8070	0%	89%	1. จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด 2. ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง - กรมทรัพยากรน้ำมีหนังสือแจ้งเตือนบอกเลิกสัญญามาแล้ว 3 ครั้ง และแจ้งเตือนบอกเลิกสัญญา (ครั้งสุดท้าย) ตามหนังสือ ที่ ทส 0604/1309 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 *ผวจ.ดำเนินการล่าช้า มีแนวโน้มจะตกพับ*	(=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบใหม่)
2	2562 พรบ.	งบลงทุน	สพน.	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นท่าเสากระโดง		กำแพงเพชร	45.5644	33.9000	28.8150	10.3740	18.4410	36%	54%	1. จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่กำหนด 2. ฝนตกในพื้นที่โครงการ 3. มีการเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกตามแนวก่อสร้าง 4. กลุ่มผู้ใช้น้ำร้องขอให้แก้แบบแปลน	(=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				5				259.9476	193.4489	130.1061	0.0000	130.1061	0%	82%		
1	2555 งบกลาง	งบลงทุน	สอน.	1	ก่อสร้างระบบส่งน้ำผิวน้ำ น้ำมัน-ห้วยส้มป่อย		น่าน	85.3330	21.8594	21.8594	0.0000	21.8594	0%	70%	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนในเขตกองทัพอากาศ จ. น่าน เพราะกองทัพฯต้องการให้กรมฯ เปลี่ยนวิธีการดำเนินการจากการขุดคลองเปิดเพื่อผิวน้ำ เป็นวางท่อGRP และให้ก่อสร้างถนนตรวจการและไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวการวางท่อ เป็นผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 95 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 10% ของเงินงบประมาณก่อสร้าง หากนำเข้า ครม. พิจารณางบประมาณ จะทำให้ล่าช้า แนวทางแก้ไข</p> <p>1. คกก.และผู้รับจ้างได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างโดยให้ผู้รับจ้างรายงานผลสำรวจค่าระดับงานก่อสร้าง งานวางท่อและบ่อพักน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินโครงการฯ</p> <p>2.-ปรับปรุงแบบแปลนให้</p>	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
2	2556 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำลำน้ำอิง		พะเยา	41.5385	41.5385	13.0033	0.0000	13.0033	0%	100%	ปัญหาอุปสรรค คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายงวด สุดท้าย งวดที่ 6และผู้รับจ้าง ได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ตามสิทธิต่อศาลปกครองกลาง แนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างหารือ กรมบัญชีกลาง กรณีเบิกจ่าย เงินงวดสุดท้าย และรอการ ตัดลินจากศาลปกครอง	งวดสุดท้ายอยู่ระหว่าง พิจารณาที่ศาลปกครอง (=ตกพับ+กรมฯ จัดหางบใหม่)


ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
3	2558 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองแขง	หนองหัววัว	ขอนแก่น	45.0000	45.0000	28.9534	0.0000	28.9534	0%	72%	ปัญหาอุปสรรค โครงการได้สิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 59 คกก. เสนอขอขยายอายุสัญญา งด หรือลดค่าปรับ ตามบันทึก ที่ทส 0610.5/812 ลว 6 มิ.ย. 62 ซึ่งรอง อทน.(อธิวัฒน์) มี ข้อสั่งการให้ สอน.พิจารณา ตามที่ สลก.เสนอ เนื่องจาก สลก.ตรวจสอบพบว่าขาด เอกสาร หนังสือสั่งให้ผู้รับจ้าง หยุดงานและหนังสือแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข กรมทรัพยากรน้ำได้ทำหนังสือ เร่งรัดและแจ้งค่าปรับ อยู่ระหว่างการหยุดงานและ แก้ไขแบบแปลน ครั้งที่ 1 คกก.ดำเนินการตรวจสอบ ตามที่ สลก. เสนอ แล้ว	(=ตกพับ+กรมา จัดหางบใหม่)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
4	2560 พรบ.	ลงทุน	สอน.	1	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองเบ็ญเครือ (ผูกพัน เก่า)	โนนเมือง หมู่ที่ 5	มหาสารคาม	64.3600	64.3600	59.9453	0.0000	59.9453	0%	80%	ปัญหาอุปสรรค '- ผู้รับจ้างมีเครื่องมือ เครื่องจักรจำนวนน้อย ไม่ สมดุลกับปริมาณที่คงเหลืออยู่ - โครงการฯ ได้สิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 62 แล้ว - ช่วงเวลาที่ผ่านมาฝนตกใน พื้นที่โครงการฯยังคงมีน้ำท่วม ขังในพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดงาน ชั่วคราว เนื่องจากอิทธิพลพายุ โพดุล เกิดภาวะน้ำท่วม อีกทั้ง โครงการฯเป็นพื้นที่รองรับการ ระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของราษฎร แนวทางแก้ไข '- เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง - อท.มีหนังสือแจ้งการเรียก ค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 62 เนื่องจาก โครงการฯ มีกำหนดเวลา ทำงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ส.ค. 62 แต่ผู้รับจ้างทำงานไม่	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนิน งาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
5	2561 พรบ.	งบลงทุน	สอน.	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อเสริมระบบนิเวศ และสำรองน้ำเพื่อเสริม ระบบการอุปโภค-บริโภค ภายในพื้นที่วนอุทยาน ไม่กลายเป็นหิน		ตาก	23.7161	20.6910	6.3448	0.0000	6.3448	0%	90%	ปัญหาอุปสรรค กลุ่มผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน เดียวกับโครงการฯ มีความ กังวลว่าปริมาณน้ำใน แหล่งน้ำต้นทุนจะมีไม่เพียงพอ ต่อการใช้ในฤดูแล้งการอนุมัติ ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ สิ้นสุด วันที่ 2 ตุลาคม 2562 แนวทางแก้ไข จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่ที่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับฟังแนวทางการ แก้ไขจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ เมื่อเดือน มิ.ย. 62 /เร่งรัดการ ดำเนินการของผู้รับจ้าง ดำเนินการให้สอดคล้องกับ แผนงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเร่ง ดำเนินการเสนอขออนุมัติใช้ พื้นที่จากกรมป่าไม้	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

ลำดับ ที่	ปี	ประเภท งบ	หน่วย งาน	จำนวน	ชื่อโครงการ	บ้าน/หมู่	จังหวัด	งบตาม พรบ.	งบตามสัญญา	เงินกัน/ เงินขยาย	ผลเบิกจ่าย ปี 63	คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย)	ผลการ เบิกจ่าย ของเงินกัน	ผลการ ดำเนินงาน	สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ	ผลสรุปจากวันประชุม 1 ก.ย.63 และการสอบถาม เพื่อยืนยันจากหน่วยงาน
รวม				1				9.2000	9.1950	7.8158	4.5975	3.2183	59%	100%		
1	2562	รายจ่ายอื่น	ศปว.	1	โครงการศึกษาประเมิน ศักยภาพ และพัฒนา ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ เก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ในพื้นที่สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ			9.2000	9.1950	7.8158	4.5975	3.2183	59%	100%	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน 2 งวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จ 10 กันยายน 2563	คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563 (=แล้วเสร็จ)

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อื่นเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด

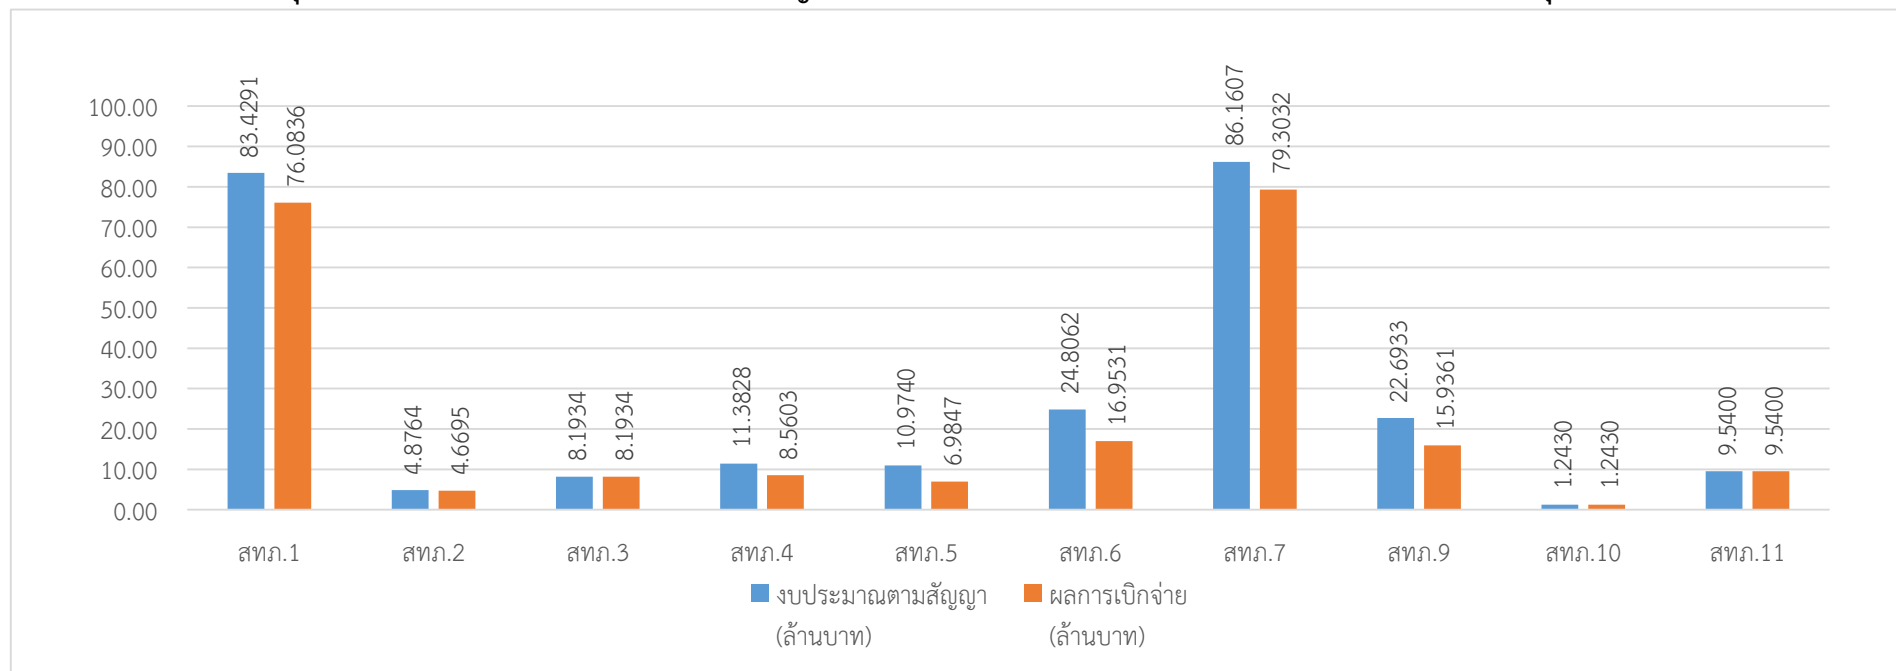

หน่วยงาน	สทภ.1	สทภ.2	สทภ.3	สทภ.4	สทภ.5	สทภ.6	สทภ.7	สทภ.9	สทภ.10	สทภ.11
จำนวนโครงการ	25	3	3	4	4	13	38	8	4	3
งบประมาณตามสัญญา (ล้านบาท)	83.4291	4.8764	8.1934	11.3828	10.9740	24.8062	86.1607	22.6933	1.2430	9.5400
ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	76.0836	4.6695	8.1934	8.5603	6.9847	16.9531	79.3032	15.9361	1.2430	9.5400
ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งหมด	91.20%	95.76%	100.00%	75.20%	63.65%	68.34%	92.04%	70.22%	100.00%	100.00%
โครงการคงเหลือจำนวน	1	0	0	1	0	4	0	3	0	0
งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	7.3455	0.0000	0.0000	2.8225	0.0000	7.8531	0.0000	6.7572	0.0000	0.0000
หมายเหตุ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

สรุปผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัด
 บลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ
 ประจำเดือนกันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)

หน่วยงาน	อนุมัติ		งบประมาณตามสัญญา		ทศจ. เป็นหน่วย ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการเอง	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ		หมายเหตุ
	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)			แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ	ยกเลิก	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	
รวมทั้งสิ้น	116	358.0275	105	263.2989	29	87	90	11	15	229.8500	64.20%	9	26.5914	
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1	25	93.1000	25	83.4291	0	25	23	1	1	76.0836	91%	1	7.35	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 23 โครงการ - หยุดงาน อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน 1 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2	3	8.5280	3	4.8764	0	3	3	0	0	4.6695	96%	0	0.21	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3	10	27.5000	3	8.1934	10	0	3	0	7	8.1934	100%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - งบประมาณตกพับ จำนวน 7 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4	7	23.6959	4	11.3828	7	0	3	1	3	10.9434	96%	1	0.44	- ทศจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - ทศจ. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ - งบประมาณตกพับ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5	4	14.4300	4	10.9740	0	4	3	0	1	6.9847	64%	0	3.99	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6	14	34.1760	13	24.8062	6	8	9	4	1	16.9531	68%	4	7.85	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ - บอกลีกสัญญา จำนวน 4 โครงการ - ทศจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ - ทศจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ - งบประมาณตกพับ จำนวน 1 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7	38	110.1883	38	86.1607	3	35	34	2	2	79.3032	92%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 33 โครงการ - ยกเลิกสัญญา จำนวน 2 โครงการ - ทศจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0.0000	-	0	0.00	- สทท.8 เสนอโครงการไม่ทันงบประมาณจึงตกพับไป
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9	8	32.2917	8	22.693326	3	5	5	3	0	15.9361	70%	3	6.76	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ - ทศจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	4	1.2490	4	1.2430	0	4	4	0	0	1.2430	100%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11	3	12.8686	3	9.54	0	3	3	0	0	9.5400	100%	0	0.00	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ
