


ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

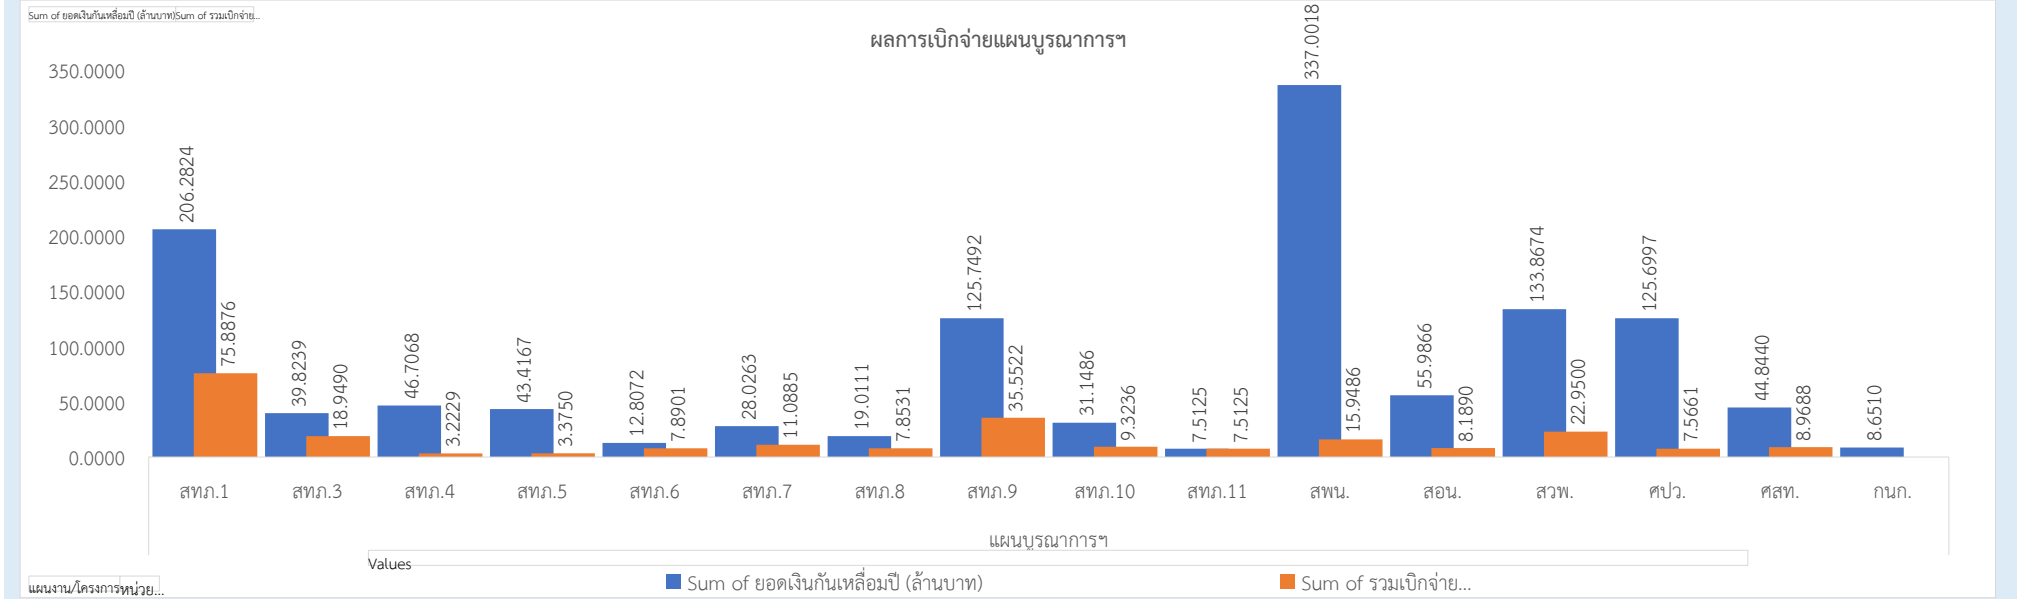


แผนบูรณาการฯ		ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563															
หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.3	สทท.4	สทท.5	สทท.6	สทท.7	สทท.8	สทท.9	สทท.10	สทท.11	สพน.	สอน.	สวพ.	ศปว.	ศสท.	กนก.
จำนวน (คก.)	129	38	11	8	9	5	5	4	19	2	2	12	4	2	6	1	1
แล้วเสร็จ (คก.)	34	11	6	2	1	3	1	2	5	1	2	0	0	0	0	0	0
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	95	27	5	6	8	2	4	2	14	1	0	12	4	2	6	1	1
ยอดเงินกันเหลือปี	1,266.5351	206.2824	39.8239	46.7068	43.4167	12.8072	28.0263	19.0111	125.7492	31.1486	7.5125	337.0018	55.9866	133.8674	125.6997	44.8440	8.6510
รวมเบิกจ่ายปี 2564	244.2769	75.8876	18.9490	3.2229	3.3750	7.8901	11.0885	7.8531	35.5522	9.3236	7.5125	15.9486	8.1890	22.9500	7.5661	8.9688	0.0000
ยอดเงินกันคงเหลือ	1,022.2582	130.3948	20.8749	43.4839	40.0417	4.9171	16.9378	11.1580	90.1970	21.8250	0.0000	321.0532	47.7976	110.9174	118.1336	35.8752	8.6510
ลดค่างาน	0.7439	0.0346	0.0974	0.0000	0.0047	0.5130	0.0000	0.0000	0.0942	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	19%	37%	48%	7%	8%	62%	40%	41%	28%	30%	100%	5%	15%	17%	6%	20%	0%

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

Sum of ยอดเงินกันเหลือปี (ล้านบาท)Sum of รวมเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายแผนพื้นฐาน

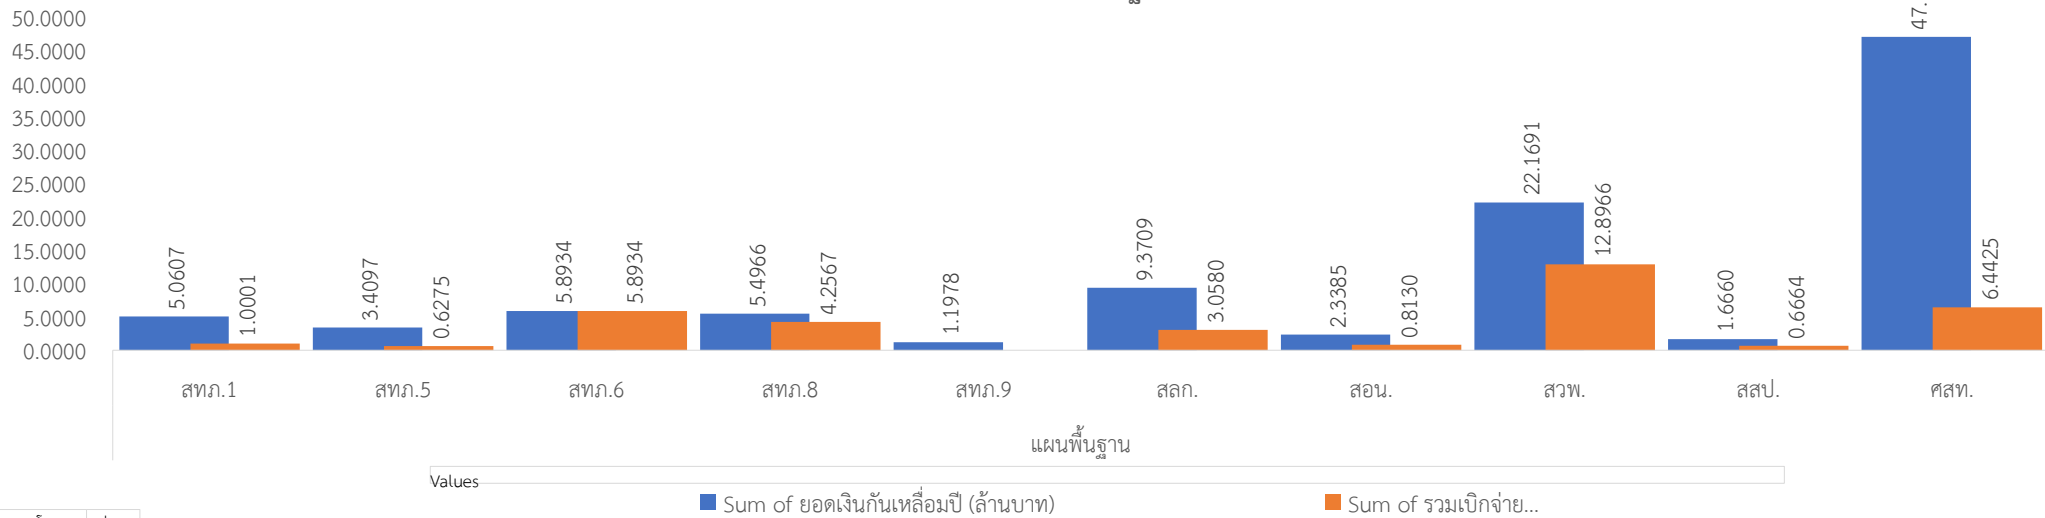

แผนงาน/โครงการหน่วย...

แผนพื้นฐาน		สทภ.1	สทภ.5	สทภ.6	สทภ.8	สทภ.9	สอน.	สสป.	สลก.	สวพ.	ศสท.
หน่วยงาน	รวม	1	1	4	3	1	1	1	11	2	4
จำนวน (คก.)	29	0	0	4	2	0	0	0	9	0	0
แล้วเสร็จ (คก.)	15	1	1	0	1	1	1	1	2	2	4
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	14										
ยอดเงินกันเหลือปี	103.6316	5.0607	3.4097	5.8934	5.4966	1.1978	2.3385	1.6660	9.3709	22.1691	47.0288
รวมเบิกจ่ายปี 2564	35.6542	1.0001	0.6275	5.8934	4.2567	0.0000	0.8130	0.6664	3.0580	12.8966	6.4425
ยอดเงินกันคงเหลือ	67.9774	4.0606	2.7823	0.0000	1.2399	1.1978	1.5255	0.9996	6.3129	9.2725	40.5863
ลดค้างงาน	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่าย เงินกัน	34%	20%	18%	100%	77%	0%	35%	40%	33%	58%	14%

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	39	211.3431	76.8877	134.4554	0.0346	0.0000	36%	83%	11	28	
1	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำ	ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1	แม่แฝก	สันทราย	เชียงใหม่	1	6.2971	3.9370	2.3601			63%	93%		1	
2	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บ น้ำน้ำแวน ระยะ 2	ผาขาว หมู่ที่ 3	ทุ่งผาสุข	เชียงคำ	พะเยา	1	4.5640		4.5640			0%	64%		1	
3	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นแม่สะมาด	ป่าปู้ หมู่ที่ 2	ผาบ่อง	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1	0.4625		0.4625			0%	90%		1	
4	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นทุ่งปงเรียน ระยะ 2		บ้านเอื้อม	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	11.5000	4.3328	7.1672			38%	10%		1	ขยายระยะเวลาดำเนินการสัญญา ใหม่ 21 มกราคม 2564
5	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะ 2		แม่งอน	ฝาง	เชียงใหม่	1	5.3847	4.3956	0.9891			82%	97%		1	
6	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นแม่ตืน พร้อมระบบกระจายน้ำ	แม่แตด หมู่ที่ 8	แม่ตืน	ลี้	ลำพูน	1	0.4904	0.4904	0.0000			100%	100%	1		
7	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใน พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37		รอบเวียง	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	11.6533		11.6533			0%	52%		1	
8	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ฉาง ข้าว	ฮ่างดำ หมู่ที่ 3	ป่าจั่ว	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	18.2945	8.0011	10.2934			44%	85%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ จากฝายน้ำล้นห้วยดั่ง	ป่าจี้ หมู่ที่ 3	ป่าไผ่	ลี้	ลำพูน	1	1.5283	1.5283	0.0000			100%	100%	1		
10	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวัง น้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ	วังตะกู หมู่ที่ 11	วังควง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	1	0.2340		0.2340			0%	98%		1	
11	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนอง กอง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองกอง หมู่ที่ 1	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	1	16.9150	7.6515	9.2635			45%	45%		1	
12	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองแขยง	สีกงาม หมู่ที่ 1	สีกงาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.5700	4.5373	0.0328	0.0328		99%	100%	1		แก้ไขแบบแปลนค่างานลดลง 32,760 บาท
13	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงคลองลาน (บ้านสุขสวรรค์)	สุขสวรรค์ หมู่ที่ 2	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	2.4800	2.4800	0.0000			100%	100%	1		
14	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นแม่น้ำมะ	สันตันธง หมู่ที่ 2	ศรีดอนมูล	เชียงแสน	เชียงราย	1	11.2998		11.2998			0%	87%		1	
15	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง		แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	10.3529	10.3529	0.0000			100%	92%		1	
16	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบการกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 1	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	5.1699		5.1699			0%	71%		1	
17	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว	ฮ้างด้า หมู่ที่ 3	ป่าจั่ว	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	2.8024		2.8024			0%	86%		1	
18	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวง แม่หลอด	แม่หลอดเหนือ หมู่ที่ 1	สบเปิง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	3.0032		3.0032			0%	95%		1	ขยายระยะเวลาดำเนินการสัญญา ใหม่ 4 มค. 64

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
19	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวง หนองเขียว	ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	2.1000		2.1000			0%	95%		1	ขยายระยะเวลาดำเนินการสัญญา ใหม่ 4 มค. 64
20	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นแม่เย็น	แสนตอ หมู่ที่ 11	ร่องเคาะ	วังเหนือ	ลำปาง	1	15.4327	5.1075	10.3252			33%	90%		1	
21	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยบวก หลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัวเหนือ	เมืองตาก	ตาก	1	0.0831		0.0831			0%	98%		1	
22	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบ โครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้าน ผาผึ้ง)	ผาผึ้ง หมู่ที่ 6	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	20.3770		20.3770			0%	15%		1	เนื่องจากอุทยานฯ ขอแก้ไข แนวท่อส่งน้ำใหม่จึงทำให้ต้อง แก้แบบใหม่ และจัดทำโครงการ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติคลองวัง เจ้า คาดว่าจะสามารถเข้า ดำเนินการได้ในวันที่ 15 มิ.ย. 63
23	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านศรีคีรีรักษ์) ระยะ 2	ศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 5	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	1.0257	1.0238	0.0019	0.0019		100%	100%	1		แก้ไขแบบแปลนค่างานลด 1,592 บาท อยู่ระหว่างขยาย ระยะเวลา (เนื่องจากติดโควิด)
24	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบ โครงการหลวงสบเมย (บ้านห้วยน้ำใส) ระยะ 2	ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	2.4605		2.4605			0%	95%		1	
25	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวัด ธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยชมพู หมู่ที่ 8	แม่แตง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	8.4069		8.4069			0%	65%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ส่วนที่สุ ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื้อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
26	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิต การเกษตรบ้านปางเพื่อง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	ปางเพื่อง	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	6.4056	4.3547	2.0509			68%	85%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ส่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
27	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยยูงใน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยยูงใน หมู่ที่ 5	สันทราย	ฝาง	เชียงใหม่	1	2.4727	1.7948	0.6779			73%	99%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ส่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
28	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโป่งลิบ บ้านโป่งลิบใน บ้านท่าสะแล ตำบล เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	โป่งลิบ,โป่งลิบใน	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.9322	3.2712	0.6609			83%	99%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ส่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
29	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่มาวหนองบัว บ้านหวนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	แม่มาวหนองบัว	ม่อนปิ่น	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.7740	2.5923	1.1817			69%	99%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ส่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
30	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองสละ บ้านเชียงหมั่น หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดง เย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เชียงหมั่น หมู่ที่ 5	ศรีดงเย็น	ไชยปราการ	เชียงใหม่	1	1.1834	1.1834	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ส่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
31	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระทุ่งโป่ง บ้านขอเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขอเหนือ หมู่ที่ 9	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.7106	1.7106	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ส่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
32	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลื๋อจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้านม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ม่วง หมู่ที่ 8	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.0451	1.0451	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลื๋อจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
33	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลื๋อจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้านสบลื บ้านสบลื หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	สบลื หมู่ที่ 6	แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.7000		4.7000			0%	98%		1	* ได้อนุมัติเหลื๋อจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
34	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลื๋อจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองกำเกาะ บ้านท่าไม้ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ท่าไม้	แม่ปุ	แม่พริก	ลำปาง	1	3.5646	3.5646	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลื๋อจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
35	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลื๋อจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บน้ำ แปลงหญ้า บ้านต้นฝืง หมู่ที่ 5 ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอกะคา จังหวัด ลำปาง	ต้นฝืง หมู่ที่ 5	ใหม่พัฒนา	กะคา	ลำปาง	1	2.0345	2.0345	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลื๋อจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
36	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลื๋อจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง		แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.1735		4.1735			0%	30%		1	* ได้อนุมัติเหลื๋อจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
37	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ละอูป (โครงการพลิกฟื้นผืนป่า) บ้านแม่ละ อูป หมู่ที่ 3 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	บ้านแม่ละอูป	แจ่มหลวง	กัลยาณิวัฒนา	เชียงใหม่	1	0.4980	0.4980	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 13 แล้ว จำนวน 18 รายการ งบม. 0.4993 ลบ. * คำนวณที่สิ้นสุด ที่ ทส 0604.3/1411 ลว 10 ก.ค. 63
38	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองครก หลวง บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบล วิเชตนคร อำเภอแจ่มห่ม จังหวัดลำปาง		วิเชตนคร	แจ่มห่ม	ลำปาง	1	3.9000		3.9000			0%	15%		1	
39	สทท.1	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สำรวจ อุทกวิทยาที่ 6 (แม่สะเรียง) พร้อมถนนภายในสำนักงานและรั้ว บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	ท่าข้าม หมู่ที่ 1	บ้านกาศ	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	5.0607	1.0001	4.0606			20%	80%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	11	39.8239	18.9490	20.8749	0.0974	0.1098	48%	79%	6	5	
1	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์บ้านน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน	น้ำหมัน หมู่ที่ 1	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	5.8756	1.2027	4.6729			20%	57%		1	
2	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์บ้านกกจาน สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน	กกจาน หมู่ที่ 7	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	2.5791		2.5791			0%	70%		1	
3	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน นาดี พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	นาดี หมู่ที่ 1	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3899	2.3709	0.0190	0.0190	0.1004	99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบปม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
4	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน โพศาลวิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	โพธิ์โพศาล หมู่ที่ 1	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.0328	2.0270	0.0058	0.0058		100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบปม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
5	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน ห้วยกอกหนองเค็ม พร้อมระบบ กระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา เด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี	หนองเค็ม หมู่ที่ 1	โพธิ์โพตาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3980	2.3618	0.0362	0.0362	0.0094	98%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
6	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านม่วง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา	ม่วง หมู่ที่ 5,10	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	7.1422	4.4986	2.6436			63%	100%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
7	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านบอน สหราษฎร์อุทิศ สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	บอน หมู่ที่ 3	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.2058	2.2058	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
8	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านแก้ง คำประชาสามัคคี สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	แก้งท่าลับ หมู่ที่ 1	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	1.9200	1.9024	0.0176	0.0176		99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์เรียนรู้คน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพระตำริ บ้านห้วยเตย	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหว่า	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.9785	1.9785			0%	32%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบป.ม. 38.5000 ลบ.ค่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63	
10	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝึกอาชีพ เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพัชร กิตติยาภิราม)	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหว่า	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.7900	1.7712	0.0188	0.0188	99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบป.ม. 38.5000 ลบ.ค่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63	
11	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน	หมากแข้ง หมู่ที่	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	9.5120	0.6086	8.9034		6%	12%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบป.ม. 38.5000 ลบ.ค่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	8	46.7068	3.2229	43.4839	0.0000	0.0616	7%	74%	2	6	
1	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูทดแคน พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมากยาง	สามขา	โพธาราย	ร้อยเอ็ด	1	10.3955		10.3955			0%	49%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
2	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคกกลาง พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	หนองศาลา	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1	5.6030		5.6030			0%	54%		1	แจ้งเร่งรัดงานแล้ว 3 ครั้ง
3	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพง	แพง หมู่ที่ 11	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.2189		5.2189			0%	67%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
4	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเล็งเค็ง	หมู่ที่ 6, 7, 8, 9	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	5.8217		5.8217			0%	78%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
5	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยแอ๋	จอมศรี หมู่ที่ 2	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	14.0555		14.0555			0%	58%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
6	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคา พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 1	สาวแห	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	1	2.3277		2.3277			0%	89%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์
7	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) กอง พลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี)	ค่ายเปรมติณสูลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	2.2000	2.1692	0.0308		0.0308	99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 2) กอง พลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี)	ค่ายเปรมติณสูล ลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	1.0845	1.0537	0.0308		0.0308	97%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	10	46.8264	4.0024	42.8239	0.0047	0.0000	9%	67%	1	9	
1	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเล็ง พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	จัว หมู่ที่ 10	คูขาด	คง	นครราชสีมา	1	2.3786	2.3738	0.0047	0.0047		100%	100%	1		
2	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการฟาร์ม ตัวอย่างตามพระราชดำรินในสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	กระเจา หมู่ที่ 7	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	1	0.2882		0.2882			0%	98%		1	คาดว่าจะเบิกจ่ายในเดือน ม.ค. 64
3	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทำนบเสียว (ช่วง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	ตะเคียน หมู่ที่ 14	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.3050		4.3050			0%	73%		1	
4	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโกรก รกฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	ดอนพัฒนา หมู่ที่ 7	ตงอีจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	1	14.9718	1.0012	13.9707			7%	41%		1	เร่งรัดงานรอบที่ 2 / อยู่ ระหว่างขออนุมัติหยุดงานเพื่อ แก้ไขแบบ
5	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบุมะค่า	บุมะค่า	มาบตะโกเอ	ครบุรี	นครราชสีมา	1	2.9556		2.9556			0%	90%		1	แจ้งเข้างานเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค. 64
6	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อม ระบบส่งน้ำ	หมู่ที่ 4,6	ตังใจ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	12.5644		12.5644			0%	51%		1	งานล่าช้าเนื่องจากคนงานน้อย

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำบึงถนนหักใหญ่	โนนสง่า หมู่ที่ 2	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	4.2243		4.2243			0%	75%		1	แจ้งเข้างานเมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (หลังปรับแผนโอน เปลี่ยนแปลง)	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	หนองพลวง หมู่ที่	พินชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	1.2288		1.2288			0%	100%		1	แจ้งเข้างานวันที่ 25 พ.ย.2563 /อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 100 %
9	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และ จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อบริหารจัดการ โครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็น ระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		หนองบัวศาล	เมืองนครราช	นครราชสีมา	1	0.5000		0.5000			0%	0%		1	มทส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นาารี /อยู่ลงนามในสัญญาเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2564
10	สทท.5	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมได้จำนวน 100 คน เลขที่ 47 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		หนองบัวศาล	เมืองนครราช	นครราชสีมา	1	3.4097	0.6275	2.7823			18%	42%		1	แรงงานมีน้อย สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.63 แจ้งสงวนสิทธิ์ครั้งที่ 3

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	9	18.7006	13.7835	4.9171	0.5130	0.0131	74%	98%	7	2	
1	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูศูนย์วิจัยกรมปศุสัตว์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0009	2.2595	0.7415			75%	93%		1	อยู่ระหว่างการปรับ (ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63)
2	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระประปาโรงพยาบาล กบินทร์บุรี พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 8	กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7579	1.7579	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.6626		3.6626			0%	85%		1	อยู่ระหว่างการปรับ (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 63)
4	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 4	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0382	2.5252	0.5130	0.5130		83%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหลังต้น น้ำภูไท	หมู่ที่ 13	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	1	1.3475	1.3475	0.0000			100%	100%	1		
6	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนบริหาร จัดการน้ำ บ้านไผ่เสวก ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	ไผ่เสวก	บางแก้ว	เมืองฉะเชิงเท	ฉะเชิงเทรา	1	3.8666	3.8666	0.0000		0.0131	100%	100%	1		
7	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองเวฬุ หมู่ที่ 4 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	หมู่ที่ 4	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	1	1.8808	1.8808	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พันุ่แหล่งน้ำข้างบ้านนายาว (อ่าง เก็บน้ำรวารูอ) หมู่ที่ 15 ตำบลท่า กระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		
9	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พันุ่แหล่งน้ำข้างป่าบ้านคลองเตย (อ่างเก็บน้ำจตุพร) หมู่ที่ 21 ตำบล ท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	28.0263	11.0885	16.9378	0.0000	0.0000	40%	71%	1	4	
1	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองข่อย ช่วง 2	หมู่ที่ 9	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	9.4787	5.3209	4.1578			56%	85%		1	ปัจจุบัน ดำเนินงานปูแผ่นดิน เหนียวสังเคราะห์ (GCL) งาน บดอัด และงานโครงสร้าง
2	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3	ไร่ หมู่ที่ 6	ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	2.5470	2.5470	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยตาเมือง	โป่งเกตุบน หมู่ที่	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	3.2206	3.2206	0.0000			100%	100%		1	อยู่ระหว่างรอการตรวจรับงาน
4	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี		โพพระ	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	1	9.7900		9.7900			0%	0%		1	อยู่ระหว่างรอสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาเพชรบุรีอนุญาตให้ ใช้พื้นที่
5	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การทำ นาอย่างอัจฉริยะ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี		นางบวช	เดิมบางนาง	สุพรรณบุรี	1	2.9900		2.9900			0%	70%		1	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้างที่ตั้งแผงโซล่าเซลล์ และก่อสร้างโรงสูบน้ำ งานดาด คอนกรีต งานก่อสร้างบันได

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	7	24.5077	12.1098	12.3980	0.0153	0.0000	49%	75%	4	3	
1	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำโพธิ์ทอง		กะลวอเหนือ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	4.1605	4.1605	0.0000			100%	100%	1		
2	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองบ่วง ช้าง	โคกขาว หมู่ที่ 7	นาโหนด	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	2.7430		2.7430			0%	65%		1	
3	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลอง สะพานดำ		ยูโป	เมือง	ยะลา	1	3.6926	3.6926	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 1 แล้ว จำนวน 11 รายการ งปม. 80.0000 ลบ. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/705 ลว 2 เม.ย. 63
4	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่ายสมทบ เพิ่มเติม)	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองลาด	หนองลาด	นาไผ่	ทุ่งสง	นครศรีธรรมร	1	8.4150		8.4150			0%	2%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 2 แล้ว จำนวน 1 รายการ งปม. 4.9850 ลบ. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/723 ลว 3 เม.ย. 63
5	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำฟาร์ม ตัวอย่าง ช่วง 2 บ้านรอตันบาตู ตำบล กะลวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส		กะลวอ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	2.5900	1.3654	1.2246			53%	55%		1	สัญญาเก่าเลขที่ 63/2563 สัญญาใหม่เลขที่ 1/2564
6	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 1-2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	หมู่ที่ 6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	1.3176	1.3023	0.0153	0.0153		99%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื้อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบ่อจิก หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	บ่อจิก หมู่ที่ 9	บางจาก	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	1	1.5890	1.5890	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	20	126.9470	35.5522	91.3948	0.0942	0.0000	28%	68%	5	15	
1	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร		วัดขวาง	โพทะเล	พิจิตร	1	12.6509	1.7357	10.9152			14%	69%		1	1) ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการมี ปริมาณน้ำมาก ตามหนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง (สงง.ใหญ่) ออ. 410/2563 ลว 20 ต.ค. 2563 2) หยุดงาน ตามหนังสือ ทส 0624.3/1536 ลว 9 พ.ย. 2563 3) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง (สงง.ใหญ่) ออ. 485/2563 ลว 3 ธ.ค. 2563
2	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร วัดบาง คลาน-แม่น้ำยม		บางคลาน	โพทะเล	พิจิตร	1	8.1113		8.1113			0%	73%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ โครงการ ตามหนังสือ ทส 0624.3/1470 ลว 15 ต.ค. 2563 2) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัท แอล.พี.พี.ซี วิล คอนสตรัคชั่น จำกัด LCC. พทล.2563/023 ลว 27 พ.ย. 2563

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
3	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนอง จระเข้-หนองแม่ระวีง		สารจิตร์	ศรีสัชชาลัย	สุโขทัย	1	5.1198	5.1198	0.0000			100%	8%	1		
4	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำครกกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำบัว	เวียงสา	น่าน	1	4.6291	1.7868	2.8424			39%	72%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากประชาชนขอใช้น้ำเพื่อ การเกษตร ตามหนังสือ ทส 0624.3/1452 ลว 14 ต.ค. 2563
5	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ		ย่านยาว	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	12.0745	12.0736	0.0009	0.0015		100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
6	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	น้ำแพะ หมู่ที่ 6	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.8930		1.8930			0%	70%		1	
7	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	2.2196		2.2196			0%	62%		1	
8	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	ปางปูก หมู่ที่ 2	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	1.6351		1.6351			0%	94%		1	
9	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	เขตรวัน หมู่ที่ 1	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	2.1670		2.1670			0%	73%		1	
10	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	น้ำลีใต้ หมู่ที่ 8	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.7283		1.7283			0%	83%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
11	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	นาเลา หมู่ที่ 3	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.4262	1.4262	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
12	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบ กระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงแม่จริม	ก้อ หมู่ที่ 3	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	8.5335	1.3623	7.1713			16%	62%		1	อยู่ระหว่างการขออนุญาต หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่
13	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชื่อมต่อ โครงข่ายน้ำปิงน้อย-ปิงน้ำด้วน	หมู่ที่ 1,2	ไร่ฮ้อย	พิชัย	อุดรดิตถ์	1	21.1410	5.4353	15.7057			26%	75%		1	
14	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจะเข้		สารจิตร์	ศรีสัชชนาลัย	สุโขทัย	1	23.1762		23.1762			0%	0%		1	1) ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน/ ค่าปรับเกินงบประมาณ 2) ผู้รับจ้างขอปรับแผนปฏิบัติ งานก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัทกฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ KRD/63/045 ลง 2 ธ.ค. 63
15	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	โป่งคำ หมู่ที่ 5	ดู่พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.5952		1.5952			0%	100%		1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
16	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	แทน 3	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	2.0845	1.9918	0.0927	0.0927		96%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
17	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	ละบ้ายา	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.3101	0.3101	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
18	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลื๋อจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อน ช่วยเพื่อน ภาคเหนือตอนล่าง กองทัพภาคที่ 3		อรัญญิก	เมือง	พิษณุโลก	1	7.0980	1.9752	5.1228			28%	60%		1	* ได้อนุมัติเหลื๋อจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งบปม. 17.6000 ลบ. ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลว. 13 เม.ย.63
19	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลื๋อจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ พิษณุโลก		หนองกะท้าว	นครไทย	พิษณุโลก	1	8.1560	2.3355	5.8205			29%	55%		1	* ได้อนุมัติเหลื๋อจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งบปม. 17.6000 ลบ. ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลว. 13 เม.ย.63
20	สทท.9	แผนงานพื้นฐาน (เหลื๋อจ่าย)	ปรับปรุงอาคารที่ล่อดจากอาคาร บังคับน้ำดงเศรษฐี ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		ย่านยาว	เมือง	พิจิตร	1	1.1978		1.1978			0%	4%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 14 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบปม. 1.1978 ลบ. * ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/1838 ลว 2 ก.ย. 63 - เลขที่สัญญา สทท.9 15/2564 ลว 2 พ.ย. 2563

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	2	7.5125	7.5125	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้าน ไหลทุ่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	ไหลทุ่งพัฒนาหมู่	ไหลทุ่ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1	4.5561	4.5561	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย ก้านเหลือง	หมู่ที่ 8	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1	2.9564	2.9564	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	2	7.5125	7.5125	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไหลทุ่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไหลทุ่งพัฒนาหมู่	ไหลทุ่ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1	4.5561	4.5561	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.11	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	หมู่ที่ 8	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1	2.9564	2.9564	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	12	337.0018	15.9486	321.0532	0.0000	0.0000	5%	29%	0	12	
1	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง		บ้านโคก	โคกโพธิ์ชัย	ขอนแก่น	1	14.4726		14.4726			0%	56%		1	
2	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย หนองหาร		ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1	22.7260		22.7260			0%	43%		1	
3	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย	ทุ่งมั่ง	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1	75.6500	12.0636	63.5864			16%	27%		1	
4	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโกรงเกรง คลองโกรงเกรง พร้อมระบบกระจาย น้ำ		ท่าผ่อ	เมืองพิจิตร	พิจิตร	1	37.3252		37.3252			0%	24%		1	
5	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจั่ว พร้อม ระบบกระจายน้ำ		ไผ่ล้อม	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	47.4300		47.4300			0%	20%		1	
6	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ		ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1	45.6336		45.6336			0%	25%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการศึกษา ความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝนในตำบลอ่างทอง, ตำบล น้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	23.3100	3.8850	19.4250			17%	48%		1	
8	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	23.3815		23.3815			0%	24%		1	
9	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	20.1788		20.1788			0%	24%		1	
10	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค ตะวันตก และภาคใต้ กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	20.3940		20.3940			0%	24%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
11	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.5000		3.5000			0%	15%		1	
12	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ จังหวัดนครพนม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.0000		3.0000			0%	15%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	58.3251	9.0020	49.3231	0.0000	0.0000	15%	19%	0	5	
1	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง)		มะเฟือง,บ้าน	พุทไธสง	บุรีรัมย์	1	8.6753		8.6753			0%	5%		1	
2	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สํารวจออกแบบและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำ ระบบกระจายน้ำภายในพื้นที่ อุทยานไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.7388	2.7025	7.0363			28%	13%		1	
3	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และจัดทำระบบการบริหารงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการนำ ร่องพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฝั่งตะวันออกตอน ใต้ (อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.6000	1.9200	7.6800			20%	37%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
4	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สำหรับออกแบบและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่ง น้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัด สกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	27.9725	3.5665	24.4060			13%	12%		1	
5	สอน.	แผนงานพื้นฐาน	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 450 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.3385	0.8130	1.5255			35%	30%		1	สพท. กันเงิน 1.0265 ลบ. เบิก 0.7390 ลบ. คงเหลือ 0.7390 ลบ. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 25 ธค. 63 สทท.7 กันเงิน 1.3120 ลบ. เบิก 0.5255 ลบ. คงเหลือ 0.7865 ลบ. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ธค. 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	4	156.0364	35.8466	120.1898	0.0000	0.0000	23%	57%	0	4		
1	สวพ.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายสถานีอุทกวิทยา เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการ กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	30.5924		30.5924			0%	10%		1	กำหนดตรวจรับการจัด งวดที่ 2 วันที่ 6 ม.ค. 64
2	สวพ.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและ พื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	103.2750	22.9500	80.3250			22%	69%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 2 แล้วเสร็จ ตามหนังสือ สวพ. ส่วนมาก ที่ ทส.0608.4/3044 ลว. 25 ธ.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว
3	สวพ.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.2000	11.2000	8.0000			58%	77%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 3 แล้วเสร็จ ตามหนังสือ สวพ.ที่ ทส. 0608.4/2995 ลว. 9 ธ.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว
4	สวพ.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อ การบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.9691	1.6966	1.2725			57%	70%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 3 แล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ ทส. 0608.4/3075 ลว.24 ธ.ค.63 และขออนุมัติเบิกจ่ายตาม หนังสือที่ ทส.0601.5/2050 ลว.29 ธ.ค. 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	6	125.6997	7.5661	118.1336	0.0000	0.0000	6%	73%	0	6	
1	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำใน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	49.8381		49.8381			0%	80%		1	
2	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	18.5972		18.5972			0%	54%		1	
3	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตาม สถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่ม น้ำกกและโขงเหนือ) กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.9025		9.9025			0%	73%		1	
4	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตาม สถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่ม น้ำแม่กลองและสาละวิน) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	21.6374		21.6374			0%	71%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหต้อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
5	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.9291	3.8027	9.1265			29%	80%		1	
6	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.7955	3.7634	9.0321			29%	80%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวง (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	91.8728	15.4113	76.4615	0.0000	0.0000	17%	84%	0	5	
1	ศสท.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ DWR Data Cleansing กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	44.8440	8.9688	35.8752			20%	22%		1	* ได้อนุมัติใช้เหลือจ่ายแล้ว จำนวนรวม 4 รายการ งบปม. 92.4068 ลบ. * ค่วนที่สุด นร 0718/14158 ลว. 23 มี.ย.63
2	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการบำรุงรักษาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	7.2000	4.9500	2.2500			69%	100%		1	
3	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.4725	1.4925	3.9800			27%	100%		1	
4	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.3869		19.3869			0%	100%		1	
5	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการระบบและบริการภูมิ สารสนเทศกลาง (DWR GIS System)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	14.9694		14.9694			0%	100%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	1	8.6510	0.0000	8.6510	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
1	กนก.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติ ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ในส่วนที่อยู่ใน หน้าที่และอำนาจ และภารกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การ จัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)		ยุโป	เมือง	ยะลา	1	8.6510		8.6510			0%	0%		1	* ได้อนุมัติครั้งที่ 9 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบม. 10.1776 ลบ. * ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/12292 ลว. 27 พ.ค.63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	1	1.6660	0.6664	0.9996	0.0000	0.0000	40%	100%	0	1	
1	สสป.	แผนงานพื้นฐาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	1.6660	0.6664	0.9996			40%	100%		1	เสนอเรื่องเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ไปที่สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 23 ธ.ค 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	11	9.3709	3.0580	6.3129	0.0000	0.0000	33%	0%	9	2	
1	สลก.	แผนงานพื้นฐาน	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	3.2258	2.8221	0.4037			87%	0%		1	* พรบ.โอนคืน จำนวน 4,008,200 บาท ทส 0604.3/ว835 ลว 23 เม.ย. 63
2	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (แก้ไขประเภท รายการ)	ลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง อาคารกรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.9092	0.0000	5.9092			0%	0%		1	
3	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 63 ซม. x สูง 90 ซม.					1	0.0252	0.0252	0.0000			100%	0%	1		
4	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด กว้าง 160 ซม. x ลึก 80 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ข้าง ขนาด กว้าง 120 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ลิ้นชัก ขนาด กว้าง 40 ซม. x ลึก 48 ซม. x สูง 52 ซม.					1	0.0236	0.0236	0.0000			100%	0%	1		
5	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 65 ซม. x ลึก 62 ซม. x สูง 115 ซม.					1	0.0049	0.0049	0.0000			100%	0%	1		
6	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 93 ซม.					1	0.1134	0.1134	0.0000			100%	0%	1		
7	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง 68 ซม. x ลึก 76 ซม. x สูง 120 ซม.					1	0.0140	0.0140	0.0000			100%	0%	1		
8	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0100	0.0100	0.0000			100%	0%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	พาร์ติชั่นจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบบทึบล้วน ขนาด 100 ซม. x 160 ซม. จำนวน 4 แผ่น เสาพาร์ติชั่น ขนาด กว้าง 5.5 ซม. x 160 ซม. จำนวน 2 ต้น ขาที่ พาร์ติชั่น จำนวน 6 อัน					1	0.0198	0.0198	0.0000			100%	0%	1		
10	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0200	0.0200	0.0000			100%	0%	1		
11	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 64 ซม. x ลึก 78 ซม. x สูง 115-121 ซม.					1	0.0050	0.0050	0.0000			100%	0%	1		
