


ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

Sum of ยอดเงินที่เหลือปี (ล้านบาท)Sum of รวมเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายแผนบูรณาการฯ

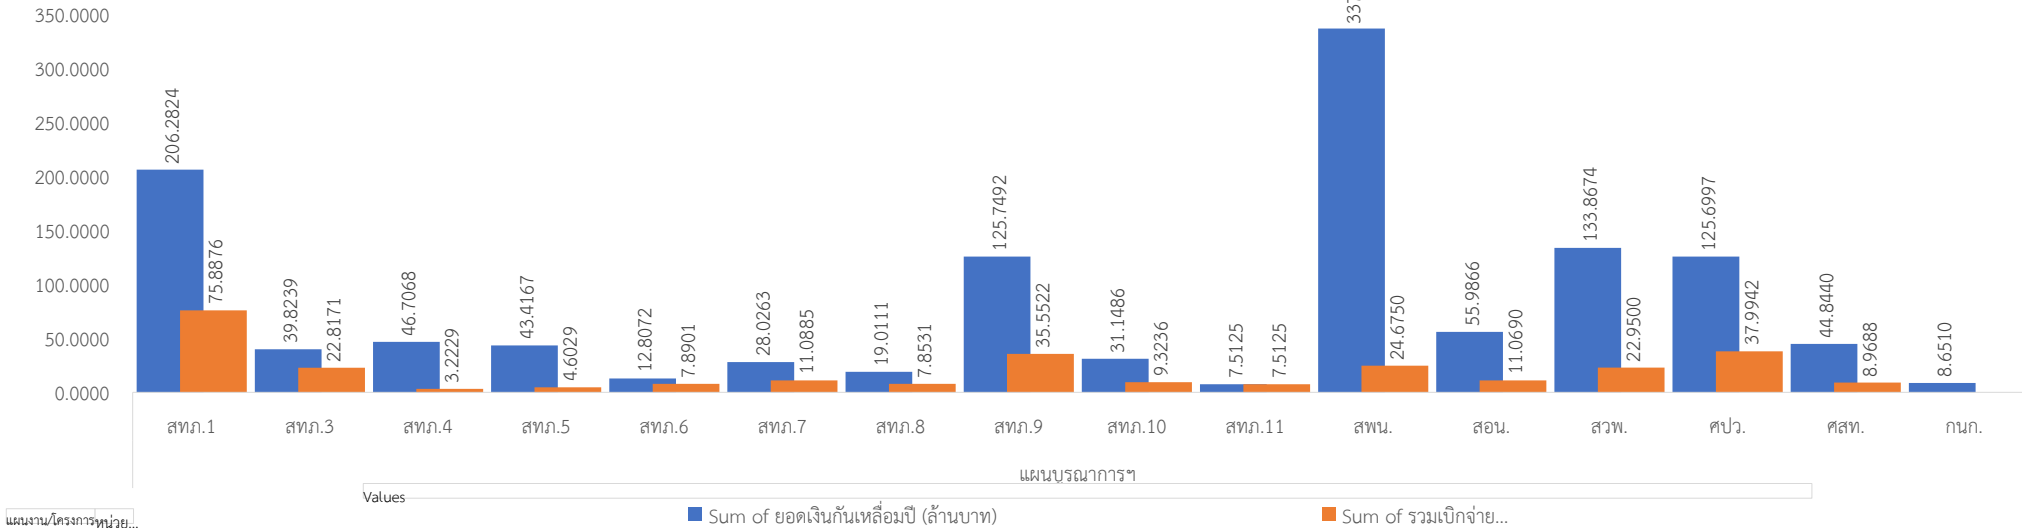

แผนงาน/โครงการหน่วย...


Sum of ยอดเงินที่เหลือปี (ล้านบาท)

Sum of รวมเบิกจ่าย...

แผนบูรณาการฯ																	
หน่วยงาน	รวม	สทก.1	สทก.3	สทก.4	สทก.5	สทก.6	สทก.7	สทก.8	สทก.9	สทก.10	สทก.11	สพน.	สอน.	สวพ.	ศปว.	ศสท.	กนก.
จำนวน (คก.)	129	38	11	8	9	5	5	4	19	2	2	12	4	2	6	1	1
แล้วเสร็จ (คก.)	38	12	7	2	2	3	2	2	5	1	2	0	0	0	0	0	0
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	91	26	4	6	7	2	3	2	14	1	0	12	4	2	6	1	1
ยอดเงินที่เหลือปี	1,266.5351	206.2824	39.8239	46.7068	43.4167	12.8072	28.0263	19.0111	125.7492	31.1486	7.5125	337.0018	55.9866	133.8674	125.6997	44.8440	8.6510
รวมเบิกจ่ายปี 2564	291.4075	75.8876	22.8171	3.2229	4.6029	7.8901	11.0885	7.8531	35.5522	9.3236	7.5125	24.6750	11.0690	22.9500	37.9942	8.9688	0.0000
ยอดเงินคงเหลือ	975.1276	130.3948	17.0068	43.4839	38.8138	4.9171	16.9378	11.1580	90.1970	21.8250	0.0000	312.3268	44.9176	110.9174	87.7054	35.8752	8.6510
ลดค้างงาน	0.7439	0.0346	0.0974	0.0000	0.0047	0.5130	0.0000	0.0000	0.0942	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงิน	23%	37%	57%	7%	11%	62%	40%	41%	28%	30%	100%	7%	20%	17%	30%	20%	0%

ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

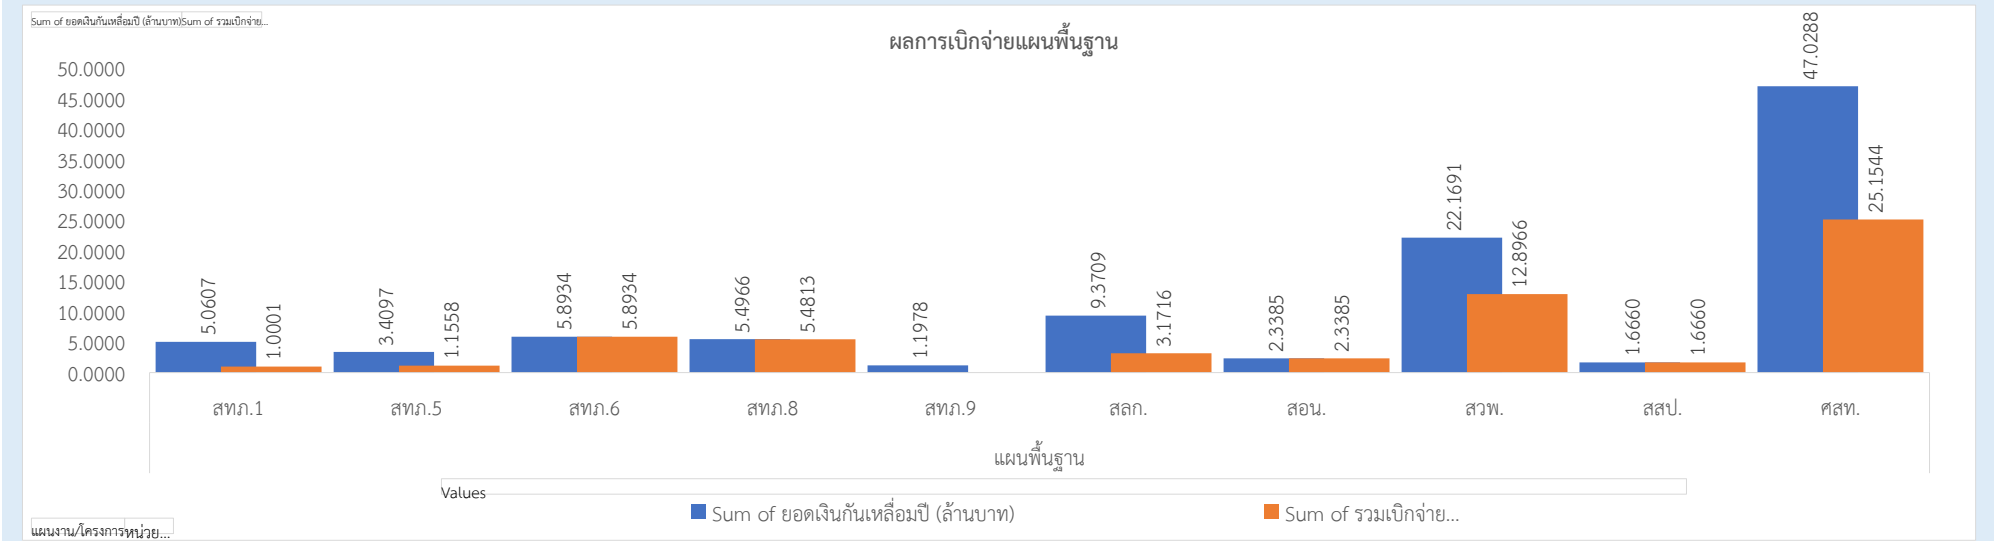

ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

แผนพื้นฐาน											
หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.5	สทท.6	สทท.8	สทท.9	สอน.	สสป.	สลก.	สวพ.	ศสท.
จำนวน (คก.)	29	1	1	4	3	1	1	1	11	2	4
แล้วเสร็จ (คก.)	20	0	0	4	3	0	1	1	9	0	2
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	9	1	1	0	0	1	0	0	2	2	2
ยอดเงินกันเหลือปี	103.6316	5.0607	3.4097	5.8934	5.4966	1.1978	2.3385	1.6660	9.3709	22.1691	47.0288
รวมเบิกจ่ายปี 2564	58.7577	1.0001	1.1558	5.8934	5.4813	0.0000	2.3385	1.6660	3.1716	12.8966	25.1544
ยอดเงินกันคงเหลือ	44.8738	4.0606	2.2539	0.0000	0.0153	1.1978	0.0000	0.0000	6.1993	9.2725	21.8744
ลดค้างงาน	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่าย เงินกัน	57%	20%	34%	100%	100%	0%	100%	100%	34%	58%	53%

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	39	211.3431	76.8877	134.4554	0.0346	0.0000	36%	87%	12	27	
1	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย แก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำ	ร่มโพธิ์ทอง หมู่แม่แฝก	สันทราย	เชียงใหม่		1	6.2971	3.9370	2.3601			63%	94%		1	
2	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่าง เก็บน้ำน้ำแวน ระยะ 2	ผาขาว หมู่ที่ 3	ทุ่งผาสุข	เชียงคำ	พะเยา	1	4.5640		4.5640			0%	64%		1	
3	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝาย น้ำสันแม่สะมาด	ป่าปู้ หมู่ที่ 2	ผาบ่อง	เมืองแม่ฮ่อง	แม่ฮ่องสอน	1	0.4625		0.4625			0%	90%		1	
4	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝาย น้ำสันทุ่งปงเรียน ระยะ 2		บ้านเอื้อม	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	11.5000	4.3328	7.1672			38%	70%		1	ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ใหม่ 21 มกราคม 2564
5	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะ 2		แม่งอน	ฝาง	เชียงใหม่	1	5.3847	4.3956	0.9891			82%	98%		1	
6	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำสันแม่ตืน พร้อมมระบบกระจายน้ำ	แม่แนต หมู่ที่ 8	แม่ตืน	ลี้	ลำพูน	1	0.4904	0.4904	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37		รอบเวียง	เมืองเชียงรา	เชียงราย	1	11.6533		11.6533			0%	52%		1	
8	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ ฉางข้าว	ฮ้างดำ หมู่ที่ 3	ป่าจั่ว	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	18.2945	8.0011	10.2934			44%	90%		1	
9	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ จากฝายน้ำล้นห้วยดั่ง	ป่าจี่ หมู่ที่ 3	ป่าไผ่	ลี้	ลำพูน	1	1.5283	1.5283	0.0000			100%	100%	1		
10	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลอง วังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ	วังตะกู หมู่ที่ 11	วังควง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	1	0.2340		0.2340			0%	98%		1	
11	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนอง กอง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองกอง หมู่ที่ 1	นาบ่อคำ	เมืองกำแพง	กำแพงเพชร	1	16.9150	7.6515	9.2635			45%	46%		1	
12	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองแขยง	สั๊กงาม หมู่ที่ 1	สั๊กงาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.5700	4.5373	0.0328	0.0328		99%	100%	1		แก้ไขแบบแปลนค่างานลดลง 32,760 บาท
13	สทภ.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงคลองลาน (บ้านสุข สวรรค์)	สุขสวรรค์ หมู่ที่ 1	คลองลาน	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	2.4800	2.4800	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
14	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝาย น้ำล้นแม่น้ำมะ	สันตันธง หมู่ที่ 1	ศรีดอนมูล	เชียงใหม่	เชียงราย	1	11.2998		11.2998			0%	87%		1	
15	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง		แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	10.3529	10.3529	0.0000			100%	100%	1		
16	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบการกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 1	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	5.1699		5.1699			0%	90%		1	หยุดงานแก้ไขแบบแปลน
17	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว	อ่างด้า หมู่ที่ 3	ป่าจี้	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	2.8024		2.8024			0%	97%		1	
18	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการ หลวงแม่หลอด	แม่หลอดเหนือ	สบเปิง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	3.0032		3.0032			0%	100%		1	ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ใหม่ 4 มค. 64 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
19	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการ หลวงหนองเขียว	ใหม่สามัคคี หมู่ 1	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	2.1000		2.1000			0%	100%		1	ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ใหม่ 4 มค. 64 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
20	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝาย น้ำล้นแม่เย็น	แสนตอ หมู่ที่ 1	ร่องเคาะ	วังเหนือ	ลำปาง	1	15.4327	5.1075	10.3252			33%	91%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
21	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย บวกหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่	หนองบัวเห	เมืองตาก	ตาก	1	0.0831		0.0831			0%	98%		1	
22	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบ โครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านผาผึ้ง)	ผาผึ้ง หมู่ที่ 6	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	20.3770		20.3770			0%	25%		1	เนื่องจากอุทยานฯ ขอแก้ไข แนวท่อส่งน้ำใหม่จึงทำให้ ต้องแก้แบบใหม่ และจัดทำ โครงการร่วมกับอุทยาน แห่งชาติคลองวังเจ้า คาดว่า จะสามารถเข้าดำเนินการได้ ในวันที่ 15 มิ.ย. 63
23	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านศรีคีรีรักษ์) ระยะ 2	ศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	1.0257	1.0238	0.0019	0.0019		100%	100%	1		แก้ไขแบบแปลนค่างานลด 1,592 บาท อยู่ระหว่างขยาย ระยะเวลา (เนื่องจากติดโค วิด)
24	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบ โครงการหลวงสบเมย (บ้านห้วยน้ำ ใส) ระยะ 2	ห้วยน้ำใส หมู่ที่	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	2.4605		2.4605			0%	95%		1	
25	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยชมพู หมู่ที่	แม่แตง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	8.4069		8.4069			0%	85%		1	หยุดงานโควิด

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
26	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิต การเกษตรบ้านปางเพื่อง ตำบลปิง โค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่	ปางเพื่อง	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	6.4056	4.3547	2.0509			68%	90%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63
27	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยงูใน หมู่ที่ 5	สันทราย	ฝาง	เชียงใหม่	1	2.4727	1.7948	0.6779			73%	99%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63
28	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโป่งถีบ บ้านโป่งถีบใน บ้านท่าสะแล ตำบล เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	โป่งถีบ,โป่งถีบใน	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.9322	3.2712	0.6609			83%	99%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63
29	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่มาวหนองบัว บ้านหัวนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	แม่มาวหนองบัว	ม่อนปิ่น	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.7740	2.5923	1.1817			69%	99%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
30	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองสละ บ้านเชียงหมั่น หมู่ที่ 5 ตำบลศรีตง เย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เชียงหมั่น หมู่ที่ 5	ศรีตงเย็น	ไชยปราการ	เชียงใหม่	1	1.1834	1.1834	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63
31	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระทุ่งโป่ง บ้านขอเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้าน ขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขอเหนือ หมู่ที่ 9	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.7106	1.7106	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63
32	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้าน ม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้าน ขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ม่วง หมู่ที่ 8	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.0451	1.0451	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63
33	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้าน สบลี บ้านสบลี หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัด ลำปาง	สบลี หมู่ที่ 6	แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.7000		4.7000			0%	98%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
34	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองกำ เกาะ บ้านท่าไม้ ตำบลแม่ปุ อำเภอ แม่พริก จังหวัดลำปาง	ท่าไม้	แม่ปุ	แม่พริก	ลำปาง	1	3.5646	3.5646	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63
35	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บ น้ำแปลงหญ้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง	ต้นผึ้ง หมู่ที่ 5	ใหม่พัฒนา	กะคา	ลำปาง	1	2.0345	2.0345	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63
36	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง		แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.1735		4.1735			0%	31%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย.63
37	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ละ อุป (โครงการพลิกฟื้นผืนป่า) บ้าน แม่ละอุป หมู่ที่ 3 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด เชียงใหม่	บ้านแม่ละอุป	แจ่มหลวง	กัลยาณิวัฒนา	เชียงใหม่	1	0.4980	0.4980	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 13 แล้ว จำนวน 18 รายการ งปม. 0.4993 ลบ. * ค่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/1411 ลว 10 ก.ค. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
38	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองครก หลวง บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		วิเชตนคร	แจ้ห่ม	ลำปาง	1	3.9000		3.9000			0%	17%		1	
39	สทท.1	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ สำรวจอุทกวิทยาที่ 6 (แม่สะเรียง) พร้อมถนนภายในสำนักงานและรั้ว บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้าน กาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	ท่าข้าม หมู่ที่ 1	บ้านกาศ	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	5.0607	1.0001	4.0606			20%	83%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	11	39.8239	22.8171	17.0068	0.0974	0.1098	57%	80%	7	4	
1	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์บ้านน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระ แม่ของแผ่นดิน	น้ำหมัน หมู่ที่ 1	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	5.8756	2.4790	3.3966			42%	60%		1	
2	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์บ้านกกจาน สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระ แม่ของแผ่นดิน	กกจาน หมู่ที่ 7	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	2.5791		2.5791			0%	75%		1	
3	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียน บ้านนาดี พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี	นาดี หมู่ที่ 1	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3899	2.3709	0.0190	0.0190	0.1004	99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
4	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน โพธิ์โพศาลวิทยา พร้อมระบบกระจาย น้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	โพธิ์โพศาล หมู่ที่ 1	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.0328	2.0270	0.0058	0.0058		100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
5	สทภ.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียน บ้านห้วยกอกหนองเค็ม พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี	หนองเค็ม หมู่ที่	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3980	2.3618	0.0362	0.0362	0.0094	98%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
6	สทภ.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านม่วง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา	ม่วง หมู่ที่ 5,10	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	7.1422	7.0904	0.0518			99%	100%	1		6/1/64 ดำเนินการและ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ลดค่างาน 0.0518 ลบ.
7	สทภ.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้าน บอน สหราษฎร์อุทิศ สนับสนุน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี	บอน หมู่ที่ 3	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.2058	2.2058	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้าน แก่งคำประชาสามัคคี สนับสนุน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี	แก่งท่าลับ หมู่ที่ ๑	อุมจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	1.9200	1.9024	0.0176	0.0176		99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
9	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์เรียนรู้คน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพระ ตำริบ้านห้วยเตย	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหว้า	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.9785		1.9785			0%	32%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
10	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝึกอาชีพ เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัด พัชรกิตติยาภิราม)	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหว้า	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.7900	1.7712	0.0188	0.0188		99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
11	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระ แม่ของแผ่นดิน	หมากแข้ง หมู่ที่ 1	กอกะทอง	ด่านซ้าย	เลย	1	9.5120	0.6086	8.9034			6%	15%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	8	46.7068	3.2229	43.4839	0.0000	0.0616	7%	75%	2	6	
1	สทภ.4	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูทดแคน พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมากยาง	สามขา	โพธาราย	ร้อยเอ็ด	1	10.3955		10.3955			0%	49%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
2	สทภ.4	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคกกลาง พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	หนองศาลา	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1	5.6030		5.6030			0%	56%		1	แจ้งเร่งรัดงานแล้ว 3 ครั้ง
3	สทภ.4	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพง	แพง หมู่ที่ 11	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.2189		5.2189			0%	67%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
4	สทภ.4	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง	หมู่ที่ 6, 7, 8, 9	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	5.8217		5.8217			0%	81%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
5	สทภ.4	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยแย้	จอมศรี หมู่ที่ 2	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	14.0555		14.0555			0%	58%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
6	สทภ.4	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคา พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 1	สาวแห	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	1	2.3277		2.3277			0%	90%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) กองพลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุน โครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ใน พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	ค่ายเปรมติณสูลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	2.2000	2.1692	0.0308		0.0308	99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
8	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 2) กองพลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุน โครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ใน พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	ค่ายเปรมติณ สูลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	1.0845	1.0537	0.0308		0.0308	97%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)											
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
							รวม	10	46.8264	5.7587	41.0677	0.0047	0.0000	12%	70%	2	8		
1	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิง พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.-สธ.)	จัว หมู่ที่ 10	คูขาด	คง	นครราชสีมา	1	2.3786	2.3738	0.0047	0.0047		100%	100%	1		ลดค่างาน 4,734.96 บาท	
2	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำรินใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	กระเจา หมู่ที่ 7	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	1	0.2882		0.2882			0%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน	
3	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทำนบเสียว (ช่วง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	ตะเคียน หมู่ที่ 1	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.3050		4.3050			0%	70%		1	ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง	
4	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโกรก รกฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	ดอนพัฒนา หมู่	คง	อิจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	1	14.9718	1.0012	13.9707			7%	41%		1	อยู่ระหว่างทำเรื่องหยุด เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
5	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบุมะค่า	บุมะค่า	มาบตะโกเอ	ครบุรี	นครราชสีมา	1	2.9556		2.9556			0%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
6	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อม ระบบส่งน้ำ	หมู่ที่ 4,6	ต้งใจ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	12.5644		12.5644			0%	63%		1	งานล่าช้าเนื่องจากคนงาน น้อยทำให้งานล่าช้ากว่าแผน
7	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่าง เก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	โนนสง่า หมู่ที่ 2	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	4.2243		4.2243			0%	73%		1	แจ้งเดือนการปรับ/หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.63
8	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (หลังปรับแผน โอนเปลี่ยนแปลง)	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	หนองพลวง หมู่	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	1.2288	1.2279	0.0009			100%	100%	1		เบิกจ่าย 99.99 % ตาม ยอดเงิน

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทภ.5	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อบริหาร จัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกัน อย่างเป็นระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำลำ เชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา สำนักงานทรัพยากร น้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา		หนองบัวศาลา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1	0.5000		0.5000			0%	0%		1	
10	สทภ.5	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมจุใต้ จำนวน 100 คน เลขที่ 47 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		หนองบัวศาลา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1	3.4097	1.1558	2.2539			34%	51%		1	แรงงานมีน้อย สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.63 แจ้งสงวนสิทธิ์ ครั้งที่ 3

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	9	18.7006	13.7835	4.9171	0.5130	0.0131	74%	100%	7	2	
1	สทภ.6	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูศูนย์วิจัยกรมปศุสัตว์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0009	2.2595	0.7415			75%	100%		1	1. อยู่ระหว่างการปรับ (ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63) 2. ห้างฯ ส่งงานวันที่ 30 ธ.ค. 63 3. อยู่ระหว่างการตรวจรับ งาน
2	สทภ.6	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระประปา โรงพยาบาลกบินทร์บุรี พร้อม ระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 8	กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7579	1.7579	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทภ.6	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.6626		3.6626			0%	98%		1	อยู่ระหว่างการปรับ (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 63)
4	สทภ.6	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 4	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0382	2.5252	0.5130	0.5130		83%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทภ.6	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหลัง ต้นน้ำภูไท	หมู่ที่ 13	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	1	1.3475	1.3475	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
6	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนบริหาร จัดการน้ำ บ้านไผ่เสวก ตำบลบาง แก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	ไผ่เสวก	บางแก้ว	เมืองฉะเชิงเ	ฉะเชิงเทรา	1	3.8666	3.8666	0.0000		0.0131	100%	100%	1		
7	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลอง เวฬุ หมู่ที่ 4 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	หมู่ที่ 4	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	1	1.8808	1.8808	0.0000			100%	100%	1		
8	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าบ้านนายาว (อ่างเก็บน้ำวรารุท) หมู่ที่ 15 ตำบล ท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		
9	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าบ้านคลองเตย (อ่างเก็บน้ำจตุพร) หมู่ที่ 21 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัย เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	28.0263	11.0885	16.9378	0.0000	0.0000	40%	79%	2	3	
1	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนอง ข่อย ช่วง 2	หมู่ที่ 9	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	9.4787	5.3209	4.1578			56%	98%		1	ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเก็บงาน
2	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3	ไร่ หมู่ที่ 6	ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	2.5470	2.5470	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยตาเมือง	โป่งเกตุบน หมู่ 1	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	3.2206	3.2206	0.0000			100%	100%	1		
4	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี		โพพระ	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	1	9.7900		9.7900			0%	0%		1	อยู่ระหว่างรอสำนักงานเจ้า ท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อนุญาตให้ใช้พื้นที่
5	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การ ทำนาอย่างอัจฉริยะ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี		นางบวช	เดิมบางนาง	สุพรรณบุรี	1	2.9900		2.9900			0%	95%		1	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้างที่ตั้งแผงโซล่าเซลล์ และก่อสร้างโรงสูบน้ำ งาน ดาดคอนกรีต งานก่อสร้างบันได

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	7	24.5077	13.3344	11.1734	0.0153	0.0000	54%	81%	5	2	
1	สทภ.8	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำโพธิ์ทอง		กะลวอเหนือ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	4.1605	4.1605	0.0000			100%	100%	1		
2	สทภ.8	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลอง บ่วงช้าง	โคกวา หมู่ที่ 7	นาโหนด	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	2.7430		2.7430			0%	65%		1	
3	สทภ.8	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลอง สะพานดำ		ยูโป	เมือง	ยะลา	1	3.6926	3.6926	0.0000			100%	100%	1		
4	สทภ.8	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่ายสมทบ เพิ่มเติม)	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนอง ลาด	หนองลาด	นาไม้ไผ่	ทุ่งสง	นครศรีธรรม	1	8.4150		8.4150			0%	2%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 2 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบปม. 4.9850 ลบ. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/723 ลว 3 เม.ย. 63
5	สทภ.8	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำฟาร์ม ตัวอย่าง ช่วง 2 บ้านรอดันบาตู ตำบลกะลวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส		กะลวอ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	2.5900	2.5900	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
6	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 1-2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลึง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	หมู่ที่ 6	ควนลึง	หาดใหญ่	สงขลา	1	1.3176	1.3023	0.0153	0.0153		99%	100%	1		
7	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อน ส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น บ้านบ่อจิก หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	บ่อจิก หมู่ที่ 9	บางจาก	เมืองนครศรี	นครศรีธรรม	1	1.5890	1.5890	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	20	126.9470	35.5522	91.3948	0.0942	0.0000	28%	76%	5	15	
1	สทภ.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร		วัดขวาง	โพทะเล	พิจิตร	1	12.6509	1.7357	10.9152			14%	75%		1	1) ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการมี ปริมาณน้ำมาก ตามหนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง (สนง.ใหญ่) อส. 410/2563 ลว 20 ต.ค. 2563 2) หยุดงาน ตามหนังสือ ทส 0624.3/1536 ลว 9 พ.ย. 2563 3) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง (สนง.ใหญ่) อส. 485/2563 ลว 3 ธ.ค. 2563

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
2	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร วัดบาง คลาน-แม่น้ำยม		บางคลาน	โพทะเล	พิจิตร	1	8.1113		8.1113			0%	95%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ โครงการ ตามหนังสือ ทส 0624.3/1470 ลว 15 ต.ค. 2563 2) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัท แอล.พี. พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด LCC. พทล.2563/023 ลว 27 พ.ย. 2563
3	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนอง จระเข้-หนองแม่ระวิง		สารจิตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	5.1198	5.1198	0.0000			100%	12%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย ของเงิน กันฯ ปี 2564
4	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำครกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำปัว	เวียงสา	น่าน	1	4.6291	1.7868	2.8424			39%	72%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากประชาชนขอใช้น้ำ เพื่อการเกษตร ตามหนังสือ ทส 0624.3/1452 ลว 14 ต.ค. 2563
5	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ		ย่านยาว	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	12.0745	12.0736	0.0009	0.0015		100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
6	สทภ.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	น้ำแพะ หมู่ที่ 6	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.8930		1.8930			0%	72%		1	
7	สทภ.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	ศรีบุญเรือง หมู่ 4	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	2.2196		2.2196			0%	65%		1	
8	สทภ.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	ปางปุก หมู่ที่ 2	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	1.6351		1.6351			0%	100%		1	อยู่ระหว่างส่งงาน
9	สทภ.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	เขตวัน หมู่ที่ 1	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	2.1670		2.1670			0%	73%		1	
10	สทภ.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	น้ำลีใต้ หมู่ที่ 8	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.7283		1.7283			0%	85%		1	
11	สทภ.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	นาเลา หมู่ที่ 3	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.4262	1.4262	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
12	สทภ.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบ กระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงแม่จริม	ก้อ หมู่ที่ 3	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	8.5335	1.3623	7.1713			16%	62%		1	อยู่ระหว่างการขออนุญาต หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ และหยุดงาน

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
13	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชื่อมต่อ โครงข่ายน้ำปิงน้อย-ปิงน้ำด้วน	หมู่ที่ 1,2	ไร่อ้อย	พิชัย	อุตรดิตถ์	1	21.1410	5.4353	15.7057			26%	84%		1	
14	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจระเข้		สารจิตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	23.1762		23.1762			0%	0%		1	1) ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน/ ค่าปรับเกินงบประมาณ 2) ผู้รับจ้างขอปรับ แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง ตาม หนังสือ บริษัทกฤษฎดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ KRD/63/045 ลว 2 ธ.ค. 63
15	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง	โป่งคำ หมู่ที่ 5	ตู่พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.5952		1.5952			0%	100%		1	อยู่ระหว่างส่งงาน
16	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง	แทน 3	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	2.0845	1.9918	0.0927	0.0927		96%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
17	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง	ละแบ๋ยาว	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.3101	0.3101	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
18	สทก.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเหนือตอนล่าง กองทัพภาคที่ 3		อรัญญิก	เมือง	พิษณุโลก	1	7.0980	1.9752	5.1228			28%	63%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งบม. 17.6000 ลบ. ด่วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลว. 13 เม.ย.63
19	สทก.9	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ พิษณุโลก		หนองกะท้าน	นครไทย	พิษณุโลก	1	8.1560	2.3355	5.8205			29%	62%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งบม. 17.6000 ลบ. ด่วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลว. 13 เม.ย.63
20	สทก.9	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงอาคารที่จอดรถจากอาคาร บังคับน้ำดงเศรษฐี ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		ย่านยาว	เมือง	พิจิตร	1	1.1978		1.1978			0%	100%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 14 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบม. 1.1978 ลบ. * ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/1838 ลว 2 ก.ย. 63 - เลขที่สัญญา สทก.9 15/2564 ลว 2 พ.ย. 2563 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	2	31.1486	9.3236	21.8250	0.0000	0.0000	30%	57%	1	1	
1	สทภ.10	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองบางรีน	หมู่ที่ 2	บางรีน	เมืองระนอง	ระนอง	1	21.8250		21.8250			0%	13%		1	1.บริหารสัญญา มีหนังสือแจ้ง เตือนผู้รับจ้างแล้ว 2 ครั้ง อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ย. 2563 2.แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 แก้ไข รูปแบบรายการก่อสร้าง มีค่า งาน และระยะเวลาเพิ่ม เป็น สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ก.พ. 2564
2	สทภ.10	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคูด้วน		สวนขัน, ละ	ช้างกลาง,ฉะ	นครศรีธรรม	1	9.3236	9.3236	0.0000			100%	100%	1		โครงการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	2	7.5125	7.5125	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สทท.11	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านไหล่ทุ่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไหล่ทุ่งพัฒนาห	ไหล่ทุ่ง	ตระการพืช	อุบลราชธานี	1	4.5561	4.5561	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.11	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย ก้านเหลือง	หมู่ที่ 8	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1	2.9564	2.9564	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	12	337.0018	24.6750	312.3268	0.0000	0.0000	7%	30%	0	12	
1	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนา แซง		บ้านโคก	โคกโพธิ์ชัย	ขอนแก่น	1	14.4726		14.4726			0%	56%		1	
2	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย หนองหาร		ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1	22.7260		22.7260			0%	43%		1	
3	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนอง หวาย	ทุ่งมั่ง	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1	75.6500	12.0636	63.5864			16%	32%		1	
4	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนอง ไกรเกรง คลองไกรเกรง พร้อม ระบบกระจายน้ำ		ท่าผ่อ	เมืองพิจิตร	พิจิตร	1	37.3252		37.3252			0%	30%		1	
5	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจั่ว พร้อม ระบบกระจายน้ำ		ไผ่ล้อม	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	1	47.4300	4.1984	43.2316			9%	25%		1	
6	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุด เรือคำ		ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1	45.6336		45.6336			0%	26%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา แหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจาย น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนในตำบล อ่างทอง, ตำบลน้ำแวน อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	23.3100	3.8850	19.4250			17%	48%		1	
8	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำ พื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	23.3815	1.2990	22.0826			6%	24%		1	
9	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	20.1788	1.1210	19.0577			6%	24%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
10	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	20.3940	1.1330	19.2610			6%	24%		1	
11	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดนา แซง จังหวัดขอนแก่น กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.5000	0.5250	2.9750			15%	15%		1	
12	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเรือ คำ จังหวัดนครพนม กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.0000	0.4500	2.5500			15%	15%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	5	58.3251	13.4075	44.9176	0.0000	0.0000	23%	41%	1	4		
1	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง)		มะเฟือง,บ้าน	พุทไธสง	บุรีรัมย์	1	8.6753		8.6753			0%	26%		1	
2	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สํารวจออกแบบและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำ ระบบกระจายน้ำภายในพื้นที่ อุทยานไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.7388	2.7025	7.0363			28%	16%		1	
3	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และจัดทำระบบการบริหารงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการนำ ร่องพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฝั่งตะวันออกตอน ใต้ (อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.6000	4.8000	4.8000			50%	46%		1	
4	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สํารวจออกแบบและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัด สกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	27.9725	3.5665	24.4060			13%	16%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
5	สอน.	แผนงานพื้นฐาน	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 450 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.3385	2.3385	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ 100 %

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินง า น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	4	156.0364	35.8466	120.1898	0.0000	0.0000	23%	57%	0	4	
1	สวพ.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายสถานีอุทกวิทยา เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	30.5924		30.5924			0%	10%		1	กำหนดตรวจรับการจ้าง งวดที่ 2 วันที่ 6 ม.ค. 64
2	สวพ.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	โครงการติดตั้งระบบเตือนภัย ล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ ลาดชันและ พื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	103.2750	22.9500	80.3250			22%	69%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 2 แล้ว เสร็จ ตามหนังสือ สวพ. ด่วน มาก ที่ ทส.0608.4/3044 ลว. 25 ธ.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว
3	สวพ.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.2000	11.2000	8.0000			58%	77%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 3 แล้ว เสร็จ ตามหนังสือ สวพ.ที่ ทส.0608.4/2995 ลว. 9 ธ.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว
4	สวพ.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อ การบริหารจัดการน้ำ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.9691	1.6966	1.2725			57%	70%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 3 แล้ว เสร็จ ตามหนังสือ ที่ ทส. 0608.4/3075 ลว.24 ธ.ค.63 และขออนุมัติเบิกจ่ายตาม หนังสือที่ ทส.0601.5/2050 ลว.29 ธ.ค. 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	6	125.6997	37.9942	87.7054	0.0000	0.0000	30%	81%	0	6	
1	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบ ตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่ง น้ำขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรม ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	49.8381	14.6583	35.1798			29%	80%		1	
2	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 1 กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไทกรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	18.5972		18.5972			0%	73%		1	
3	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ติดตามสถานการณ์น้ำทางไกล อัตโนมัติ (ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.9025	4.9513	4.9513			50%	87%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
4	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ติดตามสถานการณ์น้ำทางไกล อัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละ วิน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญา ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	21.6374	10.8187	10.8187			50%	86%		1	
5	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบ ตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่ง น้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.9291	3.8027	9.1265			29%	80%		1	
6	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบ ตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่ง น้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.7955	3.7634	9.0321			29%	80%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	91.8728	34.1232	57.7496	0.0000	0.0000	37%	84%	2	3	
1	ศสท.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ DWR Data Cleansing กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	44.8440	8.9688	35.8752			20%	22%		1	* ได้อนุมัติใช้เหลือจ่ายแล้ว จำนวนรวม 4 รายการ งบม. 92.4068 ลบ. * ส่วนที่สุด นร 0718/14158 ลว. 23 มี.ย.63
2	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการบำรุงรักษาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	7.2000	7.2000	0.0000			100%	100%	1		
3	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.4725	2.9850	2.4875			55%	100%		1	
4	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.3869		19.3869			0%	100%		1	
5	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการระบบและบริการภูมิ สารสนเทศกลาง (DWR GIS System)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	14.9694	14.9694	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	1	8.6510	0.0000	8.6510	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
1	กนก.	แผนงานบูรณา การบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษาและยกร่างอนุ บัญญัติที่ออกตามร่าง พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ในส่วนที่อยู่ในหน้าที่และ อำนาจ และภารกิจของกรม ทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การจัดสรร น้ำและการใช้น้ำ)		ยุโป	เมือง	ยะลา	1	8.6510		8.6510			0%	0%		1	* ได้อนุมัติครั้งที่ 9 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบม. 10.1776 ลบ. * ค่วนที่สุด ที่ นร 0718/12292 ลว. 27 พ.ค.63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	1	1.6660	1.6660	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
1	สสป.	แผนงานพื้นฐาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	1.6660	1.6660	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงา น	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	11	9.3709	3.1716	6.1993	0.0000	0.0000	34%	90%	9	2	
1	สลก.	แผนงานพื้นฐาน	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	3.2258	2.9357	0.2901			91%	91%		1	* พรบ.โอนคืน จำนวน 4,008,200 บาท ทส 0604.3/ว835 ลว 23 เม.ย.63
2	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (แก้ไขประเภท รายการ)	ลิฟต์โดยสาร พร้อมติดตั้ง อาคาร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.9092	0.0000	5.9092			0%	0%		1	
3	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 63 ซม. x สูง 90 ซม.					1	0.0252	0.0252	0.0000			100%	100%	1		
4	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด กว้าง 160 ซม. x ลึก 80 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ข้าง ขนาด กว้าง 120 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ลิ้นชัก ขนาด กว้าง 40 ซม. x ลึก 48 ซม. x สูง 52 ซม.					1	0.0236	0.0236	0.0000			100%	100%	1		
5	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 65 ซม. x ลึก 62 ซม. x สูง 115 ซม.					1	0.0049	0.0049	0.0000			100%	100%	1		
6	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 93 ซม.					1	0.1134	0.1134	0.0000			100%	100%	1		
7	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง 68 ซม. x ลึก 76 ซม. x สูง 120 ซม.					1	0.0140	0.0140	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/ โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผล การ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0100	0.0100	0.0000			100%	100%	1		
9	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	พาร์ทิชั่นจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบบทึบล้วน ขนาด 100 ซม. x 160 ซม. จำนวน 4 แผ่น เสาพาร์ทิชั่น ขนาด กว้าง 5.5 ซม. x 160 ซม. จำนวน 2 ต้น ขา ที่ พาร์ทิชั่น จำนวน 6 อัน					1	0.0198	0.0198	0.0000			100%	100%	1		
10	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0200	0.0200	0.0000			100%	100%	1		
11	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 64 ซม. x ลึก 78 ซม. x สูง 115-121 ซม.					1	0.0050	0.0050	0.0000			100%	100%	1		
