


ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

Sum of ยอดเงินที่เหลือปี (ล้านบาท)Sum of รวมเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายแผนบูรณาการฯ

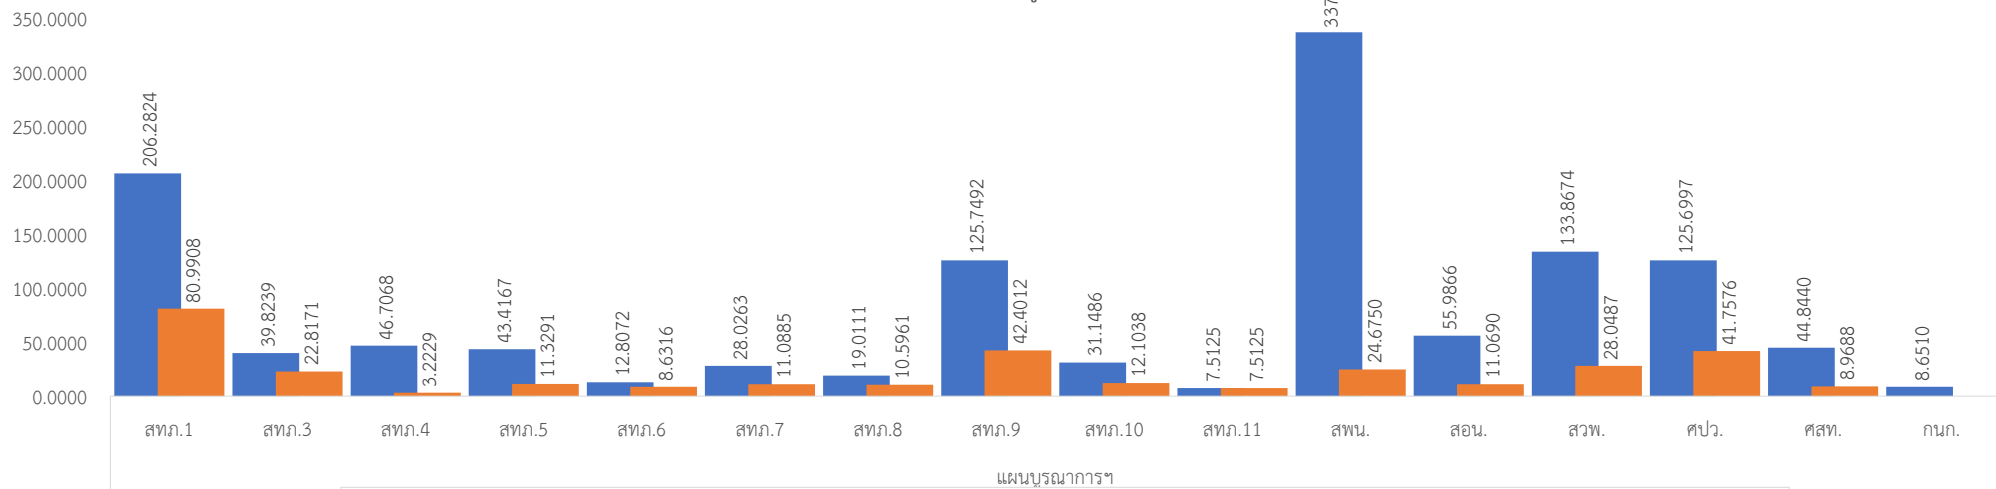

แผนงาน/โครงการหน่วย...

Sum of ยอดเงินที่เหลือปี (ล้านบาท)

Sum of รวมเบิกจ่าย...


แผนบูรณาการฯ																	
หน่วยงาน	รวม	สทก.1	สทก.3	สทก.4	สทก.5	สทก.6	สทก.7	สทก.8	สทก.9	สทก.10	สทก.11	สพน.	สอน.	สวพ.	สปว.	ศสท.	กนก.
จำนวน (คก.)	129	38	11	8	9	5	5	4	19	2	2	12	4	2	6	1	1
แล้วเสร็จ (คก.)	44	14	7	2	4	4	2	3	5	1	2	0	0	0	0	0	0
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	85	24	4	6	5	1	3	1	14	1	0	12	4	2	6	1	1
ยอดเงินที่เหลือปี	1,266.5351	206.2824	39.8239	46.7068	43.4167	12.8072	28.0263	19.0111	125.7492	31.1486	7.5125	337.0018	55.9866	133.8674	125.6997	44.8440	8.6510
รวมเบิกจ่ายปี 2564	325.2127	80.9908	22.8171	3.2229	11.3291	8.6316	11.0885	10.5961	42.4012	12.1038	7.5125	24.6750	11.0690	28.0487	41.7576	8.9688	0.0000
ยอดเงินคงเหลือ	941.3224	125.2916	17.0068	43.4839	32.0876	4.1756	16.9378	8.4150	83.3480	19.0448	0.0000	312.3268	44.9176	105.8186	83.9421	35.8752	8.6510
ลดค้างงาน	0.7958	0.0346	0.1492	0.0000	0.0047	0.5130	0.0000	0.0000	0.0942	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงิน	26%	39%	57%	7%	26%	67%	40%	56%	34%	39%	100%	7%	20%	21%	33%	20%	0%

ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

Sum of ยอดเงินกันเหลือปี (ล้านบาท)Sum of รวมเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายแผนพื้นฐาน

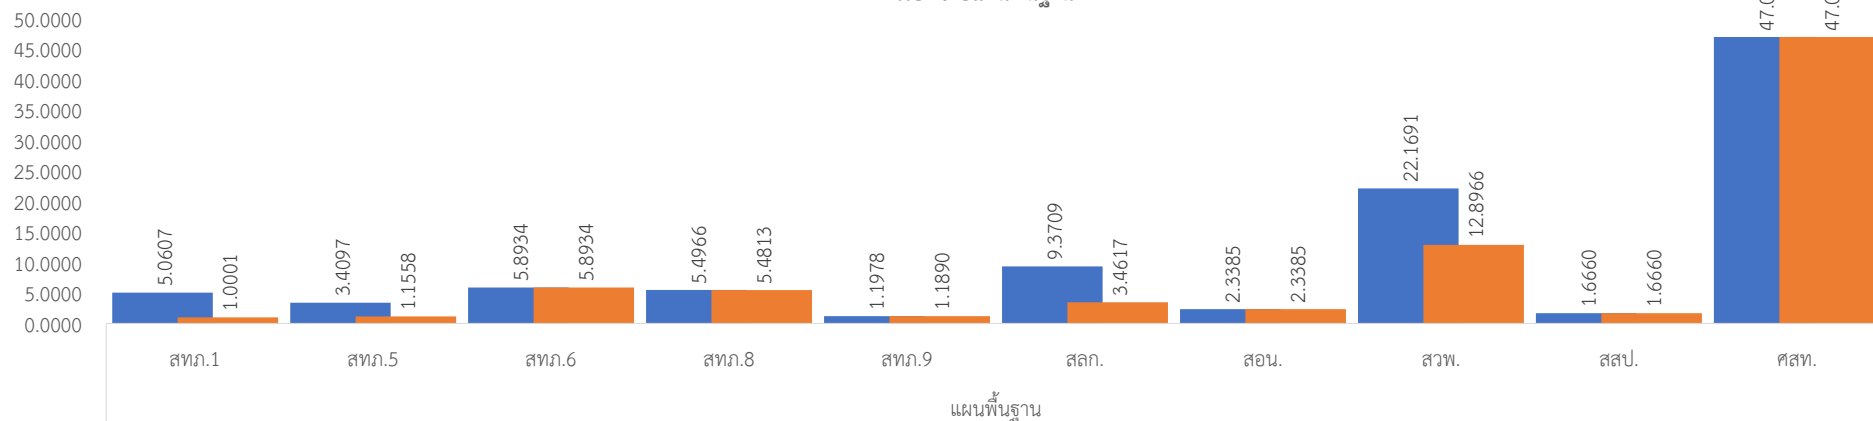

Values

■ Sum of ยอดเงินกันเหลือปี (ล้านบาท)

■ Sum of รวมเบิกจ่าย...

แผนงาน/โครงการหน่วย...

แผนพื้นฐาน											
หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.5	สทท.6	สทท.8	สทท.9	สอน.	สสป.	สลก.	สวพ.	ศสท.
จำนวน (คก.)	29	1	1	4	3	1	1	1	11	2	4
แล้วเสร็จ (คก.)	24	0	0	4	3	1	1	1	10	0	4
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	5	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0
ยอดเงินกันเหลือปี	103.6316	5.0607	3.4097	5.8934	5.4966	1.1978	2.3385	1.6660	9.3709	22.1691	47.0288
รวมเบิกจ่ายปี 2564	82.1113	1.0001	1.1558	5.8934	5.4813	1.1890	2.3385	1.6660	3.4617	12.8966	47.0288
ยอดเงินกันคงเหลือ	21.5203	4.0606	2.2539	0.0000	0.0153	0.0088	0.0000	0.0000	5.9092	9.2725	0.0000
ลดค้างงาน	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่าย เงินกัน	79%	20%	34%	100%	100%	99%	100%	100%	37%	58%	100%

ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	39	211.3431	81.9909	129.3522	0.0346	0.0000	39%	87%	14	25		
1	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำ	ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3	แม่แฝก	สันทราย	เชียงใหม่	1	6.2971	3.9370	2.3601			63%	94%		1	
2	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บ น้ำน้ำแวน ระยะ 2	ผาฮาว หมู่ที่ 3	ทุ่งผาสุข	เชียงคำ	พะเยา	1	4.5640		4.5640			0%	64%		1	ขยายสัญญาจ้าง เนื่องจากแก้ไข แบบแปลน
3	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นแม่สะมาด	ป่าปี หมู่ที่ 2	ผาป่อง	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1	0.4625		0.4625			0%	90%		1	ขยายสัญญาจ้าง เนื่องจากแก้ไข แบบแปลน
4	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นทุ่งปงเรียน ระยะ 2		บ้านเอื้อม	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	11.5000	4.3328	7.1672			38%	70%		1	ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ใหม่ 21 มกราคม 2564
5	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะ 2		แม่งอน	ฝาง	เชียงใหม่	1	5.3847	4.3956	0.9891			82%	98%		1	
6	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นแม่ตืน พร้อมระบบกระจายน้ำ	แม่แตด หมู่ที่ 8	แม่ตืน	ลี้	ลำพูน	1	0.4904	0.4904	0.0000			100%	100%	1		
7	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใน พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37		รอบเวียง	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	11.6533		11.6533			0%	52%		1	อยู่ระหว่างขออนุญาตหยุดงาน เนื่องจากการมีการแก้ไขแบบแปลน
8	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่อาจ ข้าว	ฮ้างตำ หมู่ที่ 3	ป่าจั่ว	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	18.2945	8.0011	10.2934			44%	90%		1	
9	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ จากฝายน้ำล้นห้วยตั้ง	ป่าจี้ หมู่ที่ 3	ป่าไผ่	ลี้	ลำพูน	1	1.5283	1.5283	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
10	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวัง น้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ	วังตะกู หมู่ที่ 11	วังคอง	พราณกระดำ	กำแพงเพชร	1	0.2340		0.2340		0%	98%		1	หยุดงานอยู่ระหว่างขออนุญาต ปลูกป่าทดแทน	
11	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนอง กอง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองกอง หมู่ที่	นาบ่อคำ	เมืองกำแพง	กำแพงเพชร	1	16.9150	7.6515	9.2635		45%	46%		1		
12	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองแยง	สีกงาม หมู่ที่ 1	สีกงาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.5700	4.5373	0.0328	0.0328		99%	100%	1		แก้ไขแบบแปลนค่างานลดลง 32,760 บาท
13	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงคลองลาน (บ้านสุขสวรรค์)	สุขสวรรค์ หมู่ที่	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	2.4800	2.4800	0.0000		100%	100%	1			
14	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นแม่น้ำมะ	สันตันธง หมู่ที่ 2	ศรีดอนมูล	เชียงแสน	เชียงราย	1	11.2998		11.2998		0%	87%		1		
15	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง		แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	10.3529	10.3529	0.0000		100%	100%	1			
16	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบการกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	ห้วยก้างปลา หมู่	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	5.1699		5.1699		0%	90%		1	หยุดงาน แก้ไขแบบแปลน	
17	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำแม่อาจข้าว	อ่างตำ หมู่ที่ 3	ป่าจั่ว	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	2.8024		2.8024		0%	97%		1		
18	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวง แม่สลอง	แม่สลองเหนือ ท	สบเปิง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	3.0032	3.0032	0.0000		100%	100%	1		ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ใหม่ 4 มค. 64	
19	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวง หนองเขียว	ใหม่สามัคคี หมู่ที่	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	2.1000	2.1000	0.0000		100%	100%	1		ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ใหม่ 4 มค. 64	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
20	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นแม่เย็น	แสนตอ หมู่ที่ 11	ร่องเคาะ	วังเหนือ	ลำปาง	1	15.4327	5.1075	10.3252			33%	92%		1	
21	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยบวก หลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัวเหนือ	เมืองตาก	ตาก	1	0.0831		0.0831			0%	98%		1	หยุดงานอยู่ระหว่างขออนุญาต ปลูกป่าทดแทน
22	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบ โครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้าน ผาผึ้ง)	ผาผึ้ง หมู่ที่ 6	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	20.3770		20.3770			0%	35%		1	เนื่องจากอุทยานฯ ขอแก้ไข แนวท่อส่งน้ำใหม่จึงทำให้ต้อง แก้แบบใหม่ และจัดทำโครงการ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติคลองวัง เจ้า คาดว่าจะสามารถเข้า ดำเนินการได้ในวันที่ 15 มิ.ย. 63
23	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านศรีคีรีรักษ์) ระยะ 2	ศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 1	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	1.0257	1.0238	0.0019	0.0019		100%	100%	1		แก้ไขแบบแปลนค่างานลด 1,592 บาท อยู่ระหว่างขยาย ระยะเวลา (เนื่องจากติดโควิด)
24	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบ โครงการหลวงสบเมย (บ้านห้วยน้ำใส) ระยะ 2	ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	2.4605		2.4605			0%	98%		1	
25	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวัด ธาราพิทยชัยประดิษฐ์ บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยชมพู หมู่ที่ 8	แม่แตง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	8.4069		8.4069			0%	85%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
26	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิต การเกษตรบ้านปางเพื่อง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	ปางเพื่อง	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	6.4056	4.3547	2.0509			68%	90%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
27	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยงูใน หมู่ที่ 5,	สันทราย	ฝาง	เชียงใหม่	1	2.4727	1.7948	0.6779			73%	100%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
28	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโป่งดิบ บ้านโป่งดิบโน บ้านท่าสะแล ตำบล เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	โป่งดิบ,โป่งดิบโน	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.9322	3.2712	0.6609			83%	100%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
29	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่ยาวหนองบัว บ้านหัวนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	แม่ยาวหนองบัว	ม่อนปิ่น	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.7740	2.5923	1.1817			69%	100%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
30	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองสละ บ้านเชียงหมั่น หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดง เย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เชียงหมั่น หมู่ที่ 5	ศรีดงเย็น	ไชยปราการ	เชียงใหม่	1	1.1834	1.1834	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
31	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระทุ่งโป่ง บ้านขอเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขอเหนือ หมู่ที่ 9	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.7106	1.7106	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
32	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้านม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ม่วง หมู่ที่ 8	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.0451	1.0451	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ด่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
33	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้านสบลิ บ้านสบลิ หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	สบลิ หมู่ที่ 6	แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.7000		4.7000			0%	98%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
34	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองกำเกาะ บ้านท่าไม้ ตำบลแม่ป๋อ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ท่าไม้	แม่ป๋อ	แม่พริก	ลำปาง	1	3.5646	3.5646	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
35	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บน้ำ แปลงหญ้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัด ลำปาง	ต้นผึ้ง หมู่ที่ 5	ใหม่พัฒนา	เกาะคา	ลำปาง	1	2.0345	2.0345	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
36	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง		แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.1735		4.1735			0%	31%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งปม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
37	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ละอุป (โครงการพลิกฟื้นผืนป่า) บ้านแม่ละ อุป หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	บ้านแม่ละอุป	แจ้ห่ม	กัลยาณิวัฒนา	เชียงใหม่	1	0.4980	0.4980	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 13 แล้ว จำนวน 18 รายการ งปม. 0.4993 ลบ. * ค่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/1411 ลว 10 ก.ค. 63
38	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองครก หลวง บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบล วิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		วิเชตนคร	แจ้ห่ม	ลำปาง	1	3.9000		3.9000			0%	18%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
39	สทท.1	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สำรวจ อุทกวิทยาที่ 6 (แม่สะเรียง) พร้อมถนนภายในสำนักงานและรั้ว บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	ท่าข้าม หมู่ที่ 1	บ้านกาศ	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	5.0607	1.0001	4.0606			20%	75%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	11	39.8239	22.8171	17.0068	0.1492	0.1098	57%	83%	7	4	
1	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์บ้านน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน	น้ำหมัน หมู่ที่ 1	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	5.8756	2.4790	3.3966			42%	62%		1	
2	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์บ้านกกจาน สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน	กกจาน หมู่ที่ 7	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	2.5791		2.5791			0%	77%		1	
3	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน นาดี พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	นาดี หมู่ที่ 1	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3899	2.3709	0.0190	0.0190	0.1004	99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
4	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน โพศาลวิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	โพธิ์โพศาล หมู่ที่ 1	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.0328	2.0270	0.0058	0.0058		100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
5	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน ห้วยกอกหนองเค็ม พร้อมระบบ กระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา เด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี	หนองเค็ม หมู่ที่ 5	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3980	2.3618	0.0362	0.0362	0.0094	98%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบประมาณ. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
6	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านม่วง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา	ม่วง หมู่ที่ 5,10	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	7.1422	7.0904	0.0518	0.0518		99%	100%	1		6/1/64 ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ ลดค้างงาน 0.0518 ลบ.
7	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านบอน สหราษฎร์อุทิศ สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	บอน หมู่ที่ 3	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.2058	2.2058	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบประมาณ. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
8	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านแก้ง คำประชาสามัคคี สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	แก้งท่าลับ หมู่ที่ 1	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	1.9200	1.9024	0.0176	0.0176		99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบประมาณ. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
9	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์เรียนรู้คน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพระตำริ บ้านห้วยเตย	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหว้า	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.9785		1.9785			0%	60%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบประมาณ. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
10	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝักอาชีพ เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพัชร กิตติยาราม)	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหว้า	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.7900	1.7712	0.0188	0.0188		99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
11	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน	หมากแข้ง หมู่ที่ 4	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	9.5120	0.6086	8.9034			6%	17%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	8	46.7068	3.2229	43.4839	0.0000	0.0616	7%	76%	2	6		
1	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูผืนดิน พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมากยาง	สามขา	โพธาราม	ร้อยเอ็ด	1	10.3955		10.3955			0%	49%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
2	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคกกลาง พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	หนองศาลา	หนองสังข์	แก่งคร้อ	ชัยภูมิ	1	5.6030		5.6030			0%	58%		1	แจ้งเร่งรัดงานแล้ว 3 ครั้ง
3	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพง	แพง หมู่ที่ 11	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.2189		5.2189			0%	67%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
4	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเล็งเค็ง	หมู่ที่ 6, 7, 8, 9	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	5.8217		5.8217			0%	85%		1	ขยายสัญญาถึง 26 มี.ค.64
5	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยแอ่	จอมศรี หมู่ที่ 2	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	14.0555		14.0555			0%	58%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
6	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคา พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 1	สาวแห	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	1	2.3277		2.3277			0%	94%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์
7	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) กอง พลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี)	ค่ายเปรมติณสูลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	2.2000	2.1692	0.0308		0.0308	99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 2) กอง พลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี)	ค่ายเปรมติณสูลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	1.0845	1.0537	0.0308		0.0308	97%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	10	46.8264	12.4849	34.3415	0.0047	0.0000	27%	72%	4	6	
1	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิง พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	จัว หมู่ที่ 10	คูขาด	คง	นครราชสีมา	1	2.3786	2.3738	0.0047	0.0047		100%	100%	1		ลดค่างาน 4,734.96 บาท
2	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการฟาร์ม ตัวอย่างตามพระราชดำรินในสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	กระเจา หมู่ที่ 7	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	1	0.2882	0.2882	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำท่านเสียว (ช่วง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	ตะเคียน หมู่ที่ 14	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.3050		4.3050			0%	75%		1	ทำหนังสือเร่งรัดครั้งที่ 1 เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพ คล่อง
4	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโกรก รกฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	ดอนพัฒนา หมู่ที่ 1	คง	อิจจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	1	14.9718	1.0012	13.9707		7%	41%		1	หยุดงาน เนื่องจากปัญหา กรรมสิทธิ์ที่ดิน สค.1 กำลังให้ ทางพื้นที่ดำเนินการใกล้เคียง
5	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบุมะคำ	บุมะคำ	มาบตะโกเอ	ครบุรี	นครราชสีมา	1	2.9556	2.9556	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว อยู่ ระหว่างส่งเอกสารเบิกเงิน
6	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อม ระบบส่งน้ำ	หมู่ที่ 4,6	ตั้งใจ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	12.5644	3.4824	9.0820			28%	70%		1	ส่งหนังสือเร่งรัดครั้งที่ 4 / งาน ล่าช้าเนื่องจากคนงานมีจำนวน น้อย
7	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำบึงถนนหักใหญ่	โนนสง่า หมู่ที่ 2	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	4.2243		4.2243			0%	80%		1	แจ้งเตือนการปรับ/หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (หลังปรับแผนโอน เปลี่ยนแปลง)	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	หนองพลวง หมู่ที่	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	1.2288	1.2279	0.0009			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และจัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อบริหาร จัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่าง เป็นระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		หนองบัวศาลา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1	0.5000		0.5000			0%	0%		1	
10	สทท.5	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมจุได้จำนวน 100 คน เลขที่ 47 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		หนองบัวศาลา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	1	3.4097	1.1558	2.2539			34%	54%		1	ส่งหนังสือเร่งรัดครั้งที่ 4 / สงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	9	18.7006	14.5249	4.1756	0.5130	0.0131	78%	100%	8	1	
1	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูศูนย์วิจัยกรมปศุสัตว์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0009	3.0009	0.0000			100%	100%	1		
2	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระประปาโรงพยาบาล กบินทร์บุรี พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 8	กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7579	1.7579	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.6626		3.6626			0%	100%		1	1. อยู่ระหว่างการปรับ (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 63) 2. อยู่ระหว่างการส่งเอกสารมา เบิกจ่าย
4	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 4	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0382	2.5252	0.5130	0.5130		83%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช่วงป่าหลังต้น น้ำภูไท	หมู่ที่ 13	ท่าตะเกียบ	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	1	1.3475	1.3475	0.0000			100%	100%	1		
6	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนบริหาร จัดการน้ำ บ้านไม้เสวก ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	ไม้เสวก	บางแก้ว	เมืองฉะเชิงเท	ฉะเชิงเทรา	1	3.8666	3.8666	0.0000		0.0131	100%	100%	1		
7	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองเวฬุ หมู่ที่ 4 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	หมู่ที่ 4	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	1	1.8808	1.8808	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครงการ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สทภ.6	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พันุ่แหล่งน้ำข้างป่าบ้านนายาว (อ่าง เก็บน้ำวราวุธ) หมู่ที่ 15 ตำบลท่า กระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		
9	สทภ.6	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พันุ่แหล่งน้ำข้างป่าบ้านคลองเคย (อ่างเก็บน้ำจตุพร) หมู่ที่ 21 ตำบล ท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	28.0263	11.0885	16.9378	0.0000	0.0000	40%	79%	2	3	
1	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองข่อย ช่วง 2	หมู่ที่ 9	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	9.4787	5.3209	4.1578			56%	100%		1	ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ งาน
2	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3	ไร่ หมู่ที่ 6	ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	2.5470	2.5470	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยตาเมือง	โป่งเกตุบน หมู่ที่	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	3.2206	3.2206	0.0000			100%	100%	1		
4	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี		โพพระ	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	1	9.7900		9.7900			0%	0%		1	อยู่ระหว่างรอสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาเพชรบุรีอนุญาตให้ ใช้พื้นที่
5	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การ ทำนาอย่างอัจฉริยะ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี		นางบวช	เดิมบางนางบ	สุพรรณบุรี	1	2.9900		2.9900			0%	97%		1	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้างที่ตั้งแผงโซล่าเซลล์ และก่อสร้างโรงสูบน้ำ งานคาด คอนกรีต งานก่อสร้างบันได

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	7	24.5077	16.0774	8.4303	0.0153	0.0000	66%	86%	6	1	
1	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำโพธิ์ทอง		กะลวอเหนือ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	4.1605	4.1605	0.0000			100%	100%	1		
2	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลอง บัวช้าง	โคกขาว หมู่ที่ 7	นาโหนด	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	2.7430	2.7430	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลอง สะพานดำ		ยูโป	เมือง	ยะลา	1	3.6926	3.6926	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 1 แล้ว จำนวน 11 รายการ งบปม. 80.0000 ลบ. ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/705 ลว 2 เม.ย. 63
4	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่ายสมทบ เพิ่มเติม)	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองลาด	หนองลาด	นาไม้ไผ่	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	1	8.4150		8.4150			0%	2%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 2 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบปม. 4.9850 ลบ. ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/723 ลว 3 เม.ย. 63
5	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำฟาร์ม ตัวอย่าง ช่วง 2 บ้านร่อนตันบาตู ตำบล กะลวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส		กะลวอ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	2.5900	2.5900	0.0000			100%	100%	1		สัญญาเก่าเลขที่ 63/2563 สัญญาใหม่เลขที่ 1/2564
6	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 1-2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	หมู่ที่ 6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	1.3176	1.3023	0.0153	0.0153		99%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบ่อจิก หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	บ่อจิก หมู่ที่ 9	บางจาก	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	1	1.5890	1.5890	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	20	126.9470	43.5902	83.3568	0.0942	0.0000	34%	81%	6	14	
1	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร		วัดขวาง	โพทะเล	พิจิตร	1	12.6509	1.7357	10.9152			14%	75%		1	1) ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการมี ปริมาณน้ำมาก ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง (สนง.ใหญ่) ออ. 410/2563 ลว 20 ต.ค. 2563 2) หยุดงาน ตามหนังสือ ทส 0624.3/1536 ลว 9 พ.ย. 2563 3) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง (สนง.ใหญ่) ออ. 485/2563 ลว 3 ธ.ค. 2563
2	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร วัดบาง คลาน-แม่น้ำยม		บางคลาน	โพทะเล	พิจิตร	1	8.1113	6.8490	1.2623			84%	95%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ โครงการ ตามหนังสือ ทส 0624.3/1470 ลว 15 ต.ค. 2563 2) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัท แอล.พี.พี.ซี วิล คอนสตรัคชั่น จำกัด LCC. พทล.2563/023 ลว 27 พ.ย. 2563
3	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจรเข้- หนองแม่ระวิง		สารจิตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	5.1198	5.1198	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย ของเงินกัน ฯ ปี 2564

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
4	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำครกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำบัว	เวียงสา	น่าน	1	4.6291	1.7868	2.8424			39%	72%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากประชาชนขอใช้น้ำเพื่อ การเกษตร ตามหนังสือ ทส 0624.3/1452 ลว 14 ต.ค. 2563
5	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่หนองปลาหมอ		ย่านยาว	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	12.0745	12.0736	0.0009	0.0015		100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
6	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	น้ำแพะ หมู่ที่ 6	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.8930		1.8930			0%	72%		1	
7	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	ศรีบุญเรือง หมู่ที่	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	2.2196		2.2196			0%	65%		1	
8	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	ปางปูก หมู่ที่ 2	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	1.6351		1.6351			0%	100%		1	อยู่ระหว่างส่งงาน
9	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	เขตวัน หมู่ที่ 1	สันทะ	นาร้อย	น่าน	1	2.1670		2.1670			0%	73%		1	
10	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	น้ำสี้ได้ หมู่ที่ 8	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.7283		1.7283			0%	85%		1	
11	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	นาเลา หมู่ที่ 3	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.4262	1.4262	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
12	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบ กระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงแม่จริม	ก้อ หมู่ที่ 3	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	8.5335	1.3623	7.1713			16%	62%		1	อยู่ระหว่างการขออนุญาต หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ และหยุดงาน
13	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชื่อมต่อ โครงข่ายน้ำปิงน้อย-ปิงน้ำด้วน	หมู่ที่ 1,2	ไร่ฮ้อย	พิชัย	อุดรดิตถ์	1	21.1410	5.4353	15.7057			26%	95%		1	
14	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจระเข้		สารจิตร์	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	23.1762		23.1762			0%	0%		1	1) ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน/ ค่าปรับเกินงบประมาณ 2) ผู้รับจ้างขอปรับแผนปฏิบัติ งานก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัทกฤษฎาการ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ KRD/63/045 ลว 2 ธ.ค. 63
15	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	โป่งคำ หมู่ที่ 5	ดู่พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.5952		1.5952			0%	100%		1	อยู่ระหว่างส่งงาน
16	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	แทน 3	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	2.0845	1.9918	0.0927	0.0927		96%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
17	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	ละแบ๋ยาว	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.3101	0.3101	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
18	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อน ช่วยเพื่อน ภาคเหนือตอนล่าง กองทัพภาคที่ 3		อรัญญิก	เมือง	พิษณุโลก	1	7.0980	1.9752	5.1228			28%	63%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งบป. 17.6000 ลบ. ด่วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลว. 13 เม.ย.63

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
19	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ พิชณุโลก		หนองกะท้าว	นครไทย	พิษณุโลก	1	8.1560	2.3355	5.8205			29%	62%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งบม. 17.6000 ลบ. ด่วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลว. 13 เม.ย.63
20	สทท.9	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงอาคารปลอดจากอาคาร บังคับน้ำต่งเศรษฐกิจ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		ย่านยาว	เมือง	พิจิตร	1	1.1978	1.1890	0.0088			99%	100%	1		0.0088 ลบ. ยอดเงินคงเหลือ จากยอด E-bidding

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	2	31.1486	12.1038	19.0448	0.0000	0.0000	39%	57%	1	1	
1	สทท.10	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองบางริน	หมู่ที่ 2	บางริน	เมืองระนอง	ระนอง	1	21.8250	2.7802	19.0448			13%	13%		1	1.บริหารสัญญา มีหนังสือแจ้ง เตือนผู้รับจ้างแล้ว 2 ครั้ง อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ย. 2563 2.แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 แก้ไข รูปแบบรายการก่อสร้าง มีค่า งาน และระยะเวลาเพิ่ม เป็น สิ้นสุดสัญญาววันที่ 11 ก.พ. 2564
2	สทท.10	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคูด้วน		สวนขัน, ละอ	ช้างกลาง,ฉว	นครศรีธรรมร	1	9.3236	9.3236	0.0000			100%	100%	1		โครงการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	2	7.5125	7.5125	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สทท.11	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้าน ไหลหู่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	ไหลหู่พัฒนาหมู่	ไหลหู่	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1	4.5561	4.5561	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.11	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย ก้านเหลือง	หมู่ที่ 8	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1	2.9564	2.9564	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	12	337.0018	24.6750	312.3268	0.0000	0.0000	7%	36%	0	12		
1	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง		บ้านโคก	โคกโพธิ์ชัย	ขอนแก่น	1	14.4726		14.4726			0%	56%		1	
2	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย หนองหาร		ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1	22.7260		22.7260			0%	43%		1	
3	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย	ทุ่งมั่ง	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1	75.6500	12.0636	63.5864			16%	39%		1	
4	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโกรงเเกรง คลองโกรงเเกรง พร้อมระบบกระจาย น้ำ		ท่าผ่อ	เมืองพิจิตร	พิจิตร	1	37.3252		37.3252			0%	38%		1	
5	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจั่ว พร้อม ระบบกระจายน้ำ		ไผ่ล้อม	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	1	47.4300	4.1984	43.2316			9%	30%		1	
6	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ		ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1	45.6336		45.6336			0%	31%		1	
7	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สำหรับ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝนในตำบลอ่างทอง, ตำบล น้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	23.3100	3.8850	19.4250			17%	52%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพฯ	1	23.3815	1.2990	22.0826			6%	30%		1	
9	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยา โท กรุงเทพมหานคร		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพฯ	1	20.1788	1.1210	19.0577			6%	30%		1	
10	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง ภาค ตะวันตก และภาคใต้ กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพฯ	1	20.3940	1.1330	19.2610			6%	30%		1	
11	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดนาแข งจังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพมหานคร	1	3.5000	0.5250	2.9750			15%	25%		1	
12	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ จังหวัดนครพนม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพมหานคร	1	3.0000	0.4500	2.5500			15%	25%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	5	58.3251	13.4075	44.9176	0.0000	0.0000	23%	41%	1	4		
1	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ต.มะเมือง, บ้านจาน อ. พุทไธสง จ.บุรีรัมย์		มะเพือก, บำ พุทไธสง	บุรีรัมย์	1	8.6753		8.6753			0%	28%		1		
2	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	จ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ ภายในพื้นที่อุทยานไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก		ตากออก	บ้านตาก	ตาก	1	9.7388	2.7025	7.0363			28%	16%		1	
3	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	จ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำระบบ การบริหารงานอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำ โครงการนำร่องพื้นที่ลุ่มน้ำ น่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ (อ. สันติสุข จ.น่าน)			สันติสุข	น่าน	1	9.6000	4.8000	4.8000			50%	46%		1	
4	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนอง หาร จ.สกลนคร			หนองหาร	สกลนคร	1	27.9725	3.5665	24.4060			13%	16%		1	
5	สอน.	แผนงานพื้นฐาน	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 450 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.3385	2.3385	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ 100 %

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	4	156.0364	40.9454	115.0911	0.0000	0.0000	26%	57%	0	4	
1	สวพ.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายสถานีอุทกวิทยา เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการ กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	30.5924	5.0987	25.4936			17%	10%		1	ส่งใบตรวจรับการจัด งวดที่ 2 วันที่ 18 ม.ค. 64
2	สวพ.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและ พื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	103.2750	22.9500	80.3250			22%	69%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 2 แล้วเสร็จ ตามหนังสือ สวพ.ด่วนมาก ที่ ทส.0608.4/3044 ลว. 25 ธ.ค. 63 เบิกจ่ายแล้ว
3	สวพ.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.2000	11.2000	8.0000			58%	77%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 3 แล้วเสร็จ ตามหนังสือ สวพ.ที่ ทส. 0608.4/2995 ลว. 9 ธ.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว
4	สวพ.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อ การบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.9691	1.6966	1.2725			57%	70%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 3 แล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ ทส. 0608.4/3075 ลว.24 ธ.ค.63 และขออนุมัติเบิกจ่ายตาม หนังสือที่ ทส.0601.5/2050 ลว.29 ธ..ค. 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	6	125.6997	41.7576	83.9421	0.0000	0.0000	33%	83%	0	6		
1	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำใน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	49.8381	14.6583	35.1798			29%	80%		1	
2	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	18.5972		18.5972			0%	85%		1	
3	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตาม สถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่ม น้ำกกและโขงเหนือ) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.9025	4.9513	4.9513			50%	87%		1	
4	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตาม สถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่ม น้ำแม่กลองและสาละวิน) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	21.6374	10.8187	10.8187			50%	86%		1	
5	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.9291	3.8027	9.1265			29%	80%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
6	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.7955	7.5268	5.2687			59%	80%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	91.8728	55.9976	35.8752	0.0000	0.0000	61%	84%	4	1	
1	ศสท.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ DWR Data Cleansing กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	44.8440	8.9688	35.8752			20%	22%		1	* ได้อนุมัติใช้เหลือจ่ายแล้ว จำนวนรวม 4 รายการ งบปม. 92.4068 ลบ. * ส่วนที่สุด นร 0718/14158 ลว. 23 มี.ย.63
2	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการบำรุงรักษาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	7.2000	7.2000	0.0000			100%	100%	1		
3	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.4725	5.4725	0.0000			100%	100%	1		
4	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.3869	19.3869	0.0000			100%	100%	1		
5	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการระบบและบริการภูมิ สารสนเทศกลาง (DWR GIS System)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	14.9694	14.9694	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	1	8.6510	0.0000	8.6510	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
1	กนก.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษาและยกร่างบัญญัติ ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ในส่วนที่อยู่ใน หน้าที่และอำนาจ และการกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การ จัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)		ยุโป	เมือง	ยะลา	1	8.6510		8.6510			0%	0%		1	* ได้อนุมัติครั้งที่ 9 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบม. 10.1776 ลบ. * ตัวนที่สุด ที่ นร 0718/12292 ลว. 27 พ.ค.63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	1	1.6660	1.6660	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
1	สสป.	แผนงานพื้นฐาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	1.6660	1.6660	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินที่ เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	11	9.3709	3.4617	5.9092	0.0000	0.0000	37%	91%	10	1		
1	สลก.	แผนงานพื้นฐาน	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	3.2258	3.2258	0.0000			100%	100%	1		* พรบ.โอนคืน จำนวน 4,008,200 บาท ทส 0604.3/ว835 ลว 23 เม.ย. 63
2	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (แก้ไขประเภท รายการ)	ลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง อาคารกรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.9092	0.0000	5.9092			0%	0%		1	
3	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 63 ซม. x สูง 90 ซม.					1	0.0252	0.0252	0.0000			100%	100%	1		
4	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด กว้าง 160 ซม. x ลึก 80 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ข้าง ขนาด กว้าง 120 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ลิ้นชัก ขนาด กว้าง 40 ซม. x ลึก 48 ซม. x สูง 52 ซม.					1	0.0236	0.0236	0.0000			100%	100%	1		
5	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 65 ซม. x ลึก 62 ซม. x สูง 115 ซม.					1	0.0049	0.0049	0.0000			100%	100%	1		
6	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 93 ซม.					1	0.1134	0.1134	0.0000			100%	100%	1		
7	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง 68 ซม. x ลึก 76 ซม. x สูง 120 ซม.					1	0.0140	0.0140	0.0000			100%	100%	1		
8	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0100	0.0100	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	พาร์ทิชั่นจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบบทึบลิ้น ขนาด 100 ซม. x 160 ซม. จำนวน 4 แผ่น เสาพาร์ทิชั่น ขนาด กว้าง 5.5 ซม. x 160 ซม. จำนวน 2 ต้น ขาที่ พาร์ทิชั่น จำนวน 6 อัน					1	0.0198	0.0198	0.0000			100%	100%	1		
10	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0200	0.0200	0.0000			100%	100%	1		
11	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 64 ซม. x ลึก 78 ซม. x สูง 115-121 ซม.					1	0.0050	0.0050	0.0000			100%	100%	1		
