


ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

Sum of ยอดเงินที่เหลือปี (ล้านบาท)Sum of รวมเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายแผนบูรณาการฯ

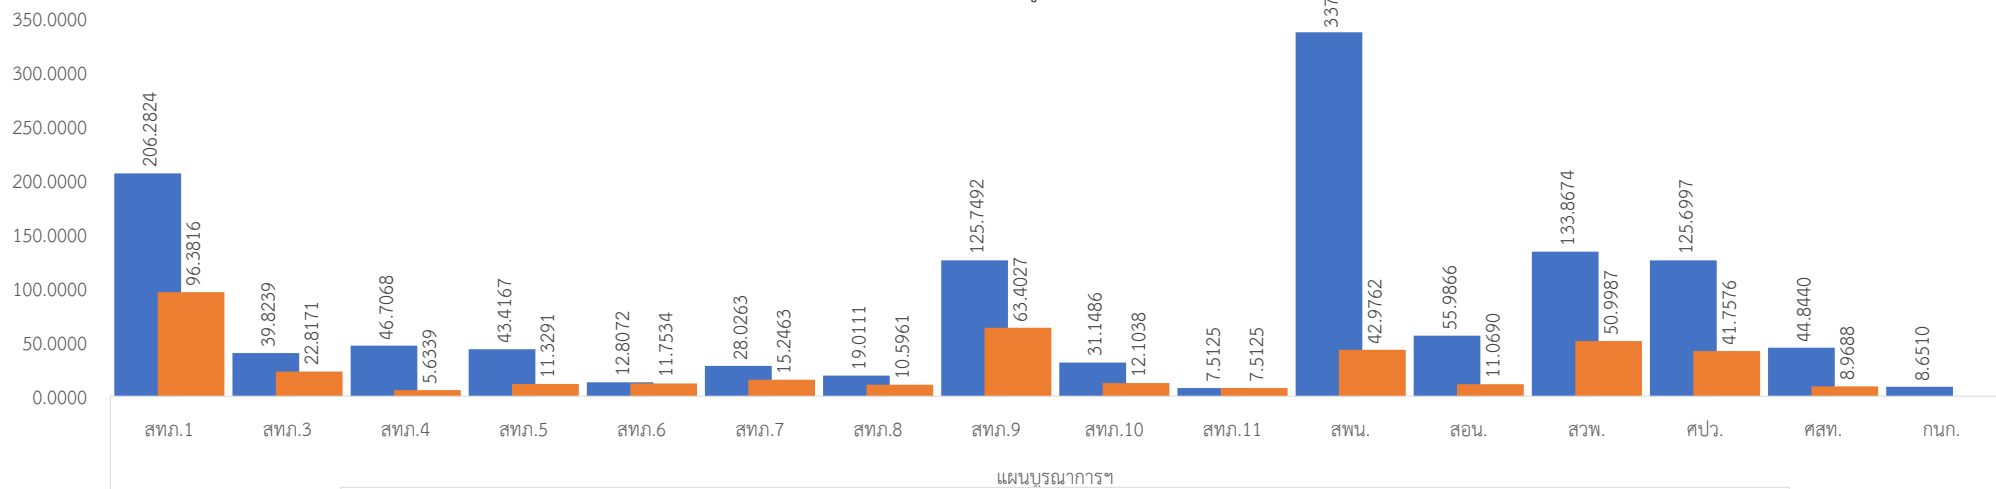

แผนงาน/โครงการหน่วย...

Sum of ยอดเงินที่เหลือปี (ล้านบาท)

Sum of รวมเบิกจ่าย...


แผนบูรณาการฯ																	
หน่วยงาน	รวม	สทภ.1	สทภ.3	สทภ.4	สทภ.5	สทภ.6	สทภ.7	สทภ.8	สทภ.9	สทภ.10	สทภ.11	สทพ.	สอน.	สวพ.	ศปว.	ศสท.	กนก.
จำนวน (คก.)	129	38	11	8	9	5	5	4	19	2	2	12	4	2	6	1	1
แล้วเสร็จ (คก.)	53	18	7	2	4	5	4	3	7	1	2	0	0	0	0	0	0
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	76	20	4	6	5	0	1	1	12	1	0	12	4	2	6	1	1
ยอดเงินที่เหลือปี	1,266.5351	206.2824	39.8239	46.7068	43.4167	12.8072	28.0263	19.0111	125.7492	31.1486	7.5125	337.0018	55.9866	133.8674	125.6997	44.8440	8.6510
รวมเบิกจ่ายปี 2564	431.2468	109.8081	22.8171	5.6339	13.6125	11.7534	18.2363	10.5961	63.4027	12.1038	7.5125	42.9762	11.0690	50.9987	41.7576	8.9688	0.0000
ยอดเงินคงเหลือ	835.2883	96.4743	17.0068	41.0729	29.8041	1.0538	9.7900	8.4150	62.3465	19.0448	0.0000	294.0256	44.9176	82.8686	83.9421	35.8752	8.6510
ลดค้างงาน	0.8108	0.0346	0.1492	0.0000	0.0047	0.5130	0.0000	0.0000	0.1093	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงิน	34%	53%	57%	12%	31%	92%	65%	56%	50%	39%	100%	13%	20%	38%	33%	20%	0%

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

Sum of ยอดเงินกันเหลือปี (ล้านบาท)Sum of รวมเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายแผนพื้นฐาน

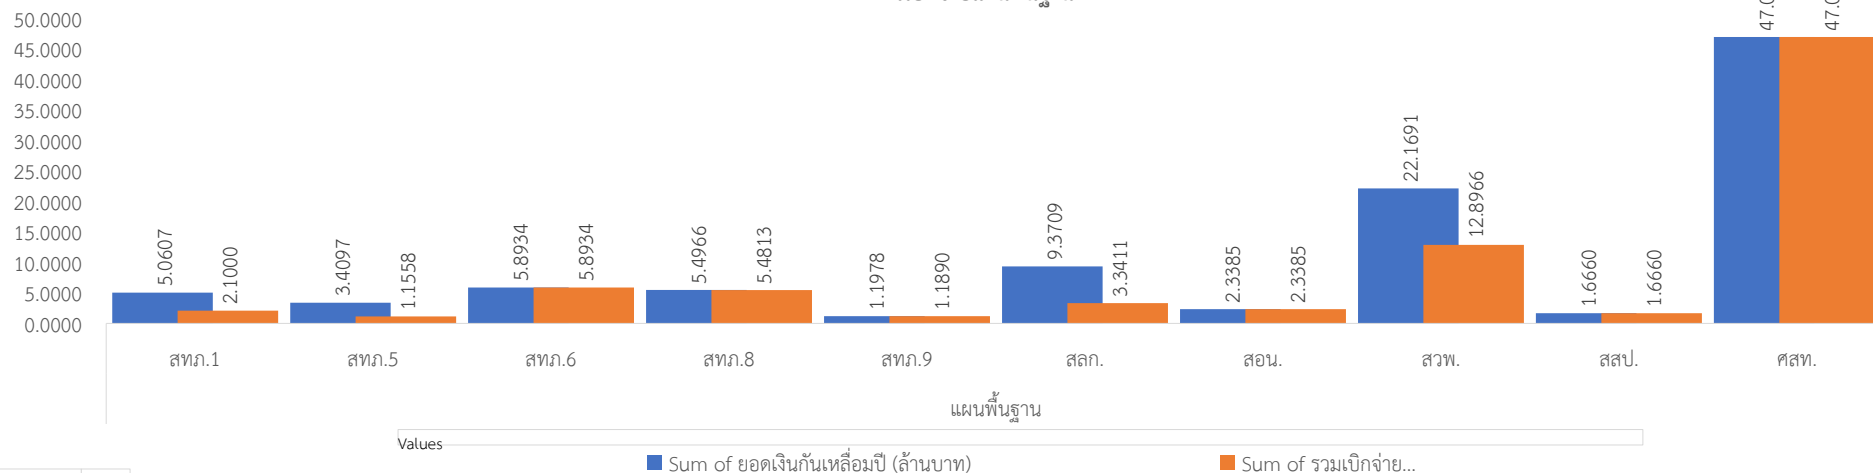

แผนงาน/โครงการหน่วย...

แผนพื้นฐาน		สทท.1	สทท.5	สทท.6	สทท.8	สทท.9	สอน.	สสป.	สลก.	สวพ.	ศสท.
หน่วยงาน	รวม	1	1	4	3	1	1	1	11	2	4
จำนวน (คก.)	29	0	0	4	3	1	1	1	9	0	4
แล้วเสร็จ (คก.)	23	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	6										
ยอดเงินกันเหลือปี	103.6316	5.0607	3.4097	5.8934	5.4966	1.1978	2.3385	1.6660	9.3709	22.1691	47.0288
รวมเบิกจ่ายปี 2564	83.0905	2.1000	1.1558	5.8934	5.4813	1.1890	2.3385	1.6660	3.3411	12.8966	47.0288
ยอดเงินกันคงเหลือ	20.5410	2.9607	2.2539	0.0000	0.0153	0.0088	0.0000	0.0000	6.0298	9.2725	0.0000
ลดค้างงาน	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่าย เงินกัน	80%	41%	34%	100%	100%	99%	100%	100%	36%	58%	100%

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	39	211.3431	111.9081	99.4350	0.0346	0.0000	53%	89%	18	21	
1	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำ	ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1	แม่แฝก	สันทราย	เชียงใหม่	1	6.2971	3.9370	2.3601			63%	94%		1	แก้ไขแบบแปลนราคาเพิ่มขึ้น 7,429.60 บาท ขยายสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 8 เม.ย.64
2	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บ น้ำน้ำแวน ระยะ 2	ผาฮาว หมู่ที่ 3	ทุ่งผาสุข	เชียงคำ	พะเยา	1	4.5640		4.5640			0%	64%		1	สงวนสิทธิการปรับ
3	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นแม่สะมาด	ป่าปี หมู่ที่ 2	ผาบ่อง	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1	0.4625	0.4625	0.0000			100%	100%	1		ขยายสัญญาจ้างสิ้นสุดสัญญา ใหม่วันที่ 7 ก.พ.64 / แล้วเสร็จ
4	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นทุ่งปงเรียน ระยะ 2		บ้านเอื้อม	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	11.5000	9.6780	1.8220			84%	70%		1	ขยายสัญญาจ้างสิ้นสุดสัญญา ใหม่วันที่ 20 มิ.ย.64
5	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะ 2		แม่งอน	ฝาง	เชียงใหม่	1	5.3847	4.3956	0.9891			82%	98%		1	อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินโครงการ
6	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นแม่ตืน พร้อมระบบกระจายน้ำ	แม่แตด หมู่ที่ 8	แม่ตืน	ลี้	ลำพูน	1	0.4904	0.4904	0.0000			100%	100%	1		
7	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายใน พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37		รอบเวียง	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	11.6533	2.1187	9.5346			18%	55%		1	หยุดงาน /แก้ไขแบบแปลน
8	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ฉาง ข้าว	อ่างต้า หมู่ที่ 3	ป่าจั่ว	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	18.2945	10.6012	7.6934			58%	90%		1	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ จากฝายน้ำล้นห้วยตั้ง	ป่าจี้ หมู่ที่ 3	ป่าไผ่	สี	ลำพูน	1	1.5283	1.5283	0.0000			100%	100%	1		
10	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวัง น้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ	วังตะกู หมู่ที่ 11	วังควง	พรานกระต่าย	กำแพงเพชร	1	0.2340		0.2340			0%	98%		1	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนลด ปริมาณงานปลูกป่าทดแทน
11	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนอง กอง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองกอง หมู่ที่	นาบ่อคำ	เมืองกำแพง	กำแพงเพชร	1	16.9150	7.6515	9.2635			45%	46%		1	ขยายสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญา ใหม่วันที่ 9 ก.พ.64
12	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองแขยง	สีกกาม หมู่ที่ 1	สีกกาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.5700	4.5373	0.0328	0.0328		99%	100%	1		แก้ไขแบบแปลนค่างานลดลง 32,760 บาท
13	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงคลองลาน (บ้านสุขสวรรค์)	สุขสวรรค์ หมู่ที่	คลองลานพัค	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	2.4800	2.4800	0.0000			100%	100%	1		
14	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นแม่น้ำมะ	สันตันธง หมู่ที่ 2	ศรีดอนมูล	เชียงแสน	เชียงราย	1	11.2998	5.5001	5.7998			49%	95%		1	อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน
15	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง		แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	10.3529	10.3529	0.0000			100%	100%	1		
16	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบการกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	ห้วยก้างปลา หมู่	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	5.1699		5.1699			0%	90%		1	แก้ไขแบบแปลนค่างานเพิ่มขึ้น 16,716.95บาท (หยุดงาน ชั่วคราว)
17	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว	อ่างคำ หมู่ที่ 3	ป่าจั่ว	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	2.8024		2.8024			0%	97%		1	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน สิ้นสุดสัญญา 13 เม.ย.64
18	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวง แม่หลอด	แม่หลอดเหนือ	หสบเปิง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	3.0032	3.0032	0.0000			100%	100%	1		ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ใหม่ 4 ม.ค. 64

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
19	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวง หนองเขียว	ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 11	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	2.1000	2.1000	0.0000			100%	100%	1		ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ใหม่ 4 ม.ค. 64
20	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำ ล้นแม่เย็น	แสนตอ หมู่ที่ 11	ร้องเคาะ	วังเหนือ	ลำปาง	1	15.4327	5.1075	10.3252			33%	93%		1	อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินโครงการ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 เม.ย. 64
21	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยบวก หลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัวเหนือ	เมืองตาก	ตาก	1	0.0831		0.0831			0%	98%		1	หยุดงานอยู่ระหว่างขออนุญาต ปลูกป่าทดแทน
22	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบ โครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้าน ผาผึ้ง)	ผาผึ้ง หมู่ที่ 6	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	20.3770	7.1516	13.2254			35%	40%		1	ขยายสัญญาจ้างสิ้นสุดสัญญา ใหม่วันที่ 12 มิ.ย. 64
23	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านศรีคีรีรักษ์) ระยะ 2	ศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 1	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	1.0257	1.0238	0.0019	0.0019		100%	100%	1		
24	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบ โครงการหลวงสบเมย (บ้านห้วยน้ำใส) ระยะ 2	ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	2.4605		2.4605			0%	98%		1	อยู่ระหว่างชะลอการตรวจรับ งาน เนื่องจากบ้านห้วยน้ำใส ห้ามบุคคลภายนอกจังหวัด แม่ฮ่องสอน ผ่านเข้าชุมชนบ้าน ห้วยน้ำใส เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมสถานการณ์และ จำกัดการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวัด ธาราพิทักษ์ประชานุสรณ์ บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยชมพู หมู่ที่ 8	แม่แตง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	8.4069		8.4069			0%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน / เบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
26	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิต การเกษตรบ้านปางเพื่อง ตำบลปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	ปางเพื่อง	ปึงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	6.4056	4.3547	2.0509			68%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน / เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
27	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยงูใน หมู่ที่ 5	สันทราย	ฝาง	เชียงใหม่	1	2.4727	2.4727	0.0000			100%	100%	1		
28	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโป่งดิบ บ้านโป่งดิบใน บ้านท่าสะแล ตำบล เวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	โป่งดิบ,โป่งดิบใน	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.9322	3.9322	0.0000			100%	100%	1		
29	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่ยาวหนองบัว บ้านหัวนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	แม่ยาวหนองบัว	ม่อนปิ่น	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.7740	3.7740	0.0000			100%	100%	1		
30	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองสละ บ้านเชียงหมั่น หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดง เย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เชียงหมั่น หมู่ที่ 5	ศรีดงเย็น	ไชยปราการ	เชียงใหม่	1	1.1834	1.1834	0.0000			100%	100%	1		
31	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระทุ่งโป่ง บ้านขอเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขอเหนือ หมู่ที่ 9	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.7106	1.7106	0.0000			100%	98%	1		
32	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้านม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ม่วง หมู่ที่ 8	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.0451	1.0451	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
33	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้านสบลิ บ้านสบลิ หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	สบลิ หมู่ที่ 6	แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.7000		4.7000		0%	98%		1	หยุดงาน	
34	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองกำเกาะ บ้านท่าไม้ ตำบลแม่ป๋ม อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ท่าไม้	แม่ป๋ม	แม่พริก	ลำปาง	1	3.5646	3.5646	0.0000		100%	100%	1			
35	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บน้ำ แปลงหญ้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอกาชา จังหวัด ลำปาง	ต้นผึ้ง หมู่ที่ 5	ใหม่พัฒนา	กาชา	ลำปาง	1	2.0345	2.0345	0.0000		100%	100%	1			
36	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง		แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.1735	2.5882	1.5853		62%	36%		1	ขยายสัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 1 เม.ย.64	
37	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ละอุป (โครงการพลิกฟื้นผืนป่า) บ้านแม่ละ อุป หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	บ้านแม่ละอุป	แจ้ห่ม	กัลยาณิวัฒนา	เชียงใหม่	1	0.4980	0.4980	0.0000		100%	100%	1			
38	สทท.1	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์จากหนองครก หลวง บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบล วิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		วิเชตนคร	แจ้ห่ม	ลำปาง	1	3.9000	0.5304	3.3696		14%	18%		1	อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินโครงการ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มิ.ย. 64	
39	สทท.1	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สำรวจ อุทกวิทยาที่ 6 (แม่สะเรียง) พร้อมถนนภายในสำนักงานและรั้ว บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	ท่าข้าม หมู่ที่ 1	บ้านกา	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	5.0607	2.1000	2.9607		41%	85%		1	แก้ไขแบบแปลน เรื่องจาก รายการก่อสร้างไม่สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	11	39.8239	22.8171	17.0068	0.1492	0.1098	57%	86%	7	4	
1	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์บ้านน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน	น้ำหมัน หมู่ที่ 1	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	5.8756	2.4790	3.3966			42%	66%		1	ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
2	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์บ้านกกจาน สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน	กกจาน หมู่ที่ 7	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	2.5791		2.5791			0%	95%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งงวดงาน
3	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน นาดี พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	นาดี หมู่ที่ 1	โพธิ์โพตาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3899	2.3709	0.0190	0.0190	0.1004	99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
4	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน โพธิ์โพตาล พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	โพธิ์โพตาล หมู่ที่	โพธิ์โพตาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.0328	2.0270	0.0058	0.0058		100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
5	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้าน ห้วยกอกหนองเค็ม พร้อมระบบ กระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนา เด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี	หนองเค็ม หมู่ที่ 3	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3980	2.3618	0.0362	0.0362	0.0094	98%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบประมาณ. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
6	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำ บ้านม่วง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา	ม่วง หมู่ที่ 5,10	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	7.1422	7.0904	0.0518	0.0518		99%	100%	1		6/1/64 ดำเนินการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ ลดค้างงาน 0.0518 ลบ.
7	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านบอน สหราษฎร์อุทิศ สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	บอน หมู่ที่ 3	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.2058	2.2058	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบประมาณ. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
8	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านแก้ง คำประชาสามัคคี สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	แก้งท่าลับ หมู่ที่ 1	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	1.9200	1.9024	0.0176	0.0176		99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบประมาณ. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
9	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์เรียนรู้คน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริ บ้านห้วยเตย	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหว้า	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.9785		1.9785			0%	61%		1	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
10	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝักอาชีพ เรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพัชร กิตติยาราม)	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหว้า	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.7900	1.7712	0.0188	0.0188		99%	100%	1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63	
11	สทท.3	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน	หมากแข้ง หมู่ที่ 4	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	9.5120	0.6086	8.9034			6%	21%		1	ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	8	46.7068	5.6339	41.0729	0.0000	0.0616	12%	77%	2	6	
1	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูผืนดิน พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมากยาง	สามขา	โพธาราย	ร้อยเอ็ด	1	10.3955		10.3955			0%	49%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
2	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคกกลาง พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	หนองศาลา	หนองสังข์	แก่งคร้อ	ชัยภูมิ	1	5.6030		5.6030			0%	56%		1	แจ้งเร่งรัดงานแล้ว 3 ครั้ง
3	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพง	แพง หมู่ที่ 11	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.2189		5.2189			0%	67%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
4	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเล็งเค็ง	หมู่ที่ 6, 7, 8, 9	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	5.8217	2.4110	3.4107			41%	89%		1	ขยายสัญญาถึง 26 มี.ค.64
5	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยแอ่	จอมศรี หมู่ที่ 2	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	14.0555		14.0555			0%	58%		1	ค่าK =216,279.51
6	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคา พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 1	สาวแห	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	1	2.3277		2.3277			0%	100%		1	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวด สุดท้าย
7	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) กอง พลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี)	ค่ายเปรมติณสูลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	2.2000	2.1692	0.0308		0.0308	99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สทท.4	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 2) กอง พลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี)	ค่ายเปรมติณสูลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	1.0845	1.0537	0.0308		0.0308	97%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	10	46.8264	14.7684	32.0580	0.0047	0.0000	32%	73%	4	6	
1	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิง พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	จัว หมู่ที่ 10	คูขาด	คง	นครราชสีมา	1	2.3786	2.3738	0.0047	0.0047		100%	100%	1		ลดค้างงาน 4,734.96 บาท
2	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการฟาร์ม ตัวอย่างตามพระราชดำรินในสมเด็จพระ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	กระเจา หมู่ที่ 7	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	1	0.2882	0.2882	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
3	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทำนบเสียว (ช่วง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	ตะเคียน หมู่ที่ 14	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.3050		4.3050			0%	77%		1	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการหลังจากหยุดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2564
4	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโกรก รกฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	ดอนพัฒนา หมู่ที่ 1	คง	อีจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	1	14.9718	1.0012	13.9707		7%	41%		1	หยุดงาน เนื่องจากปัญหา กรรมสิทธิ์ที่ดิน สค.1 กำลังให้ ทางพื้นที่ดำเนินการไถ่เกลี่ย
5	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบุมะคำ	บุมะคำ	มาบตะโก	ครบุรี	นครราชสีมา	1	2.9556	2.9556	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว
6	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อม ระบบส่งน้ำ	หมู่ที่ 4,6	ตั้งใจ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	12.5644	5.7659	6.7985			46%	75%		1	คาดว่าจะส่งงานปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บ น้ำบึงถนนหักใหญ่	โนนสง่า หมู่ที่ 2	กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	4.2243		4.2243		0%	85%		1	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการหลังจากหยุดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2564	
8	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (หลังปรับแผนโอน เปลี่ยนแปลง)	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	หนองพลวง หมู่ที่ 1	พื้นชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	1.2288	1.2279	0.0009		100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	สทท.5	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และจัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อบริหาร จัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่าง เป็นระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		หนองบัวศาล	เมืองนครราช	นครราชสีมา	1	0.5000		0.5000		0%	0%		1	อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม สัญญา	
10	สทท.5	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมได้จำนวน 100 คน เลขที่ 47 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		หนองบัวศาล	เมืองนครราช	นครราชสีมา	1	3.4097	1.1558	2.2539		34%	54%		1	ส่งหนังสือเร่งรัดครั้งที่ 4 / สงวนสิทธิ์ 1 ครั้ง	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	9	18.7006	17.6468	1.0538	0.5130	0.0131	94%	100%	9	0	
1	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูศูนย์วิจัยกรมปศุสัตว์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0009	3.0009	0.0000			100%	100%	1		
2	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระประปาโรงพยาบาล กบินทร์บุรี พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 8	กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7579	1.7579	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.6626	3.1218	0.5408			85%	100%	1		
4	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 4	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0382	2.5252	0.5130	0.5130		83%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทท.6	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช่วงป่าหลังต้น น้ำภูไท	หมู่ที่ 13	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	1	1.3475	1.3475	0.0000			100%	100%	1		
6	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน	ก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนบริหาร จัดการน้ำ บ้านไผ่เสวก ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	ไผ่เสวก	บางแก้ว	เมืองฉะเชิงเท	ฉะเชิงเทรา	1	3.8666	3.8666	0.0000		0.0131	100%	100%	1		
7	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองเวฬุ หมู่ที่ 4 ตำบลวังสรรพรส อำเภอลำลูก จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	หมู่ที่ 4	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	1	1.8808	1.8808	0.0000			100%	100%	1		
8	สทท.6	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำช่วงป่าบ้านนายาว (อ่าง เก็บน้ำวราวุธ) หมู่ที่ 15 ตำบลท่า กระดาน อำเภอสามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครงการ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทภ.6	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ พันธุแหล่งน้ำข้างบ้านคลองเคย (อ่างเก็บน้ำจตุพร) หมู่ที่ 21 ตำบล ท่ากระดาน อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สนมชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	28.0263	18.2363	9.7900	0.0000	0.0000	65%	80%	4	1	
1	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองข่อย ช่วง 2	หมู่ที่ 9	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	9.4787	9.4787	0.0000			100%	100%	1		
2	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3	ไร่ หมู่ที่ 6	ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	2.5470	2.5470	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยตาเมือง	โป่งเกตุบน หมู่ที่	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	3.2206	3.2206	0.0000			100%	100%	1		
4	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี		โพพระ	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	1	9.7900		9.7900			0%	0%		1	อยู่ระหว่างรอสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาเพชรบุรีอนุญาตให้ ใช้พื้นที่
5	สทท.7	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การ ทำนอย่างอัจฉริยะ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี		นางบวช	เดิมบางนางบ	สุพรรณบุรี	1	2.9900	2.9900	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	7	24.5077	16.0774	8.4303	0.0153	0.0000	66%	86%	6	1	
1	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำโพธิ์ทอง		กะลวอเหนือ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	4.1605	4.1605	0.0000			100%	100%	1		
2	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลอง บัวช้าง	โคกขาว หมู่ที่ 7	นาโหนด	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	2.7430	2.7430	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลอง สะพานดำ		ยูโป	เมือง	ยะลา	1	3.6926	3.6926	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 1 แล้ว จำนวน 11 รายการ งบปม. 80.0000 ลบ. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/705 ลว 2 เม.ย. 63
4	สทท.8	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่ายสมทบ เพิ่มเติม)	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองลาด	หนองลาด	นาไม้ไผ่	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	1	8.4150		8.4150			0%	2%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 2 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบปม. 4.9850 ลบ. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/723 ลว 3 เม.ย. 63
5	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำฟาร์ม ตัวอย่าง ช่วง 2 บ้านรอตันบาตู ตำบล กะลวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส		กะลวอ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	2.5900	2.5900	0.0000			100%	100%	1		สัญญาเก่าเลขที่ 63/2563 สัญญาใหม่เลขที่ 1/2564
6	สทท.8	แผนงานพื้นฐาน	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 1-2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	หมู่ที่ 6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	1.3176	1.3023	0.0153	0.0153		99%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สทภ.8	แผนงานพื้นฐาน	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบ่อจิก หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	บ่อจิก หมู่ที่ 9	บางจาก	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	1	1.5890	1.5890	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	20	126.9470	64.5917	62.3553	0.1093	0.0000	51%	82%	8	12	
1	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร		วัดขวาง	โพทะเล	พิจิตร	1	12.6509	5.5041	7.1468			44%	81%		1	1) ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการมี ปริมาณน้ำมาก ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงแะเอง (สนง.ใหญ่) อส. 410/2563 ลว 20 ต.ค. 2563 2) หยุดงาน ตามหนังสือ ทส 0624.3/1536 ลว 9 พ.ย. 2563 3) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงแะเอง (สนง.ใหญ่) อส. 485/2563 ลว 3 ธ.ค. 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครงการ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
2	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร วัดบาง คลาน-แม่น้ำยม		บางคลาน	โพทะเล	พิจิตร	1	8.1113	6.8490	1.2623			84%	100%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ โครงการ ตามหนังสือ ทส 0624.3/1470 ลว 15 ต.ค. 2563 2) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัท แอล.พี.พี.ซี วิล คอนสตรัคชั่น จำกัด LCC. พทล.2563/023 ลว 27 พ.ย. 2563 3) อยู่ระหว่างส่งงาน ตาม หนังสือ บริษัท แอล.พี.พี.ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด LCC. พทล.2564/004 ลว 8 ก.พ. 2564
3	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้- หนองแม่ระวีง		สารจิตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	5.1198	5.1198	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย ของเงินกัน ฯ ปี 2564
4	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำครกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำปัว	เวียงสา	น่าน	1	4.6291	1.7868	2.8424			39%	72%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากประชาชนขอใช้น้ำเพื่อ การเกษตร ตามหนังสือ ทส 0624.3/1452 ลว 14 ต.ค. 2563
5	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ		ย่านยาว	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	12.0745	12.0736	0.0009	0.0015		100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
6	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	น้ำแพะ หมู่ที่ 6	ปึงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.8930		1.8930			0%	72%		1	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	2.2196		2.2196			0%	65%		1	
8	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	ปางปูก หมู่ที่ 2	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	1.6351	1.5424	0.0927			94%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
9	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	เซตวัน หมู่ที่ 1	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	2.1670		2.1670			0%	73%		1	
10	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	น้ำสิดี หมู่ที่ 8	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.7283		1.7283			0%	85%		1	
11	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	นาเลา หมู่ที่ 3	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.4262	1.4262	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
12	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบ กระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงแม่จริม	ก้อ หมู่ที่ 3	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	8.5335	1.3623	7.1713			16%	62%		1	อยู่ระหว่างการขออนุญาต หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ และหยุดงาน
13	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชื่อมต่อ โครงข่ายน้ำปิงน้อย-ปิงน้ำด้วน	หมู่ที่ 1,2	ไร่ฮ้อย	พิชัย	อุดรดิตถ์	1	21.1410	21.1259	0.0151	0.0151		100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
14	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจระเข้		สารจิตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	23.1762		23.1762			0%	0%		1	1) ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน/ ค่าปรับเกินงบประมาณ 2) ผู้รับจ้างขอปรับแผนปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัททฤษฎาการ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ KRD/63/045 ลว 2 ธ.ค. 63
15	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	โป่งคำ หมู่ที่ 5	ดู่พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.5952		1.5952			0%	100%		1	อยู่ระหว่างส่งงาน
16	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	แทน 3	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	2.0845	1.9918	0.0927	0.0927		96%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
17	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	ละบ้ายา	สระเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.3101	0.3101	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
18	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อน ช่วยเพื่อน ภาคเหนือตอนล่าง กองทัพภาคที่ 3		อรัญญิก	เมือง	พิษณุโลก	1	7.0980	1.9752	5.1228			28%	67%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งปม. 17.6000 ลบ. ด่วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลว. 13 เม.ย.63
19	สทท.9	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ พิษณุโลก		หนองกะท้าว	นครไทย	พิษณุโลก	1	8.1560	2.3355	5.8205			29%	70%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งปม. 17.6000 ลบ. ด่วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลว. 13 เม.ย.63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
20	สทภ.9	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ปรับปรุงอาคารที่ปลอดภัยจากอาคาร บังคับน้ำแดงเศรษฐกิจ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		ย่านยาว	เมือง	พิจิตร	1	1.1978	1.1890	0.0088			99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 14 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบป.ม. 1.1978 ลบ. * ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/1838 ลว 2 ก.ย. 63 - เลขที่สัญญา สทภ.9 15/2564 ลว 2 พ.ย. 2563 เบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	2	31.1486	12.1038	19.0448	0.0000	0.0000	39%	57%	1	1	
1	สทท.10	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองบางริน	หมู่ที่ 2	บางริน	เมืองระนอง	ระนอง	1	21.8250	2.7802	19.0448			13%	13%		1	1.บริหารสัญญา มีหนังสือแจ้ง เตือนผู้รับจ้างแล้ว 2 ครั้ง อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ย. 2563 2.แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 แก้ไข รูปแบบรายการก่อสร้าง มีค่า งาน และระยะเวลาเพิ่ม เป็น สิ้นสุดสัญญาววันที่ 11 ก.พ. 2564
2	สทท.10	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคูด้วน		สวนขัน, ละอ	ช้างกลาง,ฉว	นครศรีธรรมร	1	9.3236	9.3236	0.0000			100%	100%	1		โครงการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	2	7.5125	7.5125	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สทท.11	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้าน ไหลทุ่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	ไหลทุ่งพัฒนาหมู่	ไหลทุ่ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1	4.5561	4.5561	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.11	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย ก้านเหลือง	หมู่ที่ 8	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1	2.9564	2.9564	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	12	337.0018	42.9762	294.0256	0.0000	0.0000	13%	36%	0	12		
1	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง		บ้านโคก	โคกโพธิ์ชัย	ขอนแก่น	1	14.4726		14.4726			0%	56%		1	
2	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย หนองหาร		ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1	22.7260		22.7260			0%	43%		1	
3	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย	ทุ่งมั่ง	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1	75.6500	29.4753	46.1747			39%	45%		1	
4	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโกรงเเกรง คลองโกรงเเกรง พร้อมระบบกระจาย น้ำ		ท่าผอ	เมืองพิจิตร	พิจิตร	1	37.3252		37.3252			0%	40%		1	
5	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจั่ว พร้อม ระบบกระจายน้ำ		ไผ่ล้อม	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	1	47.4300	4.1984	43.2316			9%	35%		1	
6	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ		ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1	45.6336		45.6336			0%	34%		1	
7	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สำหรับ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝนในตำบลอ่างทอง, ตำบล น้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	23.3100	3.8850	19.4250			17%	52%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
8	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะยาโท เขตพะยาโท กรุงเทพมหานคร		พะยาโท	พะยาโท	กรุงเทพฯ	1	23.3815	1.2990	22.0826			6%	30%		1	
9	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพะยาโท เขตพะยา โท กรุงเทพมหานคร		พะยาโท	พะยาโท	กรุงเทพฯ	1	20.1788	1.1210	19.0577			6%	30%		1	
10	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง ภาค ตะวันตก และภาคใต้ กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพะยาโท เขตพะยาโท กรุงเทพมหานคร		พะยาโท	พะยาโท	กรุงเทพฯ	1	20.3940	1.1330	19.2610			6%	30%		1	
11	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดนาแข งจังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะยาโท เขตพะยาโท กรุงเทพมหานคร		พะยาโท	พะยาโท	กรุงเทพมหานคร	1	3.5000	0.9713	2.5288			28%	15%		1	
12	สพน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ จังหวัดนครพนม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะยาโท เขตพะยาโท กรุงเทพมหานคร		พะยาโท	พะยาโท	กรุงเทพมหานคร	1	3.0000	0.8933	2.1068			30%	15%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างวน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	58.3251	13.4075	44.9176	0.0000	0.0000	23%	47%	1	4	
1	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง) ต.มะเมือง, บ้านจาน อ. พุทไธสง จ.บุรีรัมย์		มะเพือก, บ้านพุทไธสง	บุรีรัมย์		1	8.6753		8.6753			0%	29%		1	
2	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	จ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ ภายในพื้นที่อุทยานไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก		ตากออก	บ้านตาก	ตาก	1	9.7388	2.7025	7.0363			28%	21%		1	
3	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	จ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดหาระบบ การบริหารงานอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำ โครงการนำร่องพื้นที่ลุ่มน้ำ น่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ (อ. สันติสุข จ.น่าน)			สันติสุข	น่าน	1	9.6000	4.8000	4.8000			50%	63%		1	
4	สอน.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ดินน้ำหนอง หาร จ.สกลนคร		หนองหาร	สกลนคร		1	27.9725	3.5665	24.4060			13%	20%		1	
5	สอน.	แผนงานพื้นฐาน	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 450 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.3385	2.3385	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ 100 %

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	4	156.0364	63.8954	92.1411	0.0000	0.0000	41%	57%	0	4	
1	สวพ.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายสถานีอุทกวิทยา เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการ กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	30.5924	5.0987	25.4936			17%	10%		1	ส่งใบตรวจรับการจัด งวดที่ 2 วันที่ 18 ม.ค. 64
2	สวพ.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและ พื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	103.2750	45.9000	57.3750			44%	69%		1	ส่งใบตรวจรับงาน งวดที่ 3 แล้ว เสร็จ ตามหนังสือ สวพ. ด่วน มาก ที่ ทส.0608.4/187 ลว. 29 ม.ค. 64
3	สวพ.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.2000	11.2000	8.0000			58%	77%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 3 แล้วเสร็จ ตามหนังสือ สวพ.ที่ ทส. 0608.4/2995 ลว. 9 ธ.ค.63 เบิกจ่ายแล้ว
4	สวพ.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อ การบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.9691	1.6966	1.2725			57%	70%		1	ตรวจรับงาน งวดที่ 3 แล้วเสร็จ ตามหนังสือ ที่ ทส. 0608.4/3075 ลว.24 ธ.ค.63 และขออนุมัติเบิกจ่ายตาม หนังสือที่ ทส.0601.5/2050 ลว.29 ธ..ค. 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	6	125.6997	41.7576	83.9421	0.0000	0.0000	33%	92%	0	6		
1	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำใน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	49.8381	14.6583	35.1798			29%	92%		1	
2	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	18.5972		18.5972			0%	85%		1	
3	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตาม สถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่ม น้ำกกและโขงเหนือ) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.9025	4.9513	4.9513			50%	98%		1	
4	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตาม สถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่ม น้ำแม่กลองและสาละวิน) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	21.6374	10.8187	10.8187			50%	96%		1	
5	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.9291	3.8027	9.1265			29%	92%		1	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
6	ศปว.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.7955	7.5268	5.2687			59%	92%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	5	91.8728	55.9976	35.8752	0.0000	0.0000	61%	84%	4	1	
1	ศสท.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ DWR Data Cleansing กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	44.8440	8.9688	35.8752			20%	22%		1	* ได้อนุมัติใช้เหลือจ่ายแล้ว จำนวนรวม 4 รายการ งบม. 92.4068 ลบ. * ส่วนที่สุด นร 0718/14158 ลว. 23 มี.ย.63
2	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการบำรุงรักษาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	7.2000	7.2000	0.0000			100%	100%	1		
3	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.4725	5.4725	0.0000			100%	100%	1		
4	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.3869	19.3869	0.0000			100%	100%	1		
5	ศสท.	แผนงานพื้นฐาน	โครงการระบบและบริหารภูมิ สารสนเทศกลาง (DWR GIS System)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	14.9694	14.9694	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	1	8.6510	0.0000	8.6510	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
1	กนก.	แผนงานบูรณา การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (เหลือจ่าย)	โครงการศึกษาและยกร่างบัญญัติ ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ในส่วนที่อยู่ใน พื้นที่และอำนาจ และการกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การ จัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)		ยุโป	เมือง	ยะลา	1	8.6510		8.6510			0%	0%		1	* ได้อนุมัติครั้งที่ 9 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบป. 10.1776 ลบ. * ตัวนที่สุด ที่ นร 0718/12292 ลว. 27 พ.ค.63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
							รวม	1	1.6660	1.6660	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
1	สสป.	แผนงานพื้นฐาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	1.6660	1.6660	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	11	9.3709	3.3411	6.0298	0.0000	0.0000	36%	91%	9	2		
1	สลก.	แผนงานพื้นฐาน	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	3.2258	3.1052	0.1206			96%	96%		1	งบดำเนินงานในภาพรวมของกรมเบิกจ่ายแล้วเสร็จ สำหรับงบประมาณคงเหลือ 120,631.97 บาท ที่ขอเงินไว้เพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ ของ 7 หน่วยงานภายในส่วนกลาง ซึ่งหมดความจำเป็นและได้ดำเนินการสลาย PO เรียบร้อยแล้ว และจะตกต่อไปในรอบมีนาคม 2564
2	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (แก้ไขประเภทรายการ)	ลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง อาคารกรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.9092	0.0000	5.9092			0%	0%		1	
3	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 63 ซม. x สูง 90 ซม.					1	0.0252	0.0252	0.0000			100%	100%	1		
4	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด กว้าง 160 ซม. x ลึก 80 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ข้าง ขนาด กว้าง 120 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ลิ้นชัก ขนาด กว้าง 40 ซม. x ลึก 48 ซม. x สูง 52 ซม.					1	0.0236	0.0236	0.0000			100%	100%	1		
5	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 65 ซม. x ลึก 62 ซม. x สูง 115 ซม.					1	0.0049	0.0049	0.0000			100%	100%	1		
6	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 93 ซม.					1	0.1134	0.1134	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ. ปี 63)	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวมเบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้าน บาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
			ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
				บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
7	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	แก้อื้อผู้บริหาร ขนาด กว้าง 68 ซม. x ลึก 76 ซม. x สูง 120 ซม.					1	0.0140	0.0140	0.0000			100%	100%	1		
8	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	แก้อื้อผู้บริหาร ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0100	0.0100	0.0000			100%	100%	1		
9	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	พาร์ทิชั่นจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบบทึบลิ้น ขนาด 100 ซม. x 160 ซม. จำนวน 4 แผ่น เสาพาร์ทิชั่น ขนาด กว้าง 5.5 ซม. x 160 ซม. จำนวน 2 ต้น ขาที่ พาร์ทิชั่น จำนวน 6 อัน					1	0.0198	0.0198	0.0000			100%	100%	1		
10	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	แก้อื้อสำนักงาน ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0200	0.0200	0.0000			100%	100%	1		
11	สลก.	แผนงานพื้นฐาน (เหลือจ่าย)	แก้อื้อสำนักงาน ขนาด กว้าง 64 ซม. x ลึก 78 ซม. x สูง 115-121 ซม.					1	0.0050	0.0050	0.0000			100%	100%	1		
