



ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

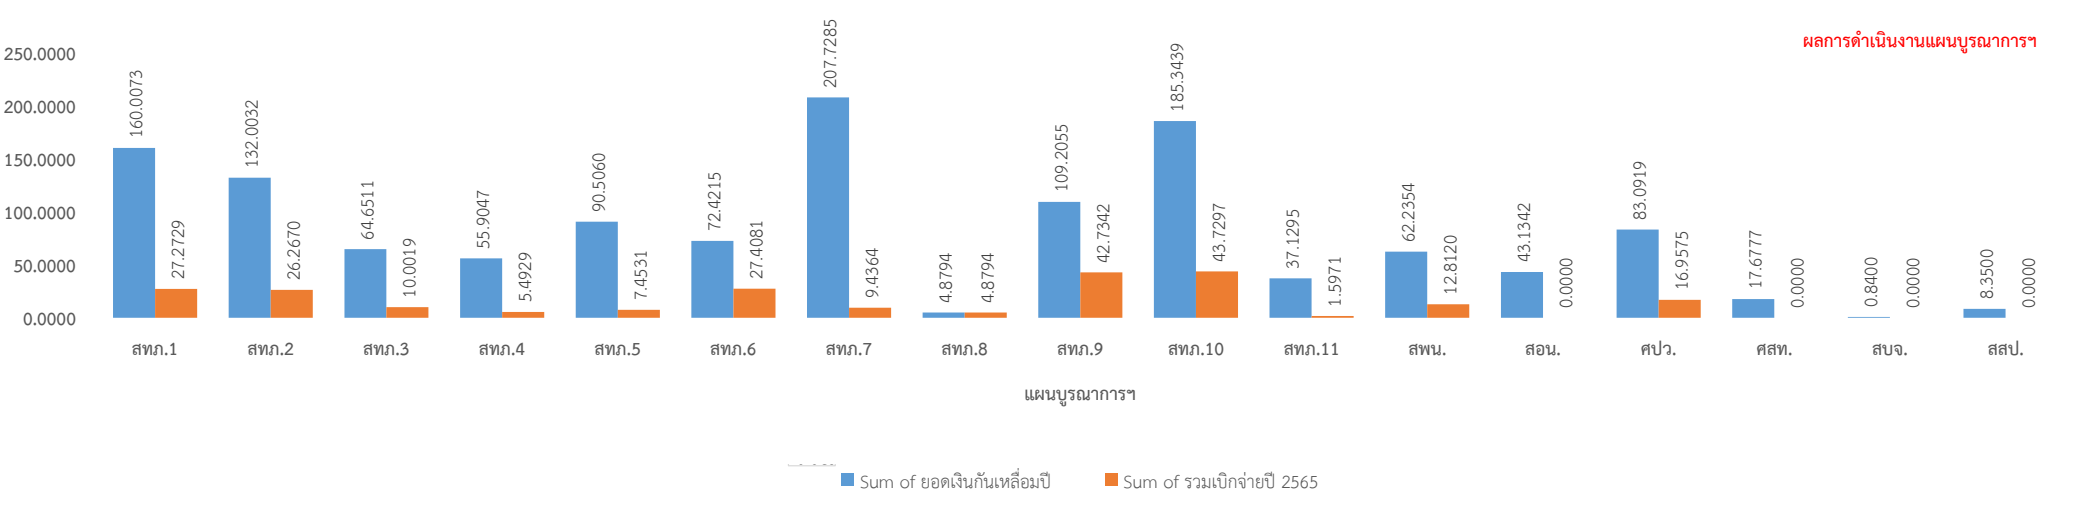

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

| หน่วยงาน               | รวม        | สทก.1    | สทก.2    | สทก.3   | สทก.4   | สทก.5   | สทก.6   | สทก.7    | สทก.8  | สทก.9    | สทก.10   | สทก.11  | สพน.    | สอน.    | ศปว.    | ศสท.    | สบจ.   | สสป.   |
|------------------------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| จำนวน (คก.)            | 112        | 22       | 10       | 10      | 12      | 2       | 9       | 5        | 1      | 14       | 13       | 4       | 4       | 1       | 2       | 1       | 1      | 1      |
| แล้วเสร็จ (คก.)        | 19         | 6        | 3        | 0       | 1       | 0       | 4       | 0        | 1      | 3        | 1        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)  | 93         | 16       | 7        | 10      | 11      | 2       | 5       | 5        | 0      | 11       | 12       | 4       | 4       | 1       | 2       | 1       | 1      | 1      |
| ยอดเงินกันเหลือปี      | 1,335.1101 | 160.0073 | 132.0032 | 64.6511 | 55.9047 | 90.5060 | 72.4215 | 207.7285 | 4.8794 | 109.2055 | 185.3439 | 37.1295 | 62.2354 | 43.1342 | 83.0919 | 17.6777 | 0.8400 | 8.3500 |
| รวมเบิกจ่ายปี 2565     | 236.0423   | 27.2729  | 26.2670  | 10.0019 | 5.4929  | 7.4531  | 27.4081 | 9.4364   | 4.8794 | 42.7342  | 43.7297  | 1.5971  | 12.8120 | 0.0000  | 16.9575 | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 |
| ยอดเงินกันคงเหลือ      | 1,099.0678 | 132.7344 | 105.7362 | 54.6492 | 50.4118 | 83.0529 | 45.0135 | 198.2921 | 0.0000 | 66.4714  | 141.6142 | 35.5324 | 49.4234 | 43.1342 | 66.1344 | 17.6777 | 0.8400 | 8.3500 |
| ลดค้างงาน              | 1.5883     | 0.0000   | 1.5787   | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0096   | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 |
| % ผลการเบิกจ่ายเงินกัน | 18%        | 17%      | 20%      | 15%     | 10%     | 8%      | 38%     | 5%       | 100%   | 39%      | 24%      | 4%      | 21%     | 0%      | 20%     | 0%      | 0%     | 0%     |

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

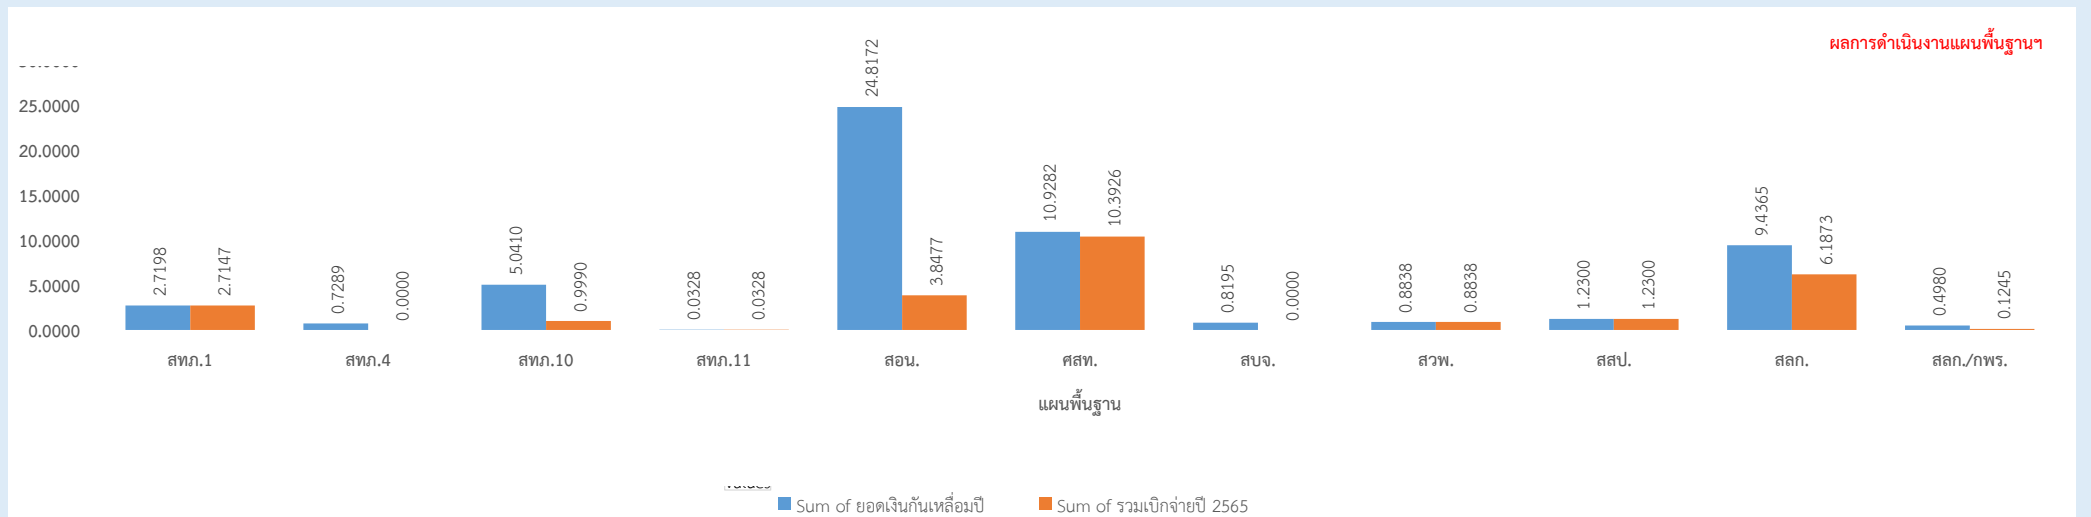

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

| หน่วยงาน               | รวม     | สทท.1  | สทท.4  | สทท.10 | สทท.11 | สอน.    | ศสท.    | สบจ.   | สวพ.   | สสป.   | สลก.   | สลก./กพร. |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| จำนวน (คก.)            | 50      | 2      | 1      | 2      | 1      | 11      | 17      | 2      | 3      | 1      | 9      | 1         |
| แล้วเสร็จ (คก.)        | 23      | 2      | 0      | 1      | 1      | 9       | 3       | 0      | 3      | 1      | 3      | 0         |
| ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)  | 27      | 0      | 1      | 1      | 0      | 2       | 14      | 2      | 0      | 0      | 6      | 1         |
| ยอดเงินกันเหลือปี      | 57.1357 | 2.7198 | 0.7289 | 5.0410 | 0.0328 | 24.8172 | 10.9282 | 0.8195 | 0.8838 | 1.2300 | 9.4365 | 0.4980    |
| รวมเบิกจ่ายปี 2565     | 26.4124 | 2.7147 | 0.0000 | 0.9990 | 0.0328 | 3.8477  | 10.3926 | 0.0000 | 0.8838 | 1.2300 | 6.1873 | 0.1245    |
| ยอดเงินกันคงเหลือ      | 30.7233 | 0.0051 | 0.7289 | 4.0420 | 0.0000 | 20.9695 | 0.5356  | 0.8195 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2491 | 0.3735    |
| ลดค้างงาน              | 0.0442  | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0391  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    |
| % ผลการเบิกจ่ายเงินกัน | 46%     | 100%   | 0%     | 20%    | 100%   | 16%     | 95%     | 0%     | 100%   | 100%   | 66%    | 25%       |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                       | พื้นที่ดำเนินโครงการ    |           |              |            | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินต้น<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ  | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                               |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                   | บ้าน/<br>หมู่ที่        | ตำบล      | อำเภอ        | จังหวัด    |                   |                         |                        |          |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                          |
|     |              |                                       |                                                                                                   |                         |           |              |            | 24                | 162.7271                | 29.9876                | 132.7395 | 0.0051   | 0.0000  | 18%                | 74%                 | 8                    | 16                      |                                                          |
| 1   | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น(บ้านห้วยน้ำขุ่น)                    | ห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16  | ท่าก้อ    | แม่สรวย      | เชียงราย   | 1                 | 6.4114                  | 6.4114                 | 0.0000   |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                       |
| 2   | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยสัมปอ(บ้านห้วยสัมปอใหม่)                    | ห้วยสัมปอใหม่ หมู่ที่ 8 | ดอยแก้ว   | จอมทอง       | เชียงใหม่  | 1                 | 1.6727                  | 0.0000                 | 1.6727   |          |         | 0%                 | 62%                 |                      | 1                       | หยุดงาน/ติดปัญหาการขออนุญาตป่าไม้                        |
| 3   | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปุนหลวง(บ้านแม่ปุนหลวง)                      | แม่ปุนหลวง หมู่ที่ 8    | เวียง     | เวียงป่าเป้า | เชียงราย   | 1                 | 6.7256                  | 5.9470                 | 0.7787   |          |         | 88%                | 100%                |                      | 1                       | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน                                    |
| 4   | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ใจ(บ้านแม่ใจหลวง)                            | แม่ใจหลวง หมู่ที่ 9     | บ่อสลี    | ฮอด          | เชียงใหม่  | 1                 | 1.7190                  | 0.0000                 | 1.7190   |          |         | 0%                 | 86%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน                                     |
| 5   | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ระยะ 2               | ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15  | ป่าตึง    | แม่จัน       | เชียงราย   | 1                 | 1.2998                  | 1.2998                 | 0.0000   |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                       |
| 6   | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านกล่อเซไถ)         | ปู่ทา หมู่ที่ 6         | แม่สามแลบ | สบเมย        | แม่ฮ่องสอน | 1                 | 4.1720                  | 0.0000                 | 4.1720   |          |         | 0%                 | 67%                 |                      | 1                       | หยุดงาน/แก้ไขแบบแปลน                                     |
| 7   | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยบัง                                                          | ห้วยบัง หมู่ที่ 3       | ศรีวิชัย  | ลี้          | ลำพูน      | 1                 | 7.5174                  | 0.0000                 | 7.5174   |          |         | 0%                 | 82%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน                                     |
| 8   | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านป่าข้าวหลาม) | ป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7   | กีดช้าง   | แม่แตง       | เชียงใหม่  | 1                 | 16.7081                 | 0.0000                 | 16.7081  |          |         | 0%                 | 22%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน /สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 5 มีนาคม 2565 |
| 9   | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยวังหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ       | ใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2   | ทาเหนือ   | แม่ออน       | เชียงใหม่  | 1                 | 4.8841                  | 4.8841                 | 0.0000   |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                       |
| 10  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม(บ้านหนองปู)                       | หนองปู หมู่ที่ 9        | นาทราย    | ลี้          | ลำพูน      | 1                 | 3.0125                  | 3.0125                 | 0.0000   |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                       |

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                                                  | พื้นที่ดำเนินโครงการ      |          |           |            | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหต้อมปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                      |
|-----|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                                              | บ้าน/<br>หมู่ที่          | ตำบล     | อำเภอ     | จังหวัด    |                   |                        |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                 |
| 11  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านคอยช้าง)                                | คอยช้าง หมู่ที่ 3         | วาวี     | แม่สรวย   | เชียงราย   | 1                 | 4.6803                 | 0.0000                 | 4.6803  |          |         | 0%                 | 90%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน                                            |
| 12  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง(บ้านผาละปี)                                                        | ผาละปี หมู่ที่ 8          | แม่ศึก   | แม่แจ่ม   | เชียงใหม่  | 1                 | 5.6239                 | 0.0000                 | 5.6239  |          |         | 0%                 | 61%                 |                      | 1                       | หยุดงาน/ติดปัญหาโควิด 19                                        |
| 13  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านเมืองก๊ิด)                              | เมืองก๊ิด หมู่ที่ 1       | ก๊ิดช้าง | แม่แตง    | เชียงใหม่  | 1                 | 12.2659                | 0.0000                 | 12.2659 |          |         | 0%                 | 3%                  |                      | 1                       | หยุดงาน/ติดปัญหาการขออนุญาตป่าไม้                               |
| 14  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะห้วยน้ำเย็น                                   | ห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 1     | แม่ตื่น  | แม่ระมาด  | ตาก        | 1                 | 13.8558                | 0.0000                 | 13.8558 |          |         | 0%                 | 30%                 |                      | 1                       | หยุดงาน/แก้ไขแบบแปลน                                            |
| 15  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านแม่สายป่าเมี่ยง)                        | แม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 | โหล่งขอด | พร้าว     | เชียงใหม่  | 1                 | 4.5870                 | 0.0000                 | 4.5870  |          |         | 0%                 | 15%                 |                      | 1                       | หยุดงาน/ติดปัญหาพื้นที่ป่า                                      |
| 16  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ระลอ(บ้านแม่วาก)                                         | แม่วาก หมู่ที่ 6          | แม่เงา   | แม่แจ่ม   | เชียงใหม่  | 1                 | 6.8087                 | 0.0000                 | 6.8087  |          |         | 0%                 | 85%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน                                            |
| 17  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านผาผึ้ง) (ระยะ2)                     | ผาผึ้ง หมู่ที่ 6          | เชียงทอง | วังเจ้า   | ตาก        | 1                 | 4.8765                 | 0.0000                 | 4.8765  |          |         | 0%                 | 62%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน / สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 18  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านละอูพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบโซน B)                          | ละอูบ หมู่ที่ 6           | ห้วยห้อม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | 1                 | 35.5699                | 0.0000                 | 35.5699 |          |         | 0%                 | 45%                 |                      | 1                       | หยุดงาน/แก้ไขแบบแปลน                                            |
| 19  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม(บ้านหนองบอน)                                                 | หนองบอน หมู่ที่ 11        | นาทราย   | สี        | ลำพูน      | 1                 | 2.8750                 | 2.8750                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                              |
| 20  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านโปง)                                    | โปง หมู่ที่ 6             | ป่าไผ่   | สันทราย   | เชียงใหม่  | 1                 | 7.5314                 | 0.0000                 | 7.5314  |          |         | 0%                 | 55%                 |                      | 1                       | หยุดงาน/ติดปัญหาโควิด 19                                        |
| 21  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (บ้านห้วยมะเขาง)<br>(ปรับแผน - ทดแทน-0900652017410030) | ห้วยมะเขาง หมู่ที่ 5      | วาวี     | แม่สรวย   | เชียงราย   | 1                 | 4.3671                 | 0.0000                 | 4.3671  |          |         | 0%                 | 100%                |                      | 1                       | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน                                           |

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                   | ชื่อโครงการ                                                                                 | พื้นที่ดำเนินโครงการ |              |          |           | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหตึ่ลือมปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|-----------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |              |                                                                          |                                                                                             | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล         | อำเภอ    | จังหวัด   |                   |                           |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
| 22  | สทภ.1        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ระยะ 2) |                      | ช้างเค็ก     | แม่แจ่ม  | เชียงใหม่ | 1                 | 2.8432                    | 2.8432                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ         |
| 23  | สทภ.1        | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง                                    | ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6 | หนองบัวเพนือ | เมืองตาก | ตาก       | 1                 | 0.5823                    | 0.5788                 | 0.0035  | 0.0035   |         | 99%                | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ         |
| 24  | สทภ.1        | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง                                        | ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6 | หนองบัวเพนือ | เมืองตาก | ตาก       | 1                 | 2.1375                    | 2.1359                 | 0.0016  | 0.0016   |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ         |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                                  | พื้นที่ดำเนินโครงการ |           |                |           | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ  | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                              | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล      | อำเภอ          | จังหวัด   |                   |                          |                        |          |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
|     |              |                                       |                                                                                                              |                      |           |                |           | 10                | 132.0032                 | 26.2670                | 105.7362 | 1.5787   | 0.0000  | 20%                | 70%                 | 3                    | 7                       |                            |
| 1   | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปึงเสนาฬ ช่วง 3                                                                        | หมู่ที่ 2, 4, 5      | ปึงเสนาฬ  | เมืองนครสวรรค์ | นครสวรรค์ | 1                 | 14.9985                  | 0.0000                 | 14.9985  |          |         | 0%                 | 93%                 |                      | 1                       |                            |
| 2   | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพืชผักแปลงใหญ่ทองหลาง                                                           | หมู่ที่ 4            | ทองหลาง   | ห้วยคต         | อุทัยธานี | 1                 | 6.9300                   | 6.9300                 | 0.0000   |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 3   | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่                                                            | หมู่ที่ 9            | วังมะกากร | ท่าตะโก        | นครสวรรค์ | 1                 | 5.2253                   | 0.0000                 | 5.2253   |          |         | 0%                 | 59%                 |                      | 1                       | ขยายสัญญา ถึง 20 ธ.ค. 64   |
| 4   | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                                              |                      | หินซื่อน  | แก่งคอย        | สระบุรี   | 1                 | 5.5900                   | 0.0000                 | 5.5900   |          |         | 0%                 | 22%                 |                      | 1                       |                            |
| 5   | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำนากกระหา-สนับสนุนประปาหมู่บ้าน                                               |                      | หนองจอก   | บ้านไร่        | อุทัยธานี | 1                 | 6.2884                   | 0.0000                 | 6.2884   |          |         | 0%                 | 97%                 |                      | 1                       |                            |
| 6   | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เกาะเทโพ, สะแกกรัง, ท่าซุง)                       |                      | เกาะเทโพ  | เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 1                 | 9.9384                   | 8.3597                 | 1.5787   | 1.5787   |         | 84%                | 100%                | 1                    |                         | ลดค่างาน                   |
| 7   | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว (จุดที่ 2) | ห้วยน้ำขาวหมู่ที่ 1  | เข็กน้อย  | เขาค้อ         | เพชรบูรณ์ | 1                 | 19.9690                  | 0.0000                 | 19.9690  |          |         | 0%                 | 20%                 |                      | 1                       |                            |
| 8   | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (สะแกกรัง, หาดทอง, เกาะเทโพ )                      |                      | หาดทอง    | เมืองอุทัยธานี | อุทัยธานี | 1                 | 21.5418                  | 0.0000                 | 21.5418  |          |         | 0%                 | 25%                 |                      | 1                       | หยุดงาน                    |
| 9   | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงวังทำดินดำแหล่งน้ำปึกอ้อย แหล่งน้ำหนองบัวพร้อมระบบกระจายน้ำ                     | หมู่ที่ 1            | ทำดินดำ   | ชัยบาดาล       | ลพบุรี    | 1                 | 30.5445                  | 0.0000                 | 30.5445  |          |         | 0%                 | 81%                 |                      | 1                       | หยุดงาน                    |
| 10  | สทภ.2        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำปึงลาดเชื่อมต่อบึงเพ็งเชื่อมต่อบึงหลังบ้านเชื่อมต่อบึงบัว                  |                      | ดาสังข์   | บรรพตพิสัย     | นครสวรรค์ | 1                 | 10.9773                  | 10.9773                | 0.0000   |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                        | พื้นที่ดำเนินโครงการ  |          |                  |             | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินต้น<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค         |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                                                                                                                    | บ้าน/<br>หมู่ที่      | ตำบล     | อำเภอ            | จังหวัด     |                   |                         |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                    |
|     |              |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                       |          |                  |             | 10                | 64.6511                 | 10.0019                | 54.6492 | 0.0000   | 0.0000  | 15%                | 49%                 | 0                    | 10                      |                                    |
| 1   | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ                                                                                                                                  |                       | บ้านข้า  | ศรีสงคราม        | นครพนม      | 1                 | 5.3779                  | 0.0000                 | 5.3779  |          |         | 0%                 | 65%                 |                      | 1                       |                                    |
| 2   | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ยางพารา                                                                                                                                                |                       | บงใต้    | สว่างแดนดิน      | สกลนคร      | 1                 | 5.4751                  | 0.0000                 | 5.4751  |          |         | 0%                 | 56%                 |                      | 1                       |                                    |
| 3   | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ นาข้าว                                                                                                                                                |                       | บงเหนือ  | สว่างแดนดิน      | สกลนคร      | 1                 | 4.4279                  | 0.0000                 | 4.4279  |          |         | 0%                 | 71%                 |                      | 1                       |                                    |
| 4   | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหว้าน้อยสนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ปรับแผน/ทดแทน) - 52017410025                                                                 | นาหว้าน้อย หมู่ที่ 3  | กกสะทอน  | ด่านซ้าย         | เลย         | 1                 | 8.0000                  | 0.0000                 | 8.0000  |          |         | 0%                 | 11%                 |                      | 1                       | 29/9/64 น้ำป่าไหลหลาก จากลำน้ำหมัน |
| 5   | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว (ปรับแผน/ทดแทน - 52017410020)                                                                                                 | หมู่ที่ 1             | ทุ่งใหญ่ | ทุ่งฝน           | อุดรธานี    | 1                 | 6.3127                  | 2.1471                 | 4.1656  |          |         | 34%                | 85%                 |                      | 1                       |                                    |
| 6   | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วัดพัชรกิติยาภาราม                                                                                                                   | บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 | หนองหัว  | เมืองหนองบัวลำภู | หนองบัวลำภู | 1                 | 7.5244                  | 6.6179                 | 0.9065  |          |         | 88%                | 97%                 |                      | 1                       |                                    |
| 7   | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำโรงเรียนบ้านสนามบินพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                  | สนามบิน หมู่ที่ 8     | อุ้มจาน  | กุสุมาลย์        | สกลนคร      | 1                 | 9.5330                  | 0.0000                 | 9.5330  |          |         | 0%                 | 2%                  |                      | 1                       |                                    |
| 8   | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | แสนพัน หมู่ที่ 14     | อุ้มจาน  | กุสุมาลย์        | สกลนคร      | 1                 | 9.0000                  | 0.7239                 | 8.2761  |          |         | 8%                 | 11%                 |                      | 1                       |                                    |

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                          | พื้นที่ดำเนินโครงการ  |         |           |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหตื้อมปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                                                                                                                      | บ้าน/<br>หมู่ที่      | ตำบล    | อำเภอ     | จังหวัด |                   |                         |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
| 9   | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนโพธิ์แสนวิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                  | แสนพัน หมู่ที่ 11     | อุ้มจาน | กุสุมาลย์ | สกลนคร  | 1                 | 6.0000                  | 0.5130                 | 5.4870  |          |         | 9%                 | 13%                 |                      | 1                       |                            |
| 10  | สทภ.3        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | หนองปลาตอง หมู่ที่ 11 | นาเพียง | กุสุมาลย์ | สกลนคร  | 1                 | 3.0000                  | 0.0000                 | 3.0000  |          |         | 0%                 | 80%                 |                      | 1                       |                            |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                   | ชื่อโครงการ                           | พื้นที่ดำเนินโครงการ  |           |                |           | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                              |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                                                          |                                       | บ้าน/<br>หมู่ที่      | ตำบล      | อำเภอ          | จังหวัด   |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                                                                         |
|     |              |                                                                          |                                       |                       |           |                |           | 13                | 56.6336                  | 5.4929                 | 51.1407 | 0.0000   | 0.0000  | 10%                | 58%                 | 1                    | 12                      |                                                                                                                         |
| 1   | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน         | เกาะแก้ว หมู่ที่ 6    | สามขา     | โพธาราม        | ร้อยเอ็ด  | 1                 | 2.9200                   | 2.9200                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว                                                                                |
| 2   | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโลโพ         | แผ่นดินทอง หมู่ที่ 13 | ลุ่มน้ำชี | บ้านเขว้า      | ชัยภูมิ   | 1                 | 12.8945                  | 0.0000                 | 12.8945 |          |         | 0%                 | 2%                  |                      | 1                       | นำจากแม่น้ำชีทะเลล้นท่วมโครงการ อนุมัติหยุดงาน 28 มิ.ย.64                                                               |
| 3   | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบอน                 | หนองบอน               | หนองบอน   | โกสุมพิสัย     | มหาสารคาม | 1                 | 5.3107                   | 0.0000                 | 5.3107  |          |         | 0%                 | 98%                 |                      | 1                       |                                                                                                                         |
| 4   | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกะฮาด        | กะฮาด หมู่ที่ 6       | กะฮาด     | เนินสง่า       | ชัยภูมิ   | 1                 | 9.4797                   | 0.0000                 | 9.4797  |          |         | 0%                 | 50%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างหยุดงานโครงการฯ ผู้ใหญ่บ้านกะฮาดหมู่ที่ 6 ระบายน้ำเข้าบึงกะฮาด ผู้ควบคุมงานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ในสัปดาห์หน้า |
| 5   | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตุล         | แจ้งฉม                | เจ้าท่า   | กมลาไสย        | กาฬสินธุ์ | 1                 | 5.8027                   | 0.0000                 | 5.8027  |          |         | 0%                 | 22%                 |                      | 1                       | หยุดงาน                                                                                                                 |
| 6   | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองราชบุรี             | โพงาม                 | โพงาม     | โกสุมพิสัย     | มหาสารคาม | 1                 | 5.0666                   | 0.0000                 | 5.0666  |          |         | 0%                 | 78%                 |                      | 1                       | หยุดงาน                                                                                                                 |
| 7   | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเติน        | หนองตอ หมู่ที่ 11     | หัวช้าง   | จตุรพักตรพิมาน | ร้อยเอ็ด  | 1                 | 4.2589                   | 1.2584                 | 3.0005  |          |         | 30%                | 97%                 |                      | 1                       |                                                                                                                         |
| 8   | สทภ.4        | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สทภ.4 |                       | ในเมือง   | เมืองขอนแก่น   | ขอนแก่น   | 1                 | 0.7289                   | 0.0000                 | 0.7289  |          |         | 0%                 | 100%                |                      | 1                       |                                                                                                                         |

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                 | พื้นที่ดำเนินโครงการ    |            |               |           | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                       |
|-----|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                                                                                                                             | บ้าน/<br>หมู่ที่        | ตำบล       | อำเภอ         | จังหวัด   |                   |                         |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                  |
| 9   | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกะมัง เขตรักษาพื้นที่สัตว์ป่าภูเขียว บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17                                                                                                                  | หนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17 | นางแดด     | หนองบัวแดง    | ชัยภูมิ   | 1                 | 1.7590                  | 0.0000                 | 1.7590  |          |         | 0%                 | 47%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างหยุดงาน                               |
| 10  | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูโคกหนองขวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมระบบส่งน้ำ                                                                                                                                               |                         | นาสีนวน    | กันทรวิชัย    | มหาสารคาม | 1                 | 2.9614                  | 0.7412                 | 2.2202  |          |         | 25%                | 79%                 |                      | 1                       | เหลืองานระบบส่งน้ำ                               |
| 11  | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงฝาย กว๊าน 11 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า                                                                                                                                                          | ตาครินทอง               | ธาตุทอง    | ภูเขียว       | ชัยภูมิ   | 1                 | 1.5760                  | 0.0000                 | 1.5760  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       | อยู่ระหว่างหยุดงานโครงการฯ ดำเนินการแก้ไขแบบแปลน |
| 12  | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           |                         | บัวเงิน    | น้ำพอง        | ขอนแก่น   | 1                 | 1.1652                  | 0.1709                 | 0.9944  |          |         | 15%                | 34%                 |                      | 1                       |                                                  |
| 13  | สทภ.4        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |                         | เหนือเมือง | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด  | 1                 | 2.7100                  | 0.4025                 | 2.3076  |          |         | 15%                | 50%                 |                      | 1                       |                                                  |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอขึ้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                | พื้นที่ดำเนินโครงการ |                         |                     |            | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                          |
|-----|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                            | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล                    | อำเภอ               | จังหวัด    |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                     |
|     |              |                                       |                                                            |                      |                         |                     |            | 2                 | 90.5060                  | 7.4531                 | 83.0529 | 0.0000   | 0.0000  | 8%                 | 3%                  | 0                    | 2                       |                                                                     |
| 1   | สทภ.5        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงพื้นที่พื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก ท้องโน | หมู่ที่ 4            | โนนสำราญ                | แก้งสนามนาง         | นครราชสีมา | 1                 | 50.0000                  | 7.4531                 | 42.5469 |          |         | 15%                | 0%                  |                      | 1                       | 1/11/64 เบิกล่วงหน้า15%=7,453,132.50 บาท                            |
| 2   | สทภ.5        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูลำสะแทดพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง      |                      | กุสุมาแดง,<br>หนองเยือง | บ้านใหม่<br>ไชยพจน์ | บุรีรัมย์  | 1                 | 40.5060                  | 0.0000                 | 40.5060 |          |         | 0%                 | 6%                  |                      | 1                       | 2/6/64 เบิกล่วงหน้า15%=7,308,750.-บาท<br>28/09/64 ง1=910,212.58 บาท |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                               | พื้นที่ดำเนินโครงการ |            |             |            | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                                                       |
|-----|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                           | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล       | อำเภอ       | จังหวัด    |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                                                                                                  |
|     |              |                                       |                                                           |                      |            |             |            | 9                 | 72.4215                  | 27.4081                | 45.0135 | 0.0000   | 0.0000  | 38%                | 88%                 | 4                    | 5                       |                                                                                                                                                  |
| 1   | สทภ.6        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกระตัง                   | หมู่ที่ 25           | คลองตะเกรา | ท่าตะเกียบ  | ฉะเชิงเทรา | 1                 | 12.6461                  | 9.0008                 | 3.6453  |          |         | 71%                | 95%                 |                      | 1                       | ขยายสัญญา 20 ต.ค. 64 - 8 ม.ค. 65                                                                                                                 |
| 2   | สทภ.6        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าชันขุน                       | หมู่ที่ 25           | คลองตะเกรา | ท่าตะเกียบ  | ฉะเชิงเทรา | 1                 | 6.8604                   | 6.8604                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                                                                                                                                                  |
| 3   | สทภ.6        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งเบญจา                           | หมู่ที่ 3            | ทุ่งเบญจา  | ท่าใหม่     | จันทบุรี   | 1                 | 15.5173                  | 0.0000                 | 15.5173 |          |         | 0%                 | 45%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการยังเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 13 จะแจ้งทางให้เข้าดำเนินการเดือนมกราคม 2565 |
| 4   | สทภ.6        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองตาคลาน (ปรับแผน - ทดแทน) | หมู่ที่ 10           | พวา        | แก่งหางแมว  | จันทบุรี   | 1                 | 0.3562                   | 0.0000                 | 0.3562  |          |         | 0%                 | 70%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากถนนทางเข้าโครงการยังไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ จึงยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในพื้นที่โครงการได้                      |
| 5   | สทภ.6        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก (ปรับแผน - ทดแทน)           | เขาดวน หมู่ที่ 9     | ย่านรี     | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1                 | 12.0433                  | 6.2839                 | 5.7594  |          |         | 52%                | 90%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 เนื่องจากเจอขึ้นหินต้องทำการแก้ไขแบบแปลน                                                              |
| 6   | สทภ.6        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเข้        | หมู่ที่ 12           | นนทรีย์    | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1                 | 1.7420                   | 1.7420                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                                                                                                                                                  |
| 7   | สทภ.6        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก้มลิงหนองกรด  | หมู่ที่ 4,9          | คำโดนด     | ประจันตคาม  | ปราจีนบุรี | 1                 | 1.7670                   | 1.7670                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                                                                                                                                                  |
| 8   | สทภ.6        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                | หนองแสง หมู่ที่ 11   | นาแหม      | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | 1                 | 1.7540                   | 1.7540                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                                                                                                                                                  |
| 9   | สทภ.6        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน                              | หมู่ที่ 5            | ดอนยอ      | เมือง       | นครนายก    | 1                 | 19.7352                  | 0.0000                 | 19.7352 |          |         | 0%                 | 24.80%              |                      | 1                       | ตกพับ - อยู่ระหว่างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64                                                                                              |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                | พื้นที่ดำเนินโครงการ  |             |            |                 | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินต้น<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ  | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                                                                              |
|-----|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                                                                                                            | บ้าน/<br>หมู่ที่      | ตำบล        | อำเภอ      | จังหวัด         |                   |                         |                        |          |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                                                                                                                         |
|     |              |                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |             |            |                 | 5                 | 207.7285                | 9.4364                 | 198.2921 | 0.0000   | 0.0000  | 5%                 | 64%                 | 0                    | 5                       |                                                                                                                                                                         |
| 1   | สทภ.7        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ                                                                                                                                                      |                       | ชัยเกษม     | บางสะพาน   | ประจวบคีรีขันธ์ | 1                 | 118.0000                | 0.0000                 | 118.0000 |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       | 29/9/64 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง สรุปผลการพิจารณาว่า ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ |
| 2   | สทภ.7        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว                                                                                                                     |                       | สามร้อยยอด  | สามร้อยยอด | ประจวบคีรีขันธ์ | 1                 | 2.4800                  | 0.0000                 | 2.4800   |          |         | 0%                 | 75%                 |                      | 1                       | 27/12/64 อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้างแผงโซลาร์เซลล์ งานวางท่อ                                                                                                          |
| 3   | สทภ.7        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุ่มวังและป่าชุมชน                                                                                                                                 | เนินสมบัติ หมู่ที่ 14 | จรเข้สามพัน | อุ้มทอง    | สุพรรณบุรี      | 1                 | 31.9396                 | 4.8982                 | 27.0414  |          |         | 15%                | 65%                 |                      | 1                       | 27/12/64 อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้าง และงานระบบกระจายน้ำ                                                                                                              |
| 4   | สทภ.7        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905)                                                                                       |                       | ไทรโยค      | ไทรโยค     | กาญจนบุรี       | 1                 | 35.4859                 | 0.0000                 | 35.4859  |          |         | 0%                 | 85%                 |                      | 1                       | 27/12/64 อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างถึงน้ำใส และงานระบบโซลาร์เซลล์                                                                                                     |
| 5   | สทภ.7        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี |                       | ท่าเสา      | ไทรโยค     | กาญจนบุรี       | 1                 | 19.8230                 | 4.5382                 | 15.2848  |          |         | 23%                | 94%                 |                      | 1                       | 27/12/64 อยู่ระหว่างงานก่อสร้างถึงเก็บน้ำ คลส. และงานวางท่อ และงานชุดสระเก็บน้ำ งานดาดครีตสระเก็บน้ำ                                                                    |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                           | พื้นที่ดำเนินโครงการ |       |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                       | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล  | อำเภอ | จังหวัด |                   |                         |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
|     |              |                                       |                                                                                       |                      |       |       |         | 1                 | 4.8794                  | 4.8794                 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 100%               | 100%                | 1                    | 0                       |                            |
| 1   | สทก.8        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 | ลำลอง หมู่ที่ 12,13  | นาทวี | นาทวี | สงขลา   | 1                 | 4.8794                  | 4.8794                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                     | พื้นที่ดำเนินโครงการ |               |            |          | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                  |
|-----|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                 | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล          | อำเภอ      | จังหวัด  |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                             |
|     |              |                                       |                                                                                                 |                      |               |            |          | 14                | 109.2055                 | 42.7342                | 66.4714 | 0.0000   | 0.0000  | 39%                | 64%                 | 3                    | 11                      |                                                             |
| 1   | สทภ.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจรเข้-หนองแม่ระวีง (ผูกพันข้ามปี 2563-2565)                         |                      | สารจิตร       | ศรีสขาลัย  | สุโขทัย  | 1                 | 14.3481                  | 0.0000                 | 14.3481 |          |         | 0%                 | 30%                 |                      | 1                       |                                                             |
| 2   | สทภ.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ                     | ห้วยโพน หมู่ที่ 2    | ดงญา          | บ่อเกลือ   | น่าน     | 1                 | 12.7279                  | 0.0000                 | 12.7279 |          |         | 0%                 | 11%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างการรออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน)        |
| 3   | สทภ.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง                       | ปางยาง หมู่ที่ 1     | ภูคา          | ปัว        | น่าน     | 1                 | 4.5904                   | 0.0000                 | 4.5904  |          |         | 0%                 | 55%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างการรออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน)        |
| 4   | สทภ.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงพาด-หนองบัวแดง                                                                 |                      | หาดสองแคว     | ตรอน       | อุดรดิต์ | 1                 | 38.0934                  | 26.1687                | 11.9247 |          |         | 69%                | 89%                 |                      | 1                       |                                                             |
| 5   | สทภ.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ | น้ำจุน หมู่ที่ 4     | บ่อเกลือเหนือ | บ่อเกลือ   | น่าน     | 1                 | 2.9930                   | 0.0000                 | 2.9930  |          |         | 0%                 | 20%                 |                      | 1                       |                                                             |
| 6   | สทภ.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน  | สมุนใหม่ ม.16        | สะเนียน       | เมืองน่าน  | น่าน     | 1                 | 2.7571                   | 0.0000                 | 2.7571  |          |         | 0%                 | 30%                 |                      | 1                       |                                                             |
| 7   | สทภ.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน  | ใหม่หัวดง หมู่ที่ 10 | สันทะ         | นาน้อย     | น่าน     | 1                 | 1.3434                   | 1.3434                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 21 ต.ค. 2564) |
| 8   | สทภ.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน          | นุขเขียน หมู่ที่ 7   | บ่อภาค        | ชาติตระการ | พิษณุโลก | 1                 | 2.8947                   | 0.0000                 | 2.8947  |          |         | 0%                 | 95%                 |                      | 1                       |                                                             |

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                                                 | พื้นที่ดำเนินโครงการ     |           |            |          | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                     |
|-----|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                                             | บ้าน/<br>หมู่ที่         | ตำบล      | อำเภอ      | จังหวัด  |                   |                         |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                                                                |
| 9   | สทก.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง (ระยะที่ 2)                  | นาม่วง ม.7               | เมืองลี   | นาหมื่น    | น่าน     | 1                 | 1.1045                  | 0.0000                 | 1.1045  |          |         | 0%                 | 85%                 |                      | 1                       |                                                                                                                |
| 10  | สทก.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน                              | ล้าน หมู่ที่ 8           | สันทะ     | น่าน้อย    | น่าน     | 1                 | 1.1031                  | 0.0000                 | 1.1031  |          |         | 0%                 | 98%                 |                      | 1                       |                                                                                                                |
| 11  | สทก.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม                               | ตองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 | แม่จริม   | แม่จริม    | น่าน     | 1                 | 7.4979                  | 0.0000                 | 7.4979  |          |         | 0%                 | 77%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างการรออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน)                                                           |
| 12  | สทก.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงตำบลห้วยหม้าย                                                                                          |                          | ห้วยหม้าย | สอง        | แพร่     | 1                 | 11.9137                 | 11.9137                | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 5 งวดสุดท้าย 15 ต.ค. 2564)                                                    |
| 13  | สทก.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค (ภูซัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว) |                          | บ่อภาค    | ชาติตระการ | พิษณุโลก | 1                 | 3.3083                  | 3.3083                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 14 ก.ย. 2564)                                                    |
| 14  | สทก.9        | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ                               | น้ำโฆ้ง                  | ดู่พงษ์   | สันติสุข   | น่าน     | 1                 | 4.5300                  | 0.0000                 | 4.5300  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       | * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และลงนามในสัญญา เลขที่ สทก.9 25/2565 ลง 18 พ.ย. 64 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,510,000.00 บาท |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                             | พื้นที่ดำเนินโครงการ |                                                     |                     |               | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ  | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |              |                                       |                                                         | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล                                                | อำเภอ               | จังหวัด       |                   |                          |                        |          |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
|     |              |                                       |                                                         |                      |                                                     |                     |               | 15                | 190.3849                 | 44.7287                | 145.6562 | 0.0096   | 0.0000  | 23%                | 43%                 | 2                    | 13                      |                            |
| 1   | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงพื้นที่พุน้ำตื้นจังหวัด                         | หมู่ที่ 11           | บางหมาก                                             | เมืองชุมพร          | ชุมพร         | 1                 | 14.9945                  | 10.0164                | 4.9781   |          |         | 67%                | 88%                 |                      | 1                       |                            |
| 2   | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | อนุรักษ์พื้นที่พุน้ำตื้นคลองโทรมาศ ช่วง 1               |                      | บางหริ่ง,<br>โคกเจริญ,<br>ทับปุด,มะรุ่ย,<br>นาเหนือ | ทับปุด,อำเภอกะเปอร์ | พังงา         | 1                 | 17.8197                  | 10.2358                | 7.5839   |          |         | 57%                | 98%                 |                      | 1                       |                            |
| 3   | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงพื้นที่พุน้ำตื้น                                | หมู่ที่ 2            | จันดี                                               | ฉวาง                | นครศรีธรรมราช | 1                 | 25.4660                  | 7.6501                 | 17.8159  |          |         | 30%                | 39%                 |                      | 1                       |                            |
| 4   | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจ่อ                 |                      | เสวียด                                              | ท่าฉาง              | สุราษฎร์ธานี  | 1                 | 44.9900                  | 12.0000                | 32.9900  |          |         | 27%                | 32%                 |                      | 1                       |                            |
| 5   | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงพื้นที่พุน้ำตื้นดิน-คลองกระโสม                  | หมู่ที่ 5            | ถ้ำ                                                 | ตะกั่วทุ่ง          | พังงา         | 1                 | 3.8370                   | 3.8274                 | 0.0096   | 0.0096   |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | - ดำเนินการแล้วเสร็จ       |
| 6   | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงพื้นที่พุน้ำตื้นคูด้วน                          |                      | ละฮาย<br>สวนขัน                                     | ฉวาง<br>ข้างกลาง    | นครศรีธรรมราช | 1                 | 16.9475                  | 0.0000                 | 16.9475  |          |         | 0%                 | 2%                  |                      | 1                       |                            |
| 7   | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่<br>มังคุด         | หมู่ที่ 3            | บ้านนา,นาไต่                                        | บ้านนาเดิม          | สุราษฎร์ธานี  | 1                 | 4.8947                   | 0.0000                 | 4.8947   |          |         | 0%                 | 81%                 |                      | 1                       |                            |
| 8   | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่<br>เจาะบ้านนาเดิม |                      | บ้านนา,นาไต่                                        | บ้านนาเดิม          | สุราษฎร์ธานี  | 1                 | 4.9447                   | 0.0000                 | 4.9447   |          |         | 0%                 | 62%                 |                      | 1                       |                            |

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                   | ชื่อโครงการ                                                                                             | พื้นที่ดำเนินโครงการ |            |                   |              | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหต้อนปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                    |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     |              |                                                                          |                                                                                                         | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล       | อำเภอ             | จังหวัด      |                   |                        |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                               |
| 9   | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน                                                            |                      | บ้านล้อง   | เวียงสระ          | สุราษฎร์ธานี | 1                 | 9.8800                 | 0.0000                 | 9.8800  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                                                               |
| 10  | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ลองกอง                                                             | หมู่ที่ 1            | เขาวง      | บ้านตาขุน         | สุราษฎร์ธานี | 1                 | 9.8949                 | 0.0000                 | 9.8949  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                                                               |
| 11  | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ บางดี                                                | หมู่ที่ 4            | พ่วงพรมคร  | เคียนซา           | สุราษฎร์ธานี | 1                 | 21.9900                | 0.0000                 | 21.9900 |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       | - หยุดงานเนื่องจากอุทกภัย                                     |
| 12  | สทท.10       | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10                                                                  | 4                    | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 1                 | 4.0420                 | 0.0000                 | 4.0420  |          |         | 0%                 | 42%                 |                      | 1                       | - คนงานบางส่วนอยู่นอกพื้นที่ มีปัญหาการเดินทางจากภาวะโควิด-19 |
| 13  | สทท.10       | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดชุมพร                                                     | 8                    | ขุนกระหัง  | เมืองชุมพร        | ชุมพร        | 1                 | 0.9990                 | 0.9990                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                                                               |
| 14  | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง (สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร) (ปรับแผน/ทดแทน -52017410028) |                      | ทรัพย์ทวี  | บ้านนาเดิม        | สุราษฎร์ธานี | 1                 | 8.3980                 | 0.0000                 | 8.3980  |          |         | 0%                 | 7%                  |                      | 1                       | - หยุดงานเนื่องจากอุทกภัย                                     |
| 15  | สทท.10       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองบางวัง                                                                       | 2                    | ท่านา      | กะปง              | พังงา        | 1                 | 1.2870                 | 0.0000                 | 1.2870  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       | - หยุดงานเนื่องจากอยู่ระหว่างประสานขอเข้าดำเนินการในพื้นที่   |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                   | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                            | พื้นที่ดำเนินโครงการ |         |                  |             | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค  |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------|-------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
|     |              |                                                                          |                                                                                                                                                                        | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล    | อำเภอ            | จังหวัด     |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                             |
|     |              |                                                                          |                                                                                                                                                                        |                      |         |                  |             | 5                 | 37.1623                  | 1.6299                 | 35.5324 | 0.0000   | 0.0000  | 4%                 | 92%                 | 1                    | 4                       |                             |
| 1   | สทท.11       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชิงเปือย (แก้มลิง)                                                                                                                              | กุดดากกล้า           | สงเปือย | คำเขื่อนแก้ว     | ยโสธร       | 1                 | 28.2691                  | 0.0000                 | 28.2691 |          |         | 0%                 | 68%                 |                      | 1                       | หยุดงานเนื่องจากน้ำท่วม     |
| 2   | สทท.11       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าว                                                                                                                             | หมู่ 4               | ไร่สี   | ลืออำนาจ         | อำนาจเจริญ  | 1                 | 1.7369                   | 0.0000                 | 1.7369  |          |         | 0%                 | 100%                |                      | 1                       | อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย |
| 3   | สทท.11       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ช่วง 2                                                                                                              | หมู่ที่ 1            | นาแก    | คำเขื่อนแก้ว     | ยโสธร       | 1                 | 2.1024                   | 1.5971                 | 0.5052  |          |         | 76%                | 98%                 |                      | 1                       |                             |
| 4   | สทท.11       | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชหลากหลายบ้านพรานบุญ (ปรับแผน/ทดแทน - 52017410015)                                                                     | หมู่ที่ 13           | หนองซอน | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1                 | 5.0212                   | 0.0000                 | 5.0212  |          |         | 0%                 | 95%                 |                      | 1                       |                             |
| 5   | สทท.11       | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ช่วง 2 ตำบลนาหว้า, ห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ |                      |         |                  |             | 1                 | 0.0328                   | 0.0328                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ  |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                       | พื้นที่ดำเนินโครงการ |            |          |          | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                     |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                   | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล       | อำเภอ    | จังหวัด  |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                |
|     |              |                                       |                                                                                                   |                      |            |          |          | 4                 | 62.2354                  | 12.8120                | 49.4234 | 0.0000   | 0.0000  | 21%                | 57%                 | 0                    | 4                       |                                                                |
| 1   | สพน.         | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร (ผูกพันข้ามปี 2562-2564)                                    |                      | ไชยบุรี    | ท่าอุเทน | นครพนม   | 1                 | 13.1121                  | 7.6403                 | 5.4718  |          |         | 58%                | 95%                 |                      | 1                       |                                                                |
| 2   | สพน.         | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ (ผูกพันข้ามปี 2563-2565)                                       |                      | บ้านหินโงม | สร้างคอม | อุดรธานี | 1                 | 16.5048                  | 5.1717                 | 11.3331 |          |         | 31%                | 32%                 |                      | 1                       |                                                                |
| 3   | สพน.         | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 26 ชุด |                      |            |          |          | 1                 | 29.2110                  | 0.0000                 | 29.2110 |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       | ลงนามในสัญญา ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2564 สัญญาเลขที่ ทส 0601/11/2565 |
| 4   | สพน.         | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย                                                                  | ทุ่งมั่ง             | หนองลาด    | เมือง    | สกลนคร   | 1                 | 3.4076                   | 0.0000                 | 3.4076  |          |         | 0%                 | 100%                |                      | 1                       |                                                                |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วยงาน | แผนงาน                                                                   | ชื่อโครงการ                                                                                                                                         | พื้นที่ดำเนินโครงการ |         |         |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |          |                                                                          |                                                                                                                                                     | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล    | อำเภอ   | จังหวัด |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
|     |          |                                                                          |                                                                                                                                                     |                      |         |         |         | 12                | 67.9514                  | 3.8477                 | 64.1037 | 0.0000   | 0.0000  | 6%                 | 93%                 | 9                    | 3                       |                            |
| 1   | สอน.     | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก                                                                                                                       |                      | ตาพระยา | ตาพระยา | สระแก้ว | 1                 | 43.1342                  | 0.0000                 | 43.1342 |          |         | 0%                 | 32%                 |                      | 1                       |                            |
| 2   | สอน.     | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                                    |                      |         |         |         | 1                 | 16.5615                  | 0.5009                 | 16.0607 |          |         | 3%                 |                     |                      | 1                       |                            |
| 3   | สอน.     | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                                  |                      |         |         |         | 1                 | 7.2949                   | 2.3860                 | 4.9088  |          |         | 33%                |                     |                      | 1                       |                            |
| 4   | สอน.     | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง |                      |         |         |         | 1                 | 0.4613                   | 0.4613                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 5   | สอน.     | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด                                                                                                                           |                      |         |         |         | 1                 | 0.0689                   | 0.0689                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 6   | สอน.     | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เก้าอี้ประธาน จำนวน 1 ตัว                                                                                                                           |                      |         |         |         | 1                 | 0.0052                   | 0.0052                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 7   | สอน.     | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 51 ตัว                                                                                                               |                      |         |         |         | 1                 | 0.2385                   | 0.2385                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 8   | สอน.     | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | โต๊ะผู้บริหารตัวแอล จำนวน 1 ชุด                                                                                                                     |                      |         |         |         | 1                 | 0.0257                   | 0.0257                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 9   | สอน.     | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว                                                                                                                         |                      |         |         |         | 1                 | 0.0085                   | 0.0085                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 10  | สอน.     | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว                                                                                                                              |                      |         |         |         | 1                 | 0.0128                   | 0.0128                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                               | ชื่อโครงการ                                         | พื้นที่ดำเนินโครงการ |      |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหตึ่ลือมปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------------------|---------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |              |                                                                                      |                                                     | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |                   |                           |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
| 11  | สอน.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                         |                      |      |       |         | 1                 | 0.0035                    | 0.0035                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 12  | สอน.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ทรงสูง<br>จำนวน 17 ตู้ |                      |      |       |         | 1                 | 0.1364                    | 0.1364                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                               | พื้นที่ดำเนินโครงการ |      |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค       |
|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|
|     |              |                                       |                                                                                                                                                                           | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                  |
|     |              |                                       |                                                                                                                                                                           |                      |      |       |         | 2                 | 83.0919                  | 16.9575                | 66.1344 | 0.0000   | 0.0000  | 20%                | 47%                 | 0                    | 2                       |                                  |
| 1   | ศปว.         | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                |                      |      |       |         | 1                 | 57.6555                  | 16.9575                | 40.6980 |          |         | 29%                | 62%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง |
| 2   | ศปว.         | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดบราฮิอาส เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร |                      |      |       |         | 1                 | 25.4364                  | 0.0000                 | 25.4364 |          |         | 0%                 | 33%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                               | ชื่อโครงการ                                                                                                                                           | พื้นที่ดำเนินโครงการ |      |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินต้น<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |              |                                                                                      |                                                                                                                                                       | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |                   |                         |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
|     |              |                                                                                      |                                                                                                                                                       |                      |      |       |         | 18                | 28.6059                 | 10.3926                | 18.2133 | 0.0391   | 0.0000  | 36%                | 19%                 | 3                    | 15                      |                            |
| 1   | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์<br>และเครือข่าย                                                                       |                      |      |       |         | 1                 | 2.4810                  | 2.4419                 | 0.0391  | 0.0391   |         | 98%                | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 2   | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการ<br>ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงาน<br>ทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ<br>แขวงพงญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร |                      |      |       |         | 1                 | 7.7945                  | 7.7945                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 3   | ศสท.         | แผนงานบูรณาการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรน้ำ                                            | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการใช้<br>เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพยากรณ์<br>ข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน                                             |                      |      |       |         | 1                 | 17.6777                 | 0.0000                 | 17.6777 |          |         | 0%                 | 44%                 |                      | 1                       |                            |
| 4   | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ กรม<br>ทรัพยากรน้ำ                                                                                                 |                      |      |       |         | 1                 | 0.1562                  | 0.1562                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |
| 5   | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | จอร์บบท ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น<br>ทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ                                                                                      |                      |      |       |         | 1                 | 0.0130                  | 0.0000                 | 0.0130  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                            |
| 6   | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA<br>ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1<br>เครื่อง                                                              |                      |      |       |         | 1                 | 0.0270                  | 0.0000                 | 0.0270  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                            |
| 7   | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart<br>TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x<br>2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง                                  |                      |      |       |         | 1                 | 0.0277                  | 0.0000                 | 0.0277  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                            |
| 8   | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู<br>จำนวน 2 เครื่อง                                                     |                      |      |       |         | 1                 | 0.0648                  | 0.0000                 | 0.0648  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                            |
| 9   | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้                                                                                                                        |                      |      |       |         | 1                 | 0.0177                  | 0.0000                 | 0.0177  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                            |
| 10  | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | โต๊ะกลางแบบวงรี จำนวน 2 ตัว                                                                                                                           |                      |      |       |         | 1                 | 0.0240                  | 0.0000                 | 0.0240  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                            |

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                               | ชื่อโครงการ                                                                                                                  | พื้นที่ดำเนินโครงการ |      |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหตึ่ล่อมปี | รวมเบิ่จจ่าย<br>ปี 2565 | ค่งเหลือ | ลัดค่างาน | ค่างบับ | %ผลการ<br>เบิ่จจ่าย | %ผลการ<br>ค่างเนินงาน | ลั่วล่ร็ | ม่ลั่วล่ร็ | หมายเหตุ/<br>ปัญหาลูบสรค |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------------------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|----------|------------|--------------------------|
|     |              |                                                                                      |                                                                                                                              | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |                   |                           |                         |          |           |         |                     |                       |          |            |                          |
| 11  | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 189 x<br>82 x 78 ซม. หุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 2 ตัว                                        |                      |      |       |         | 1                 | 0.0660                    | 0.0000                  | 0.0660   |           |         | 0%                  | 0%                    |          | 1          |                          |
| 12  | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x<br>74 x 78 ซม. หุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 3 ตัว                                         |                      |      |       |         | 1                 | 0.0360                    | 0.0000                  | 0.0360   |           |         | 0%                  | 0%                    |          | 1          |                          |
| 13  | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | โต๊ะทำงาน แบบไม้ัดทำลือ จำนวน 3 ตัว                                                                                          |                      |      |       |         | 1                 | 0.0120                    | 0.0000                  | 0.0120   |           |         | 0%                  | 0%                    |          | 1          |                          |
| 14  | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | เก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับได้และมีล้อ<br>จำนวน 3 ตัว                                                                       |                      |      |       |         | 1                 | 0.0105                    | 0.0000                  | 0.0105   |           |         | 0%                  | 0%                    |          | 1          |                          |
| 15  | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | โต๊ะประชุม จำนวน 2 รายการ                                                                                                    |                      |      |       |         | 1                 | 0.0288                    | 0.0000                  | 0.0288   |           |         | 0%                  | 0%                    |          | 1          |                          |
| 16  | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงห้องประชุมสำหรับบัญชาการ<br>โครงการขนาดใหญ่ (WAR ROOM) กรม<br>ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท<br>จังหวัดกรุงเทพมหานคร |                      |      |       |         | 1                 | 0.0890                    | 0.0000                  | 0.0890   |           |         | 0%                  | 0%                    |          | 1          |                          |
| 17  | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ตกแต่งภายใน (Build in) ตู้โซวไม้ จำนวน 1<br>รายการ                                                                           |                      |      |       |         | 1                 | 0.0450                    | 0.0000                  | 0.0450   |           |         | 0%                  | 0%                    |          | 1          |                          |
| 18  | ศสท.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ตกแต่งภายใน (Build in) เคาน์เตอร์ รูปตัว<br>แอล จำนวน 1 รายการ                                                               |                      |      |       |         | 1                 | 0.0350                    | 0.0000                  | 0.0350   |           |         | 0%                  | 0%                    |          | 1          |                          |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                   | ชื่อโครงการ                                                                                      | พื้นที่ดำเนินโครงการ |      |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินต้น<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                                                          |                                                                                                  | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |                   |                         |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |              |                                                                          |                                                                                                  |                      |      |       |         | 3                 | 1.6595                  | 0.0000                 | 1.6595  | 0.0000   | 0.0000  | 0%                 | 33%                 | 0                    | 3                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1   | สบจ.         | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน      |                      |      |       |         | 1                 | 0.8400                  | 0.0000                 | 0.8400  |          |         | 0%                 | 50%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 25 มกราคม 2565 (เบิกจ่ายค่าจ้างงวดเดียว)                                                                                                                                                                 |
| 2   | สบจ.         | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                      |      |       |         | 1                 | 0.3200                  | 0.0000                 | 0.3200  |          |         | 0%                 | 50%                 |                      | 1                       | อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 26 มกราคม 2565 (เบิกจ่ายค่าจ้างงวดเดียว)                                                                                                                                                                 |
| 3   | สบจ.         | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการศึกษากระบวนการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะนอกเขตชลประทาน               |                      |      |       |         | 1                 | 0.4995                  | 0.0000                 | 0.4995  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       | -ยังไม่มีเบิกจ่าย/ ลงนาม สัญญาเลขที่ 0601/5/2564 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญา 18 พ.ย. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2565<br>-อยู่ระหว่างการค้าเงินงานและส่งมอบงานงวดที่ 1 โดยจะเบิกเงินค่าจ้างร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาในเดือนมกราคม 2565 |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วยงาน | แผนงาน                                                                               | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                        | พื้นที่ดำเนินโครงการ |      |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                 |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                    | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                                                            |
|     |          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                      |      |       |         | 3                 | 0.8838                   | 0.8838                 | 0.0000  | 0.0000   | 0.0000  | 100%               | 100%                | 3                    | 0                       |                                                                                                            |
| 1   | สวพ.     | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี<br>อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS)                                                                                                |                      |      |       |         | 1                 | 0.0013                   | 0.0013                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | - 11 สถานี<br>- สวพ. ได้จัดการโอนเงิน เพื่อจัดสรรให้ สทภ. 1,3,11<br>เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานแล้ว |
| 2   | สวพ.     | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ<br>เครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า<br>(Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-<br>ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา |                      |      |       |         | 1                 | 0.0595                   | 0.0595                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | สวพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รู้ไปแล้ว 3<br>รุ่น                                               |
| 3   | สวพ.     | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ<br>ท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)                                                                                                           |                      |      |       |         | 1                 | 0.8230                   | 0.8230                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         | สวพ. ได้จัดการโอนเงิน เพื่อจัดสรรให้ สทภ. 1 - 11<br>ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานแล้ว                        |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                   | ชื่อโครงการ                                                                                             | พื้นที่ดำเนินโครงการ |      |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |              |                                                                          |                                                                                                         | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |                   |                         |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
|     |              |                                                                          |                                                                                                         |                      |      |       |         | 2                 | 9.5800                  | 1.2300                 | 8.3500  | 0.0000   | 0.0000  | 13%                | 95%                 | 1                    | 1                       |                            |
| 1   | สสป.         | แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                    | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ |                      |      |       |         | 1                 | 8.3500                  | 0.0000                 | 8.3500  |          |         | 0%                 | 90%                 |                      | 1                       |                            |
| 2   | สสป.         | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ                                      |                      |      |       |         | 1                 | 1.2300                  | 1.2300                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                            |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                               | ชื่อโครงการ                                                                                                                     | พื้นที่ดำเนินโครงการ |      |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินกัน<br>เหลือปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค้างวน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |                                                                                      |                                                                                                                                 | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |                   |                       |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |              |                                                                                      |                                                                                                                                 |                      |      |       |         | 9                 | 9.4365                | 6.1873                 | 3.2491  | 0.0000   | 0.0000  | 66%                | 41%                 | 3                    | 6                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | สกก.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | งบดำเนินงาน (แผนพื้นฐาน)                                                                                                        |                      |      |       |         | 1                 | 8.1046                | 5.8119                 | 2.2926  |          |         | 72%                | 72%                 |                      | 1                       | งบดำเนินงานในภาพรวมของกรมเบิกจ่ายยังไม่แล้ว<br>เสร็จ<br>จำนวน 2,217,545.03 บาท เป็นงบประมาณที่ขอค้น<br>ไว้<br>เพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ<br>และค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในส่วนกลาง<br>สทท.2 และ สทท.4 และเป็นรายการที่หมดความ<br>จำเป็น<br>และได้ดำเนินการสลาย PO เรียบร้อยแล้ว<br>(ตกพร้อมมีนาคม 2565) จำนวน 75,091.38 บาท |
| 2   | สกก.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบแชนวอน ขนาด 15,000 บีทียู<br>จำนวน 2 เครื่อง                             |                      |      |       |         | 1                 | 0.0518                | 0.0518                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3   | สกก.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม<br>ค่าติดตั้ง) แบบแชนวอน ขนาด 30,000 บีทียู<br>จำนวน 1 เครื่อง                             |                      |      |       |         | 1                 | 0.0794                | 0.0794                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4   | สกก.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง กว้าง 2.00 เมตร หุ้ม<br>ด้วยหนัง PVC จำนวน 2 ตัว                                                            |                      |      |       |         | 1                 | 0.0738                | 0.0000                 | 0.0738  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5   | สกก.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง กว้าง 0.80 เมตร หุ้ม<br>ด้วยหนัง PVC จำนวน 1 ตัว                                                            |                      |      |       |         | 1                 | 0.0152                | 0.0000                 | 0.0152  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6   | สกก.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ระบบเครื่องเสียง 5.1 ช่อง (DTS) จำนวน 1<br>ชุด                                                                                  |                      |      |       |         | 1                 | 0.0416                | 0.0000                 | 0.0416  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7   | สกก.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงห้องเกียรติยศและทำเนียบผู้บริหาร<br>กรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ<br>แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัด<br>กรุงเทพมหานคร |                      |      |       |         | 1                 | 0.4997                | 0.0000                 | 0.4997  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8   | สกก.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงห้องที่ปรึกษาของกรมทรัพยากรน้ำ<br>ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต<br>พญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร                     |                      |      |       |         | 1                 | 0.3261                | 0.0000                 | 0.3261  |          |         | 0%                 | 0%                  |                      | 1                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9   | สกก.         | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ปรับปรุงอาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 4 เพื่อ<br>จัดทำห้องเก็บครุภัณฑ์ กรมทรัพยากรน้ำ<br>แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัด<br>กรุงเทพมหานคร |                      |      |       |         | 1                 | 0.2442                | 0.2442                 | 0.0000  |          |         | 100%               | 100%                | 1                    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกให้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | หน่วย<br>งาน | แผนงาน                                                                               | ชื่อโครงการ                                                                            | พื้นที่ดำเนินโครงการ |      |       |         | จำนวน<br>(รายการ) | ยอดเงินเกิน<br>เหลือในปี | รวมเบิกจ่าย<br>ปี 2565 | คงเหลือ | ลดค่างาน | ค่าปรับ | %ผลการ<br>เบิกจ่าย | %ผลการ<br>ดำเนินงาน | แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | ไม่แล้วเสร็จ<br>(จำนวน) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------|----------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|     |              |                                                                                      |                                                                                        | บ้าน/<br>หมู่ที่     | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |                   |                          |                        |         |          |         |                    |                     |                      |                         |                            |
|     |              |                                                                                      |                                                                                        |                      |      |       |         | 1                 | 0.4980                   | 0.1245                 | 0.3735  | 0.0000   | 0.0000  | 25%                | 25%                 | 0                    | 1                       |                            |
| 1   | สลง./กพร.    | แผนงานพื้นฐานด้านการ<br>สร้างการเติบโตบน<br>คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร<br>และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรน้ำ |                      |      |       |         | 1                 | 0.4980                   | 0.1245                 | 0.3735  |          |         | 25%                | 25%                 |                      | 1                       |                            |
