



ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

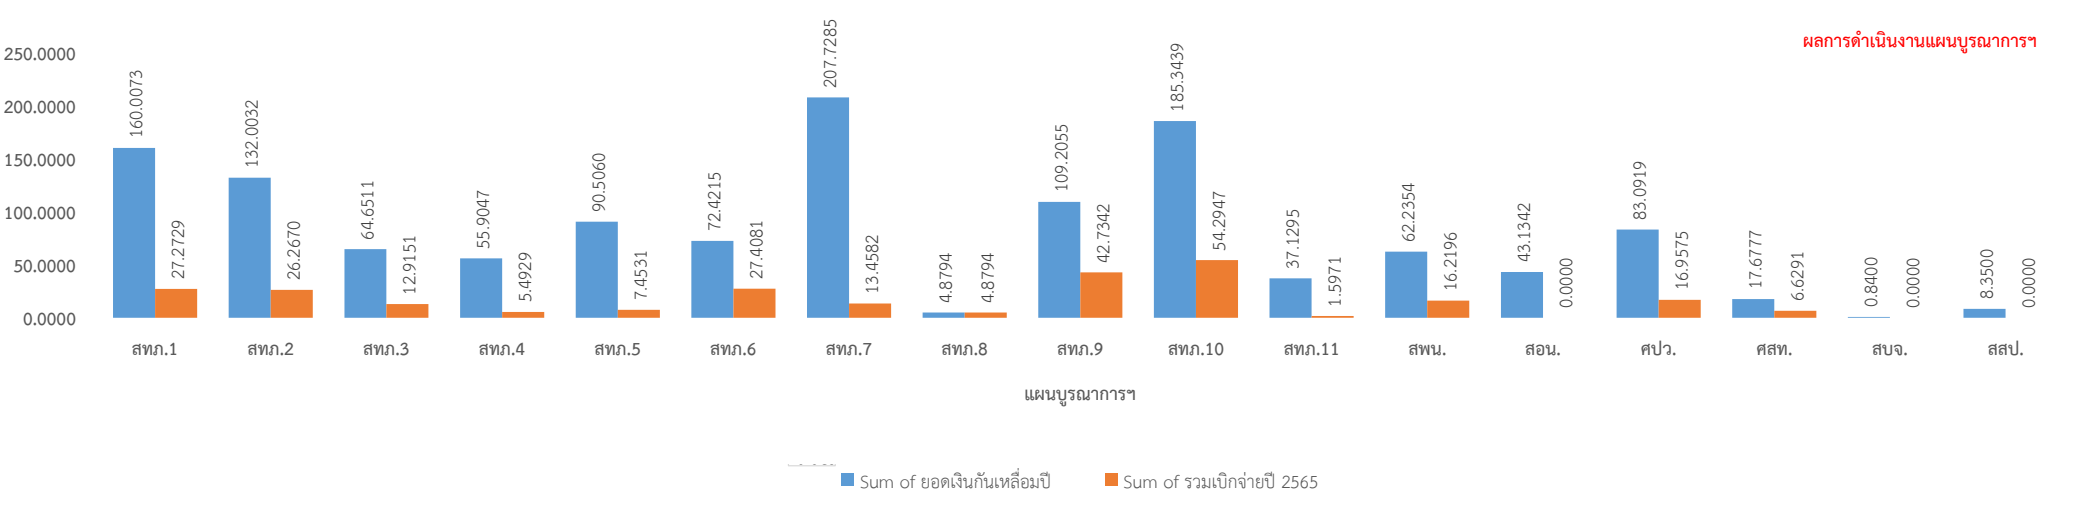

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565

หน่วยงาน	รวม	สทก.1	สทก.2	สทก.3	สทก.4	สทก.5	สทก.6	สทก.7	สทก.8	สทก.9	สทก.10	สทก.11	สพน.	สอน.	ศปว.	ศสท.	สบจ.	สสป.
จำนวน (คก.)	112	22	10	10	12	2	9	5	1	14	13	4	4	1	2	1	1	1
แล้วเสร็จ (คก.)	21	6	3	0	1	0	4	0	1	3	2	0	1	0	0	0	0	0
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	91	16	7	10	11	2	5	5	0	11	11	4	3	1	2	1	1	1
ยอดเงินกันเหลือปี	1,335.1101	160.0073	132.0032	64.6511	55.9047	90.5060	72.4215	207.7285	4.8794	109.2055	185.3439	37.1295	62.2354	43.1342	83.0919	17.6777	0.8400	8.3500
รวมเบิกจ่ายปี 2565	263.5790	27.2729	26.2670	12.9151	5.4929	7.4531	27.4081	13.4582	4.8794	42.7342	54.2947	1.5971	16.2196	0.0000	16.9575	6.6291	0.0000	0.0000
ยอดเงินกันคงเหลือ	1,071.5311	132.7344	105.7362	51.7360	50.4118	83.0529	45.0135	194.2704	0.0000	66.4714	131.0492	35.5324	46.0158	43.1342	66.1344	11.0486	0.8400	8.3500
ลดค้างงาน	1.5883	0.0000	1.5787	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	20%	17%	20%	20%	10%	8%	38%	6%	100%	39%	29%	4%	26%	0%	20%	38%	0%	0%

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

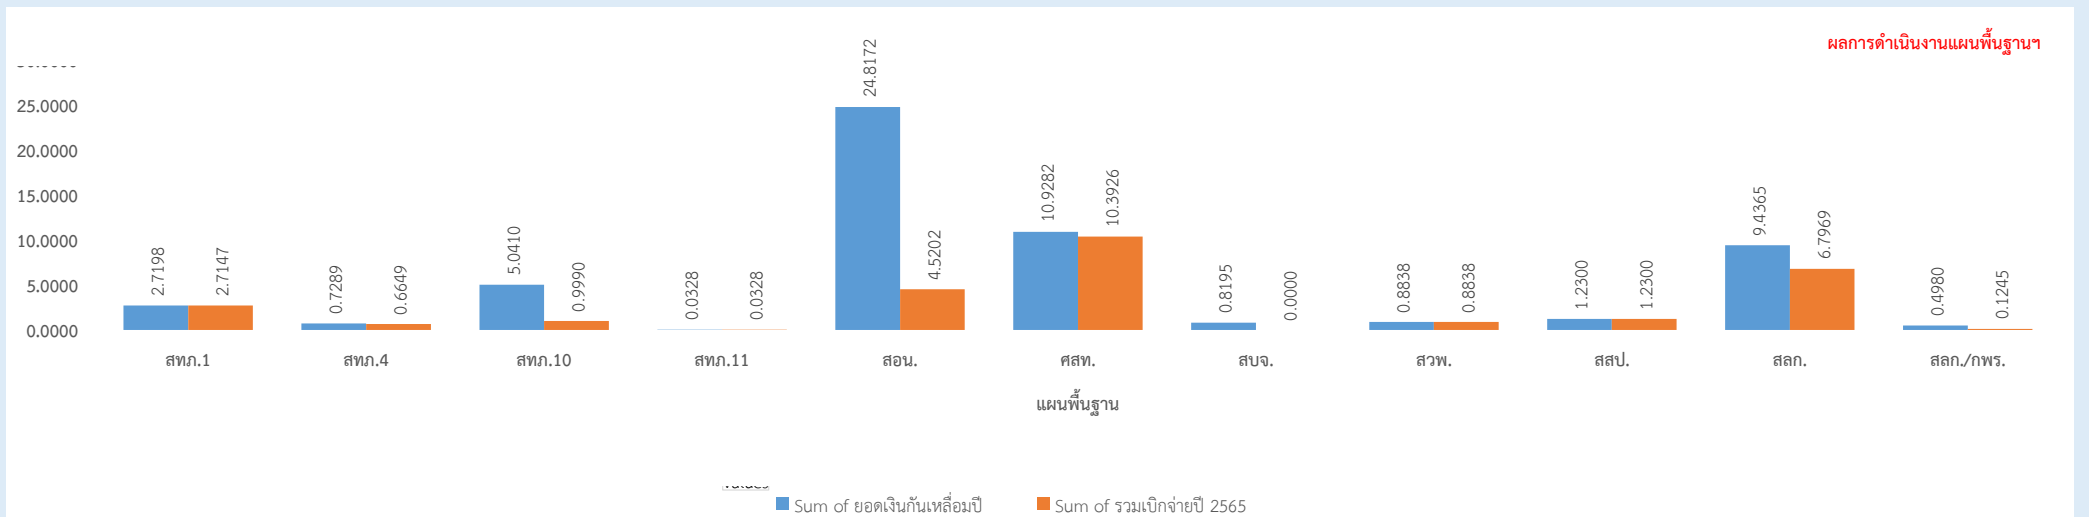

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565

หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.4	สทท.10	สทท.11	สอน.	ศสท.	สบจ.	สวพ.	สสป.	สลก.	สลก./กพร.
จำนวน (คก.)	50	2	1	2	1	11	17	2	3	1	9	1
แล้วเสร็จ (คก.)	24	2	1	1	1	9	3	0	3	1	3	0
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	26	0	0	1	0	2	14	2	0	0	6	1
ยอดเงินกันเหลือปี	57.1357	2.7198	0.7289	5.0410	0.0328	24.8172	10.9282	0.8195	0.8838	1.2300	9.4365	0.4980
รวมเบิกจ่ายปี 2565	28.3594	2.7147	0.6649	0.9990	0.0328	4.5202	10.3926	0.0000	0.8838	1.2300	6.7969	0.1245
ยอดเงินกันคงเหลือ	28.7763	0.0051	0.0640	4.0420	0.0000	20.2970	0.5356	0.8195	0.0000	0.0000	2.6396	0.3735
ลดค้างงาน	0.1082	0.0051	0.0640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0391	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	50%	100%	91%	20%	100%	18%	95%	0%	100%	100%	72%	25%

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								24	162.7271	29.9876	132.7395	0.0051	0.0000	18%	74%	8	16	
1	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น(บ้านห้วยน้ำขุ่น)	ห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	6.4114	6.4114	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยสัมปอ(บ้านห้วยสัมปอใหม่)	ห้วยสัมปอใหม่ หมู่ที่ 8	ดอยแก้ว	จอมทอง	เชียงใหม่	1	1.6727	0.0000	1.6727			0%	62%		1	หยุดงาน/ติดปัญหาการขออนุญาตป่าไม้
3	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปุนหลวง(บ้านแม่ปุนหลวง)	แม่ปุนหลวง หมู่ที่ 8	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	6.7256	5.9470	0.7787			88%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
4	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ใจ(บ้านแม่ใจหลวง)	แม่ใจหลวง หมู่ที่ 9	บ่อสลี	ฮอด	เชียงใหม่	1	1.7190	0.0000	1.7190			0%	86%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ระยะ 2	ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	1.2998	1.2998	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านกล่อเซไถ)	ปู่ทา หมู่ที่ 6	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	4.1720	0.0000	4.1720			0%	67%		1	หยุดงาน/แก้ไขแบบแปลน
7	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยบัง	ห้วยบัง หมู่ที่ 3	ศรีวิชัย	ลี้	ลำพูน	1	7.5174	0.0000	7.5174			0%	82%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านป่าข้าวหลาม)	ป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7	กีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	16.7081	0.0000	16.7081			0%	22%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 5 มีนาคม 2565
9	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยวังหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ	ใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2	ทาเหนือ	แม่ออน	เชียงใหม่	1	4.8841	4.8841	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม(บ้านหนองปู)	หนองปู หมู่ที่ 9	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	3.0125	3.0125	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหต้อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
11	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านคอยช้าง)	คอยช้าง หมู่ที่ 3	วารวิ	แม่สรวย	เชียงราย	1	4.6803	0.0000	4.6803			0%	90%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
12	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง(บ้านผาละปี)	ผาละปี หมู่ที่ 8	แม่ศึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	5.6239	0.0000	5.6239			0%	61%		1	หยุดงาน/ติดปัญหาโควิด 19
13	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านเมืองก๊ิด)	เมืองก๊ิด หมู่ที่ 1	ก๊ิดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	12.2659	0.0000	12.2659			0%	3%		1	หยุดงาน/ติดปัญหาการขออนุญาตป่าไม้
14	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะห้วยน้ำเย็น	ห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 1	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	1	13.8558	0.0000	13.8558			0%	30%		1	หยุดงาน/แก้ไขแบบแปลน
15	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านแม่สายป่าเมี่ยง)	แม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7	โหล่งขอด	พร้าว	เชียงใหม่	1	4.5870	0.0000	4.5870			0%	15%		1	หยุดงาน/ติดปัญหาพื้นที่ป่า
16	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ระลอ(บ้านแม่วาก)	แม่วาก หมู่ที่ 6	แม่เงา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	6.8087	0.0000	6.8087			0%	85%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
17	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านผาผึ้ง) (ระยะ2)	ผาผึ้ง หมู่ที่ 6	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	4.8765	0.0000	4.8765			0%	62%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
18	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านละอูพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบโซน B)	ละอูบ หมู่ที่ 6	ห้วยห้อม	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	1	35.5699	0.0000	35.5699			0%	45%		1	หยุดงาน/แก้ไขแบบแปลน
19	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม(บ้านหนองบอน)	หนองบอน หมู่ที่ 11	นาทราย	สี	ลำพูน	1	2.8750	2.8750	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านโป่ง)	โป่ง หมู่ที่ 6	ป่าไผ่	สันทราย	เชียงใหม่	1	7.5314	0.0000	7.5314			0%	55%		1	หยุดงาน/ติดปัญหาโควิด 19
21	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวารวิ (บ้านห้วยมะเขาง) (ปรับแผน - ทดแทน-0900652017410030)	ห้วยมะเขาง หมู่ที่ 5	วารวิ	แม่สรวย	เชียงราย	1	4.3671	0.0000	4.3671			0%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหตึ่ลือมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
22	สทภ.1	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ระยะ 2)		ช้างเค็ก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	2.8432	2.8432	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	สทภ.1	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัวเพนือ	เมืองตาก	ตาก	1	0.5823	0.5788	0.0035	0.0035		99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	สทภ.1	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัวเพนือ	เมืองตาก	ตาก	1	2.1375	2.1359	0.0016	0.0016		100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								10	132.0032	26.2670	105.7362	1.5787	0.0000	20%	70%	3	7	
1	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปึงเสนาท ช่วง 3	หมู่ที่ 2, 4, 5	ปึงเสนาท	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	1	14.9985	0.0000	14.9985			0%	93%		1	
2	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพืชผักแปลงใหญ่ทองหลาง	หมู่ที่ 4	ทองหลาง	ห้วยคต	อุทัยธานี	1	6.9300	6.9300	0.0000			100%	100%	1		
3	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่	หมู่ที่ 9	วังมะกากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1	5.2253	0.0000	5.2253			0%	59%		1	หยุดงาน
4	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		หินซื่อน	แก่งคอย	สระบุรี	1	5.5900	0.0000	5.5900			0%	22%		1	หยุดงาน
5	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำนากกระหา-สนับสนุนประปาหมู่บ้าน		หนองจอก	บ้านไร่	อุทัยธานี	1	6.2884	0.0000	6.2884			0%	99%		1	
6	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เกาะเทโพ, สะแกกรัง, ท่าซุง)		เกาะเทโพ	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	1	9.9384	8.3597	1.5787	1.5787		84%	100%	1		ลดค่างาน
7	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว (จุดที่ 2)	ห้วยน้ำขาวหมู่ที่ 1	เข็กน้อย	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	1	19.9690	0.0000	19.9690			0%	25%		1	
8	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (สะแกกรัง, หาดทอง, เกาะเทโพ)		หาดทอง	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	1	21.5418	0.0000	21.5418			0%	25%		1	หยุดงาน
9	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงวังทำดินดำแหล่งน้ำปึกอ้อย แหล่งน้ำหนองบัวพร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 1	ทำดินดำ	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	30.5445	0.0000	30.5445			0%	81%		1	หยุดงาน
10	สทภ.2	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำบึงลาดเชื่อมตอบึงเพ็งเชื่อมตอบึงหลังบ้านเชื่อมตอบึงบัว		ตาสังข์	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	1	10.9773	10.9773	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								10	64.6511	12.9151	51.7360	0.0000	0.0000	20%	49%	0	10	
1	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ขยายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ		บ้านข้า	ศรีสงคราม	นครพนม	1	5.3779	0.0000	5.3779			0%	65%		1	
2	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ยางพารา		บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1	5.4751	0.0000	5.4751			0%	56%		1	
3	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ นาข้าว		บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1	4.4279	0.0000	4.4279			0%	71%		1	
4	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหว้าน้อยสนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ปรับแผน/ทดแทน) - 52017410025	นาหว้าน้อย หมู่ที่ 3	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	8.0000	0.0000	8.0000			0%	11%		1	29/9/64 น้ำป่าไหลหลาก จากลำน้ำหมัน
5	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว (ปรับแผน/ทดแทน - 52017410020)	หมู่ที่ 1	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1	6.3127	2.1471	4.1656			34%	85%		1	
6	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วัดพัชรกิติยาภาราม	บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหัว	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	1	7.5244	6.6179	0.9065			88%	97%		1	
7	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำโรงเรียนบ้านสนามบินพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สนามบิน หมู่ที่ 8	อุ้มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	9.5330	0.0000	9.5330			0%	2%		1	
8	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211 พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แสนพัน หมู่ที่ 14	อุ้มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	9.0000	0.7239	8.2761			8%	11%		1	

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหตื้อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำโรงเรียนโพธิ์แสนวิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แสนพัน หมู่ที่ 11	อุ้มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	6.0000	0.5130	5.4870			9%	13%		1	
10	สทภ.3	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	หนองปลาตอง หมู่ที่ 11	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	3.0000	2.9132	0.0868			97%	80%		1	

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								13	56.6336	6.1579	50.4758	0.0640	0.0000	11%	60%	2	11	
1	สทภ.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน	เกาะแก้ว หมู่ที่ 6	สามขา	โพธาราย	ร้อยเอ็ด	1	2.9200	2.9200	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	สทภ.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโลโพ	แผ่นดินทอง หมู่ที่ 13	ลุ่มน้ำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1	12.8945	0.0000	12.8945			0%	2%		1	นำจากแม่น้ำชีทะเลกักท่วมโครงการ อนุมัติหยุดงาน 28 มิ.ย.64
3	สทภ.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบอน	หนองบอน	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.3107	0.0000	5.3107			0%	98%		1	
4	สทภ.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกะฮาด	กะฮาด หมู่ที่ 6	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	9.4797	0.0000	9.4797			0%	50%		1	อยู่ระหว่างหยุดงานโครงการฯ ผู้ใหญ่บ้านกะฮาดหมู่ที่ 6 งดระบายน้ำเข้าบึงกะฮาด ผู้ควบคุมงานจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ในสัปดาห์หน้า
5	สทภ.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตุล	แจ้งฉม	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1	5.8027	0.0000	5.8027			0%	22%		1	หยุดงาน
6	สทภ.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองราชบุรี	โพงาม	โพงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.0666	0.0000	5.0666			0%	78%		1	หยุดงาน
7	สทภ.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเติน	หนองตอ หมู่ที่ 11	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1	4.2589	1.2584	3.0005			30%	97%		1	
8	สทภ.4	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สทภ.4		ในเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1	0.7289	0.6649	0.0640	0.0640		91%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 มีลดค่างาน 0.0640

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เห็ลือมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทท.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกะมัง เขตรักษาพื้นที่สัตว์ป่าภูเขียว บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17	หนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1	1.7590	0.0000	1.7590			0%	47%		1	อยู่ระหว่างหยุดงาน
10	สทท.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูโคกหนองขวาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมระบบส่งน้ำ		นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	2.9614	0.7412	2.2202			25%	81%		1	เหลืองานระบบส่งน้ำ
11	สทท.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงฝาย ภูมิ 11 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า	ตาครินทอง	ธาตุทอง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	1.5760	0.0000	1.5760			0%	0%		1	อยู่ระหว่างหยุดงานโครงการฯ ดำเนินการแก้ไขแบบแปลน
12	สทท.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	1.1652	0.1709	0.9944			15%	44%		1	
13	สทท.4	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.7100	0.4025	2.3076			15%	58%		1	

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอรับไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								2	90.5060	7.4531	83.0529	0.0000	0.0000	8%	4%	0	2	
1	สทภ.5	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่พื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก หนองโน	หมู่ที่ 4	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	1	50.0000	7.4531	42.5469			15%	0%		1	1/11/64 เบิกล่วงหน้า15%=7,453,132.50 บาท
2	สทภ.5	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำสะแทดพร้อมระบบกระจายน้ำและระบบอ่างพวง		กุสุมาแดง, หนองเยือง	บ้านใหม่ ไชยพจน์	บุรีรัมย์	1	40.5060	0.0000	40.5060			0%	7%		1	2/6/64 เบิกล่วงหน้า15%=7,308,750.-บาท 28/09/64 ง1=910,212.58 บาท

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								9	72.4215	27.4081	45.0135	0.0000	0.0000	38%	88%	4	5	
1	สทภ.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกระตัง	หมู่ที่ 25	คลองตะเกรา	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	1	12.6461	9.0008	3.6453			71%	100%		1	
2	สทภ.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าชันขุน	หมู่ที่ 25	คลองตะเกรา	ท่าตะเกียบ	ฉะเชิงเทรา	1	6.8604	6.8604	0.0000			100%	100%	1		
3	สทภ.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งเบญจา	หมู่ที่ 3	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	1	15.5173	0.0000	15.5173			0%	45%		1	อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการยังเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 13 จะแจ้งทางให้เข้าดำเนินการเดือนมกราคม 2565
4	สทภ.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองตาคลาน (ปรับแผน - ทดแทน)	หมู่ที่ 10	พวา	แก่งหางแมว	จันทบุรี	1	0.3562	0.0000	0.3562			0%	70%		1	อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากถนนทางเข้าโครงการยังไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ จึงยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการในพื้นที่โครงการได้
5	สทภ.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก (ปรับแผน - ทดแทน)	เขาดวน หมู่ที่ 9	ย่านรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	12.0433	6.2839	5.7594			52%	90%		1	อยู่ระหว่างหยุดงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เพื่อทำการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากพบข้อขัดแย้งบริเวณพื้นที่โครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกได้ตามแบบแปลน
6	สทภ.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเข้	หมู่ที่ 12	นนทรีย์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7420	1.7420	0.0000			100%	100%	1		
7	สทภ.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก้มลิงหนองกรด	หมู่ที่ 4,9	คำโดนด	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี	1	1.7670	1.7670	0.0000			100%	100%	1		
8	สทภ.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแสง หมู่ที่ 11	นาแหม	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7540	1.7540	0.0000			100%	100%	1		
9	สทภ.6	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน	หมู่ที่ 5	ดอนยอ	เมือง	นครนายก	1	19.7352	0.0000	19.7352			0%	24.80%		1	ตกพับ - อยู่ระหว่างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								5	207.7285	13.4582	194.2704	0.0000	0.0000	6%	64%	0	5	
1	สทภ.7	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบ		ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	118.0000	0.0000	118.0000			0%	0%		1	29/9/64 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง สรุปผลการพิจารณาว่า ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
2	สทภ.7	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว		สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	1	2.4800	0.0000	2.4800			0%	75%		1	27/12/64 อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้างแผงโซลาร์เซลล์ งานวางท่อ
3	สทภ.7	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุ่มวังและป่าชุมชน	เนินสมบัติ หมู่ที่ 14	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	สุพรรณบุรี	1	31.9396	4.8982	27.0414			15%	65%		1	27/12/64 อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้าง และงานระบบกระจายน้ำ
4	สทภ.7	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905)		ไทรโยค	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	35.4859	0.0000	35.4859			0%	85%		1	27/12/64 อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างถึงน้ำใส และงานระบบโซลาร์เซลล์
5	สทภ.7	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	19.8230	8.5600	11.2631			43%	94%		1	27/12/64 อยู่ระหว่างงานก่อสร้างถังเก็บน้ำ คลส. และงานวางท่อ และงานชุดสระเก็บน้ำ งานลาดคังวัดสระเก็บน้ำ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								1	4.8794	4.8794	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
1	สทก.8	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842	ลำลอง หมู่ที่ 12,13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	4.8794	4.8794	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								14	109.2055	42.7342	66.4714	0.0000	0.0000	39%	64%	3	11	
1	สทภ.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจรเข้-หนองแม่ระวีง (ผูกพันข้ามปี 2563-2565)		สารจิตร	ศรีสขาลัย	สุโขทัย	1	14.3481	0.0000	14.3481			0%	30%		1	
2	สทภ.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	ห้วยโพน หมู่ที่ 2	ดงญา	บ่อเกลือ	น่าน	1	12.7279	0.0000	12.7279			0%	11%		1	อยู่ระหว่างการรออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน)
3	สทภ.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง	ปางยาง หมู่ที่ 1	ภูคา	ปัว	น่าน	1	4.5904	0.0000	4.5904			0%	55%		1	อยู่ระหว่างการรออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน)
4	สทภ.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูเชิงผาด-หนองบัวแดง		หาดสองแคว	ตรอน	อุดรดิต์	1	38.0934	26.1687	11.9247			69%	89%		1	
5	สทภ.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	น้ำจุน หมู่ที่ 4	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	2.9930	0.0000	2.9930			0%	20%		1	
6	สทภ.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สมุนใหม่ ม.16	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	2.7571	0.0000	2.7571			0%	30%		1	
7	สทภ.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัวดง หมู่ที่ 10	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	1.3434	1.3434	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 21 ต.ค. 2564)
8	สทภ.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	นุขเขียน หมู่ที่ 7	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	2.8947	0.0000	2.8947			0%	95%		1	

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทก.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง (ระยะที่ 2)	นาม่วง ม.7	เมืองลี	นาหมื่น	น่าน	1	1.1045	0.0000	1.1045			0%	85%		1	
10	สทก.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ล้าน หมู่ที่ 8	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	1.1031	0.0000	1.1031			0%	98%		1	
11	สทก.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	ตองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	7.4979	0.0000	7.4979			0%	77%		1	อยู่ระหว่างการรออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน)
12	สทก.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงตำบลห้วยหม้าย		ห้วยหม้าย	สอง	แพร่	1	11.9137	11.9137	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 5 งวดสุดท้าย 15 ต.ค. 2564)
13	สทก.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค (ภูซัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว)		บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	3.3083	3.3083	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 14 ก.ย. 2564)
14	สทก.9	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ	น้ำโจ่ง	ดู่พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	4.5300	0.0000	4.5300			0%	0%		1	* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และลงนามในสัญญา เลขที่ สทก.9 25/2565 ลว 18 พ.ย. 64 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,510,000.00 บาท

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								15	190.3849	55.2937	135.0912	0.0096	0.0000	29%	44%	3	12	
1	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่พุน้ำตื้นจังหวัด	หมู่ที่ 11	บางหมาก	เมืองชุมพร	ชุมพร	1	14.9945	10.0164	4.9781			67%	88%		1	
2	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์พื้นที่คลองโทรมาศ ช่วง 1		บางหริ่ง, โคกเจริญ, ทับปุด,มะรุ่ย, นาเหนือ	ทับปุด,อำเภอกะเปอร์	พังงา	1	17.8197	17.8132	0.0064			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่พุน้ำตื้น	หมู่ที่ 2	จันดี	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	1	25.4660	7.6501	17.8159			30%	39%		1	
4	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจ่อ		เสวียด	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	1	44.9900	12.0000	32.9900			27%	32%		1	
5	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่คลองโคกดิน-คลองกระโสม	หมู่ที่ 5	ถ้ำ	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	3.8370	3.8274	0.0096	0.0096		100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงพื้นที่พุน้ำตื้นคูด้วน		ละฮาย สวนขัน	ฉวาง ข้างกลาง	นครศรีธรรมราช	1	16.9475	0.0000	16.9475			0%	2%		1	
7	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ มังคุด	หมู่ที่ 3	บ้านนา,นาไต่	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	4.8947	0.0000	4.8947			0%	81%		1	
8	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ เจาะบ้านนาเดิม		บ้านนา,นาไต่	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	4.9447	2.9876	1.9571			60%	62%		1	

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน		บ้านล้อง	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	1	9.8800	0.0000	9.8800			0%	0%		1	
10	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ลองกอง	หมู่ที่ 1	เขาวง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	1	9.8949	0.0000	9.8949			0%	0%		1	
11	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตร 2000 ไร่ บางดี	หมู่ที่ 4	พ่วงพรมคร	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	21.9900	0.0000	21.9900			0%	0%		1	- หยุดงานเนื่องจากอุทกภัย อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างพิจารณาเข้าดำเนินการ -
12	สทท.10	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	4	มะขามเตี้ย	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	4.0420	0.0000	4.0420			0%	45%		1	- ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน
13	สทท.10	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดชุมพร	8	ขุนกระหัง	เมืองชุมพร	ชุมพร	1	0.9990	0.9990	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง (สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร) (ปรับแผน/ทดแทน -52017410028)		ทรัพย์ทวี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	8.3980	0.0000	8.3980			0%	7%		1	- หยุดงานเนื่องจากอุทกภัย อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างพิจารณาเข้าดำเนินการ -
15	สทท.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองบางวัง	2	ท่านา	กะปง	พังงา	1	1.2870	0.0000	1.2870			0%	0%		1	- อยู่ระหว่างประสานขอเข้าดำเนินการในพื้นที่

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								5	37.1623	1.6299	35.5324	0.0000	0.0000	4%	92%	1	4	
1	สทท.11	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชิงเปือย (แก้มลิง)	กุดตากล้า	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	28.2691	0.0000	28.2691			0%	68%		1	หยุดงานเนื่องจากน้ำท่วม
2	สทท.11	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าว	หมู่ 4	ไร่สี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1	1.7369	0.0000	1.7369			0%	100%		1	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
3	สทท.11	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ ช่วง 2	หมู่ที่ 1	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	2.1024	1.5971	0.5052			76%	98%		1	
4	สทท.11	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชหลากหลายบ้านพรานบุญ (ปรับแผน/ทดแทน - 52017410015)	หมู่ที่ 13	หนองซอน	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	5.0212	0.0000	5.0212			0%	95%		1	
5	สทท.11	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ช่วง 2 ตำบลนาหว้า, ห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ					1	0.0328	0.0328	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								4	62.2354	16.2196	46.0158	0.0000	0.0000	26%	57%	1	3	
1	สพน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร (ผูกพันข้ามปี 2562-2564)		ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1	13.1121	7.6403	5.4718			58%	95%		1	
2	สพน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสือ (ผูกพันข้ามปี 2563-2565)		บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	1	16.5048	5.1717	11.3331			31%	34%		1	
3	สพน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 26 ชุด					1	29.2110	0.0000	29.2110			0%	0%		1	
4	สพน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย	ทุ่งมั่ง	หนองลาด	เมือง	สกลนคร	1	3.4076	3.4076	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								12	67.9514	4.5202	63.4312	0.0000	0.0000	7%	93%	9	3	
1	สอน.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก		ตาพระยา	ตาพระยา	สระแก้ว	1	43.1342	0.0000	43.1342			0%	32%		1	
2	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	16.5615	1.0129	15.5486			6%			1	
3	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	7.2949	2.5465	4.7483			35%			1	
4	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง					1	0.4613	0.4613	0.0000			100%	100%	1		
5	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด					1	0.0689	0.0689	0.0000			100%	100%	1		
6	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เก้าอี้ประธาน จำนวน 1 ตัว					1	0.0052	0.0052	0.0000			100%	100%	1		
7	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 51 ตัว					1	0.2385	0.2385	0.0000			100%	100%	1		
8	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โต๊ะผู้บริหารตัวแอล จำนวน 1 ชุด					1	0.0257	0.0257	0.0000			100%	100%	1		
9	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว					1	0.0085	0.0085	0.0000			100%	100%	1		
10	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว					1	0.0128	0.0128	0.0000			100%	100%	1		

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหตึ่ลือมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
11	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว					1	0.0035	0.0035	0.0000			100%	100%	1		
12	สอน.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ทรงสูง จำนวน 17 ตู้					1	0.1364	0.1364	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								2	83.0919	16.9575	66.1344	0.0000	0.0000	20%	47%	0	2	
1	ศปว.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	57.6555	16.9575	40.6980			29%	62%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
2	ศปว.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดบราฮิอาส เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	25.4364	0.0000	25.4364			0%	33%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								18	28.6059	17.0218	11.5842	0.0391	0.0000	60%	19%	3	15	
1	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย					1	2.4810	2.4419	0.0391	0.0391		98%	100%	1		
2	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	7.7945	7.7945	0.0000			100%	100%	1		
3	ศสท.	แผนงานบูรณาการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการใช้ เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพยากรณ์ ข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน					1	17.6777	6.6291	11.0486			38%	44%		1	
4	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรม ทรัพยากรน้ำ					1	0.1562	0.1562	0.0000			100%	100%	1		
5	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	จอร์บภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น ทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ					1	0.0130	0.0000	0.0130			0%	0%		1	
6	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง					1	0.0270	0.0000	0.0270			0%	0%		1	
7	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง					1	0.0277	0.0000	0.0277			0%	0%		1	
8	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง					1	0.0648	0.0000	0.0648			0%	0%		1	
9	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้					1	0.0177	0.0000	0.0177			0%	0%		1	
10	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	โต๊ะกลางแบบวงรี จำนวน 2 ตัว					1	0.0240	0.0000	0.0240			0%	0%		1	

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหตึ่ล่อมปี	รวมเบิ่จจ่าย ปี 2565	ค้งเหลื่อ	ลตค่างาน	ค่างบับ	%ผลการ เบิ่จจ่าย	%ผลการ ค่างเนินงาน	ล่แล้วล่ร็ (จำนวน)	ม่ล่แล้วล่ร็ (จำนวน)	หมายเหต/ ปัญหาลูบสรรรค
				บ้าน/ หญ่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
11	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 189 x 82 x 78 ซม. หุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 2 ตัว					1	0.0660	0.0000	0.0660			0%	0%		1	
12	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 74 x 78 ซม. หุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 3 ตัว					1	0.0360	0.0000	0.0360			0%	0%		1	
13	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	โต๊ะทำงาน แบบไม้ัดทำลั จำนวน 3 ตัว					1	0.0120	0.0000	0.0120			0%	0%		1	
14	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	เก้าอี้สำนักงาน แบบปรับระดับได้และมีล้อ จำนวน 3 ตัว					1	0.0105	0.0000	0.0105			0%	0%		1	
15	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	โต๊ะประชุม จำนวน 2 รายการ					1	0.0288	0.0000	0.0288			0%	0%		1	
16	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงห้องประชุมสำหรับบัญชาการ โครงการขนาดใหญ่ (WAR ROOM) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร					1	0.0890	0.0000	0.0890			0%	0%		1	
17	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ตกแต่งภายใน (Build in) ตู้โซวม่ จำนวน 1 รายการ					1	0.0450	0.0000	0.0450			0%	0%		1	
18	ศสท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ตกแต่งภายใน (Build in) เคาน์เตอร์ รูปตัว แอล จำนวน 1 รายการ					1	0.0350	0.0000	0.0350			0%	0%		1	

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								3	1.6595	0.0000	1.6595	0.0000	0.0000	0%	30%	0	3	
1	สบจ.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน					1	0.8400	0.0000	0.8400			0%	45%		1	อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 25 มกราคม 2565 (เบิกจ่ายค่าจ้างงวดเดียว)
2	สบจ.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					1	0.3200	0.0000	0.3200			0%	45%		1	อยู่ระหว่างบริหารสัญญาและจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 26 มกราคม 2565 (เบิกจ่ายค่าจ้างงวดเดียว)
3	สบจ.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการศึกษากระบวนการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะนอกเขตชลประทาน					1	0.4995	0.0000	0.4995			0%	0%		1	-ยังไม่มีเบิกจ่าย/ ลงนาม สัญญาเลขที่ 0601/5/2564 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 เริ่มต้นสัญญา 18 พ.ย. 2564 สิ้นสุดสัญญา 16 พ.ค. 2565 -เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15 % ตามสัญญา เป็นเงิน 74,850.00 บาทแล้ว -อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								3	0.8838	0.8838	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	3	0	
1	สวพ.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS)					1	0.0013	0.0013	0.0000			100%	100%	1		- 11 สถานี - สวพ. ได้จัดการโอนเงิน เพื่อจัดสรรให้ สทภ. 1,3,11 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานแล้ว
2	สวพ.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย- ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา					1	0.0595	0.0595	0.0000			100%	100%	1		สวพ. ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รู้ไปแล้ว 3 รุ่น
3	สวพ.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ ท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)					1	0.8230	0.8230	0.0000			100%	100%	1		สวพ. ได้จัดการโอนเงิน เพื่อจัดสรรให้ สทภ. 1 - 11 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								2	9.5800	1.2300	8.3500	0.0000	0.0000	13%	95%	1	1	
1	สสป.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ					1	8.3500	0.0000	8.3500			0%	90%		1	
2	สสป.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ					1	1.2300	1.2300	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอکنไว้เบิกเหลื้อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกััน เหลื้อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								9	9.4365	6.7969	2.6396	0.0000	0.0000	72%	42%	3	6	
1	สลก.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	งบดำเนินงาน (แผนพื้นฐาน)					1	8.1046	6.4215	1.6831			79%	79%		1	งบดำเนินงานในภาพรวมของกรมเบิกจ่ายยังไม่แล้ว เสร็จ จำนวน 1,608,038.03 บาท เป็นงบประมาณที่ขอกัน ไว้ เพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในส่วนกลาง สทท.2 และ สทท.4 และเป็นรายการที่หมดความ จำเป็น และได้ดำเนินการสลาย PO เรียบร้อยแล้ว (ตกปรับอบนีนาคม 2565) จำนวน 75,091.38 บาท
2	สลก.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแชนวอน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง					1	0.0518	0.0518	0.0000			100%	100%	1		
3	สลก.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแชนวอน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง					1	0.0794	0.0794	0.0000			100%	100%	1		
4	สลก.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง กว้าง 2.00 เมตร หุ้ม ด้วยหนัง PVC จำนวน 2 ตัว					1	0.0738	0.0000	0.0738			0%	0%		1	
5	สลก.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง กว้าง 0.80 เมตร หุ้ม ด้วยหนัง PVC จำนวน 1 ตัว					1	0.0152	0.0000	0.0152			0%	0%		1	
6	สลก.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ระบบเครื่องเสียง 5.1 ช่อง (DTS) จำนวน 1 ชุด					1	0.0416	0.0000	0.0416			0%	0%		1	
7	สลก.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงห้องเกียรติยศและทำเนียบผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร					1	0.4997	0.0000	0.4997			0%	0%		1	
8	สลก.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงห้องที่ปรึกษาของกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร					1	0.3261	0.0000	0.3261			0%	0%		1	
9	สลก.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงอาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 4 เพื่อ จัดทำห้องเก็บครุภัณฑ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร					1	0.2442	0.2442	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกให้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								1	0.4980	0.1245	0.3735	0.0000	0.0000	25%	25%	0	1	
1	สกก./กพร.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ					1	0.4980	0.1245	0.3735			25%	25%		1	
