


ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

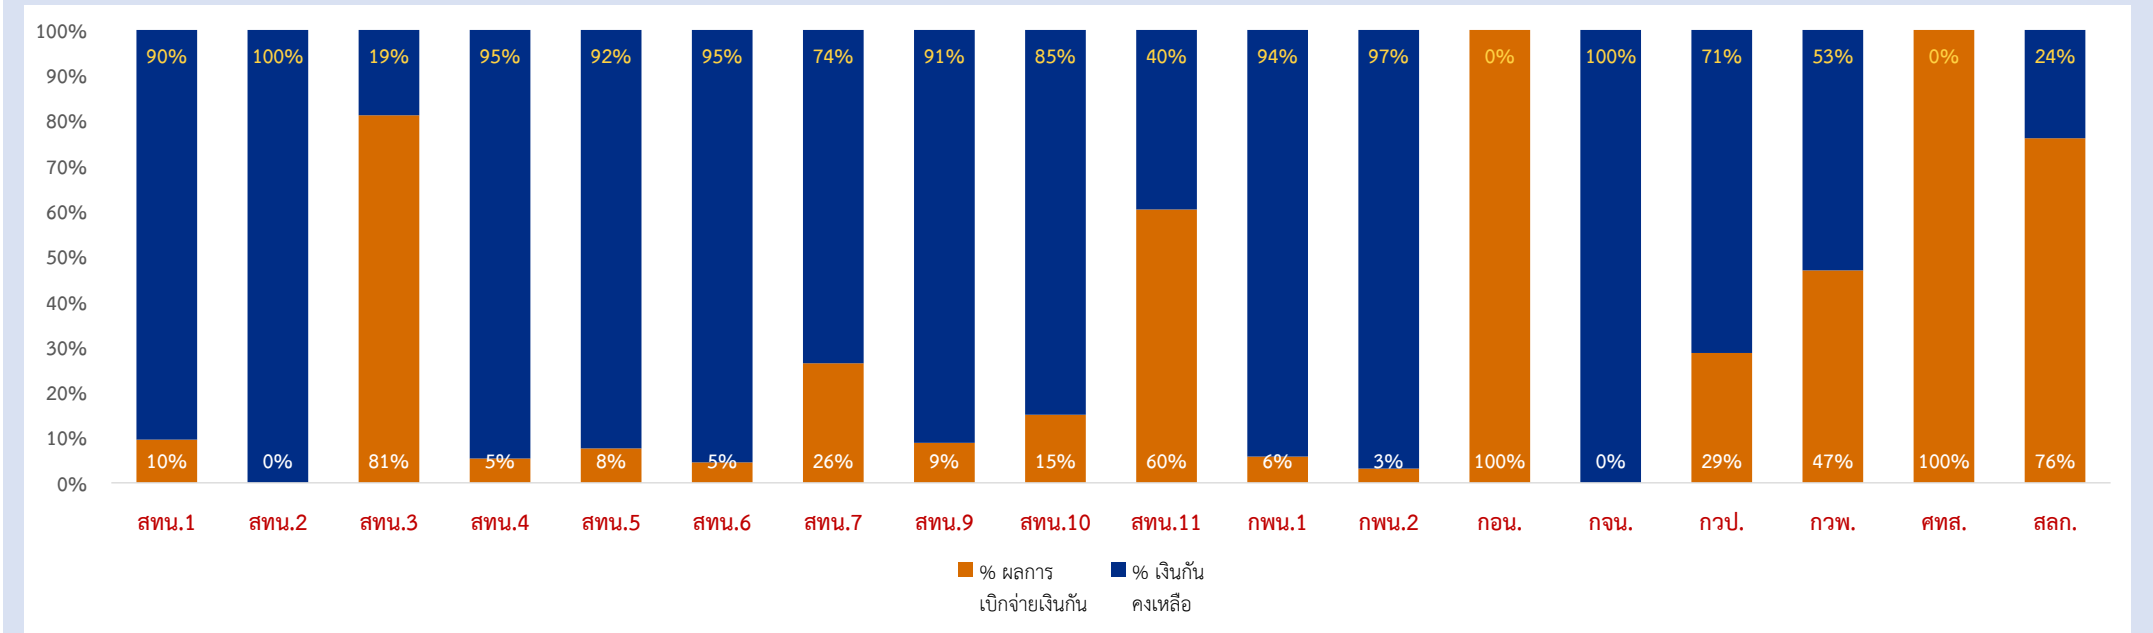

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.2	สทท.3	สทท.4	สทท.5	สทท.6	สทท.7	สทท.9	สทท.10	สทท.11	กพน.1	กพน.2	กอน.	กจน.	กวป.	กวพ.	ศทส.	สลก.
จำนวน (รายการ)	128	16	14	3	8	13	13	7	19	5	8	3	3	1	1	6	3	1	4
แล้วเสร็จ (รายการ)	29	3	2	1	0	0	4	2	1	0	7	0	0	1	0	3	2	1	2
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	99	13	12	2	8	13	9	5	18	5	1	3	3	0	1	3	1	0	2
ยอดเงินกันเหลือปี	1,189.9788	140.5145	130.6151	18.1280	107.7603	130.2576	174.8443	83.8845	210.5412	46.6374	33.1363	18.1795	5.0940	1.3442	1.9380	27.0908	52.9287	2.4810	4.6033
รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	160.7019	13.4315	0.0000	14.7144	5.7822	9.9014	7.9287	22.1652	18.6242	7.0204	19.9968	1.0514	0.1595	1.3442	0.0000	7.7684	24.8298	2.4810	3.5029
ยอดเงินกันคงเหลือ	1,023.5924	127.0830	125.8800	3.2982	101.9781	120.3562	166.0828	61.7184	191.9170	39.6170	13.1395	17.1281	4.9345	0.0000	1.9380	19.3222	28.0989	0.0000	1.1004
ลดค้างงาน	5.6845	0.0000	4.7351	0.1154	0.0000	0.0000	0.8329	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0001
% ผลการเบิกจ่ายเงิน	14%	10%	0%	81%	5%	8%	5%	26%	9%	15%	60%	6%	3%	100%	0%	29%	47%	100%	76%

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	16	140.5145	13.4315	127.0830	0.0000	0.0000	10%	87%	3	13	
1	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังตะกู หมู่ที่ 11	วังควง	พราณกระต่าย	กำแพงเพชร	1	13.9360	0.0000	13.9360			0%	100%		1	
2	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอื้อง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โหม่นน้ำเย็น หมู่ที่ 9	ดอยลาน	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	3.6923	0.0000	3.6923			0%	100%		1	
3	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาหม)	อาหม หมู่ที่ 3	แม่สลองใน	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	8.2147	0.0000	8.2147			0%	100%		1	
4	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านปาคาสุโข)	ปาคาสุโข หมู่ที่ 5	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	7.3108	0.0000	7.3108			0%	100%		1	
5	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านปาคาสามัคคี)	ปาคาสามัคคี หมู่ที่ 8	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	8.1158	0.0000	8.1158			0%	100%		1	
6	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา (บ้านเสาฝู)	เสาฝู หมู่ที่ 20	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	5.1587	0.0000	5.1587			0%	100%		1	
7	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพบ้านปางเพื่อง)	ปางเพื่อง หมู่ที่ 2	ปัว	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	7.0792	7.0792	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
8	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการป่าอนุรักษ์ประโยชน์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา (บ้านแม่ขี้มูกน้อย)	แม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13	บ้านทับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	30.6627	0.0000	30.6627			0%	62%		1	หยุดงาน 19 พ.ค. 65 / อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา
9	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	9.9224	0.0000	9.9224			0%	65%		1	แก้ไขแบบแปลน /อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา
10	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านผาละปี) ระยะ 2	ผาละปี หมู่ที่ 8	แม่ตีก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	8.7352	0.0000	8.7352			0%	55%		1	หยุดงาน 19 พ.ค. 65 / อยู่ระหว่างแจ้งขอเข้า / ขอขยายระยะเวลา
11	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้ง(บ้านทุ่งดินคำ)	ทุ่งดินคำ หมู่ที่ 6	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	7.9120	0.0000	7.9120			0%	55%		1	หยุดงาน 11 พ.ค. 65 / แก้ไขแบบแปลน / ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
12	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแม่ จดที่ 1 (บ้านก๊วย-ปางมะโอ) หมู่ที่ 12	ก๊วย-ปางมะโอ หมู่ที่ 12	ป่าแม่	แม่แตง	เชียงใหม่	1	3.4163	3.4163	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
13	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านครองราชย์)	ครองราชย์ หมู่ที่ 9	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	3.5977	0.0000	3.5977			0%	85%		1	หยุดงาน / ขออนุญาตขุดต่อลดถนน / แก้ไขแบบแปลน
14	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านหนองปลาไหล)	หนองปลาไหล หมู่ที่ 8	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	7.0768	0.0000	7.0768			0%	74%		1	หยุดงาน / ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ												จังหวัด
15	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูด้านน้ำภาคเหนือ		แม่ทะ	แม่ทะ	ลำปาง	1	12.7479	0.0000	12.7479		0%	90%		1		
16	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านนาเลียง)	นาเลียง หมู่ที่ 1	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	2.9361	2.9361	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	14	130.6151	0.0000	125.8800	4.7351	0.0000	0%	72%	2	12		
1	สทน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่	หมู่ที่ 4	คู้งสามา	มโนรมย์	ชัยนาท	1	4.3384	0.0000	4.3384			0%	95%	1		
2	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหานไกรเชื่อมต่อบึงใหญ่		วังไก่อีเรือน	หันคา	ชัยนาท	1	18.4752	0.0000	18.4752			0%	23%	1		หยุดงาน เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
3	สทน.2	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา)	หมู่ที่ 6, 7	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	1.2883	0.0000	1.2883			0%	96%	1		หยุดงาน เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
4	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสนุ่น เชื่อมต่อบึงปลิก	หมู่ที่ 5, 6	ย่านมัทรี	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	1	1.0037	0.0000	1.0037			0%	92%	1		
5	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 (สนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์)		นครสวรรค์ออก	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	1	15.3757	0.0000	15.3757			0%	21%	1		
6	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	หมู่ที่ 7	ห้วยถั่วเหนือ	หนองบัว	นครสวรรค์	1	5.7715	0.0000	5.7715			0%	56%	1		
7	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อคลองน้ำพุ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 2	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	9.2178	0.0000	9.2178			0%	73%	1		
8	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระจับเชื่อมต่อคลองไต่ตะโก เชื่อมต่อแม่น้ำป่าสัก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	1	24.1481	0.0000	24.1481			0%	62%	1		หยุดงาน เนื่องจากเหตุอุทกภัย และแก้ไขแบบแปลน
9	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำยาเชื่อมต่อห้วยช้อย		ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	16.1300	0.0000	16.1300			0%	41%	1		หยุดงาน เนื่องจากเหตุอุทกภัย และแก้ไขแบบแปลน
10	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		เขาแหลม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	4.4774	0.0000	4.4774			0%	97%	1		
11	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาน้อย(ฝ่ายพระเทพ), อ่างเก็บน้ำบ่อแม้น, อ่างเก็บน้ำหนองกรด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		ดิสัย	พัฒนานิคม	ลพบุรี	1	22.3203	0.0000	22.3203			0%	60%	1		หยุดงาน เนื่องจากปัญหาการใช้น้ำและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
12	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระ 400 ไร่ ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชื่อมต่อคลองโพธิ์		ไผ่เขียว	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	3.2317	0.0000	0.0000	3.2317		0%	100%	1		
13	สทน.2	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองขุมเห็ดและระบบส่งน้ำ	หมู่ที่ 5, 6	พลวงสองนาง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	1.5033	0.0000	0.0000	1.5033		0%	100%	1		
14	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำ ส.ป.ก. ช่วง 2 (โครงการภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หมู่ที่ 1	ข้าผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	1	3.3338	0.0000	3.3338			0%	87%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	3	18.1280	14.7144	3.2982	0.1154	0.0000	81%	73%	1	2	
1	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อตาลน้อย ช่วง 1	ดอนเตย หมู่ที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1	10.9964	8.7372	2.2592			79%	97%		1	
2	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ ช่วง 1	เจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	นาหว้าบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1	6.0926	5.9772	0.0000	0.1154		98%	100%	1		ลดค้างงาน 115,442.97 บาท
3	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำหมากหม่าง	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8	ท่าลี่	กุมภวาปี	อุดรธานี	1	1.0390	0.0000	1.0390			0%	23%		1	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	8	107.7603	5.7822	101.9781	0.0000	0.0000	5%	72%	0	8		
1	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอี้อยพร้อมระบบกระจายน้ำ	สีถาน	ดงลิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1	29.2800	0.0000	29.2800			0%	3%		1	หยุดงานเนื่องจากน้ำท่วม
2	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโพธิ์พร้อมระบบกระจายน้ำ	สงแดง	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	9.0841	0.0000	9.0841			0%	80%		1	หยุดงานเนื่องจากน้ำท่วม อยู่ระหว่างแจ้งเข้า
3	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดมะโนดพร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 5, 7, 8	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	13.3484	0.0000	13.3484			0%	65%		1	หยุดงานเนื่องจากน้ำขึ้นท่วม
4	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนโพธิ์ หมู่ที่ 6	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	5.6807	0.0000	5.6807			0%	89%		1	ผู้รับจ้างขอหยุดงานเนื่องจากน้ำท่วมโครงการตั้งแต่ 18 ต.ค.65
5	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักขู	ป่าเลี้ยว หมู่ที่ 16	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	5.9817	5.7822	0.1996			97%	100%		1	
6	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบลลาดพัฒนา, ตำบลเก็ง)		ลาดพัฒนา, เก็ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1	13.1613	0.0000	13.1613			0%	76%		1	หยุดงานเนื่องจากชาวบ้านขอระบายน้ำลงโครงการ
7	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจิว ระยะที่ 2		ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1	18.3613	0.0000	18.3613			0%	60%		1	หยุดงานเนื่องจากน้ำท่วม
8	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำพลับพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนเคือ	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1	12.8628	0.0000	12.8628			0%	100%		1	ขยายสิ้นสุดสัญญา 17/12/65

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	13	130.2576	9.9014	120.3562	0.0000	0.0000	8%	71%	0	13		
1	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสำโรง (ช่วง2)		บึงสำโรง	แก้งสามนาง	นครราชสีมา	1	11.2710	0.0000	11.2710			0%	90%		1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค. 2565
2	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองห้อยพร้อมระบบอ่างพวงสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองห้อย	ห้วยวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	6.5795	0.0000	6.5795			0%	95%		1	อยู่ระหว่างสูบน้ำออกจากพื้นที่โครงการ
3	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกาบ	นาราคพัฒนา หมู่ที่ 5	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	1	23.2659	2.7898	20.4761			12%	72%		1	
4	สทท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกระเดิน	หนองยาง หมู่ที่ 5	ตู	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1	4.8523	0.0000	4.8523			0%	90%		1	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน (แนวท่อ)
5	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่	หนองบัวแดง, สมปิตีเจริญ หมู่ที่ 6,14	กุดโบสถ์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1	6.2329	2.9988	3.2341			48%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
6	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกวังวน หมู่ที่ 4	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1	16.8739	0.0000	16.8739			0%	60%		1	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนเนื่องจากเปลี่ยนแปลงแนวท่อ
7	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน หมู่ที่ 6,8,9	ทัพใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	1	12.5412	0.0000	12.5412			0%	75%		1	แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้างาน วันที่ 6/12/65 มีหนังสือ
8	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่า เขากะปือด)		ลำน้ำร่อง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1	15.0000	0.0000	15.0000			0%	0%		1	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าพื้นที่
9	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน)		ลำน้ำร่อง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1	12.1162	2.1632	9.9530			18%	55%		1	
10	สทท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่		คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1	6.8498	0.8128	6.0370			12%	85%		1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ. 2565
11	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงดูชาติสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โนนแดง หมู่ที่ 4	ดูชาติ	คง	นครราชสีมา	1	11.2498	0.0000	11.2498			0%	73%		1	
12	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่		กุดพิมาน	คำชะขุนทด	นครราชสีมา	1	2.9563	1.1368	1.8195			38%	70%		1	
13	สทท.5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บและบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง-อุทกภัย					1	0.4688	0.0000	0.4688			0%	60%		1	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	13	174.8443	7.9287	166.0828	0.8329	0.0000	5%	60%	4	9		
1	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนวังหวั 2	หมู่ที่ 9	วังหวั	แกลง	ระยอง	1	8.7895	0.0000	8.7895			0%	60%		1	- คงเหลืออุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 65
2	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงคิงกะปาว	หมู่ที่ 4	ประณีต	เขาสมิง	ตราด	1	33.9765	0.0000	33.9765			0%	38%		1	- เดิมหยุดงาน ติดปัญหาน้ำท่วมโครงการ - ห้างแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว เมื่อ 25 พ.ย. 65 - ขยายสัญญาถึง 5 ก.พ. 66
3	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ช่วง 3		สำนักท้อน	บ้านฉาง	ระยอง	1	25.6228	0.0000	25.6228			0%	60%		1	- หยุดงาน เนื่องจากน้ำท่วมซึ่งบริเวณโครงการ ประกอบกับการประสานจากกองทัพเรือสัปดาห์ ขอให้หยุดการระบายน้ำออกจากโครงการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ต.สำนักท้อน ได้รับ
4	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองพันปลา พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 13	คงขี้เหล็ก	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	15.2837	0.0000	15.2837			0%	65%		1	- ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน ม.ค. 66
5	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโนนหมากเค็ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 4	โนนหมากเค็ง	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	11.1005	4.0185	7.0819			36%	90%		1	- ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือน ม.ค. 66
6	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง แพรกหนามเตียน	หมู่ที่ 3	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	1	3.9101	3.9101	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการก่อสร้าง + เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
7	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขามันเทศ	หมู่ที่ 13	ทุ่งพระยา	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	42.5680	0.0000	42.5680			0%	13%		1	- หยุดงาน ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้ - รอหนังสืออนุญาตเข้าดำเนินการจากกรมป่าไม้
8	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเปือย ช่วง 2	หมู่ที่ 8	ย่านรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	16.6227	0.0000	16.6227			0%	40%		1	- หยุดงาน เนื่องจากชุดพบขึ้นหินแข็ง ต้องแก้ไขแบบแปลน - คาดว่าจะแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จภายในกลางเดือน ธ.ค. และสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที
9	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	9.7495	0.0000	9.7495			0%	0%		1	- หยุดงาน ระหว่างรอสำนักปฎิบัติที่ดินตรวจสอบว่าอยู่ในพื้นที่ สปก. หรือไม่
10	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองโพรง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	1	6.3880	0.0000	6.3880			0%	15%		1	- หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหาตรวจสอบดำเนินการกรณีผู้รับจ้างลักลอบขนย้ายมูลดินไปจำหน่าย - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง และหารือกับกลุ่มนิติการ กรมทรัพยากรน้ำ
11	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนามกีฬาบ้านเนินฝ้อ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 3	เนินฝ้อ	แกลง	ระยอง	1	0.0366	0.0000	0.0000	0.0366		0%	100%	1		- ลดค่างาน 0.0366 ล้านบาท (เงินคงเหลือแจ้งคืนกรม) - เบิกจ่ายแล้ว 100%
12	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเกาะจันทร์ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 1	เกาะจันทร์	เกาะจันทร์	ชลบุรี	1	0.6965	0.0000	0.0000	0.6965		0%	100%	1		- ลดค่างาน 0.6965 ล้านบาท (เงินคงเหลือแจ้งคืนกรม) - เบิกจ่ายแล้ว 100%
13	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร.		พรหมณี	เมืองนครนายก	นครนายก	1	0.0998	0.0000	0.0000	0.0998		0%	100%	1		- ลดค่างาน 0.0998 ล้านบาท (เงินคงเหลือแจ้งคืนกรม) - เบิกจ่ายแล้ว 100%

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	7	83.8845	22.1652	61.7184	0.0009	0.0000	26%	70%	2	5		
1	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองดอนหงษ์	หมู่ที่ 1,2	ดอนมะนาว	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	29.0304	0.0000	29.0304			0%	36%		1	หยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (นสล.) หลักเขตที่ดินได้มีการอุทธรณ์เป็นบางส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาวได้
2	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในพื้นที่ตำบลปากแพรก	แขก หมู่ที่ 5	ปากแพรก	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	1	12.8055	12.8055	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.7	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองจั่น	หมู่ที่ 4	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	14.6024	0.0000	14.6024			0%	92%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงานอาคารทางน้ำเข้า -ทางน้ำออก
4	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่แนวกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรณีหมู่บ้านตะเพินคี ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วย	หมู่ที่ 5	วังยาว	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	1	8.2690	0.0000	8.2690			0%	2%		1	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ ตามบันทึกข้อความ ที่ ทส 0910.504/17105 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ปัจจุบัน ได้มีสมรรมสรุปผ่าน ทำให้ฝนตกชุกในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ และเส้นทางในการขนส่งเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ ทำให้ถนนได้รับความเสียหายเป็นร่องลึก จึงให้ผู้รับจ้างหยุดงานต่อเนื่องไปอีก จนกว่าผู้รับจ้างสามารถขนส่งเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อเข้าดำเนินโครงการได้ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เส้นทางในการขนส่งเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการได้
5	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโพธิ์		บ้านโพธิ์	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	1.2272	0.8614	0.3658			70%	100%		1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
6	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณวิทยาลัยการเกษตร		ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	1	17.8600	8.4092	9.4508			47%	62%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้าง งานชุดลอก และงานวางท่อ
7	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง		หนองพันจันทร์	บ้านคา	ราชบุรี	1	0.0899	0.0890	0.0000	0.0009		99%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	19	210.5412	18.6242	191.9170	0.0000	0.0000	9%	57%	1	18		
1	สทน.9	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยค๊ะ	ค๊ะ หมู่ที่ 6	ศรีภูมิ	ท่าวังผา	น่าน	1	0.3204	0.0000	0.3204			0%	90%		1	หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย- เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่
2	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายเสริมระบบนิเวศห้วยกอกพร้อมระบบกระจายน้ำห้วยทอบคอกสนับสนุนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินิคมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ	ผาสุก หมู่ที่ 3	ภูฟ้า	บ่อเกลือ	น่าน	1	2.7676	0.0000	2.7676			0%	34%		1	หยุดงาน เนื่องจากขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่
3	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแวง ระยะที่ 2	น้ำแวง หมู่ที่ 6	ปงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	0.3652	0.3652	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ ส่งงานงวด 5 สุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2565
4	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2	ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	4.3515	2.3104	2.0410			53%	70%		1	
5	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเงี้ยว ระยะที่ 2	ปางปูก หมู่ที่ 2	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.3420	0.0000	0.3420			0%	98%		1	
6	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแวง ระยะที่ 2	น้ำลิ้น หมู่ที่ 8	ปงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.3271	0.0000	1.3271			0%	95%		1	
7	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2	นาเลา หมู่ที่ 3	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	4.2797	2.8091	1.4706			66%	70%		1	
8	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2	โป่งคำ หมู่ที่ 5	ทุ่งพงษ์	สันติสุข	น่าน	1	4.3202	2.0481	2.2721			47%	60%		1	
9	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหัววังกว้าง	ไม้คอดอน ม.3	ไม้คอดอน	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	1	0.8008	0.0000	0.8008			0%	89%		1	หยุดงาน/ เนื่องจากน้ำท่วมโครงการ ไม่สามารถก่อสร้างอาคารระบายน้ำได้
10	สทน.9	ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลห้วยมุ่น ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและป่าสงวนแห่งชาติป่า น้ำปาดอย่างมีส่วนร่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ธรรมวงศ์ หมู่ที่ 6,ธรรมวงศ์ หมู่ที่ 7	ห้วยมุ่น	น้ำปาด	อุดรดิต์	1	3.3325	0.0000	3.3325			0%	73%		1	
11	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเหี้ยะ	ปางเคาะ หมู่ที่ 11	โพธิ์ชัย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3500	0.0000	4.3500			0%	0%		1	หยุดงาน/ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ป่าน
12	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล		สะเอียบ	สอง	แพร่	1	89.9500	0.0000	89.9500			0%	1%		1	
13	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ป่าน (ม่อนพลอยล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	น้ำพริก หมู่ที่ 6	โพธิ์ชัย	เด่นชัย	แพร่	1	3.5950	0.0000	3.5950			0%	0%		1	หยุดงาน/ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ่อแก้ว แม่สิน แม่สูง
14	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล	น้ำปุ่น หมู่ที่ 1	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	6.8101	2.4425	4.3676			36%	77%		1	
15	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล	น้ำพาง หมู่ที่ 4	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.0958	3.5327	9.5631			27%	71%		1	
16	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล	น้ำตวง หมู่ที่ 9	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	11.2718	3.6512	7.6206			32%	67%		1	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
17	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้ม-หนองแม่ระวีง		สารจิตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	46.3312	0.0000	46.3312			0%	55%		1	
18	สทท.9	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเคือ	เวียงคัง หมู่ที่ 1	วังธง	เมืองแพร่	แพร่	1	6.2220	0.0000	6.2220			0%	2%		1	แจ้งเร่งรัดงานครั้งที่ 2
19	สทท.9	ปรับปรุงฟื้นฟูหนองหันตรา	บุง หมู่ที่ 2	บ้านบุง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	1	6.7083	1.4649	5.2434			22%	37%		1	** งานทำเอง

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	5	46.6374	7.0204	39.6170	0.0000	0.0000	15%	67%	0	5	
1	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านบางฝนตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 18	รับร้อ	ท่าแซะ	ชุมพร	1	3.8299	0.0000	3.8299			0%	98%		1	- คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2565
2	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนพื้นที่ สปก. แปลง 83 ช่วง 2		หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	1	6.7958	0.0000	6.7958			0%	13%		1	- แก้ไขแบบแปลนเพิ่มเติมแล้วเสร็จ และเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการ
3	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มังคุด	หมู่ที่ 8	พ้อแดง	หลังสวน	ชุมพร	1	8.1563	0.0000	8.1563			0%	62%		1	- คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565
4	สทท.10	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สนับสนุนน้ำเพื่อการปศุสัตว์และการเกษตรกรรม ระยะที่1	หมู่ที่ 9	มะลวน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	25.1577	7.0204	18.1373			28%	62%		1	- คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2566
5	สทท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแหล่งน้ำห้วยโศก สนับสนุนพื้นที่ สปก.	หมู่ที่ 2	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	2.6977	0.0000	2.6977			0%	100%		1	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ												จังหวัด
					รวม	8	33.1363	19.9968	13.1395	0.0000	0.0000	60%	100%	7	1		
1	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกะเหลิบ	โนนค้อ	หนองเปิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	18.4096	5.2701	13.1395			29%	97%		1	
2	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ					1	1.9776	1.9776	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 11 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี					1	3.5035	3.5035	0.0000			100%	100%	1		
4	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ หมู่ที่ 4 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ					1	1.8912	1.8912	0.0000			100%	100%	1		
5	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร					1	3.1216	3.1216	0.0000			100%	100%	1		
6	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ					1	2.5085	2.5085	0.0000			100%	100%	1		
7	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ถั่วลิสง หมู่ที่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร					1	0.8854	0.8854	0.0000			100%	100%	1		
8	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3,10,11 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ					1	0.8388	0.8388	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	3	18.1795	1.0514	17.1281	0.0000	0.0000	6%	93%	0	3		
1	กพน.1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะ				1	5.3800	0.0000	5.3800			0%	100%		1		
2	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 49 แห่ง				1	1.3199	1.0514	0.2685			80%	100%		1		
3	กพน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว		บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	1	11.4796	0.0000	11.4796			0%	78%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ													
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ											
					รวม	3	5.0940	0.1188	4.9752	0.0000	0.0000	2%	63%	0	3	
1	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 300 แห่ง				1	1.3922	0.0000	1.3922			0%	92%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 79 แห่ง				1	0.5019	0.1188	0.3830			24%	97%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมอไค้ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ				1	3.2000	0.0000	3.2000			0%	0%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	1	1.3442	1.3442	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0		
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ				1	1.3442	1.3442	0.0000				100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	1	1.9380	0.0000	1.9380	0.0000	0.0000	0%	55%	0	1	
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน					1	1.9380	0.0000	1.9380			0%	55%		1	ทปช.อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขร่างรายงานฉบับสุดท้าย ซึ่งทปช.ได้จัดส่งร่างรายงานฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 และคณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 และมีมติไม่รับรายงานฉบับดังกล่าวและให้ ทปช. จัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้าย (ฉบับแก้ไข)จัดส่งกรมทรัพยากรน้ำต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านมีองค์ประกอบหลายส่วน มีรายละเอียดเอกสารประกอบแบบแปลน ประมาณราคาและคู่มือที่ซับซ้อน

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเปลี่ยนปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	6	27.0908	7.7684	19.3222	0.0002	0.0000	29%	99%	3	3		
1	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 1 รายการ				1	0.0904	0.0902	0.0000	0.0002		100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว (เป็นงบด้านระบบสื่อสาร)	
2	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 1 รายการ				1	1.0992	1.0992	0.0000			100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว	
3	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง)				1	7.3185	0.0000	7.3185			0%	98%		1	งวด4 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ปลายเดือน ธ.ค.65 งวด5 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค.66	
4	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอบางสะพาน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร				1	7.7988	4.6793	3.1195			60%	100%		1	งวด5 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ปลายเดือน ธ.ค.65	
5	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร				1	8.8842	0.0000	8.8842			0%	94%		1	งวด4 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือน ม.ค.66 งวด5 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.พ.66	
6	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร				1	1.8998	1.8998	0.0000			100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	3	52.9287	24.8298	28.0989	0.0000	0.0000	47%	90%	2	1		
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 1 รายการ				1	0.7429	0.7429	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS) 1 รายการ				1	0.0022	0.0022	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ				1	52.1836	24.0848	28.0989			46%	70%		1	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 งวด / อยู่ระหว่างการตรวจรับงวด 4	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	1	2.4810	2.4810	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0		
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 รายการ				1	2.4810	2.4810	0.0000			100%	100%	1			

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ													
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ											
					รวม	4	4.6033	3.5029	1.1004	0.0001	0.0000	76%	74%	2	2	
1	สกก.	งบดำเนินงาน				1	3.9979	3.3641	0.6338			84%	95%		1	
2	สกก.	ก่อสร้างเพื่อเชื่อมท่อระบายน้ำทั้งของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร				1	0.4665	0.0000	0.4665			0%	0%		1	
3	สกก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2, 6, 14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี				1	0.1072	0.1072	0.0000	0.0000		100%	100%	1		
4	สกก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการ ปรับปรุงพื้นที่หนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย				1	0.0316	0.0316	0.0000	0.0000		100%	100%	1		
