


ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

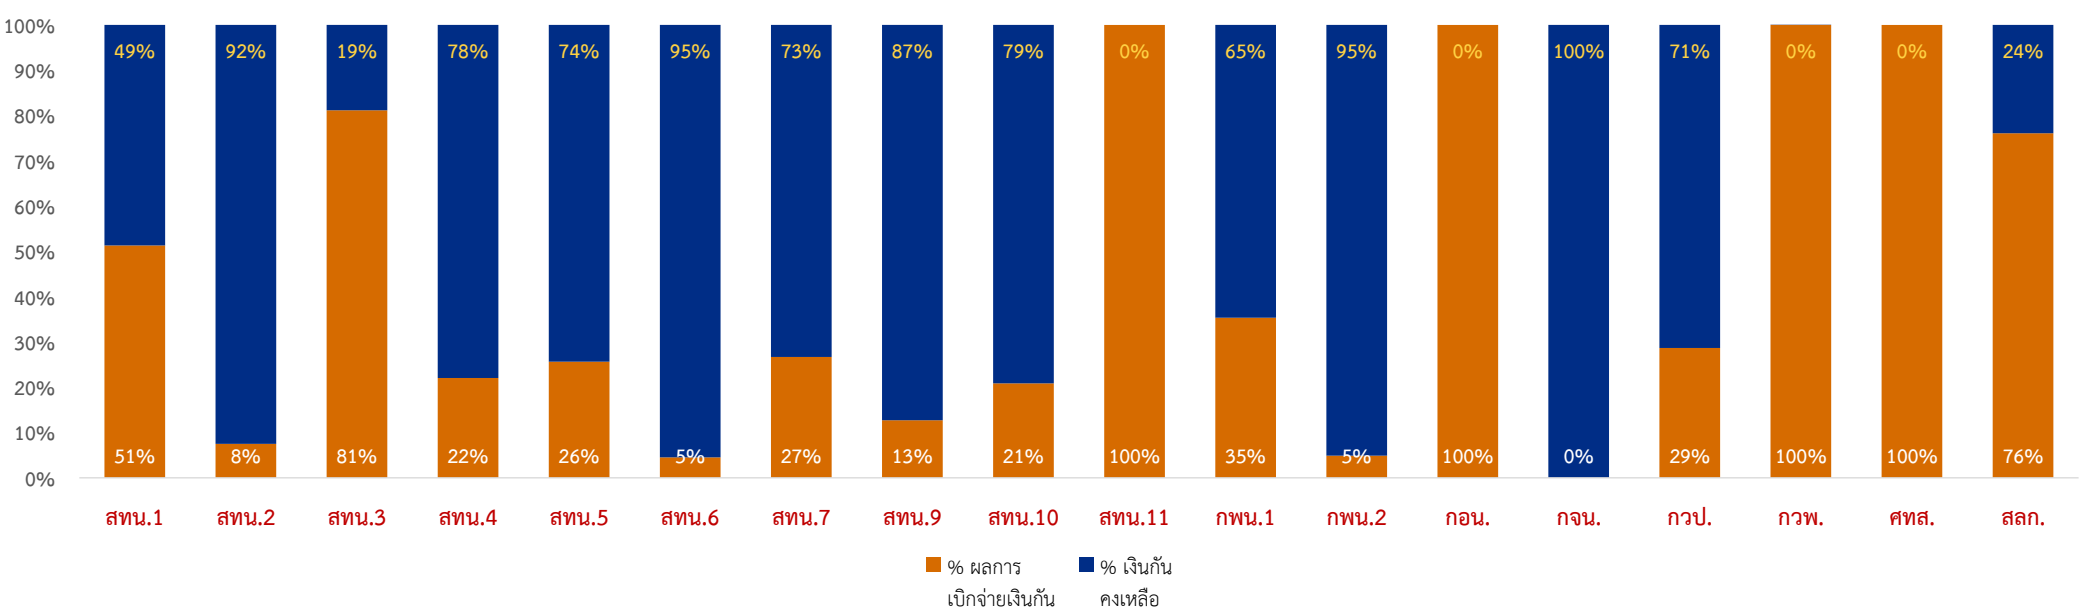

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สทน.1	สทน.2	สทน.3	สทน.4	สทน.5	สทน.6	สทน.7	สทน.9	สทน.10	สทน.11	กพน.1	กพน.2	กอน.	กจน.	กวป.	กวพ.	ศทส.	สลก.
จำนวน (รายการ)	128	16	14	3	8	13	13	7	19	5	8	3	3	1	1	6	3	1	4
แล้วเสร็จ (รายการ)	42	8	3	1	1	1	4	2	2	1	8	1	0	1	0	3	3	1	2
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	86	8	11	2	7	12	9	5	17	4	0	2	3	0	1	3	0	0	2
ยอดเงินกันเหลือปี	1,189.9788	140.5145	130.6151	18.1280	107.7603	130.2576	174.8443	83.8845	210.5412	46.6374	33.1363	18.1795	5.0940	1.3442	1.9380	27.0908	52.9287	2.4810	4.6033
รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	328.3769	72.0991	9.7995	14.7144	23.7404	33.3980	7.9287	22.3700	26.7676	9.7181	33.1363	6.4314	0.2487	1.3442	0.0000	7.7684	52.9284	2.4810	3.5029
ยอดเงินกันคงเหลือ	855.8986	68.4154	116.0805	3.2982	84.0013	96.8596	166.0828	61.5136	183.7736	36.9194	0.0000	11.7481	4.8453	0.0000	1.9380	19.3222	0.0004	0.0000	1.1004
ลดค้างงาน	5.7032	0.0000	4.7351	0.1154	0.0187	0.0000	0.8329	0.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0001
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	28%	51%	8%	81%	22%	26%	5%	27%	13%	21%	100%	35%	5%	100%	0%	29%	100%	100%	76%

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ												จังหวัด
						รวม	16	140.5145	72.0991	68.4154	0.0000	0.0000	51%	91%	8	8	
1	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังตะกู หมู่ที่ 11	วังควง	พราณกระต่าย	กำแพงเพชร	1	13.9360	6.1343	7.8017			44%	90%		1	คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนม.ค.66
2	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอื้อง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โหม่นน้ำเย็น หมู่ที่ 9	คดยส้าน	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	3.6923	3.6923	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
3	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาหม)	อาหม หมู่ที่ 3	แม่สลองใน	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	8.2147	8.2147	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
4	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านป่าคสุโขใจ)	ป่าคสุโขใจ หมู่ที่ 5	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	7.3108	7.3108	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
5	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านป่าสามัคคี)	ป่าสามัคคี หมู่ที่ 8	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	8.1158	8.1158	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
6	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา (บ้านเล่าฝู)	เล่าฝู หมู่ที่ 20	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	5.1587	5.1587	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
7	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพบ้านปางเพื่อง)	ปางเพื่อง หมู่ที่ 2	ปึงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	7.0792	7.0792	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
8	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการเอนกประโยชน์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา (บ้านแม่ขี้มูกน้อย)	แม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13	บ้านทับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	30.6627	20.0410	10.6217			65%	87%		1	คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนก.พ.66
9	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	9.9224	0.0000	9.9224			0%	80%		1	อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา /คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน กพ.66
10	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านผาละปี) ระยะ 2	ผาละปี หมู่ที่ 8	แม่ตีก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	8.7352	0.0000	8.7352			0%	75%		1	อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลา /คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือน กพ.66
11	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป่า(บ้านทุ่งดินคำ)	ทุ่งดินคำ หมู่ที่ 6	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	7.9120	0.0000	7.9120			0%	60%		1	หยุดงาน 11 พ.ค. 65 / แก้ไขแบบแปลน / ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
12	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ จุดที่ 1 (บ้านก๊วย-ปางมะโอ)	ก๊วย-ปางมะโอ หมู่ที่ 12	ป่าแป๋	แม่แตง	เชียงใหม่	1	3.4163	3.4163	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ												จังหวัด
13	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านครองราชย์)	ครองราชย์ หมู่ที่ 9	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	3.5977	0.0000	3.5977			0%	85%		1	หยุดงาน / ขออนุญาตขุดท่อลอดถนน / แก้ไขแบบแปลน
14	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านหนองปลาไหล)	หนองปลาไหล หมู่ที่ 8	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	7.0768	0.0000	7.0768			0%	74%		1	หยุดงาน / ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
15	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ		แม่ทะ	แม่ทะ	ลำปาง	1	12.7479	0.0000	12.7479			0%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน/เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
16	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านนาเลียง)	นาเลียง หมู่ที่ 1	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	2.9361	2.9361	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	14	130.6151	9.7995	116.0805	4.7351	0.0000	8%	74%	3	11		
1	สทน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่	หมู่ที่ 4	คู้งลำภา	มโนรมย์	ชัยนาท	1	4.3384	4.3384	0.0000			100%	100%	1		
2	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหานไกรเชื่อมต่อบึงใหญ่		วังโกเถื่อน	หันคา	ชัยนาท	1	18.4752	0.0000	18.4752			0%	23%		1	หยุดงาน เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
3	สทน.2	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา)	หมู่ที่ 6, 7	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	1.2883	0.0000	1.2883			0%	96%		1	หยุดงาน เนื่องจากปัญหาอุทกภัย
4	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสนุ่น เชื่อมต่อบึงปลีก	หมู่ที่ 5, 6	ย่านมัทรี	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	1	1.0037	0.0000	1.0037			0%	96%		1	
5	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 (สนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์)		นครสวรรค์ออก	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	1	15.3757	0.0000	15.3757			0%	32%		1	
6	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	หมู่ที่ 7	ห้วยอั่วเหนือ	หนองบัว	นครสวรรค์	1	5.7715	0.0000	5.7715			0%	60%		1	
7	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งสิง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อคลองน้ำขุ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 2	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	9.2178	2.4967	6.7211			27%	77%		1	
8	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระจับเชื่อมต่อกองโคตะโก เชื่อมต่อแม่น้ำป่าสัก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	1	24.1481	0.0000	24.1481			0%	62%		1	หยุดงาน เนื่องจากเหตุอุทกภัย และแก้ไขแบบแปลน
9	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำยาเชื่อมต่อห้วยช้อย		ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	16.1300	0.0000	16.1300			0%	41%		1	หยุดงาน เนื่องจากเหตุอุทกภัย และแก้ไขแบบแปลน
10	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		เขาแหลม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	4.4774	0.0000	4.4774			0%	98%		1	
11	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาน้อย(ฝ่ายพระเทพ), อ่างเก็บน้ำบ่อแม้น, อ่างเก็บน้ำหนองกรด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		ดิสั่ง	พัฒนานิคม	ลพบุรี	1	22.3203	0.0000	22.3203			0%	60%		1	หยุดงาน เนื่องจากปัญหาการใช้น้ำและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
12	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระ 400 ไร่ ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชื่อมต่อคลองโพธิ์		ไผ่เขียว	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	3.2317	0.0000	0.0000	3.2317		0%	100%	1		
13	สทน.2	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองขุนเฒ่าและระบบส่งน้ำ	หมู่ที่ 5, 6	พลางสองนาง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	1.5033	0.0000	0.0000	1.5033		0%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
14	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำ ส.ป.ก. ช่วง 2 (โครงการภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หมู่ที่ 1	ข้าฝักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	1	3.3338	2.9644	0.3694			89%	90%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	3	18.1280	14.7144	3.2982	0.1154	0.0000	81%	77%	1	2	
1	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อตลน้อย ช่วง 1	ดอนเตย หมู่ที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1	10.9964	8.7372	2.2592			79%	98%		1	
2	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ ช่วง 1	เจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	นาหว้าบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1	6.0926	5.9772	0.0000	0.1154		98%	100%	1		ลดค้างงาน 115,442.97 บาท
3	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำถ้ำหมากหม่าง	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8	ท่าลี่	กุมภวาปี	อุดรธานี	1	1.0390	0.0000	1.0390			0%	32%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	8	107.7603	23.7404	84.0013	0.0187	0.0000	22%	77%	1	7	
1	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอี้อยพร้อมระบบกระจายน้ำ	สีถ่าน	คงลิ่ง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1	29.2800	0.0000	29.2800			0%	3%		1	หยุดงานเนื่องจากน้ำท่วม
2	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโพธิ์พร้อมระบบกระจายน้ำ	สงแดง	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	9.0841	3.7434	5.3407			41%	91%		1	
3	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุมะโนดพร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 5, 7, 8	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	13.3484	0.0000	13.3484			0%	90%		1	
4	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนโพธิ์ หมู่ที่ 6	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	5.6807	4.8190	0.8618			85%	99%		1	
5	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักขู	ป่าเลี้ยว หมู่ที่ 16	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	5.9817	5.9631	0.0000	0.0187		100%	100%	1		แล้วเสร็จ 19/12/65
6	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบลลาดพัฒนา, ตำบลเก้ง)		ลาดพัฒนา, เก้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	1	13.1613	0.0000	13.1613			0%	76%		1	
7	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจิว ระยะที่ 2		ธงธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1	18.3613	0.0000	18.3613			0%	60%		1	
8	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนเคือ	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1	12.8628	9.2149	3.6479			72%	100%		1	ขยายสิ้นสุดสัญญา 17/12/65

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	13	130.2576	33.3980	96.8596	0.0000	0.0000	26%	76%	1	12		
1	สทน.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสำโรง (ช่วง2)		บึงสำโรง	แก่งสนามนาง	นครราชสีมา	1	11.2710	8.8540	2.4170			79%	94%		1	
2	สทน.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทัพค่ายพร้อมระบบอ่างพวงสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองทัพค่าย	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	6.5795	0.0000	6.5795			0%	95%		1	
3	สทน.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกาบ	นาราคพัฒนา หมู่ที่ 5	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	1	23.2659	6.7901	16.4757			29%	75%		1	
4	สทน.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกระเดิน	หนองยาง หมู่ที่ 5	คู	กันทรามย์	ศรีสะเกษ	1	4.8523	3.5001	1.3523			72%	97%		1	
5	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่	หนองบัวแดง, สมบัติเจริญ หมู่ที่ 6,14	กุศโพนส์	เลิงสาง	นครราชสีมา	1	6.2329	6.2329	0.0000			100%	100%	1		
6	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกวังวน หมู่ที่ 4	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1	16.8739	0.0000	16.8739			0%	61%		1	อยู่ระหว่างประชาคมย้ายแนวท่อ แก้ไขแบบแปลน
7	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน หมู่ที่ 6,8,9	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	1	12.5412	0.0000	12.5412			0%	75%		1	แก้ไขแบบแปลน
8	สทน.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่า เขากะปือด)		ลำน้ำร่อง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1	15.0000	0.0000	15.0000			0%	0%		1	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าพื้นที่
9	สทน.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน)		ลำน้ำร่อง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1	12.1162	4.2110	7.9052			35%	60%		1	
10	สทน.5	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่		คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1	6.8498	1.8177	5.0321			27%	84%		1	
11	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงคูขาดสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โนนแดง หมู่ที่ 4	คูขาด	คง	นครราชสีมา	1	11.2498	0.0000	11.2498			0%	79%		1	
12	สทน.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่		กุดพิมาน	คำชะนุด	นครราชสีมา	1	2.9563	1.7110	1.2453			58%	95%		1	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
13	สทท.5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ แม่น้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัย					1	0.4688	0.2813	0.1875			60%	70%		1	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	13	174.8443	7.9287	166.0828	0.8329	0.0000	5%	60%	4	9		
1	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนวังหวั 2	หมู่ที่ 9	วังหวั	แก่ง	ระยอง	1	8.7895	0.0000	8.7895			0%	60%	1		- คงเหลือติดตั้งอุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ. 66
2	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงคึกะบ่าว	หมู่ที่ 4	ประณีต	เขาสมิง	ตราด	1	33.9765	0.0000	33.9765			0%	38%	1		- เดิมหยุดงาน ติดปัญหาน้ำท่วมโครงการ - ท้างแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว เมื่อ 25 พ.ย. 65 - ขยายสัญญาถึง 5 ก.พ. 66 - อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จ เดือน มี.ย. 66
3	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ช่วง 3		สำนักท้อน	บ้านฉาง	ระยอง	1	25.6228	0.0000	25.6228			0%	60%	1		- หยุดงาน เนื่องจากน้ำท่วมช่วงบริเวณโครงการ ประกอบกับได้รับ การประสานจากกองทัพเรือสัดทับ ขอให้หยุดการระบายน้ำออก จากโครงการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ต.สำนักท้อน ได้รับ ผลกระทบจากการระบายน้ำ - ระหนังสือให้เข้าดำเนินการจากฐานทัพเรือ
4	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองหินปลา พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 13	คงขี้เหล็ก	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	15.2837	0.0000	15.2837			0%	65%	1		- ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ. 66
5	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโนนหมากแข้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 4	โนนหมากแข้ง	วัฒนาคร	สระแก้ว	1	11.1005	4.0185	7.0819			36%	90%	1		- ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ. 66
6	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง แพรกพนาม เตียน	หมู่ที่ 3	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	1	3.9101	3.9101	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการก่อสร้าง + เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
7	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขามันเทศ	หมู่ที่ 13	ทุ่งพระยา	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	42.5680	0.0000	42.5680			0%	13%	1		- เดิมหยุดงาน ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้ - จะแจ้งเข้าดำเนินการวันที่ 20 ม.ค. 66
8	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปรือ ช่วง 2	หมู่ที่ 8	ย่านรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	16.6227	0.0000	16.6227			0%	40%	1		- หยุดงาน เนื่องจากชุดพบขึ้นหินแข็ง ต้องแก้ไขแบบแปลน - คาดว่าจะแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. และสามารถเข้า ดำเนินการได้ทันที
9	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	9.7495	0.0000	9.7495			0%	0%	1		- แจ้งเข้าดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66 - ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
10	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองโโรง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	1	6.3880	0.0000	6.3880			0%	15%	1		- หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหาตรวจสอบดำเนินคดีกรณีผู้รับจ้าง ลักลอบขนย้ายมูลดินไปจำหน่าย - อยู่ระหว่างรอศาลพิจารณาคัดสินคดี

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ												จังหวัด
11	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สวมกีฬาบ้านเนินซ้อ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 3	เนินซ้อ	แก่ง	ระยอง	1	0.0366	0.0000	0.0000	0.0366		0%	100%	1		- ลดค่างาน 0.0366 ล้านบาท (เงินคงเหลือแจ้งคืนกรม) - เบิกจ่ายแล้ว 100%
12	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเกาะจันทร์ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 1	เกาะจันทร์	เกาะจันทร์	ชลบุรี	1	0.6965	0.0000	0.0000	0.6965		0%	100%	1		- ลดค่างาน 0.6965 ล้านบาท (เงินคงเหลือแจ้งคืนกรม) - เบิกจ่ายแล้ว 100%
13	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.ร.จปร.		พรหมณี	เมืองนครนายก	นครนายก	1	0.0998	0.0000	0.0000	0.0998		0%	100%	1		- ลดค่างาน 0.0998 ล้านบาท (เงินคงเหลือแจ้งคืนกรม) - เบิกจ่ายแล้ว 100%

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	7	83.8845	22.3700	61.5136	0.0009	0.0000	27%	76%	2	5	
1	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองดอนหงษ์	หมู่ที่ 1,2	ดอนมะนาว	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	29.0304	0.0000	29.0304			0%	36%		1	หยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (นสล.) หลักเขตที่ดินได้มีการสูญเสียเป็นบางส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาวได้ประสานขอให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีมาทำการรังวัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าดำเนินการรังวัดเขตที่ดิน
2	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในพื้นที่ตำบลปากแพรก	แขก หมู่ที่ 5	ปากแพรก	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	1	12.8055	12.8055	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.7	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองจัน	หมู่ที่ 4	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	14.6024	0.0000	14.6024			0%	98%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงานหินเรียงข้างอาคาร
4	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่แนวกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรณีหมู่บ้านตะเพินคี ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง	หมู่ที่ 5	วังยาว	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	1	8.2690	0.0000	8.2690			0%	20%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 และ 200 ลบ.ม. และงานฐานรากท่อส่งสูงและโรงสูบน้ำ
5	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงบ้านโพธิ์		บ้านโพธิ์	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	1.2272	1.0663	0.1609			87%	100%		1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
6	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณวิทยาลัยการเกษตร		ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	1	17.8600	8.4092	9.4508			47%	80%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้าง งานประสานระบบแมงโซ่ลำเซลล์ และงานวางท่อ
7	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง		หนองพันจันทร์	บ้านคา	ราชบุรี	1	0.0899	0.0890	0.0000	0.0009		99%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ													
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ											
					รวม	4	4.6033	3.5029	1.1004	0.0001	0.0000	76%	74%	2	2	
1	สกก.	งบดำเนินงาน				1	3.9979	3.3641	0.6338			84%	95%		1	
2	สกก.	ก่อสร้างเพื่อเชื่อมต่อระบายน้ำทิ้งของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร				1	0.4665	0.0000	0.4665			0%	0%		1	
3	สกก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2, 6, 14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี				1	0.1072	0.1072	0.0000	0.0000		100%	100%	1		
4	สกก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการ ปรับปรุงพื้นที่หนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย				1	0.0316	0.0316	0.0000	0.0000		100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	5	46.6374	9.7181	36.9194	0.0000	0.0000	21%	70%	1	4		
1	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านบางฝนตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 18	รับร้อ	ท่ามะแซ	ชุมพร	1	3.8299	0.0000	3.8299			0%	100%		1	- อยู่ระหว่างทดสอบระบบ
2	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนพื้นที่ สปก. แปลง 83 ช่วง 2		หงษ์เจริญ	ท่ามะแซ	ชุมพร	1	6.7958	0.0000	6.7958			0%	22%		1	- แก้ไขแบบแปลนเพิ่มเติมแล้วเสร็จ และเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการ
3	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มังคุด	หมู่ที่ 8	พ้อแดง	หลังสวน	ชุมพร	1	8.1563	0.0000	8.1563			0%	65%		1	
4	สทท.10	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สนับสนุนน้ำเพื่อการปศุสัตว์และการเกษตรกรรม ระยะที่1	หมู่ที่ 9	มะสวน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	25.1577	7.0204	18.1373			28%	64%		1	
5	สทท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแหล่งน้ำห้วยโศก สนับสนุนพื้นที่ สปก.	หมู่ที่ 2	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	2.6977	2.6977	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	8	33.1363	33.1363	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	8	0		
1	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกะเหลิบ	โนนค้อ	หนองเปิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	18.4096	18.4096	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ					1	1.9776	1.9776	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 11 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี					1	3.5035	3.5035	0.0000			100%	100%	1		
4	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ หมู่ที่ 4 ตำบลคำพระ อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ					1	1.8912	1.8912	0.0000			100%	100%	1		
5	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร					1	3.1216	3.1216	0.0000			100%	100%	1		
6	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ					1	2.5085	2.5085	0.0000			100%	100%	1		
7	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ถั่วลิสง หมู่ที่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร					1	0.8854	0.8854	0.0000			100%	100%	1		
8	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3,10,11 ตำบลเปือย อำเภอสิโสมอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ					1	0.8388	0.8388	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	8	33.1363	33.1363	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	8	0		
1	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกะเหลิบ	โนนค้อ	หนองเปิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	18.4096	18.4096	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ					1	1.9776	1.9776	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 11 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี					1	3.5035	3.5035	0.0000			100%	100%	1		
4	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ หมู่ที่ 4 ตำบลคำพระ อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ					1	1.8912	1.8912	0.0000			100%	100%	1		
5	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านเป่า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร					1	3.1216	3.1216	0.0000			100%	100%	1		
6	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ					1	2.5085	2.5085	0.0000			100%	100%	1		
7	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ถั่วลิสง หมู่ที่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร					1	0.8854	0.8854	0.0000			100%	100%	1		
8	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3,10,11 ตำบลเปือย อำเภอสิโสมอำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ					1	0.8388	0.8388	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	3	18.1795	6.4314	11.7481	0.0000	0.0000	35%	94%	1	2		
1	กพน.1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ				1	5.3800	5.3800	0.0000			100%	100%	1		โครงการแล้วเสร็จ	
2	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 49 แห่ง				1	1.3199	1.0514	0.2685			80%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย	
3	กพน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว		บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	1	11.4796	0.0000	11.4796			0%	83%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ													
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ											
					รวม	3	5.0940	0.2487	4.8453	0.0000	0.0000	5%	63%	0	3	
1	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 300 แห่ง				1	1.3922	0.0000	1.3922			0%	92%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 79 แห่ง				1	0.5019	0.2487	0.2532			50%	97%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำมอด้ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ				1	3.2000	0.0000	3.2000			0%	0%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	1	1.3442	1.3442	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0		
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ				1	1.3442	1.3442	0.0000			100%	100%	1			

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	1	1.9380	0.0000	1.9380	0.0000	0.0000	0%	55%	0	1	
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน					1	1.9380	0.0000	1.9380			0%	55%		1	ทปช.อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขร่างรายงานฉบับสุดท้าย ซึ่งทปช.ได้จัดส่งร่างรายงานฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 และคณะกรรมการตรวจรับฯ ประชุมเมื่อวันที่ 9 พ.ย.65 และมีมติไม่รับรายงานฉบับดังกล่าวและให้ ทปช. จัดทำร่างรายงานฉบับสุดท้าย (ฉบับแก้ไข)จัดส่งกรมทรัพยากรน้ำต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านมีองค์ประกอบหลายส่วน มีรายละเอียดเอกสารประกอบแบบแปลน ประมาณราคาและคู่มือที่ซับซ้อน

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้ใช้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	6	27.0908	7.7684	19.3222	0.0002	0.0000	29%	99%	3	3		
1	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 1 รายการ				1	0.0904	0.0902	0.0000	0.0002		100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว (เป็นงบด้านระบบสื่อสาร)	
2	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 1 รายการ				1	1.0992	1.0992	0.0000			100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว	
3	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร				1	7.3185	0.0000	7.3185			0%	99%		1	งวด4 กวป.ได้มีการทำเรื่องเบิกจ่ายไปเมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 งวด5 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.พ.66	
4	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอบางสะพาน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร				1	7.7988	4.6793	3.1195			60%	100%		1	งวด5 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค.66	
5	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร				1	8.8842	0.0000	8.8842			0%	93%		1	งวด4 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค.66 งวด5 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ก.พ.66	
6	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร				1	1.8998	1.8998	0.0000			100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลื่อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	3	52.9287	52.9284	0.0004	0.0000	0.0000	100%	100%	3	0		
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 1 รายการ				1	0.7429	0.7429	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong – HYCOS) 1 รายการ				1	0.0022	0.0018	0.0004			83%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ				1	52.1836	52.1836	0.0000			100%	100%	1		- เบิกจ่ายงวดที่ 4 แล้ว และดำเนินการประชุมตรวจรับงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	1	2.4810	2.4810	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0		
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 รายการ				1	2.4810	2.4810	0.0000			100%	100%	1			

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ													
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ											
					รวม	4	4.6033	3.5029	1.1004	0.0001	0.0000	76%	74%	2	2	
1	สกก.	งบดำเนินงาน				1	3.9979	3.3641	0.6338			84%	95%		1	
2	สกก.	ก่อสร้างเพื่อเชื่อมท่อระบายน้ำทิ้งของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร				1	0.4665	0.0000	0.4665			0%	0%		1	
3	สกก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2, 6, 14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี				1	0.1072	0.1072	0.0000	0.0000		100%	100%	1		
4	สกก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการ ปรับปรุงพื้นที่หนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย				1	0.0316	0.0316	0.0000	0.0000		100%	100%	1		
