


สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณที่ขอเบิกเงินไว้ เบิกเหลือมีปี (2)		ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 30 มกราคม 2569) (3)		ลดค่างาน/ อื่นๆ (4)	คงเหลือเบิกจ่าย (5)=(2)-(3)-(4)			โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน
	จำนวน	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ		งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	
งบดำเนินงาน	1	113.5252	4.9768	4.38%	4.8906	98.27%	0.0862	-	0.00%	1	
งบลงทุน	145	3,465.2176	1,563.9899	45.13%	558.3806	35.70%	1.3806	1,004.2286	64.21%	76	
งบรายจ่ายอื่น	45	868.2302	339.6045	39.11%	204.9116	60.34%	0.2940	134.3989	39.58%	26	
รวมทั้งสิ้น	191	4,446.9731	1,908.5711	42.92%	768.1829	40.25%	1.7608	1,138.6275	59.66%	103	

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือมีปี พ.ศ. 2568

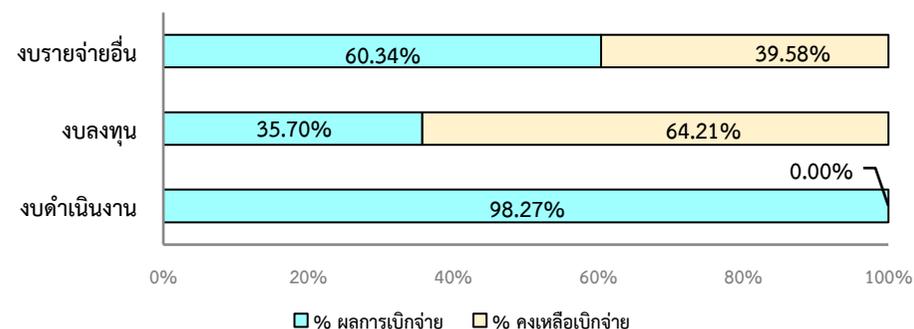

สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณที่ขอ เงินไว้เบิกเหลือมีปี (2)	ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 30 มกราคม 2569) (3)		ลดค่างาน/ อื่นๆ (4)	คงเหลือเบิกจ่าย (5)=(2)-(3)-(4)	โครงการ แล้วเสร็จ
	จำนวน	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวน
รวม	191	4,446.9731	1,908.5711	768.1829	40.25%	1.7608	1,138.6275	103
สทน.1	14	616.6095	260.5362	98.3883	37.76%	-	162.1479	7
สทน.2	6	168.7550	75.7983	4.3216	5.70%	-	71.4767	2
สทน.3	11	305.7030	236.9096	90.6209	38.25%	-	146.2887	6
สทน.4	9	106.7849	67.2166	38.2164	56.86%	0.0056	28.9945	4
สทน.5	4	81.8776	17.2689	10.9064	63.16%	0.0735	6.2890	3
สทน.6	10	252.8439	133.0238	31.2021	23.46%	-	101.8217	4
สทน.7	9	418.4247	119.9852	7.4617	6.22%	-	112.5235	4
สทน.8	17	237.9914	123.6905	56.9460	46.04%	1.2822	65.4623	5
สทน.9	12	257.4925	124.1382	48.7761	39.29%	-	75.3622	2
สทน.10	4	102.2260	58.6954	40.0509	68.24%	-	18.6445	3
สทน.11	3	45.5494	25.2546	12.7846	50.62%	-	12.4700	2
กพน.1	8	398.6787	107.9060	37.8625	35.09%	0.0170	70.0265	3
กพน.2	6	362.2766	156.3846	56.3383	36.03%	0.0004	100.0459	1
กจน.	16	145.0233	54.6133	41.5484	76.08%	0.0013	13.0636	12
กวป.	12	446.0931	177.8314	70.1339	39.44%	-	107.6976	3
กวพ.	7	220.1625	89.0044	75.1195	84.40%	0.0011	13.8839	6
กอน.	7	93.6255	22.7725	20.9527	92.01%	-	1.8199	5
ศทส.	9	66.7861	47.9631	18.1517	37.85%	0.2926	29.5188	6
กนก.	1	0.4600	0.4600	0.4590	99.79%	0.0010	-	1
กยผ.	7	1.1540	0.3735	0.3531	94.54%	-	0.0204	6
สลก.	18	4.9303	3.7682	2.6982	71.60%	-	1.0700	17
ทน. (งบดำเนินงาน)	1	113.5252	4.9768	4.8906	98.27%	0.0862	-	1

หมายเหตุ : กพน.1 มีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 0.0070 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% ที่ไม่ได้ถูกตัดออกจากระบบได้แก่
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน บ้านผาขาว ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา
