




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569




ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 8 ม.ค. 69 (16.35 น.)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 69 (1)		งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (2)		ลงนามสัญญา (3)		ผลเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณสุทธิ) (4)			ผลการใช้จ่าย (5)			คงเหลือเบิกจ่าย (1) - (4)	
	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	422	8,997.5021	423	8,997.5021	177	4,046.5768	149	429.4966	4.77%	300	4,347.0622	48.31%	8,568.0055	95.23%
งบบุคลากร	-	682.6607	-	682.6607	-	-	-	171.2643	25.09%	-	171.2643	25.09%	511.3964	74.91%
งบดำเนินงาน	-	134.3528	-	134.3528	-	-	-	25.3800	18.89%	-	34.4706	25.66%	108.9728	81.11%
งบลงทุน	361	6,943.7179	362	6,943.7179	172	4,005.2821	128	171.1227	2.46%	277	4,053.6372	58.38%	6,772.5952	97.54%
งบเงินอุดหนุน	2	40.5079	2	40.5079	-	-	1	39.1043	96.53%	1	39.1043	96.53%	1.4036	3.47%
งบรายจ่ายอื่น	59	1,196.2628	59	1,196.2628	5	41.2947	20	22.6253	1.89%	22	48.5858	4.06%	1,173.6375	98.11%

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

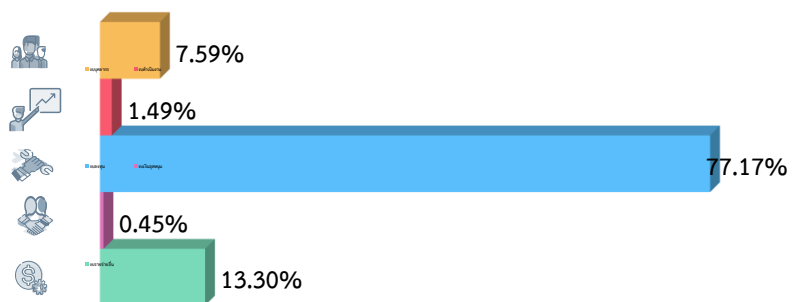

แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

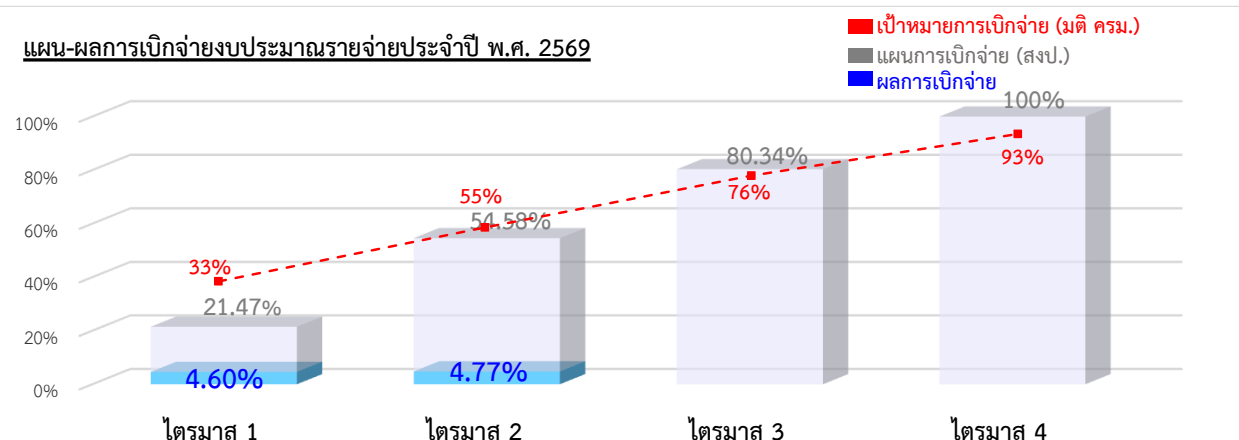




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 8 ม.ค. 69 (16.35 น.)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร		ยกเลิก/ อยู่ระหว่าง โอนเปลี่ยนแปลง		ดำเนินการตามแผน							ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบป.ที่ได้รับจัดสรร)		โครงการ แล้วเสร็จ
					งานทำเอง		งานจัดซื้อจัดจ้าง							
	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)			จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ยังไม่ลงนามในสัญญา (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ลงนามในสัญญาแล้ว (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	คงเหลือ	
รวมทั้งสิ้น	423	8,997.5021	11	126.4743	137	1,306.9497	98	3,409.9218	177	4,046.5768	111.8561	429.4966	4.77%	0
งบบุคลากร	-	682.6607	-	-	-	682.6607						171.2643	25.09%	
งบดำเนินงาน	-	134.3528	-	-	-	134.3528						25.3800	18.89%	
สกก.	4	18.1256	-	-	1	0.9319	-	-	3	17.1144	0.0793	2.1793	12.02%	-
กยผ.	4	59.0052	-	-	3	43.0952	1	15.9100	-	-	-	39.1043	66.27%	-
กจน.	7	122.0220	-	-	3	22.3418	4	99.6802	-	-	-	2.2221	1.82%	-
กวพ.	8	157.6330	-	-	7	41.1330	1	116.5000	-	-	-	4.1492	2.63%	-
กวป.	14	622.0293	-	-	3	39.1468	11	582.8825	-	-	-	4.3816	0.70%	-
กอน.	14	415.7561	-	-	5	58.8501	8	341.1377	1	15.3898	0.3785	4.9858	1.20%	-
ศทส.	16	142.8774	-	-	-	-	14	138.2874	2	4.5400	0.0500	-	0.00%	-
กพน.1	4	423.8347	-	-	1	41.2500	2	58.1437	1	324.4410	-	30.2594	7.14%	-
กพน.2	22	1,664.2247	-	-	3	138.1998	12	1,111.6343	7	411.9333	2.4573	23.5162	1.41%	-
สทน.1	20	383.5322	3	54.6743	3	3.5363	1	24.5217	13	290.8459	9.9540	10.7264	2.80%	-
สทน.2	18	353.3200	1	7.8000	-	-	-	-	17	329.9880	15.5320	-	0.00%	-
สทน.3	24	325.7000	-	-	3	20.9000	2	70.0000	19	224.5940	10.2060	1.0862	0.33%	-
สทน.4	41	679.9756	-	-	-	-	-	-	41	651.3921	28.5835	25.0708	3.69%	-
สทน.5	15	433.2920	-	-	1	0.4920	1	4.2766	13	409.9862	22.8138	6.1463	1.42%	-
สทน.6	8	284.7430	-	-	-	-	-	-	8	269.8100	14.9330	1.1085	0.39%	-
สทน.7	17	429.0045	-	-	1	25.0407	-	-	16	403.4791	0.4847	-	0.00%	-
สทน.8	45	514.1900	7	64.0000	-	-	12	170.4400	26	273.9580	5.7920	5.1441	1.00%	-
สทน.9	47	539.9803	-	-	26	16.6726	21	523.3077	-	-	-	9.8910	1.83%	-
สทน.10	86	204.5460	-	-	77	38.3460	8	153.2000	1	12.8000	0.2000	35.9952	17.60%	-
สทน.11	9	406.6970	-	-	-	-	-	-	9	406.3050	0.3920	26.8859	6.61%	-



ลำดับผลการเบิกจ่าย หน่วยงาน (จากมาก - น้อย)

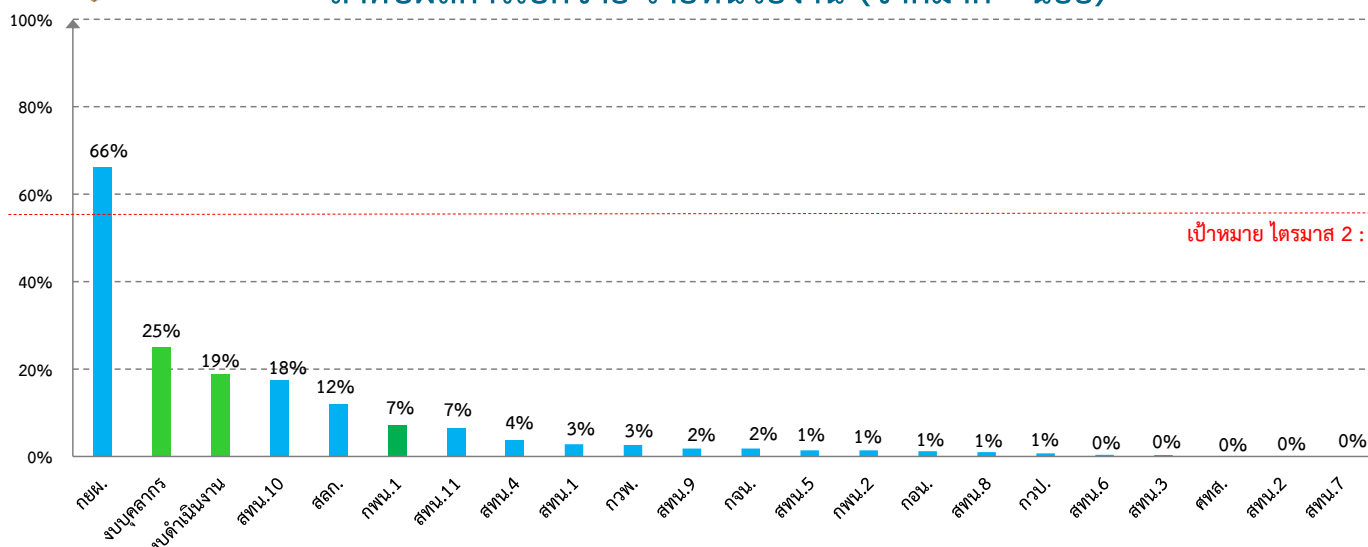



กรมทรัพยากรน้ำ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รายจ่ายประจำ - ลงทุน)



ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 8 ม.ค. 69 (16.35 น.)

ประเภท	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณตามสัญญา (2)		ผลเบิกจ่าย (3)		คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (1) - (3)	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	990.6114	11.01%	17.9747	1.81%	211.0576	21.31%	779.5538	78.69%
รายจ่ายลงทุน	8,006.8907	88.99%	4,028.6021	50.31%	218.4389	2.73%	7,788.4518	97.27%
รวมทั้งสิ้น	8,997.5021	100%	4,046.5768	44.97%	429.4966	4.77%	8,568.0055	95.23%

