




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569




ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 5 ก.พ. 69 (16.34 น.)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 69 (1)		งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (2)		ลงนามสัญญา (3)		ผลเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณสุทธิ) (4)			ผลการใช้จ่าย (5)			คงเหลือเบิกจ่าย (1) - (4)	
	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	422	8,997.5021	427	8,997.5021	218	5,654.2427	193	710.4282	7.90%	342	5,929.7230	65.90%	8,287.0739	92.10%
งบบุคลากร	-	682.6607	-	682.6607	-	-	-	233.2270	34.16%	-	233.2270	34.16%	449.4337	65.84%
งบดำเนินงาน	-	134.3528	-	134.3528	-	-	-	35.8074	26.65%	-	42.8411	31.89%	98.5454	73.35%
งบลงทุน	361	6,943.7179	366	6,943.7179	204	5,509.1731	168	363.5286	5.24%	307	5,420.6098	78.06%	6,580.1893	94.76%
งบเงินอุดหนุน	2	40.5079	2	40.5079	-	-	1	39.1043	96.53%	1	39.1043	96.53%	1.4036	3.47%
งบรายจ่ายอื่น	59	1,196.2628	59	1,196.2628	14	145.0696	24	38.7609	3.24%	34	193.9408	16.21%	1,157.5019	96.76%

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

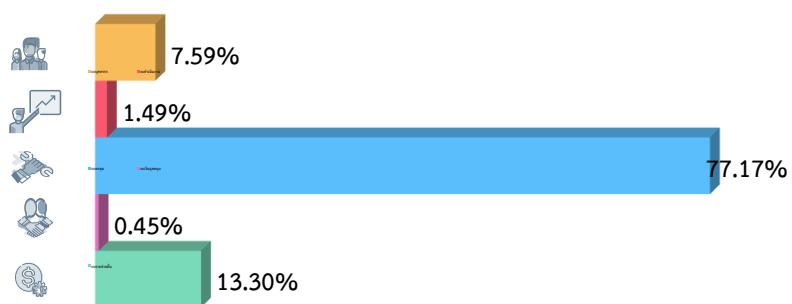

แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

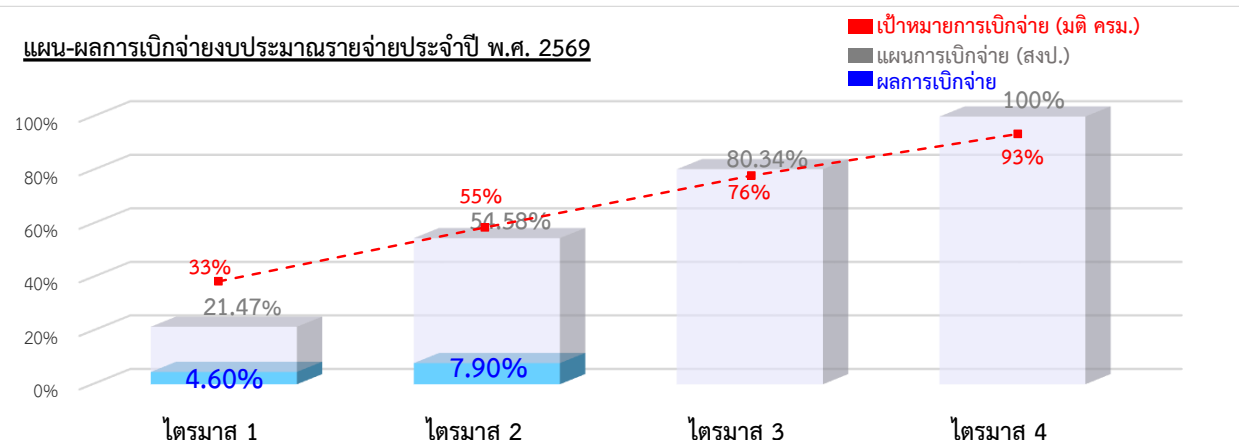




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 5 ก.พ. 69 (16.34 น.)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร		อยู่ระหว่าง โอนเปลี่ยนแปลง		ดำเนินการตามแผน							ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบม.ที่ได้รับจัดสรร)		โครงการ แล้วเสร็จ
					งานทำเอง		งานจัดซื้อจัดจ้าง							
	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)			ยังไม่ลงนามในสัญญา (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ลงนามในสัญญาแล้ว (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	คงเหลือ			
รวมทั้งสิ้น	427	8,997.5021	11	122.0793	137	1,306.5079	61	1,806.5841	218	5,654.2427	108.0880	710.4282	7.90%	1
งบบุคลากร	-	682.6607	-	-	-	682.6607						233.2270	34.16%	
งบดำเนินงาน	-	134.3528	-	-	-	134.3528						35.8074	26.65%	
สกก.	4	18.1256	-	-	1	0.9319	-	-	3	17.1144	0.0793	17.2968	95.43%	-
กยผ.	4	59.0052	-	-	3	43.0952	1	15.9100	-	-	-	39.1043	66.27%	-
กจน.	7	122.0220	-	-	3	22.3418	4	99.6802	-	-	-	4.1089	3.37%	-
กาวพ.	8	157.6330	-	-	7	41.1330	1	116.5000	-	-	-	8.5017	5.39%	-
กาวป.	14	622.0293	-	-	3	39.1468	11	582.8825	-	-	-	7.2674	1.17%	-
กอน.	14	415.7561	-	-	5	58.8501	3	100.4584	6	251.6776	4.7700	9.7547	2.35%	-
ศทส.	16	142.8774	-	-	-	-	9	58.8418	7	83.8000	0.2356	0.9080	0.64%	-
กพน.1	5	433.7847	-	-	1	41.2500	3	68.0937	1	324.4410	-	31.3675	7.23%	-
กพน.2	22	1,664.2247	-	-	3	138.1998	2	252.9320	17	1,270.0103	3.0826	74.2480	4.46%	-
สทน.1	20	382.3211	3	54.6743	3	3.5363	-	-	14	314.2459	9.8646	27.9236	7.30%	-
สทน.2	18	348.9250	1	3.4050	-	-	-	-	17	329.9880	15.5320	18.5389	5.31%	-
สทน.3	24	325.7000	-	-	3	20.9000	-	-	21	292.1930	12.6070	2.4503	0.75%	-
สทน.4	43	683.2877	-	-	-	-	2.00	4.3950	41	651.3921	27.5006	36.5722	5.35%	-
สทน.5	15	430.3866	-	-	1	0.4920	1	4.2766	13	409.9862	15.6318	27.0409	6.28%	1
สทน.6	8	275.5342	-	-	-	-	-	-	8	269.8100	5.7242	18.9893	6.89%	-
สทน.7	17	429.0045	-	-	1	25.0407	-	-	16	403.4791	0.4847	7.3866	1.72%	-
สทน.8	45	514.1900	7	64.0000	-	-	3	47.0000	35	397.0571	6.1329	25.8096	5.02%	-
สทน.9	48	544.4385	-	-	26	16.2308	14	315.4139	8	206.9550	5.8388	9.8910	1.82%	-
สทน.10	86	204.5460	-	-	77	38.3460	7	140.2000	2	25.7880	0.2120	39.8634	19.49%	-
สทน.11	9	406.6970	-	-	-	-	-	-	9	406.3050	0.3920	34.3709	8.45%	-



ลำดับผลการเบิกจ่าย รายหน่วยงาน (จากมาก - น้อย)

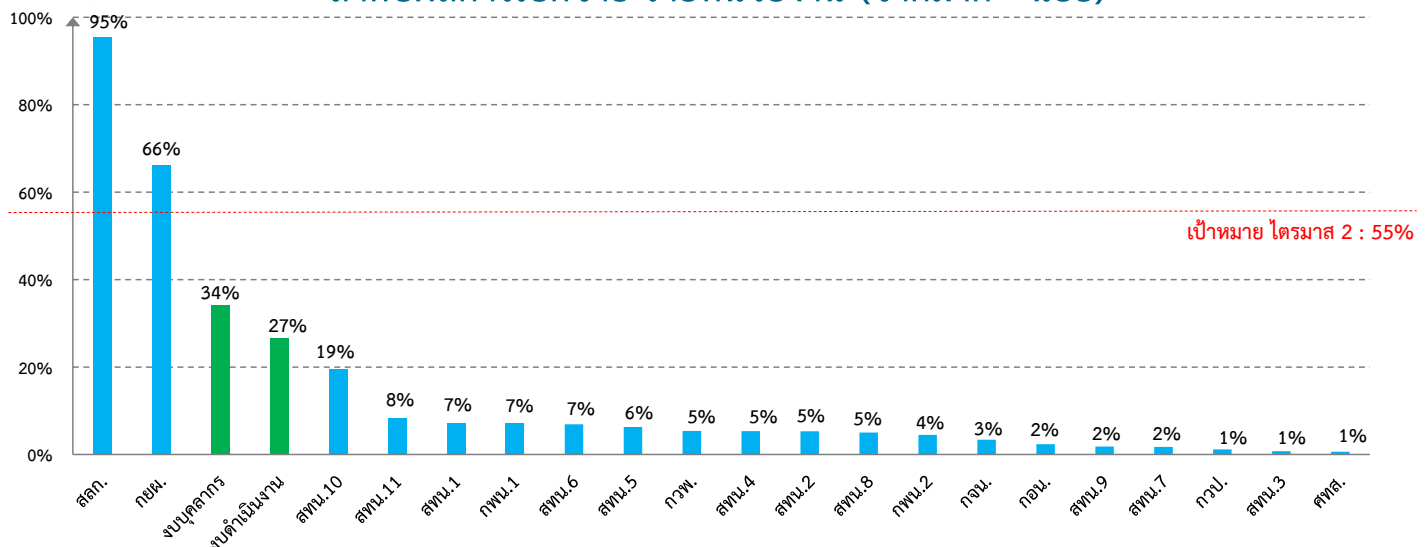



กรมทรัพยากรน้ำ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รายจ่ายประจำ - ลงทุน)



ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 5 ก.พ. 69 (16.34 น.)

ประเภท	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณตามสัญญา (2)		ผลเบิกจ่าย (3)		คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (1) - (3)	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	990.6114	11.01%	34.7147	3.50%	294.2615	29.71%	696.3499	70.29%
รายจ่ายลงทุน	8,006.8907	88.99%	5,619.5280	70.18%	416.1667	5.20%	7,590.7240	94.80%
รวมทั้งสิ้น	8,997.5021	100%	5,654.2427	62.84%	710.4282	7.90%	8,287.0739	92.10%

