




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569




ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 5 มี.ค. 69 (16.37 น.)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 69 (1)		งบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร (2)		ลงนามสัญญา (3)		ผลเบิกจ่าย (เทียบงบประมาณสุทธิ) (4)			ผลการใช้จ่าย (5)			คงเหลือเบิกจ่าย (1) - (4)	
	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	422	8,997.5021	430	8,997.5021	260	6,580.2158	235	1,033.8967	11.49%	389	7,057.3782	78.44%	7,963.6054	88.51%
งบบุคลากร	-	682.6607	-	682.6607	-	-	-	289.5179	42.41%	-	289.5179	42.41%	393.1428	57.59%
งบดำเนินงาน	-	134.3528	-	134.3528	-	-	-	44.1131	32.83%	-	49.2530	36.66%	90.2397	67.17%
งบลงทุน	361	6,943.7179	369	6,943.6939	237	6,155.8720	202	587.3231	8.46%	343	6,188.9405	89.13%	6,356.3708	91.54%
งบเงินอุดหนุน	2	40.5079	2	40.5079	-	-	2	39.7998	98.25%	2	39.7998	98.25%	0.7081	1.75%
งบรายจ่ายอื่น	59	1,196.2628	59	1,196.2868	23	424.3438	31	73.1428	6.11%	44	489.8670	40.95%	1,123.1440	93.89%

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

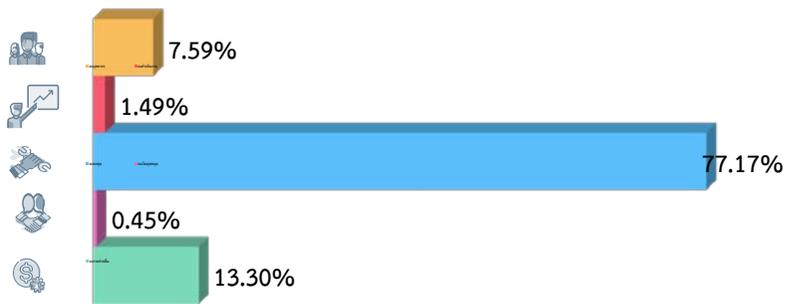

แผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

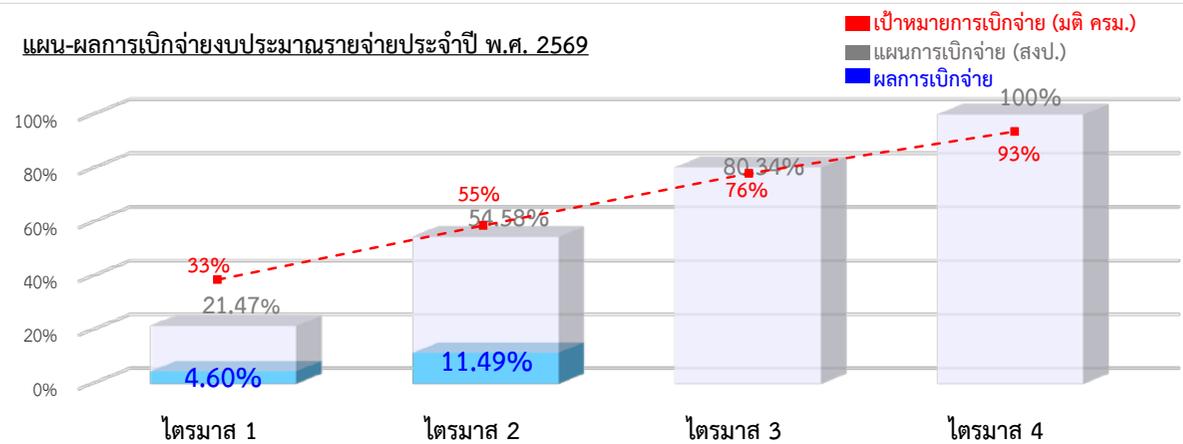




กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 5 มี.ค. 69 (16.37 น.)

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร		อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลง		ดำเนินการตามแผน							ผลเบิกจ่าย (เทียบ งบป.ที่ได้รับจัดสรร)		โครงการแล้วเสร็จ
					งานทำเอง		งานจัดซื้อจัดจ้าง			คงเหลือ				
							ยังไม่ลงนามในสัญญา	ลงนามในสัญญาแล้ว	งบประมาณ					
จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (รายการ)		
รวมทั้งสิ้น	430	8,997.5021	9	88.2403	135	1,306.1579	26	995.6634	260	6,580.2158	27.2247	1,033.8967	11.49%	4
งบบุคลากร	-	682.6607	-	-	-	682.6607						289.5179	42.41%	
งบดำเนินงาน	-	134.3528	-	-	-	134.3528						44.1131	32.83%	
สถก.	4	18.2756	-	-	1	1.1599	-	-	3	17.1144	0.0013	17.2968	94.64%	-
กยผ.	4	59.0052	-	-	3	43.0952	-	-	1	15.9000	0.0100	39.1043	66.27%	-
กจน.	9	221.1393	-	-	3	22.3418	3	103.9647	3	94.7840	0.0488	6.3269	2.86%	-
กวพ.	8	157.6330	-	-	7	41.1330	1	116.5000	-	-	-	11.4773	7.28%	-
กวป.	14	622.0293	-	-	3	39.1468	8	459.4611	3	123.3550	0.0664	19.3395	3.11%	-
กอน.	14	411.3961	-	-	5	58.8501	1	1.2790	8	350.8476	0.4194	32.1775	7.82%	-
ศทส.	16	142.7274	-	-	-	-	1	9.9629	15	131.7548	1.0097	0.9080	0.64%	-
กพน.1	5	433.7847	-	-	1	41.2500	3	68.0937	1	324.4410	-	35.8872	8.27%	-
กพน.2	22	1,662.8347	-	-	3	138.1998	1	156.0000	18	1,366.9423	1.6926	92.0717	5.54%	-
สทน.1	20	372.4821	3	54.6743	3	3.5363	-	-	14	314.2459	0.0256	62.8900	16.88%	2
สทน.2	18	336.3410	1	3.4050	-	-	-	-	17	329.9880	2.9480	37.4084	11.12%	-
สทน.3	24	313.9210	-	-	3	20.9000	-	-	21	292.1930	0.8280	9.6568	3.08%	-
สทน.4	43	658.1034	-	-	-	-	2	4.3950	41	651.3921	2.3163	69.7181	10.59%	1
สทน.5	15	414.7666	-	-	1	0.4920	-	-	14	414.2562	0.0184	58.0552	14.00%	1
สทน.6	9	271.2512	-	-	-	-	1	1.4170	8	269.8100	0.0242	18.9893	7.00%	-
สทน.7	17	428.6945	-	-	1	25.0407	-	-	16	403.4791	0.1747	23.4084	5.46%	-
สทน.8	45	506.7710	3	29.5830	-	-	4	33.0000	38	442.6421	1.5459	59.4838	11.74%	-
สทน.9	48	538.6185	2	0.5780	24	15.6528	-	-	22	506.4823	15.9054	14.3492	2.66%	-
สทน.10	86	204.3470	-	-	77	38.3460	1	41.5900	8	124.2830	0.1280	40.8864	20.01%	-
สทน.11	9	406.3670	-	-	-	-	-	-	9	406.3050	0.0620	50.8307	12.51%	-



ลำดับผลการเบิกจ่าย รายหน่วยงาน (จากมาก - น้อย)

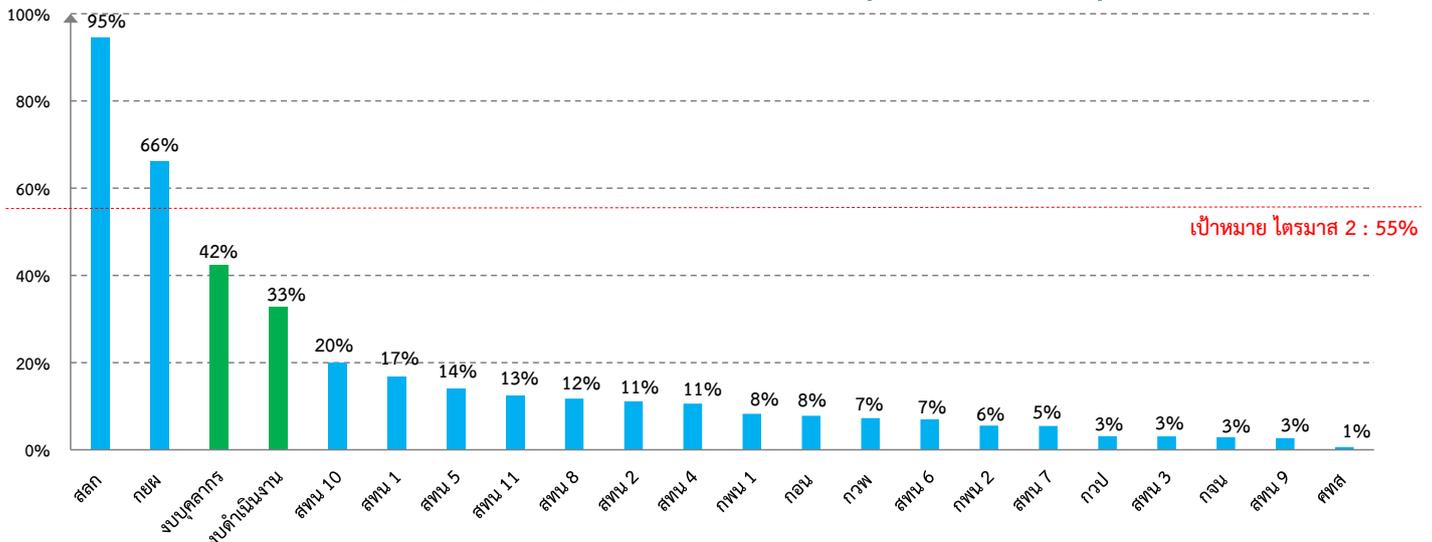



กรมทรัพยากรน้ำ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รายจ่ายประจำ - ลงทุน)



ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ 5 มี.ค. 69 (16.37 น.)

ประเภท	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณตามสัญญา (2)		ผลเบิกจ่าย (3)		คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (1) - (3)	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	990.7854	11.01%	34.7147	3.50%	374.6998	37.82%	616.0856	62.18%
รายจ่ายลงทุน	8,006.7167	88.99%	6,545.5011	81.75%	659.1968	8.23%	7,347.5199	91.77%
รวมทั้งสิ้น	8,997.5021	100%	6,580.2158	73.13%	1,033.8967	11.49%	7,963.6054	88.51%

