



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๒๓๕๕
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕
๐๓.๐๘๑๖

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 01353
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา 11.53 น.

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๕๖

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ ที่ ทส ๐๖๒๑/๔๔๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการ และเป็นเครื่องมือในการกำกับ กระตุ้น เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการของหน่วยงานภายในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนประสานงานการปฏิบัติและชี้แนะให้แนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑ รวมถึงประเด็นที่หน่วยรับตรวจต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค/ผู้แทน ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการฯ

๒.๒ สำนักผู้ตรวจราชการ ได้จัดทำสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ข้อมูล GFMS ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๐๗.๔๓๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๙๑.๐๔๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๕ จำแนกเป็น

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่าย ๓๔.๗๒๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๔๑.๖๘๖๔ ล้านบาท)

- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ๔๓.๕๘๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๑๒๘.๓๐๕๖ ล้านบาท)


- แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ๖.๒๓๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๗.๙๗๐๐ ล้านบาท)

- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เบิกจ่าย ๗๐๖.๕๐๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๓,๓๒๙.๔๗๕๘ ล้านบาท)

เรื่องกลับ ผณ.
วันที่ ๒๗.๓.๖๕
เวลา ๑๖.๐๐ น.

/๘๐๐.๐๐๐๐ ...

เรื่องกลับ กลน.
วันที่ 27 มี.ค. 65
เวลา 15.00 น.

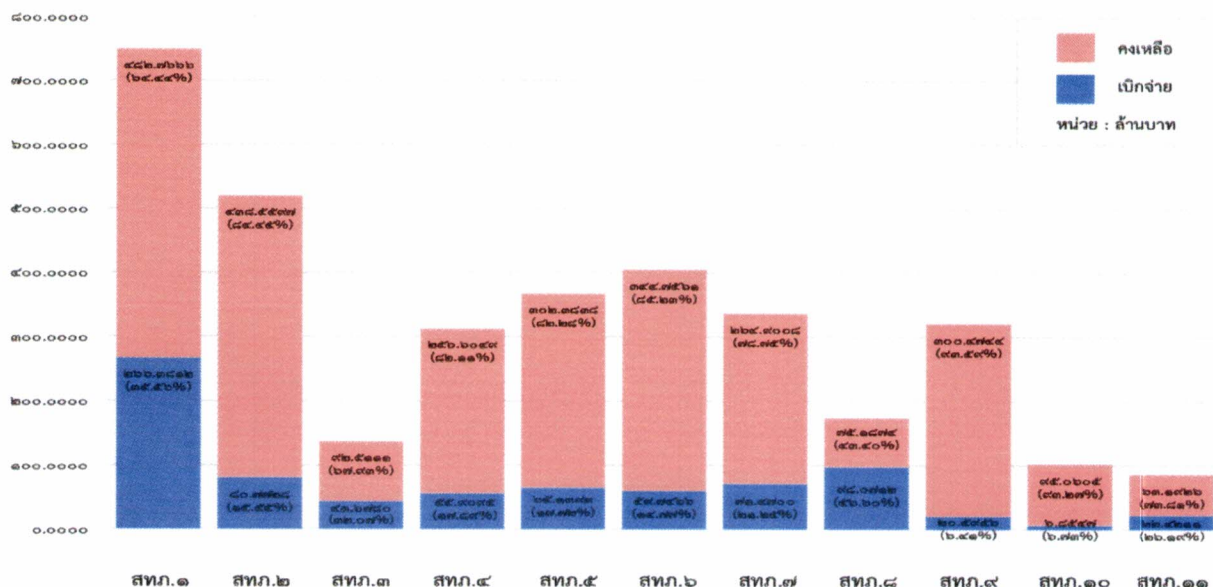

๒.๒.๒ การตรวจราชการใน ๓ แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ

๑) ผลการดำเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี้

๑.๑) ผลผลิตที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ดำเนินการโดย สทภ.๑ และ สทภ.๙ แผนการดำเนินงานรวม ๒๐๕ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๓

๑.๒) ผลผลิตที่ ๒ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ : ค่าสำรวจออกแบบ รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๖ ค่าควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๙ และ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ รวมทั้งสิ้น ๔๙ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๖

๑.๓) ผลผลิตที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

- การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำ แม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ดำเนินการโดย สทภ.๑ สทภ.๓ และ สทภ.๑๑ อยู่ระหว่างตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ ณ สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำตามแผน

- การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม พบว่า ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ตามแผน โดยมีบางสถานีไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีเตือนภัยได้ เนื่องจากอุปกรณ์บางชนิดชำรุดหรือการซ่อมบำรุงรักษา และไม่มีอุปกรณ์สำรองไว้เปลี่ยน

- การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง พบว่า สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุฯ และรายงานข้อมูลระดับน้ำรายวันและรายเดือนได้ตามแผน อย่างไรก็ตามพบว่า บางสถานีมีอุปกรณ์วัดระดับน้ำชำรุดหรือการซ่อมบำรุง

/ การบำรุงรักษา ...

- การบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ พบว่า สทภ.๑ - ๑๑ ดำเนินการติดตามตรวจสอบบำรุงรักษาระบบฯ ได้เฉพาะสถานีปกติ กรณีสถานีมีการชำรุด หรือ Server ชัดข้อง ต้องรอเจ้าหน้าที่ส่วนกลางดำเนินการ

๒) ผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี้

๒.๑) การจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ดำเนินการโดย สอน. และส่งมอบเครื่องจักรกลฯ ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยปัจจุบันรายการรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน จำนวน ๒ คัน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา รายการสายยางสูบล้างน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ มีการส่งมอบให้ สทภ.๒ สทภ.๖ และ สทภ.๗ หน่วยงานละ ๒ ชุด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ส่วนรายการเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง มีการยกเลิกโครงการ


๒.๒) การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน สทภ.๑ - ๑๑ มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้ว ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	ปริมาณการสูบน้ำ			รถน้ำ แจกน้ำ (ลบ.ม.)	แจกน้ำดื่ม (ขวด)
		น้ำแล้ง (ลบ.ม.)	น้ำท่วม (ลบ.ม.)	รวม (ลบ.ม.)		
๑	สทภ.๑	-	-	-	๑,๓๑๔,๙๙๙	๔,๗๐๐
๒	สทภ.๒	๑,๕๑๓,๐๘๐	๗,๕๓๔,๕๖๐	๙,๐๔๗,๖๔๐	๔๘,๐๐๐	๑๕,๘๔๐
๓	สทภ.๓	๓,๑๘๒,๕๐๐	๑๒๖,๖๘๐	๓,๓๐๙,๑๘๐	๑๐๘,๐๐๐	-
๔	สทภ.๔	๑,๒๕๘,๓๖๐	๑,๘๒๕,๗๒๐	๓,๐๘๔,๐๘๐	-	-
๕	สทภ.๕	๘๓๒,๐๐๐	๑,๙๙๐,๖๒๐	๒,๘๒๒,๖๒๐	-	-
๖	สทภ.๖	๔,๐๑๗,๒๐๐	๑,๙๙๒,๒๐๐	๖,๐๐๙,๔๐๐	-	๑๓,๘๔๐
๗	สทภ.๗	๑๒,๙๖๐	๒๙,๕๘๐,๔๘๐	๒๙,๕๙๓,๔๔๐	-	-
๘	สทภ.๘	๖๑๗,๒๒๐	๑,๗๒๙,๑๑๐	๒,๓๔๖,๓๓๐	-	-
๙	สทภ.๙	๑,๕๘๑,๔๖๐	๙๑๕,๗๖๐	๒,๔๙๗,๒๒๐	๑๕๘,๘๕๐	๕,๒๔๔
๑๐	สทภ.๑๐	๒๔๙,๖๐๐	๑๐๕,๖๐๐	๓๕๕,๒๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑,๒๗๐
๑๑	สทภ.๑๑	๑๗๓,๖๐๐	๒,๙๒๖,๔๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐
รวม		๑๓,๔๓๗,๙๘๐	๔๘,๗๒๗,๑๓๐	๖๒,๑๖๕,๑๑๐	๑,๘๑๕,๘๔๙	๔๑,๔๙๔

๓) ผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สรุปดังนี้

๓.๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ แห่ง ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๙๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ แห่ง และมีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จำนวน ๑๒ แห่ง โดยจำแนกตามสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑ จำนวน ๒๑๕ แห่ง ดังนี้

/ ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ...

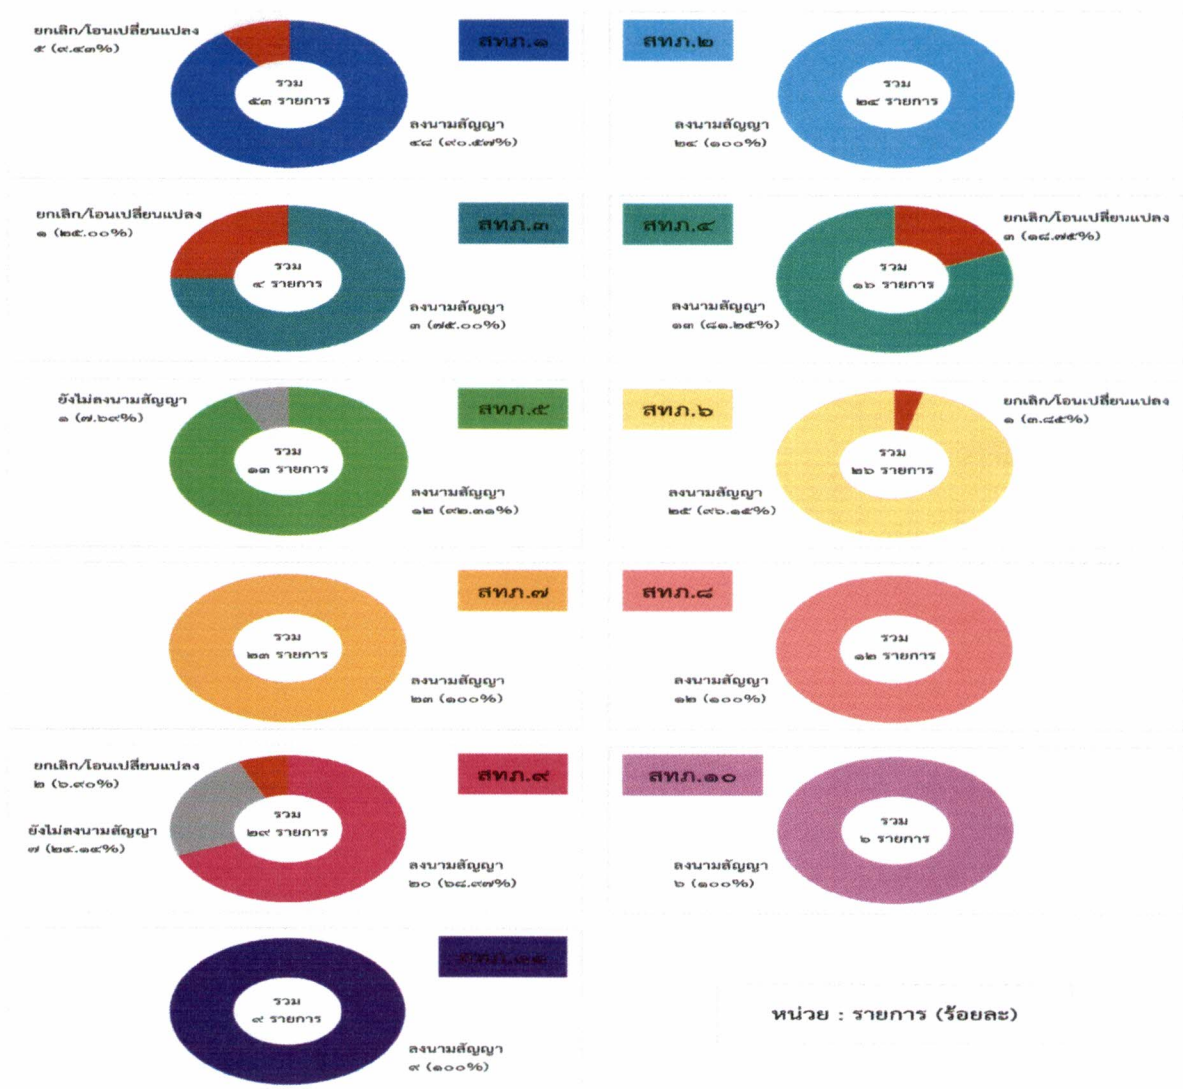

๓.๒) โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ดำเนินการโดย สอน. และ สพน. ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณรวมจำนวน ๔ แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๓ แห่ง

๒.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

๑) ปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของ สทก.๑ - ๑๑

๑.๑) บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ หรือ บางอัตรามีการเกษียณอายุราชการไปแล้ว ไม่มีอัตรากำลังมาทดแทน (เช่น บุคลากรส่วนอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น)

๑.๒) การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ในรายการค่าตอบแทนผู้รู้/ผู้ดูแลสถานีเตือนภัย ทำให้มีการค้างจ่าย และงบประมาณไม่เพียงพอ ในการซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัยได้ตามแผน

/ ๑.๓) ระบบตรวจวัด ...

๑.๓) ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หรือระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) บางกรณีเมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ไม่สามารถซ่อมได้ต้องรอเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจากส่วนกลาง

๑.๔) การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติฯ ได้รับงบประมาณล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

๒) ปัญหา อุปสรรคเฉพาะรายหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค
๑	สทภ.๑	- การนิเทศติดตามผลการบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา มีพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่สูง อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ทำให้การคมนาคมลำบากและเสี่ยงอันตราย - การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ขาดแคลนเครื่องมือสำรวจ ได้แก่ เครื่องมือ Current Meter อะไหล่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเครื่องมือ ADCP และ GPS มีอายุการใช้งานมานานและขัดข้องบ่อย - การช่วยเหลือในภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ขาดอุปกรณ์ท่อน้ำ (ปัจจุบันมีจำนวน ๕ ชุด) และสายยางส่งน้ำ มีความยาวไม่เกิน ๕๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒	สทภ.๒	- ในการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีเตือนภัยฯ เกิดจากตำแหน่งที่ตั้งสถานีเตือนภัยฯ มีระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของสถานีเตือนภัยฯ - การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำบางแห่งมีการหยุดงาน เนื่องจากน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการได้
๓	สทภ.๔	- บุคลากรด้านการสำรวจออกแบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะสำรวจชั้นดิน รวมทั้งอุปกรณ์ในการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า - Server ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ชำรุด/ใช้งานไม่ได้ จำนวน ๔ สถานี ทำให้ข้อมูลจากสถานีสนามที่ตรวจวัดได้ ไม่สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์ของระบบโทรมาตรได้ - การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำบางแห่งล่าช้า เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลายฤดูฝน ทำให้น้ำท่วมบริเวณโครงการ และบริเวณรอบโครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถระบายน้ำออกจากแหล่งน้ำได้
๔	สทภ.๕	- การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตจากกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เข้าดำเนินการ - ขาดวัสดุอุปกรณ์สำรองสำหรับการใช้งานของระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม กรณีมีการชำรุด - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ในการดูแลสถานีเตือนภัยฯ หรือระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ - Server ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ชำรุด/ใช้งานไม่ได้ จำนวน ๒ สถานี ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลในระบบประมวลผลส่วนกลางได้

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค
๕	สทท.๗	- การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำมีการหยุดงาน จำนวน ๖ แห่ง เนื่องจากมีน้ำท่วมขังพื้นที่โครงการประชาชนในพื้นที่ต้องการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และอุทยานแห่งชาติพุเตยยังไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ
๖	สทท.๙	- การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำมีการหยุดงาน จำนวน ๔ แห่ง เนื่องจากติดปัญหาขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเกษตรกรขอใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร
๗	สทท.๑๐	- การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำมีการหยุดงาน จำนวน ๑ แห่ง เนื่องจากรอหนังสือเข้าดำเนินการจากกรมปศุสัตว์
๘	สทท.๑๑	- การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ขาดแคลนเครื่องมือสำรวจ ได้แก่ เครื่องมือ ADCP และกล้องสำรวจ - สายยางสูบน้ำ มีการฉีกขาดสายยาง เนื่องจากขาดเครื่องทุ่นแรง - เครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำระยะไกลได้ โดยเครื่องที่สามารถสูบน้ำได้ไกลประมาณ ๑.๕ กม.

๒.๒.๔ ประเด็นที่ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๑) ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติฯ เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณมาเพียงงวดเดียว ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง ทำให้มีเงินค้างจ่าย ทั้งนี้ ควรพิจารณาจัดสรรตามพื้นที่ที่มีภาวะน้ำแล้ง-น้ำท่วมตามสภาพจริง รวมถึงขอให้มีการจัดสรรงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ชำรุดสึกหรอจากการใช้งาน

๒) ขอให้เร่งจัดสรรเพิ่มงบประมาณรายการ ค่าสำรวจและค่าควบคุมงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๓) ขอให้จัดสรรงบประมาณรายการ บำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำท่วม-ดินถล่ม ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ เช่น ค่าตอบแทนผู้รู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานีที่ชำรุด ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสนามประจำเดือน เป็นต้น

๔) ขอให้กรมพิจารณาเรื่องการจัดสรรอัตราว่างของพนักงานราชการ ทดแทนอัตราของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ (และจะเกษียณอายุราชการ) และขอให้เร่งเปิดสอบอัตราว่างของข้าราชการ เนื่องจากภาคขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง

๕) ขอให้กรมพิจารณาการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจออกแบบโครงการ เนื่องจากปัจจุบันมีไม่เพียงพอ

๖) ขอให้กรมเร่งจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการสำรวจตรวจสอบโครงการเพื่อการถ่ายโอนทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗) ขอให้กรมผลักดันเรื่องค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๘) ขอให้กรมสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อรองรับภารกิจในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศหรือนักวิชาการแผนที่ เป็นต้น

๒.๒.๕ ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

๑) ขอให้ สทภ.๑ - ๑๑ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำเป็นไปตามเป้าหมาย และให้เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณของงบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) ขอให้ สทภ.๑ - ๑๑ จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายรายการบำรุงรักษาระบบเตือนภัย ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ให้ครอบคลุมภาพรวมทุกรายการ ส่งให้ สวพ. และ ศปว. เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณหรือจัดทำแผนสนับสนุนงบประมาณในภาพรวมต่อไป

๓) ขอให้ สทภ.๑ - ๑๑ จัดวางโครงการในลักษณะภาพรวมระดับตำบลหรือโครงข่ายน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ โดยการวางโครงการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นบนแผนที่ (Desk Feasibility) ก่อนลงพื้นที่จริง และใช้ GIS ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รวมถึงการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เห็นควรแจ้งหน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้สำนักผู้ตรวจราชการต่อไป ดังนี้

๓.๑ สทภ.๑ - ๑๑ สพน. สอน. และ ศปว. เร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายแผนงาน/โครงการ และพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ตามข้อเท็จจริง ๒.๒.๕

๓.๒ ศปว. สนผ. สอน. สวพ. และ สลก. พิจารณาดำเนินการตามข้อเท็จจริง ๒.๒.๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายนิทัศน์ สุตติพงษ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม



สรุปผลการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ทน. / เจริญพร เจริญพร
๓๓๖ / ๓๓๐



๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕
(นายภาคกร ธารกฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปผลการตรวจราชการ

ตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑
ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ



สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ



นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



นายพลิชฐ์ เอี่ยมพานิช
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



นายธีระชุน บุญสิทธิ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



นายนิทัศน์ สุธิตพงษ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

- เขตตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑, ๓, ๕, ๗, ๘ และ ๙
- เขตตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๓, ๔, ๕, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๖
และ ๑๗




นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา

ผู้ตรวจราชการกรม

- เขตตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒, ๔, ๖, ๑๐ และ ๑๑
- เขตตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๖, ๘, ๙, ๑๒, ๑๔ และ ๑๘

การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่แสดงจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑

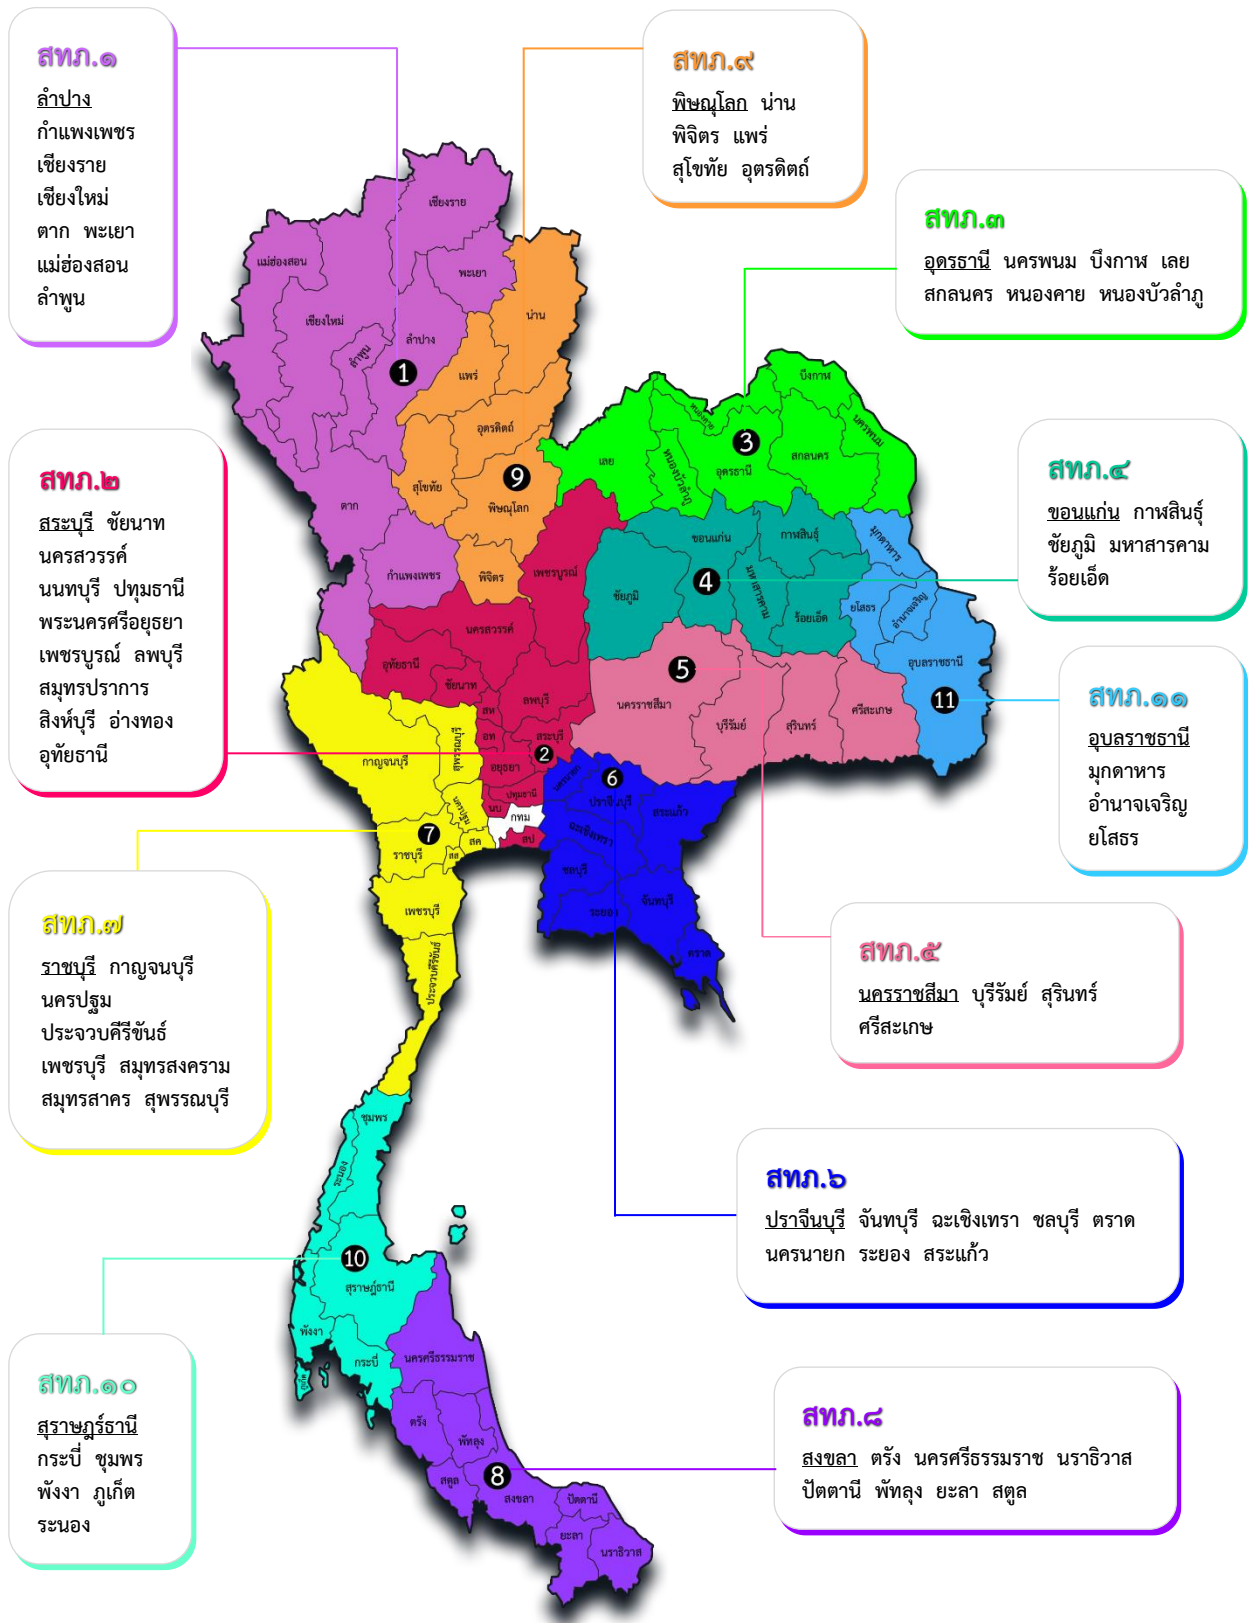

ผู้ประสานงานตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ



นางสาวกุสุมา แก้วทนต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



นางสาวอรพรรณ ไทรแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



นายธนกัณฑ์ เดชะนิวรรตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



นางสาววัลยา พงษ์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่งานธุรการ



**สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑**

กรมทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การตรวจราชการฯ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สรุปสาระสำคัญจากการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการกรม ดังนี้

๑. การประชุมตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕	ตรวจราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ๒ ๓ และ ๔
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕	ตรวจราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ๖ ๗ และ ๑๐
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕	ตรวจราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ๙ และ ๑๑

๒. รูปแบบการตรวจราชการ

การตรวจราชการเป็นการประเมินผล (Monitoring / Evaluation) การปฏิบัติราชการตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๔) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการรับฟังรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อสรุปประมวลผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๓. สรุปผลการตรวจราชการ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ข้อมูล GFMS ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕)


ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๐๗.๔๓๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๙๑.๐๔๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๕ จำแนกเป็น

๓.๑.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่าย ๓๔.๗๒๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๙ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๔๑.๖๘๖๔ ล้านบาท)

๓.๑.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ๔๓.๕๘๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๑๒๘.๓๐๕๖ ล้านบาท)

๓.๑.๓ แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เบิกจ่าย ๖.๒๓๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๗.๙๗๐๐ ล้านบาท)

๓.๑.๔ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เบิกจ่าย ๗๐๖.๕๐๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๓,๓๒๙.๔๗๕๘ ล้านบาท)

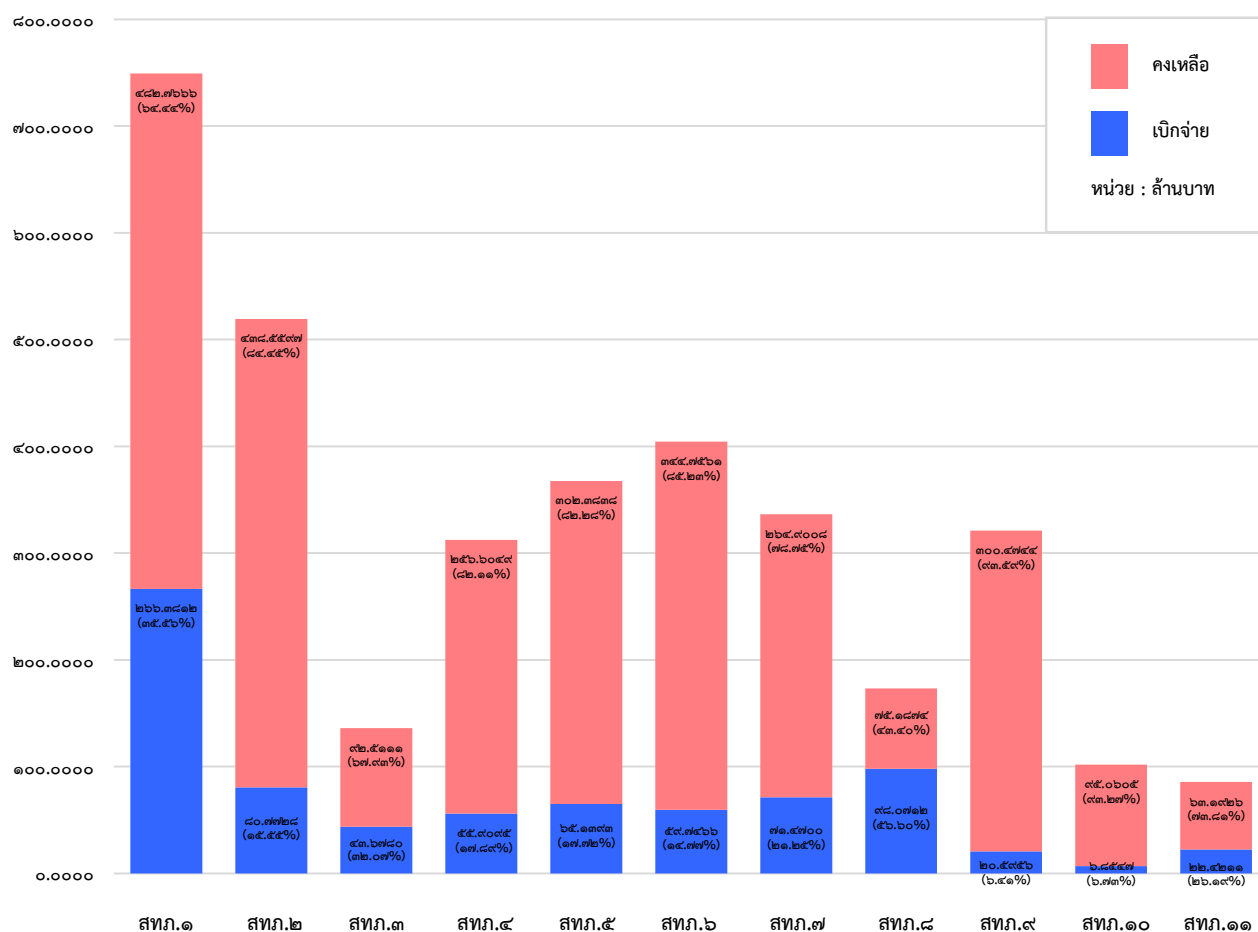

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	แผนงานบุคลากร	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	รวม
สทภ.๑					
จัดสรร	๗,๑๔๔๐	๒๕,๕๖๐๘	๐,๒๔๕๔	๗๑๖,๑๔๒๗	๗๔๔,๑๔๗๘
เบิกจ่าย	๕,๕๒๓๓	๔,๕๓๗๔	๐,๐๒๘๔	๒๕๐,๘๔๑๕	๒๖๖,๓๘๑๒
ร้อยละ	๘๒,๒๘	๓๗,๓๑	๑๑,๕๔	๓๕,๐๓	๓๕,๕๖
สทภ.๒					
จัดสรร	๓,๔๔๗๐	๑๐,๗๔๗๓	๑,๐๖๗๐	๕๐๔,๐๒๓๒	๕๑๔,๓๓๒๕
เบิกจ่าย	๒,๗๖๑๗	๓,๘๗๕๔	๐,๔๓๓๖	๗๓,๒๐๒๑	๘๐,๗๗๒๘
ร้อยละ	๗๘,๔๗	๓๖,๐๖	๔๑,๕๔	๑๔,๕๒	๑๕,๕๕
สทภ.๓					
จัดสรร	๔,๐๒๒๐	๑๔,๕๐๓๖	๐,๒๖๔๖	๑๑๗,๓๔๔๐	๑๓๖,๑๘๔๒
เบิกจ่าย	๓,๒๓๒๔	๔,๔๗๔๘	๐,๒๖๔๒	๓๕,๗๐๑๒	๔๓,๖๗๘๐
ร้อยละ	๘๐,๓๘	๓๐,๘๘	๑๑,๘๓	๓๐,๔๑	๓๒,๐๗
สทภ.๔					
จัดสรร	๓,๖๐๑๐	๑๓,๘๓๒๕	๐,๓๓๓๖	๒๔๔,๗๖๗๓	๓๑๒,๕๓๔๔
เบิกจ่าย	๒,๘๔๐๕	๓,๔๐๘๔	๐,๒๘๗๖	๔๘,๘๒๓๐	๕๕,๕๐๔๕
ร้อยละ	๘๐,๒๗	๒๔,๒๖	๑๑,๗๑	๑๖,๕๖	๑๗,๘๔
สทภ.๕					
จัดสรร	๕,๐๑๔๓๐	๔,๕๓๒๐	๐,๓๐๔๓	๓๕๒,๖๖๒๔	๓๖๗,๕๒๓๐
เบิกจ่าย	๔,๘๐๓๑๐	๒,๗๔๒๒	๐,๓๐๘๓	๕๗,๒๓๕๗	๖๕,๑๓๔๓
ร้อยละ	๙๕,๖๔	๒๔,๒๔	๑๑,๖๔	๑๖,๒๓	๑๗,๗๒
สทภ.๖					
จัดสรร	๓,๘๘๗๐	๗,๔๔๕๑	๐,๒๘๕๔	๓๔๒,๘๓๔๖	๔๐๔,๕๐๒๗
เบิกจ่าย	๓,๒๒๒๘	๓,๑๓๔๕	๐,๒๖๔๕	๕๓,๑๑๔๘	๕๔,๕๑๖๖
ร้อยละ	๘๒,๔๑	๔๑,๘๘	๑๒,๕๒	๑๓,๕๒	๑๔,๗๗
สทภ.๗					
จัดสรร	๔,๓๔๐๑๐	๑๐,๐๗๒๓	๔,๓๗๒๘	๓๑๗,๕๓๕๗	๓๓๖,๓๗๐๔
เบิกจ่าย	๓,๖๓๔๑๘	๒,๕๔๘๖	๓,๑๕๕๕	๖๒,๐๘๑๘	๗๑,๔๗๐๐
ร้อยละ	๘๒,๗๘	๒๕,๘๐	๗๒,๑๖	๑๙,๕๕	๒๑,๒๕
สทภ.๘					
จัดสรร	๔,๕๒๒๐	๘,๙๔๖๓	๐,๒๒๖๒	๑๕๔,๕๖๔๒	๑๗๓,๒๕๘๖
เบิกจ่าย	๓,๖๑๗๖	๓,๔๑๓๖	๐,๒๑๔๔	๔๐,๘๒๕๖	๔๘,๐๗๑๒
ร้อยละ	๘๐,๐๐	๓๘,๑๖	๑๑,๘๐	๒๖,๔๒	๒๖,๖
สทภ.๙					
จัดสรร	๒,๙๒๘๐	๑๒,๘๐๑๑	๐,๔๔๔๑	๓๐๔,๘๔๖๘	๓๒๑,๐๗๐๐
เบิกจ่าย	๒,๔๗๔๗	๒,๖๖๐๔	๐,๓๕๐๔	๑๕,๑๐๔๐	๒๐,๕๔๕๖
ร้อยละ	๘๔,๕๒	๒๐,๗๔	๗๔,๐๒	๔,๙๖	๖,๔๑
สทภ.๑๐					
จัดสรร	๒,๖๒๑๐	๖,๐๓๒๑	๐,๒๐๔๑	๔๓,๐๕๓๐	๕๑,๙๑๒๒
เบิกจ่าย	๒,๑๕๔๔	๒,๘๔๐๖	๐,๒๐๖๘	๑,๖๔๗๕	๖,๘๕๗๗
ร้อยละ	๘๒,๔๑	๔๗,๐๔	๑๑,๘๔	๑,๗๗	๖,๗๓
สทภ.๑๑					
จัดสรร	-	๘,๗๘๒๖	๐,๒๓๒๑	๗๖,๕๔๔๐	๘๕,๖๑๓๗
เบิกจ่าย	-	๔,๓๓๓๗	๐,๒๑๘๘	๑๗,๘๖๘๕	๒๒,๔๒๑๑
ร้อยละ	-	๔๙,๓๔	๑๑,๒๔	๒๓,๓๓	๒๖,๑๔
รวม					
จัดสรร	๔๑,๖๘๖๔	๑๒๘,๓๐๕๖	๗,๙๗๐๐	๓,๓๒๙,๔๗๕๘	๓,๕๐๗,๔๓๗๔
เบิกจ่าย	๓๔,๗๒๐๗	๔๓,๕๘๐๖	๖,๒๓๓๑	๗๐๖,๕๐๕๗	๗๔๑,๐๔๐๐
ร้อยละ	๘๓,๒๔	๓๓,๙๗	๗๘,๒๑	๒๑,๒๒	๒๒,๕๕

๓.๒ การตรวจราชการใน ๓ แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ

๓.๒.๑ ผลการดำเนินงานแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี้

๑) ผลผลิตที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ: โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ ดำเนินการโดย สทภ.๑ และ สทภ.๙ แผนการดำเนินงานรวม ๒๐๕ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๒ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๕๔.๖๓

๒) ผลผลิตที่ ๒ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ:
ค่าสำรวจออกแบบ รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๗๖
ค่าควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น ๒๑๕ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๙
และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รวมทั้งสิ้น ๔๙ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖

๓) ผลผลิตที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

- การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน
ห้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ดำเนินการโดย สทภ.๑ สทภ.๓ และ สทภ.๑๑ อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพ
การเปลี่ยนแปลงห้องน้ำ ณ สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำตามแผน

- การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม พบว่า ส่วนใหญ่
ดำเนินการได้ตามแผน โดยมีบางสถานีไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีเตือนภัยได้ เนื่องจากอุปกรณ์บางชนิด
ชำรุด รอการซ่อมบำรุงรักษา และไม่มีอุปกรณ์สำรองไว้เปลี่ยน

- การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ - อุทกวิทยาแม่น้ำโขง พบว่า
สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุฯ และรายงานข้อมูลระดับน้ำรายวันและรายเดือนได้ตามแผน
อย่างไรก็ตาม พบว่า บางสถานีมีอุปกรณ์วัดระดับน้ำชำรุดรอการซ่อมบำรุง

- การบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบ
ส่งข้อมูลสัญญาณภาพ พบว่า สทภ.๑ - ๑๑ ดำเนินการติดตามตรวจสอบบำรุงรักษาระบบฯ ได้เฉพาะสถานีปกติ
กรณีสถานีมีการชำรุด หรือ Server ชัดข้อง ต้องรอเจ้าหน้าที่ส่วนกลางดำเนินการ

๓.๒.๒ ผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี้


๑) การจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ดำเนินการ
โดย สอน. และส่งมอบเครื่องจักรกลฯ ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยปัจจุบันรายการรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาด
๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน จำนวน ๒ คัน อยู่ระหว่างบริหารสัญญา รายการสายยางสูบลมส่งน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ มีการส่งมอบให้ สทภ.๒ สทภ.๖ และ สทภ.๗ หน่วยงานละ ๒ ชุด เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์
ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ส่วนรายการเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อน
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง มีการยกเลิกโครงการ

๒) การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทาน
หรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน สทภ.๑ - ๑๑ มีการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแล้ว ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	ปริมาณการสูบน้ำ			รถน้ำ แจกน้ำ (ลบ.ม.)	แจกน้ำดื่ม (ขวด)
		แล้ง (ลบ.ม.)	ท่วม (ลบ.ม.)	รวม (ลบ.ม.)		
๑.	สทภ.๑	-	-	-	๑,๓๑๔,๙๙๙	๔,๗๐๐
๒.	สทภ.๒	๑,๕๑๓,๐๘๐	๗,๕๓๔,๕๖๐	๙,๐๔๗,๖๔๐	๔๘,๐๐๐	๑๕,๘๔๐
๓.	สทภ.๓	๓,๑๘๒,๕๐๐	๑๒๖,๖๘๐	๓,๓๐๙,๑๘๐	๑๐๘,๐๐๐	-
๔.	สทภ.๔	๑,๒๕๘,๓๖๐	๑,๘๒๕,๗๒๐	๓,๐๘๔,๐๘๐	-	-
๕.	สทภ.๕	๘๓๒,๐๐๐	๑,๙๙๐,๖๒๐	๒,๘๒๒,๖๒๐	-	-
๖.	สทภ.๖	๔,๐๑๗,๒๐๐	๑,๙๙๒,๒๐๐	๖,๐๐๙,๔๐๐	-	๑๓,๘๔๐
๗.	สทภ.๗	๑๒,๙๖๐	๒๙,๕๘๐,๔๘๐	๒๙,๕๙๓,๔๔๐	-	-
๘.	สทภ.๘	๖๑๗,๒๒๐	๑,๗๒๙,๑๑๐	๒,๓๔๖,๓๓๐	-	-
๙.	สทภ.๙	๑,๕๘๑,๔๖๐	๙๑๕,๗๖๐	๒,๔๙๗,๒๒๐	๑๕๘,๘๕๐	๕,๒๔๔
๑๐.	สทภ.๑๐	๒๔๙,๖๐๐	๑๐๕,๖๐๐	๓๕๕,๒๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑,๒๗๐
๑๑.	สทภ.๑๑	๑๗๓,๖๐๐	๒,๙๒๖,๔๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐
รวม		๑๓,๔๓๗,๙๘๐	๔๘,๗๒๗,๑๓๐	๖๒,๑๖๕,๑๑๐	๑,๘๑๕,๘๔๙	๔๑,๔๔๔

๓.๒.๓ ผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สรุปดังนี้

๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ รวมทั้งสิ้น ๒๑๙ แห่ง ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๙๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๗ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ แห่ง และมีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จำนวน ๑๒ แห่ง โดยจำแนกตามสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑ จำนวน ๒๑๕ แห่ง ดังนี้

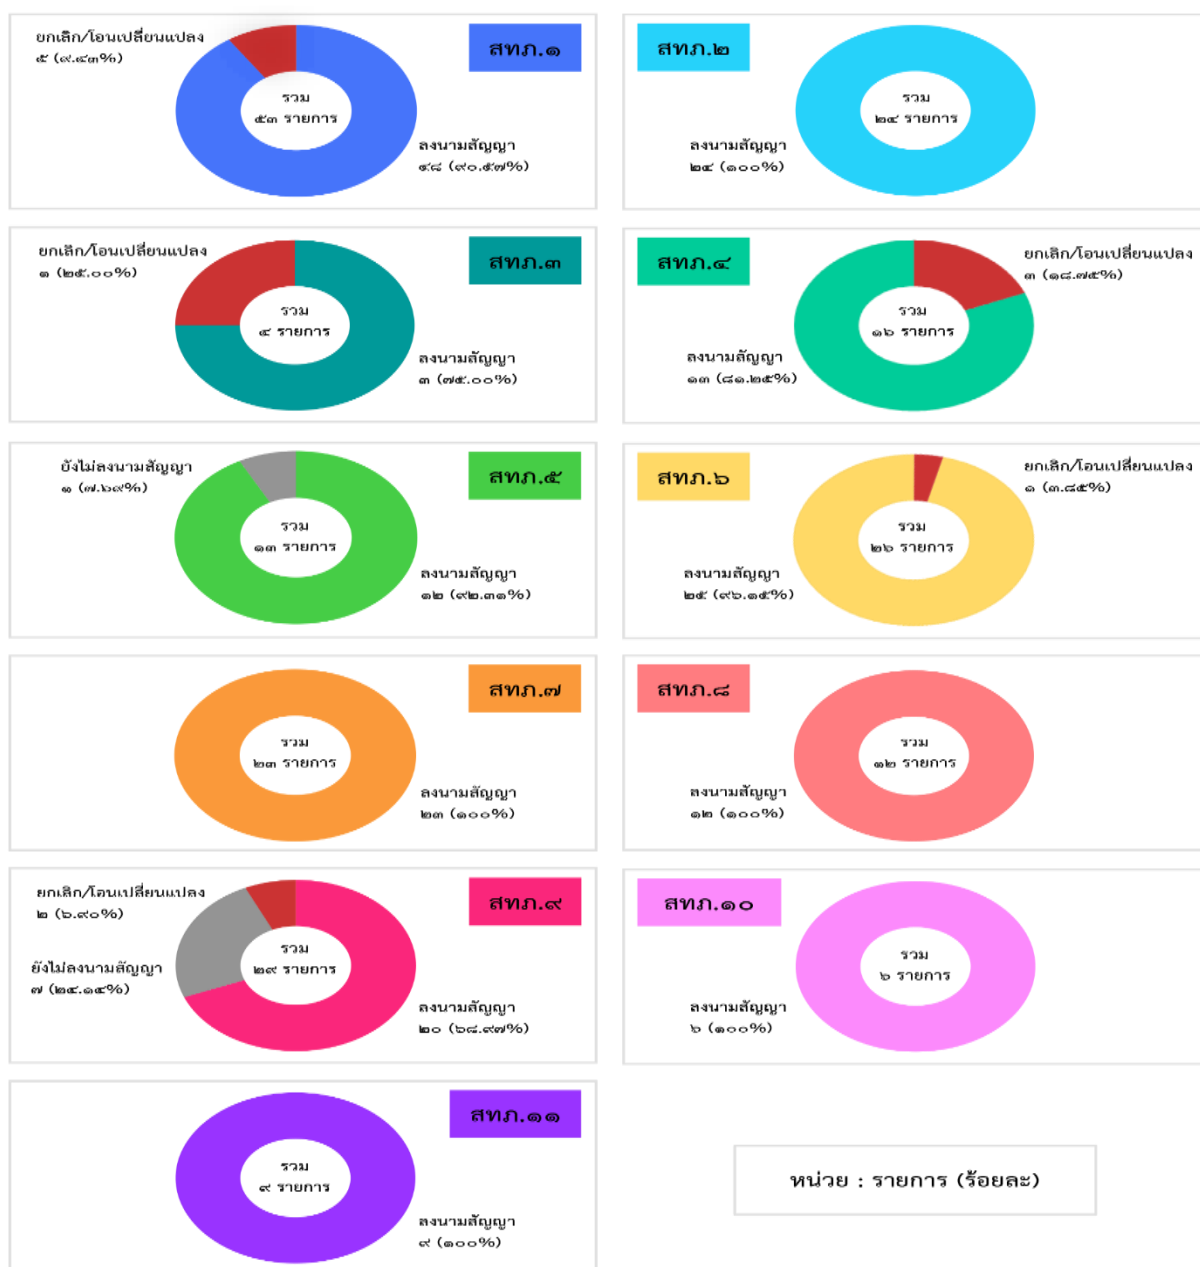

๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ดำเนินการโดย สอน. และ สพน. ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณ รวมจำนวน ๔ แห่ง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๓ แห่ง

๔. ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๑ ปัญหา อุปสรรคในภาพรวมของ สทภ.๑ – ๑๑

๔.๑.๑ บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ หรือ บางอัตรามีการเกษียณอายุราชการไปแล้ว ไม่มีอัตรากำลังมาทดแทน (เช่น บุคลากรส่วนอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น)

๔.๑.๒ การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอ ในรายการค่าตอบแทนผู้รู้/ผู้ดูแลสถานีเตือนภัย ทำให้มีการค้างจ่าย และงบประมาณไม่เพียงพอ ในการซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัยได้ตามแผน

๔.๑.๓ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หรือระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (CCTV) บางกรณีเมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ไม่สามารถซ่อมได้ต้องรอ เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจากส่วนกลาง

๔.๑.๔ การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติฯ ได้รับงบประมาณล่าช้าและไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

๔.๒ ปัญหา อุปสรรคเฉพาะรายหน่วยงาน

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค
๑	สทภ.๑	- การนิเทศติดตามผลการบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา มีพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่สูง อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ทำให้การคมนาคมลำบากและเสี่ยงอันตราย - การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว ขาดแคลนเครื่องมือสำรวจ ได้แก่ เครื่องมือ Current Meter อะไหล่อุปกรณ์ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเครื่องมือ ADCP และ GPS มีอายุการใช้งานมานานและขัดข้องบ่อย - การช่วยเหลือในภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ขาดอุปกรณ์ท่อสูบน้ำ (ปัจจุบันมีจำนวน ๕ ชุด) และสายยางส่งน้ำ มีความยาวไม่เกิน ๕๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒	สทภ.๒	- ในการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีเตือนภัยฯ เกิดจากตำแหน่งที่ตั้งสถานีเตือนภัยฯ มีระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของสถานีเตือนภัยฯ - การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำบางแห่งมีการหยุดงาน เนื่องจากน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการได้
๓	สทภ.๔	- บุคลากรด้านการสำรวจออกแบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะสำรวจชั้นดิน รวมทั้งอุปกรณ์ในการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า - Server ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ชำรุด/ใช้งานไม่ได้ จำนวน ๔ สถานี ทำให้ข้อมูลจากสถานีสนามที่ตรวจวัดได้ ไม่สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์ของระบบโทรมาตรได้ - การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำบางแห่งล่าช้า เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลายฤดูฝน ทำให้น้ำท่วมบริเวณโครงการ และบริเวณรอบโครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถระบายน้ำออกจากแหล่งน้ำได้

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค
๔	สทภ.๕	- การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำ จำนวน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตจากกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เข้าดำเนินการ - ขาดวัสดุอุปกรณ์สำรองสำหรับการทำงานของระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม กรณีมีการ ชำรุด - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ ในการดูแลสถานีเตือนภัยฯ หรือระบบ ตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ - Server ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ชำรุด/ใช้งานไม่ได้ จำนวน ๒ สถานี ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลในระบบประมวลผลส่วนกลางได้
๕	สทภ.๗	- การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำมีการหยุดงาน จำนวน ๖ แห่ง เนื่องจากมีน้ำท่วมขังพื้นที่ โครงการ ประชาชนในพื้นที่ต้องการเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร และอุทยานแห่งชาติพุเตย ยังไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ
๖	สทภ.๙	- การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำมีการหยุดงาน จำนวน ๔ แห่ง เนื่องจากติดปัญหาขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเกษตรกรขอใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร
๗	สทภ.๑๐	- การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำมีการหยุดงาน จำนวน ๑ แห่ง เนื่องจากรอหนังสือ เข้าดำเนินการจากกรมปศุสัตว์
๘	สทภ.๑๑	- การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว ขาดแคลนเครื่องมือสำรวจ ได้แก่ เครื่องมือ ADCP และกล้องสำรวจ - สายยางสูบน้ำ มีการฉีกขาดสายยาง เนื่องจากขาดเครื่องท่อนแรง - เครื่องสูบน้ำไม่สามารถสูบน้ำระยะไกลได้ โดยเครื่องที่สามารถสูบน้ำได้ไกลประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร

๔.๓ ประเด็นที่ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๔.๓.๑ ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำ ในภาวะวิกฤติฯ เนื่องจากหน่วยงานได้รับงบประมาณมาเพียงงวดเดียว ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง ทำให้มี เงินค้างจ่าย ทั้งนี้ ควรพิจารณาจัดสรรตามพื้นที่ที่มีภาวะน้ำแล้ง-น้ำท่วมตามสภาพจริง รวมถึงขอให้มีการจัดสรร งบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะที่ชำรุดสึกหรอ จากการใช้งาน

๔.๓.๒ ขอให้เร่งจัดสรรเพิ่มงบประมาณรายการ ค่าสำรวจและค่าควบคุมงาน ปิ๊งประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๔.๓.๓ ขอให้จัดสรรงบประมาณรายการ บำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำท่วม - ดินถล่ม ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานแต่ละพื้นที่ เช่น ค่าตอบแทนผู้รู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานีที่ชำรุด ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสนามประจำเดือน เป็นต้น

๔.๓.๔ ขอให้กรมพิจารณาเรื่องการจัดสรรอัตราว่างของพนักงานราชการ ทดแทนอัตราของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ (และจะเกษียณอายุราชการ) และขอให้เร่งเปิดสอบอัตราว่างของข้าราชการ เนื่องจากภาคขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง

๔.๓.๕ ขอให้กรมพิจารณาการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจออกแบบโครงการ เนื่องจากปัจจุบันมีไม่เพียงพอ

๔.๓.๖ ขอให้กรมเร่งจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการสำรวจตรวจสอบโครงการเพื่อการถ่ายโอนทรัพย์สินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๓.๗ ขอให้กรมผลักดันเรื่องค่าเสียงภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔.๓.๘ ขอให้กรมสนับสนุนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อรองรับภารกิจในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศหรือนักวิชาการแผนที่ เป็นต้น

๕. ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ

๕.๑ ข้อเสนอแนะของ ผต.ทส. (นายจรัสศักดิ์ ชูความดี) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ ทน. ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางโครงการมีผู้รับจ้างขอยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง จึงยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ประกอบกับเกษตรกรมีความต้องการใช้น้ำทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ รวมทั้งการดำเนินโครงการของ สทท.๑ (ลำปาง) จำนวน ๔ โครงการ และ สทท.๙ (พิษณุโลก) จำนวน ๖ โครงการ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตจาก ปม. และ อส.	ขอให้ ทน. ดำเนินการ ดังนี้ ๑. เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกันเหลือปี โดยถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา ประกอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และส่งผลให้การเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย ๒. กรณีขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ควรกำหนดแผนงาน/โครงการไว้ล่วงหน้าให้ครอบคลุมในระยะยาวจนถึงช่วงดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยขอให้ ปม. และ อส. พิจารณาสันับสนุนการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า และแจ้งผลให้ ทน. ทราบ ต่อไป ๓. สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านซำจำปี อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อฟื้นฟูสวนป่าจำปีสิรินธร ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ในป่าพรวนน้ำจัดให้น้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีและสร้างสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ

๕.๒ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ (ม.ค.๒๕๖๕)
เกษตรสร้างมูลค่า	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่กำกับดูแลการใช้ที่ดินของรัฐ ควรนำเรื่องเกษตรสร้างมูลค่า ไปสนับสนุนให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ รวมถึงสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ เช่น การลดใช้สารเคมี การลดการเผา การทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดินและน้ำ รวมถึงการนำแนวทางการพัฒนาตาม BCG Model มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงาน : กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงฯ ดังนี้ ๑. เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะเป็ผลงานเด่นในการขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงฯ ประกอบด้วย ๑.๑ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑๒๒ แห่ง (งบประมาณรวม ๑,๘๕๓.๗๑๒๑ ล้านบาท) โดยดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรให้ทั่วถึง แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มผลผลิตและรายได้จากเกษตรกรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หน่วยปฏิบัติ : สทก.๑ ๒ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ และ สอน. ๑.๒ โครงการเปลี่ยนแหล่งน้ำสาธารณะเป็นพื้นที่สีเขียว โดยขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕.๐๗๔๐ ล้านบาท หน่วยปฏิบัติ : สสป. และหน่วยงานในพื้นที่ ๒. กิจกรรม/แนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ ตามพื้นที่เป้าหมายของกระทรวง ๕ พื้นที่ ได้แก่ <u>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเศรษฐกิจฐานราก โดยเป็นแผนงานที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> หน่วยปฏิบัติ : สทก.๑ และ สทก.๑๐

ภาคผนวก

- OPPM การประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑
- สรุปประเด็นการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑
- หนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ ที่ ทส ๐๖๒๑/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- หนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ ที่ ทส ๐๖๒๑/ว ๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- หนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ ที่ ทส ๐๖๒๑/๗๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเลื่อนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- แผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕




การประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประชุมตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 2 3 และ 4

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายนิทัศน์ สูดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 1 2 3 และ 4 โดยมี นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการ ร่วมประชุมในรูปแบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และติดตามความก้าวหน้าข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทั้งนี้ หน.ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานในเรื่อง การวางโครงการเป็นระบบโครงข่ายน้ำระดับตำบล



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี




สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประชุมตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 6 7 และ 10

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายนิทัศน์ สูดิพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5 6 7 และ 10 โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการ ร่วมประชุมในรูปแบบ ประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและติดตามความก้าวหน้าข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทั้งนี้ น.พ.ศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานในเรื่อง การวางโครงการเป็นระบบโครงข่ายน้ำระดับตำบล

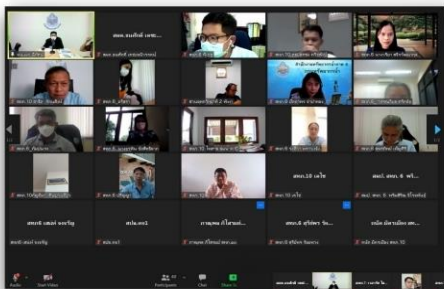

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี

[illegible]

มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี

สรุป

ประเด็นการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๖,๕๓๕,๐๐๐	๕,๔๓๑,๓๘๗.๑๖	๘๓.๑๑
๒) งบดำเนินงาน	๔,๗๓๓,๐๐๐	๓,๓๐๒,๑๓๑.๕๘	๖๙.๗๗
๓) งบลงทุน	๗๓๑,๖๔๖,๓๖๗	๒๐๐,๘๕๐,๓๕๕.๕๘	๒๗.๔๕
๔) งบรายจ่ายอื่น	๖,๒๓๓,๔๗๗	๒,๗๘๗,๐๔๖.๒๕	๔๔.๗๑
รวม	๑๙,๓๓๘,๘๔๔	๑๐,๓๗๐,๙๒๐.๕๗	๕๓.๖๕

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๒๗๕,๐๐๐ บาท	เป้าหมายการดำเนินงาน ๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๑ มี.ค. ๖๕ จำนวน ๑๕๐ แห่ง	
ผล	๘๐๙,๔๒๕ บาท (ร้อยละ ๖๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙๐ แห่ง	ปัญหาอุปสรรค 1. ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถเข้าดำเนินการพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน 2. พื้นที่ดำเนินงานเป็นพื้นที่สูง

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
			ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน การคมนาคมลำบากและเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าพื้นที่และการปฏิบัติงานของ จนท. 3. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการและไม่มีตำแหน่งทดแทน 4. ปัญหาเรื่องการสื่อสารกับชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 5. พื้นที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ข้อเสนอแนะ 1. การประสานงานกับพื้นที่ ให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดแทนการประสานงานโดยตรงกับพื้นที่ตั้งโครงการ 2. มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูอาสาสมัครการศึกษานอก โรงเรียนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นในพื้นที่สูง ฯลฯ 3. มีการผลิตเอกสารคู่มือ เพื่อช่วยในการดูแลระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น 4. จัดหายานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอกับพื้นที่ทำงาน

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗,๐๓๕,๐๐๐.บาท	จำนวน ๔๖ โครงการ	
ผล	๑,๕๕๑,๐๙๔.บาท (ร้อยละ ๒๒.๐๕)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๐๒๕,๘๐๐ บาท	จำนวน ๓๓ โครงการ	
ผล	๔๕๐,๒๖๐ บาท (ร้อยละ ๑๔.๘๘)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕,๔๔๒,๙๐๐.บาท	จำนวน ๑๔ โครงการ	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท) จัดสรรทั้งปี ๒๒๐,๕๕๐ บาท ได้รับแล้ว ๑๑๖,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๔,๐๕๐ บาท	๑๑๖,๕๐๐	๓๑,๔๘๐	สำรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำ เพื่อตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ ณ สถานีตรวจวัดปริมาณแม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย - แผนการสำรวจ ๓๖ ครั้ง - ผลการดำเนินงาน ๑๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๙	ปัญหาอุปสรรค ขาดแคลนเครื่องมือสำรวจ ได้แก่ - เครื่องมือ Current Meter อะไหล่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ - เครื่องมือ ADCP และ GPS อายุการใช้งาน มานาน ขัดข้องบ่อย ข้อเสนอแนะ ๑.ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการสำรวจ ๒.ประสาน จนท.สวพ. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท) จัดสรรทั้งปี ๕,๘๙๑,๖๐๐ บาท ได้รับแล้ว ๑,๑๔๗,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๔,๗๔๔,๐๐๐ บาท	๑,๑๔๗,๖๐๐	๑,๑๑๘,๙๙๖.๘๐	ตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา สถานีเตือนภัยล่วงหน้าทั้งหมด ๖๔๗ สถานี ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน - แผนการซ่อมบำรุง ๔ ครั้งต่อปี - ผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง ปัจจุบันเครื่องมือเตือนภัยมีประสิทธิภาพในการทำงาน และเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๔๙๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๗๗ และเป็นตัวชี้วัดหลักของกรมทรัพยากรน้ำ ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก	ปัญหาอุปสรรค - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้รับจัดสรร เดือน ต.ค.-พ.ย. ๖๔ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าตอบแทนผู้รู้/ผู้ดูแลสถานีเตือนภัย เบิกจ่ายได้ถึงเดือน พ.ย. ๖๔ - ส่วนตั้งแต่เดือน ธ.ค. ๖๔ จนถึงปัจจุบัน ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากไม่มีงบประมาณ และไม่สามารถซ่อมบำรุงสถานีเตือนภัยได้ตามแผน - ขาดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะด้านเทคนิคการซ่อมบำรุง - อุปกรณ์บางชนิดชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้และส่งซ่อมใช้เวลาการส่งซ่อมนาน ทำให้เครื่องมือเตือนภัยไม่สามารถทำงานได้ ข้อเสนอแนะ - สนับสนุนด้านงบประมาณให้

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
				เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรายไตรมาส และแผนงานเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลักของกรมทรัพยากรน้ำ - สนับสนุนบุคลากรตามกรอบพนักงานราชการที่มีความรู้ด้านเทคนิคการซ่อมบำรุง - เน้นย้ำ ผู้รู้/ดูแลสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในการตรวจวัดข้อมูลน้ำฝนจากกระบอกวัดน้ำฝนธรรมดา กรณีสถานีที่ชำรุดหรือไม่สามารถลงพื้นที่บำรุงรักษา เพื่อติดตามข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำ - ลำดับความสำคัญเร่งด่วนของสถานีที่ชำรุด โดยจัดทำแผนลงพื้นที่ซ่อมบำรุงรักษาเป็นลำดับแรก เพื่อให้สถานีเตือนภัยมีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามปกติ - จัดฝึกอบรมซ้ำเสริมผู้รู้เครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามสถานการณ์น้ำ
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท) จัดสรรทั้งปี ๑๕๗,๙๐๐ บาท ได้รับแล้ว ๘๔,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๔๕,๖๐๐ บาท	๘๔,๗๐๐	๔๔,๒๐๘.๙๘	ซ่อมบำรุงรักษาเครือข่าย สถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำ โขง และรายงานข้อมูล ระดับน้ำรายวันและราย เดือน จำนวน ๓ สถานี - แผนการสำรวจ จำนวน ๑๒ ครั้ง - ผลการดำเนินงาน จำนวน ๕ ครั้ง	ปัญหาอุปสรรค อุปกรณ์ในการตรวจวัดระดับ น้ำชำรุด ข้อเสนอแนะ ประสาน จนท.สวพ. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์มา ทดแทน
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและ ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๑๖๔,๑๕๐	๗๔,๓๘๙.๗๔	ซ่อมบำรุงรักษาระบบ ตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติ (สถานีโทรมาตร) และระบบส่งข้อมูล	ปัญหาอุปสรรค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถซ่อมได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ รวมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
จัดสรรทั้งปี ๕๙๐,๒๔๐ บาท ได้รับแล้ว ๑๖๔,๑๕๐ บาท คงเหลือ ๔๒๖,๐๙๐ บาท			สัญญาณภาพ (CCTV) จำนวน ๕๐ สถานี เครื่องมือสามารถเชื่อมโยง ได้ ๓๙ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๗๐ - แผนการดำเนินงาน ๔ ครั้ง - ผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง	ศปว. มาดำเนินแก้ไข <u>ข้อเสนอแนะ</u> จัดหาอะไหล่อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สำรองและ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการ ซ่อมบำรุงสถานี
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)				

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ
จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน			
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย			
๓) สายยางสูบลม ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด			
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง			

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๔๕,๔๐๐ บาท	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คน	
ผล	๑๗๐,๐๖๐ บาท (ร้อยละ ๖๙)	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม จำนวน ๔๔๘,๙๐๐ คน <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด ๑,๓๑๔,๙๙๙ ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ๔,๗๐๐ ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาดลิตร น้ำดื่มบรรจุขวดขวด	ปัญหาอุปสรรค 1. เครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้ว จำนวน 24 เครื่อง ขาดอุปกรณ์ท่อสูบน้ำ (มีอยู่ 5 ชุด) สายยางส่งน้ำ (ที่มีอยู่ไม่เกิน 500 ม.) ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. เครื่องสูบน้ำมีสภาพชำรุด (ได้รับจากกรมตั้งแต่ปี 54)/การติดตั้งใช้เวลานาน (บางแห่ง 1 วัน) 3. ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นและทันสมัย เช่น เครื่องผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (RO)/เครื่องสูบน้ำระยะไกล เป็นต้น 4. জন.เกษียณอายุแต่ละปีจำนวนมาก ไม่มีอัตรากำลังทดแทน 5. สภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเส้นทางคมนาคมเป็นภูเขา พื้นที่สูงชัน ระยะทางไกล เดินทางไปปฏิบัติงานลำบาก แนวทางแก้ไข - สทท.1 ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์ จากกรมทรัพยากรน้ำ แทนรายการเดิมที่ชำรุด และขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการดำเนินงานอื่นๆที่ขาดแคลน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
			ข้อเสนอแนะ - ขอให้พิจารณาจัดสรรตำแหน่ง พนักงานราชการ (ช่างยนต์/ช่าง กลโรงงาน) ทดแทนตำแหน่ง ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ราชการในแต่ละปี เพื่อให้มี บุคลากรสนับสนุนการทำงาน อย่างเพียงพอ

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....แห่ง ครุฑเรือนได้รับประโยชน์.....ครุฑเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....แห่ง - แล้วเสร็จแห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการแห่ง - หยุดงานแห่ง - อื่นๆแห่ง ๒. รอลงนาม.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง).....แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗๑๖,๑๔๒,๖๖๗ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๕๓.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๙,๕๘๘.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๕,๕๒.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๓๒,๓๑๑.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๑๙๘,๓๓๗,๗๖๓,๘๕๕ บาท (ร้อยละ ๒๗.๗๐)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๔๘..... แห่ง - แล้วเสร็จ.....๔..... แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ.....๔๔..... แห่ง - ยุติงานแห่ง - อื่นๆแห่ง ๒. รอลงนาม.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง.....๕..... แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง).....๔๘..... แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครราชสีมาและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔) คชจ. การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑-๖๑๙๑

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๓,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๗๖๑,๖๖๔.๒๘	๗๘.๙๗
๒) งบดำเนินงาน	๒,๕๒๘,๕๐๐.๐๐	๑,๓๕๘,๒๒๓.๑๘	๕๓.๗๒
๓) งบลงทุน	๕๑๑,๕๙๖,๙๖๗.๓๐	๖๙,๔๘๒,๘๖๙.๖๙	๑๓.๕๘
๔) งบรายจ่ายอื่น	๑,๗๐๙,๙๙๐.๐๐	๑,๓๑๑,๙๗๓.๑๓	๗๖.๗๒
รวม	๕,๑๙๓,๓๓๒,๔๕๗.๓๐	๗๔,๙๑๔,๗๓๐.๒๘	๑๔.๔๓

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	-	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	-	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	..๖,๒๓๑,๐๐๐.๐๐.บาท	ค่าสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๓๑ แห่ง	-
ผล	..๑,๒๓๖,๗๖๒.๖๙.บาท (ร้อยละ ๑๙.๘๕.)	อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ แห่ง	-

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	..๑,๓๔๔,๘๐๐.๐๐.บาท	ค่าควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและ บริหารจัดการน้ำ จำนวน ๑๖ แห่ง และโครงการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๘ แห่ง รวมจำนวน ๒๔ แห่ง	-
ผล	...๓๔๕,๓๐๐.๐๐.บาท (ร้อยละ ๒๕.๖๘.)	อยู่ระหว่างการควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๑๖ แห่ง และ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๘ แห่ง รวมจำนวน ๒๔ แห่ง	-

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	-	-
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	-	-

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัย น้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๑,๐๗๘,๘๐๐	๑๙๘,๐๗๐	ติดตามตรวจสอบ บำรุง รักษาสถานีเตือนภัย ล่องหน้า (EWS) จาก ๑๑๗ สถานี โดย สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ได้เป็นจำนวน ๗๙ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๓	ในการเชื่อมโยงข้อมูลของ สถานีเตือนภัยล่องหน้า (EWS) เกิดจากตำแหน่งที่ตั้ง สถานีเตือนภัยฯ มีระดับ ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เป็นตัวแปรของ ปัญหาดังกล่าวทำให้ส่งผล กระทบต่อการทำงาน และ ประสิทธิภาพในของการ เตือนภัยของสถานีฯ
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยา (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	๒๑๔,๒๕๐	๖๙,๑๑๕	- ติดตามและรายงาน สถานการณ์น้ำท่าของ สถานีอุทกวิทยา จำนวน ๑๑ สถานี เป็นประจำทุกวัน - สำรวจจัดทำ Cross- section ลำนํ้าตามแผน ประจำปี ได้จำนวน ๔ สถานี	ขาดแคลนบุคลากร/ อัตรากำลัง /ความพร้อมของ เครื่องมือและยานพาหนะ/ งบประมาณ <u>บุคลากร</u> ผู้ปฏิบัติงานจริง ไม่เป็นไป ตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ ต้องการตำแหน่งพนักงาน ราชการเพื่อทดแทนอัตรากำลัง ที่เกษียณอายุราชการไป (ต้องการบุคลากรในตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,นายท้ายเรือ, พนักงานวัดระดับน้ำ) ให้เป็นไปตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น <u>เครื่องมือ/ยานพาหนะ</u> ต้องการยานพาหนะที่ เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงาน <u>งบประมาณ</u> งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติงาน และปริมาณงาน

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๕๕๕,๒๐๐	๑๔๐,๘๐๖.๐๔	ติดตามตรวจสอบบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๖๒ สถานี	ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการปรับปรุงโครงข่าย และระบบฐานข้อมูล จึงทำให้สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างปกติ
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	ส่วนกลางจะเป็นผู้ดูแลและจัดสรรงบประมาณในกรณีที่มีการมอบหมายให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคดำเนินโครงการฯ อีกครั้ง	เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการร่วมประชุม สัมมนา หรืออบรมกับเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ได้

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-	-	-
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย	-	-	-
๓) สายยางสูบลูกยาง ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด	๒ ชุด	สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม	-
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	-	-	-

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๐๖๗,๐๐๐.บาท	สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒ จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด ปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี	-
ผล	๙๒๑,๔๘๘.๘๑.บาท (ร้อยละ ๘๖.๓๖.)	(ระบุผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ.....๑,๕๑๓.๐๘๐..ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด.....๓๖,๐๐๐.ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด.....-.....ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ.....๗,๕๓๔.๕๖๐..ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด.....๑๒,๐๐๐.ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด.....๑๕,๘๔๐..ขวด	๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอ และได้รับโอนล่าช้า ๒. เครื่องมือและอุปกรณ์ชำรุด บ่อย

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๔๕,๒๔๙,๑๖๗.๓๐.บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๑๖.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๓,๗๔๐.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑๗,๕๔๓๙.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๑๔,๐๔๕.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๓๕,๑๐๖,๓๗๑.๐๐.บาท (ร้อยละ ๑๔.๓๑.)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๑๖.....แห่ง - แล้วเสร็จ.....-.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ.....๑๓.....แห่ง - หยุดงาน.....๓.....แห่ง - อื่นๆ.....-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....-.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง.....-.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง).....-.....แห่ง ๕. อื่นๆ.....-.....แห่ง	เกษตรกรขอให้หยุดงานเพื่อเก็บน้ำ ไว้ใช้ทำการเกษตร

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๕๘,๗๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๘.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๓,๑๑๔.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑๓,๕๐๐๐.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๗,๕๘๐.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๓๒,๗๔๔,๔๓๖.๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๒.๖๗.)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๘.....แห่ง - แล้วเสร็จ.....-.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ.....๗.....แห่ง - หยุดงาน.....๑.....แห่ง - อื่นๆ.....-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....-.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง.....-.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง).....-.....แห่ง ๕. อื่นๆ.....-.....แห่ง	น้ำท่วมไม่สามารถเข้าทำงานได้

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)	-	-
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (กลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)	-	-
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)	-	-

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔) คชจ. การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)	-	-
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)	-	-

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑-๖๑๕๑

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๓,๔๓๗,๐๐๐	๒,๘๐๐,๘๗๕	๘๑.๔๙
๒) งบดำเนินงาน	๒,๑๖๘,๐๐๐	๑,๙๓๔,๓๖๘.๗๙	๘๙.๒๒
๓) งบลงทุน	๑๒๘,๑๖๕,๒๐๐	๒๙,๔๕๙,๙๐๔.๒๐	๒๓.๖๙
๔) งบรายจ่ายอื่น	๒,๔๑๘,๙๕๑	๘๙๐,๔๖๔.๓๗	๓๖.๘๑
รวม	๑๓๖,๑๘๙,๑๕๑	๓๕,๐๘๕,๖๑๒.๓๖	๒๕.๗๖

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒,๔๑๘,๙๕๑ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) ๘ กิจกรรม	
ผล	๘๙๐,๔๖๔.๓๗ บาท (ร้อยละ ๓๖.๘๑)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๖,๔๓๒,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) ๓๒ โครงการ	
ผล	๑,๘๑๔,๖๖๕ บาท (ร้อยละ ๒๘.๒๑)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑๐ โครงการ	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕๐๔,๓๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) ๓ โครงการ	
ผล	๓๕๔,๗๘๐ บาท (ร้อยละ ๗๐.๓๕)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๓ โครงการ	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๘๒๙,๙๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ โครงการ ผลงานเฉลี่ยร้อยละ ๒๔.๒๙	
ผล	๕๑๕,๗๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๓.๔๗)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพพระบพพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้อง น้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	๒๑๗,๐๐๐	๖๘,๙๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการแล้วจำนวน ๑๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓ (ข้อตกลง ๓๖ ครั้ง/ ปี)	
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ ท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๐,๐๖๒.๔๐	สทภ. ๓ มีจำนวน ๙๕ สถานี ดำเนินการ บำรุงรักษาไปแล้ว จำนวน ๘๗ สถานี คิด เป็นร้อยละ ๙๑.๕๐	
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง Mekong Hy-cos (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	๑๒๓,๙๐๐	๓๙,๘๑๖.๒๕	สทภ. ๓ มีจำนวน ๔ สถานี ดำเนินการ บำรุงรักษาเป็นไปตาม แผนงาน	
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูล สัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๔๑,๑๗๐	๒๗,๔๕๖๘.๓๒	ดำเนินการไปแล้วตาม แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย ลุ่มน้ำฯ (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)			สวพ.	
๖) คชจ.ในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก- อุตุนิคมวิทยา	๑,๐๗๙,๓๗๕	๒๔๓,๒๕๗.๔๐	สทภ. ๓ มีจำนวน ๘๕ สถานี ดำเนินการ บำรุงรักษาไปแล้ว จำนวน ๓๕ สถานี คิด เป็นร้อยละ ๖๐	
๗) คชจ.ในการสำรวจปริมาณเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็ก	๔๘๖,๙๐๖	๕๖,๗๓๐	สทภ. ๓ มีจำนวน ๓๒ สถานี ดำเนินการ บำรุงรักษาไปแล้ว จำนวน ๓๒ สถานี คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐	

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ (ติดตั้งเครน)		๑ คัน	ใช้เพื่อบรรทุกครุภัณฑ์ทางการเกษตร	
๒) รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖,๐๐๐ ลิตร		๒ คัน	ใช้บรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง	
๓) รถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ๑๐ คัน		๔ คัน	ใช้ขนดิน (งานทำเอง)	
๔) รถขุดไฮดรอลิก		๒ คัน	ใช้ขุดดิน (งานทำเอง)	
รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕) เรือดูดโคลนสเหินน้ำสะเทินบก		๒ ลำ	ใช้ดูดโคลนเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ	
๖) เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว		๑ เครื่อง	ใช้สูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้ง,อุทกภัย	
๗) เครื่องสูบน้ำขนาด ๓๐ นิ้ว		๒ เครื่อง	ใช้สูบน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้ง,อุทกภัย	
๘) สายยางสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว		๕๐ เมตร	ใช้ส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัยแล้ง,อุทกภัย	

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๔๒๔,๓๕๐ บาท งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (๒๖๔,๖๐๐)	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) ช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง, น้ำท่วม ในเขต พื้นที่รับผิดชอบของ สทภ.๓	
ผล	๒๖๔,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	(ระบุผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๓,๑๘๒,๕๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด ๑๐๘,๐๐๐ ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด - ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๑๒๖,๖๘๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด - ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด - ขวด	ขาดงบประมาณในการบริหาร จัดการทำให้งานหรือผลการ ดำเนินงานล่าช้า

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑๑๔,๗๗๐,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๓ แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๑,๑๑๕ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒.๙๗๒๐ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๕,๑๔๐ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๒๓,๘๘๘,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๐.๘๑)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว ๓ แห่ง - แล้วเสร็จ - แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ แห่ง - หยุดงานแห่ง - อื่นๆแห่ง ๒. รอลงนาม.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒,๖๒๙,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๑ แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ - ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๖๐ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)ค่าอาหาร.....	
ผล	บาท (ร้อยละ ๐)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว ๑ แห่ง - แล้วเสร็จแห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ แห่ง - หยุดงานแห่ง - อื่นๆแห่ง ๒. รอลงนาม.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาค้อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (กลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔) คชจ. การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๕.๑ การจัดทำชุดบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์

๕.๒ สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

๕.๓ ขอสนับสนุนบุคลากรทดแทนลูกจ้างประจำส่วนอุทกวิทยาที่เกษียณอายุราชการ

๕.๔

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑-๖๑๙๑

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.....๕

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่๒๔.กุมภาพันธ์.๒๕๖๕.....

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๒,๙๓๙,๐๐๐.๐๐	๒,๔๔๘,๖๐๐.๐๐	๘๓.๓๑
๒) งบดำเนินงาน	๒,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๘๐,๘๔๔.๘๓	๖๘.๙๐
๓) งบลงทุน	๔๓๙,๙๗๑,๙๔๔.๘๔	๖๗,๖๙๕,๐๕๒.๗๕	๑๕.๓๙
๔) งบรายจ่ายอื่น	๑,๔๙๗,๕๖๑.๐๐	๖๓๓,๗๓๑.๓๘	๔๒.๓๒
รวม	๔,๔๗,๒๘๓,๕๐๕.๘๔	๓๒,๗๕๘,๒๒๘.๙๖	๑๖.๒๗

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	-	-	-
ผล	-	-	-

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๘,๘๔๔,๐๐๐ บาท	๑. สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๕๒ โครงการ ๒. สำรวจปฏิพิกลศาสตร์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๑๑ แห่ง (เป้าหมาย ๖ เดือนแรก)	-

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ผล	๑,๑๑๘,๙๙๒ บาท (ร้อยละ ๑๒.๖๕)	๑. สํารวจออกแบบ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๕ ๒. สํารวจภูมิศาสตร์ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ แห่ง (โครงการตามแผนงานปี ๖๕ จำนวน ๘ แห่ง และโครงการเพิ่มเติม จำนวน ๒ แห่ง)	- บุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในเจาะสำรวจชั้นดิน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา : - ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (ขรก./พนักงานราชการ) ทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ - ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในการเจาะสำรวจชั้นดิน/เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุในห้องปฏิบัติการ - ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุก ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมเครน,รถบรรทุกและขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ทดแทนยานพาหนะเดิมที่มีสภาพเก่าไม่พร้อมใช้งาน

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๖๗๐,๕๐๐ บาท (ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒ ครั้ง)	ควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ ดังนี้ - โครงการปี ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ - โครงการปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ	-
ผล	๙๐๑,๗๖๐ บาท (ร้อยละ ๕๓.๙๘)	ดำเนินการควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ ดังนี้ - โครงการเงินกู้เงินช่วยเหลือปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ โครงการ ผลงานร้อยละ ๗๐.๐๖ - โครงการเงินกู้ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ โครงการ ผลงานร้อยละ ๖๙.๑๒ - โครงการงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ ผลงานร้อยละ ๓๐.๒๙	-

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗๕๑,๐๐๐ บาท	งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ	-
ผล	ยังไม่มีเบิกจ่าย (ร้อยละ ๐)	ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งสองโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง	-

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๓๖๔,๘๐๐	๖๔,๔๔๐	- มีสถานีในความรับผิดชอบ จำนวน ๓๒ สถานี ปัจจุบันสถานีใช้งานได้ ๓๑ สถานี (มีจำนวน ๑ สถานี ที่มีอุปกรณ์หน้าจอประมวลผลชำรุด อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทดแทน)	- ได้รับจัดสรรงบประมาณในไตรมาส ๑-๒ รวม ๖๗,๐๐๐ บาท ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนผู้รู้ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๖๕
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๒๐๗,๗๖๐	๓๖,๖๘๓	- มีสถานีในความรับผิดชอบจำนวน ๑๘ สถานี (โทรมาตร ๑๗ สถานี และ CCTV ๑ สถานี) - ชำรุด ๔ สถานี (อุปกรณ์ประมวลผล NRT ชำรุด)	- ได้รับจัดสรรงบประมาณในไตรมาส ๑-๒ รวม ๘๑,๗๔๐ - Server ระบบโทรมาตรใช้งานไม่ได้ ทำให้ข้อมูลจากสถานีสนามที่ตรวจวัดได้ ไม่สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์ของระบบโทรมาตรได้ - สถานีติดตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ควรได้รับการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนที่ชำรุดบางสถานี โดยหน่วยงานส่วนกลางขอรับสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมทั้งระบบโทรมาตร โขง-ชี-มูล ๕๑ สถานี (สปว.)
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	- ดำเนินการโดย สวพ.	-

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุดผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-	-	-
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย	-	-	-
๓) สายยางสูบลม ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด	-	-	-
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	-	-	-

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓๑๓,๖๐๐ บาท	สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔	-
ผล	๒๖๘,๐๔๖ บาท (ร้อยละ...๕๑.๒๑.....)	<u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ดำเนินการ ต.ค.๖๔-ปัจจุบัน ในพื้นที่ ๒ จังหวัด (ขอนแก่น และมหาสารคาม) จำนวนรวม ๑๓ แห่ง ปริมาณการสูบน้ำ๑,๒๕๘,๓๖๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด-.....ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ดำเนินการ ต.ค.๖๔-ปัจจุบัน ในพื้นที่ ๒ จังหวัด (ขอนแก่น และชัยภูมิ) จำนวนรวม ๘ แห่ง ปริมาณการสูบน้ำ๑,๘๒๕,๗๒๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด-.....ขวด	- ขาดบุคลากรด้านช่างฝีมือสนาม เครื่องมือเครื่องจักรชำรุด - ขาดงบประมาณในการ ดำเนินงาน

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑๒๒.๕๙๓๕ ล้านบาท	จำนวน...๑๑...แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์...๑,๘๘๖...ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก...๗,๓๘๘๗...ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์...๗,๐๕๕...ไร่	-
ผล	๓๐.๕๓๒๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๓.๒๒)	๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว...๕...แห่ง - แล้วเสร็จ...๒...แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ...๗...แห่ง - ยุติงาน - แห่ง ๒. รอลงนาม - แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง...๓...แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)...๑...แห่ง	ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลาย ฤดูฝน มีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม บริเวณโครงการ เกษตรกรระบาย น้ำลงแหล่งน้ำ อีกทั้งบริเวณรอบ โครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ทางการเกษตร ผู้รับจ้างจึงไม่ สามารถระบายน้ำออกจาก แหล่งน้ำได้

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑๖๔.๓๗๔๐ ล้านบาท	จำนวน...๕...แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์...๑,๒๓๓...ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก...๑๑,๗๒๒๘...ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์...๑๐,๘๙๑...ไร่	-
ผล	๗.๔๕๙๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๔.๕๐)	๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว...๕...แห่ง - แล้วเสร็จ - แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ...๕...แห่ง - ยุติงาน - แห่ง ๒. รอลงนาม - แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง - แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง) - แห่ง	ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลาย ฤดูฝน มีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม บริเวณโครงการ เกษตรกรระบาย น้ำลงแหล่งน้ำ อีกทั้งบริเวณรอบ โครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ทางการเกษตร ผู้รับจ้างจึงไม่ สามารถระบายน้ำออกจาก แหล่งน้ำได้

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)	-	-
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)	-	-
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)	-	-
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)	- ศปว.เป็นผู้ดำเนินการ โดยได้ขอ ความอนุเคราะห์ ผอ.สทท. มอบหมาย ให้อำนาจการส่วนอุทกวิทยา สทท. ๓,๔,๕ และ ๑๑ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเป็น คณะกรรมการตรวจการจ้าง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการ ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อ พิจารณารายงานการเริ่มงาน คัดเลือก แหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมในการติดตั้ง เสาวัดระดับน้ำ และการตรวจรับงาน งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๕
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)	-	-

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๕.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพิ่มเติมในจุดที่เสี่ยงภัย
ดำเนินการโดย สวพ. โดยในพื้นที่ สทท.๔ ได้พิจารณาติดตั้งสถานีเพิ่มจำนวน ๑๐ สถานี หากงบประมาณยังได้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเหมือนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา และได้รับการติดตั้งสถานีเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมี
มากขึ้น (ค่าตอบแทนผู้รู้/ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานีที่ชำรุด/ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจสอบและบำรุงรักษา
สถานีสนามประจำเดือน/ประสานงานผู้รู้ ผู้นำชุมชน เครือข่ายหมู่บ้านครอบคลุม) จะส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน ทำให้
การปฏิบัติตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปีไม่สัมฤทธิ์ผล และเจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน.....

๕.๒ บุคลากรและเครื่องมือที่ใช้ในงานจะสำรวจชั้นดินรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุมี
ไม่เพียงพอ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนดังนี้.....

.....(๑) ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (ข้าราชการ/พนักงานราชการ) เพื่อทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ

.....(๒) ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือในสำรวจชั้นดิน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบ
วัสดุในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน.....

.....(๓) ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุก ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมครน และรถบรรทุกขับเคลื่อน
๔ ล้อ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อทดแทนยานพาหนะเดิมที่มีสภาพเก่าไม่พร้อมใช้งาน.....

๕.๓ ปัจจุบันมีข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการไปเป็นจำนวนมาก และบางส่วนยังไม่มี การจัดสรรอัตรากำลังเพื่อทดแทน ทำให้ต้องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและใน ภาคสนาม โดยการปฏิบัติงานในภาคสนามจะต้องเดินทางไกลและมีการพักค้างคืนในบางครั้ง จึงอยากจะขอให้กรม ทรัพยากรน้ำโปรดพิจารณาหรือกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องสวัสดิการค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเช่าที่พักของพนักงานจ้างเหมา เหล่านี้ เพื่อให้สามารถเขียนใน TOR ได้เหมือนหน่วยงานอื่นๆ.....

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑-๖๑๕๑

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ๒ มีนาคม ๒๕๖๕.....

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๔,๑๙๐,๓๐๐.๐๐	๓,๔๘๙,๘๓๐.๖๕	๘๓.๒๘
๒) งบดำเนินงาน	๒,๘๔๐,๕๐๐.๐๐	๑,๗๙๓,๐๕๕.๐๐	๖๓.๑๒
๓) งบลงทุน	๓๕๙,๕๓๔,๘๙๕.๐๐	๕๘,๕๓๒,๘๑๘.๓๖	๑๖.๒๘
๔) งบรายจ่ายอื่น	๙๕๗,๓๑๙	๕๒๘,๑๕๐.๔๙	๕๕.๑๗
รวม	๓๖๗,๕๒๓,๐๑๔.๐๐	๖๔,๓๔๓,๘๙๔.๕๐	๑๗.๕๑

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) -	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน) -	

หมายเหตุ สทก. ๕ ไม่ได้รับงบประมาณดำเนินการสำหรับกิจกรรมนี้

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔,๐๒๐,๐๐๐.๐๐.....บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๒๐ โครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ	
ผล	๑,๐๑๑,๑๖๐.๐๐.....บาท (ร้อยละ...๒๕.๑๕....)	(ระบุผลการดำเนินงาน) จำนวน ๘ โครงการ (สำรวจ)	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๘๔๐,๕๐๐.....บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณค่าควบคุมงานเพิ่มเติม	
ผล	๒๘๖,๐๐๐...บาท (ร้อยละ...๓๔.๐๓...)	(ระบุผลการดำเนินงาน) แล้วเสร็จ ๑ โครงการ ได้แก่ อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวแดงสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านวันชาติ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒,๐๑๒,๐๐๐.๐๐.....บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๔ โครงการ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง	
ผล	๐.....บาท (ร้อยละ.....๐.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๓๘๑,๖๐๐	๗๐,๑๘๐	บำรุงรักษาสถานีเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) จำนวน ๓๔ สถานี ใช้งานได้จำนวน ๒๙ สถานี ขำรุต จำนวน ๕ สถานี	- ขาดวัสดุ อุปกรณ์สำรอง ใ้สำหรับการใช้งาน - จัดสรรงบประมาณไม่ สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินงาน
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูล สัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๒๒๑,๔๘๐	๓๙,๓๙๐.๔๙	บำรุงรักษาระบบ ตรวจวัดสถานีโทรมาตร จำนวน ๑๘ สถานี ระบบ Server ขำรุตทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูล ในระบบประมวลผล ส่วนกลางได้ CCTV จำนวน ๒ สถานี กล้องเสียทั้ง ๒ สถานี	- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้าน ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย ล่วงหน้าฯ (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุดผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-	-	-
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย	-	-	-
๓) สายยางสูบล้างน้ำ ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด	๑	ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในที่ พื้นที่รับผิดชอบ	เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับการ จัดสรรจาก สอน.
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	๑	ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ปัญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภคในพื้นที่ รับผิดชอบ	เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่งได้รับการ จัดสรรจาก สอน.

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓๐๘,๓๐๐.๐๐.....บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) เป้าหมาย ๓๐ แห่ง ปริมาณการสูบน้ำ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ประชาชน ได้รับประโยชน์ ๖,๐๐๐ ครัวเรือน ๑๘,๐๐๐ คน	
ผล	๓๐๘,๓๔๐.....บาท (ร้อยละ.....๙๙.๖๙.....)	(ระบุดผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ดำเนินการแล้ว ๑๒ แห่ง ปริมาณการสูบน้ำ๘๓๒,๐๐๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด-.....ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ดำเนินการแล้ว ๘ แห่ง ปริมาณการสูบน้ำ ๑,๙๙๐,๖๒๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด-.....ขวด	- เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือได้ในทุกพื้นที่ และบุคลากรไม่เพียงพอ มีอายุมาก - งบประมาณในงวดที่ ๑ ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอและเหมาะสมกับเป้าหมายดำเนินการ

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๐๙,๓๒๘,๐๔๕.....บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๘.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๒,๑๔๗.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑๓.๙๒๘๘.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๑๐,๔๘๖.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	
ผล	๓๐,๗๗๗,๐๑๔.....บาท (ร้อยละ.....๑๔.๗๐.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๖.....แห่ง - แล้วเสร็จ๑.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ๗.....แห่ง - หยุดงาน-.....แห่ง - อื่นๆ-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....-.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง-.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)-.....แห่ง ๕. อื่นๆ-.....แห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	...๑๔๓,๓๓๔,๓๕๐.๐๐....บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๕.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๑,๙๐๓.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๔.๘๓๖๕.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๕,๔๗๐.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๒๖,๔๕๘,๖๔๔.๓๖....บาท (ร้อยละ...๑๘.๔๖....)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๔.....แห่ง - แล้วเสร็จ	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔) คชจ. การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑ ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการสำรวจการถ่ายโอนสิ่งก่อสร้างและแหล่งน้ำ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้ถ่ายโอน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
- ๕.๒ ขอรับการจัดสรรเพิ่มงบประมาณค่าสำรวจและค่าควบคุมงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจาก
งบประมาณไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ
- ๕.๓ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจออกแบบโครงการไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายใน
ปัจจุบัน
- ๕.๔

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑-๖๑๕๑

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.....๖.....

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.....

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๓,๖๗๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๖๑,๖๒๕.๐๐	๘๓.๓๓
๒) งบดำเนินงาน	๒,๐๔๕,๕๐๐.๐๐	๑,๔๗๔,๙๙๗.๙๙	๗๒.๑๑
๓) งบลงทุน	๓๙๗,๘๑๕,๕๑๒.๙๕	๔๙,๐๖๖,๕๓๐.๙๘	๑๒.๓๓
๔) งบรายจ่ายอื่น	๗๙๑,๖๔๐.๐๐	๕๒๗,๔๗๒.๓๑	๖๖.๖๓
รวม	๔๐๔,๓๒๖,๓๕๙.๙๙	๕๔,๑๓๐,๖๑๖.๒๘	๑๓.๓๙

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการนิเทศติดตาม ผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ในสถานศึกษา	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)		

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๖๑๘,๐๐๐.....บาท	แผนสำรวจ ออกแบบ ๑๘ โครงการ	
ผล	...๑,๔๖๓,๖๔๕.๒๕...บาท (ร้อยละ....๔๐.๔๕....)	สำรวจ ออกแบบแล้วเสร็จ ๓ โครงการ	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๐๐๘,๖๐๐.....บาท	แผนควบคุมงาน ๒๕ โครงการ	
ผล	๒๕๑,๖๘๐.....บาท (ร้อยละ...๒๕.๙๕....)	ควบคุมงานแล้วเสร็จ ๒ โครงการ	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓๕๔,๐๐๐.....บาท	ได้รับโอนจากส่วนกลาง ๑ โครงการ คือ บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด	
ผล	-.....บาท (ร้อยละ.....-.....)	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพพระบพพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ร่วม ดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๙๐,๐๐๐	๗๘,๕๔๐	ตรวจสอบสถานีเตือนภัยฯ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมในการแจ้งเตือน	ปัญหา อุปสรรค : งบประมาณโอนจัดสรรล่าช้า การเบิกจ่ายไม่ต่อเนื่อง
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา แม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	๒๒๓,๔๔๐	๖๐,๕๙๐	สำรวจ จัดเก็บข้อมูลอุทก-อุตุนิยามวิทยา ไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง/ปี จำนวน ๑๓ สถานี (โดยเพิ่มความถี่ในการสำรวจข้อมูลช่วงฤดูฝน)	
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๑๖๗,๐๐๐	๑๒๘,๕๑๒.๐๖	อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งระบบ	

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)			สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค(ทุกภาค) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน		ส่วนบริหารจัดการน้ำ ประสานกับสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งยังไม่ได้ขออนุมัติเพื่อส่งมอบไปประจำการ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคใด	
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย	-	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ไม่ได้รับการจัดสรร	
๓) สายยางสูบลม ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด	-	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ไม่ได้รับการจัดสรร	
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	-	ส่วนบริหารจัดการน้ำ ประสานกับสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ แจ้งว่ายกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๕๓๙,๒๐๐.- บาท	บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ในพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด โดยการเตรียมความพร้อมดำเนินงานในพื้นที่เผชิญเหตุ รวมถึงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภค และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ	

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
		สำหรับการนำไปติดตั้งสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบปัญหาสภาวะวิกฤตน้ำ ตามที่ได้รับการ ประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ โดยปัจจุบันดำเนินการช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๑๐ แห่ง ผู้ได้รับประโยชน์จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ๕,๓๙๐ ครัวเรือน ประชากร ๑๔,๔๑๖ คน และพื้นที่เกษตร ๓๘,๔๐๒ ไร่ ซึ่งจะมีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	
ผล	๒๘๕,๙๐๐.- บาท (ร้อยละ ๑๘.๕๑) เบิกจ่าย ๒๖๔,๔๑๐.๒๕ บาท คงเหลือ ๒๑,๔๘๙.๗๕ บาท	การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง ปริมาณการสูบน้ำ ๔,๐๑๗,๒๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด - ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด - ขวด การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม ปริมาณการสูบน้ำ ๑,๙๙๒,๒๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด - ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ๑๓,๘๔๐ ขวด	ปัญหา อุปสรรค : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๔ ใช้บริหารจัดการโครงการฯ ใน ไตรมาสที่ ๑- ๒ โดยปัจจุบัน งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับ การบริหารจัดการโครงการฯ แนวทางการแก้ไข : ชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณ

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	 ๓๐๐,๒๒๖,๑๑๙.....บาท	จำนวน.....๑๕.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๓,๑๔๗.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๗.๘๒.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๖,๗๖๕.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๓๒,๖๙๒,๐๖๙.....บาท (ร้อยละ.....๑๐.๘๙.....)	๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๑๔.....แห่ง - แล้วเสร็จ๒.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ๑๒.....แห่ง - หยุดงาน๔.....แห่ง - อื่นๆ-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....-.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง๑.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)-.....แห่ง ๕. อื่นๆ-.....แห่ง	หมายเหตุ : ยกเลิก ๑ โครงการ คือ อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขาบ่อทอง หมู่ที่ ๔,๕ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๙๒,๖๐๘,๕๐๐.....บาท	จำนวน.....๑๑.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๕๓๐.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑.๗๔.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๑,๒๒๒.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	
ผล	๙,๘๘๕,๗๕๐.....บาท (ร้อยละ...๑๐.๖๗...)	๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๑๑.....แห่ง - แล้วเสร็จ-.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ๑๐.....แห่ง - หยุดงาน๑.....แห่ง - อื่นๆ-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....-.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง๑.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)๑.....แห่ง ๕. อื่นๆ-.....แห่ง	หมายเหตุ : โอนเปลี่ยนแปลง ๑ โครงการ จาก อนุรักษ์ฟื้นฟูสระ น้ำ รพช.ห้วยมาบไฟ พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็น ก่อสร้างระบบ กระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (กลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)	ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำดำเนินการ	

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑-๖๑๕๑

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1) งบบุคลากร	๔,๑๑๙,๑๐๐	๓,๔๑๐,๐๑๐.๑๙	๘๒.๗๙
2) งบดำเนินงาน	๑,๙๔๙,๕๐๐	๑,๒๒๘,๖๗๐.๘๙	๖๓.๐๒
3) งบลงทุน	๓๒๕,๑๒๕,๓๐๐	๖๑,๗๐๓,๕๗๕.๘๖	๑๘.๙๘
4) งบรายจ่ายอื่น	๕,๑๗๖,๙๕๗	๓,๓๖๗,๔๓๗.๕๙	๖๕.๐๕
รวม	๓๓๖,๓๗๐,๘๕๗	๖๙,๗๐๙,๖๙๔.๕๓	๒๐.๗๒

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท		
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๑.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๖,๐๓๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ	
ผล	๗๓๒,๖๕๒.๘๙ บาท (ร้อยละ๑๒.๑๕)	แล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๐๐๘,๖๐๐ บาท	ดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ	
ผล	๓๖๘,๖๔๐ บาท (ร้อยละ ๓๖.๕๕)	แล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕๕๑,๐๐๐ บาท	แผนดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	

- ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ส่วนประสานและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จากค่าสำรวจออกแบบ จำนวน ๒๓๔,๕๐๐.- บาท	สปล.แม่กลอง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการงบลงทุน ปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวนทั้งสิ้น ๓๘ โครงการ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๓๐ โครงการ และ จังหวัดราชบุรี จำนวน ๘ โครงการ	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	- ขออนุมัติในหลักการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๓ โครงการ ระหว่างวันที่ ๒๓,๒๔,๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ ระหว่างวันที่ ๒,๓,๔, มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ และในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ	

ส่วนประสานและบริหารจัดการน้ำลุ่มเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	สปล.เพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับ จัดสรรงบประมาณจากค่า สำรวจออกแบบ จำนวน ๑๓๑,๓๐๐ บาท	- ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการงบลงทุน ปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๔ โครงการ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๖ โครงการ	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	- มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานกับส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อนำรายละเอียดของโครงการฯ จัดทำเป็นข้อมูลประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามแผนที่กำหนดไว้	

ส่วนประสานและบริหารจัดการน้ำลุ่มท่าจีน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	สปล.ท่าจีน ได้รับจัดสรร งบประมาณจากค่าสำรวจ ออกแบบ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท	- ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการงบลงทุน ปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ โครงการ	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	- มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานกับส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อนำรายละเอียดของโครงการฯ จัดทำเป็นข้อมูลประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ตามแผนที่กำหนดไว้	

๑.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)				
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๑๔๙,๖๗๔.๐๐	๑๒๗,๑๒๐.๐๐	ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) จำนวน ๑๐๔ สถานี พร้อมใช้งาน ๙๖ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓%	-จำนวนเงินและรอบระยะไม่เป็นไปตามรอบการจัดสรรงบประมาณ
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)				
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๕๒,๑๘๐.๐๐	๓๓,๒๘๐.๙๔	ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (โทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน จำนวน ๑๒ สถานี) และสถานี CCTV จำนวน ๒ สถานี)	
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)				
๖) คชจ.ในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก - อุตุ นิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๑๖๑,๒๘๐.๐๐	๕๑,๕๔๐.๐๐	การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก - อุตุ นิยมวิทยา (การจัดทำรูปตัดขวางลำน้ำ (Cross Section) จำนวน ๒ สถานี)	-การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๗) คชจ.ในการบำรุงรักษาระบบ ตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่ง น้ำขนาดเล็ก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๔๒๗,๒๗๓.๐๐	-	ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดต่อ ประสานงานข้อมูล ระบบตรวจวัดปริมาณ น้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาค ตะวันตก ๒๘ แหล่งน้ำ (๕๖ สถานี)	เบิกจ่ายผู้ดูแลสถานตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๖๕ เป็นต้น ไป

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ
จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) สายยางสูบลมส่งน้ำ ๑๒ นิ้ว	-	๑๓ ชุด	ใช้ประกอบการติดตั้งเครื่องสูบลม น้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว เพื่อเพิ่ม ระยะการส่งน้ำจากแหล่งน้ำไป ยังพื้นที่รับน้ำที่อยู่ห่างไกล	สายยางเสื่อมสภาพจากการใช้ งานมานาน ต้องการทดแทน และเพิ่มเติมจากของเดิม
๒) เรือดูดโคลน	-	๒ ชุด	-	-
๓) รถขุดตักไฮดรอลิค	-	๒ คัน	-	-

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔,๓๗๒,๗๕๐ บาท	ปริมาณการสูบลมช่วยเหลือ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.	
ผล	๓,๑๕๕,๔๙๖.๖๕ บาท (ร้อยละ ๗๒.๑๖)	<u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๑๒,๙๖๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด - ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด - ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๒๙,๕๘๐,๔๘๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด - ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด - ขวด	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	งบประมาณ ตามสัญญา ๑๖๖,๓๗๒,๓๐๐ บาท	จำนวน ๑๖ แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๑,๘๘๗ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๑.๒๑ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๗,๙๖๐ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	เบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๘๒๑,๔๗๕ บาท (ร้อยละ ๑๑.๙๑)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว ๑๖ แห่ง - แล้วเสร็จ ๒ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ แห่ง - หยุดงาน ๖ แห่ง - อื่นๆแห่ง ๒. รอลงนาม.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	ปัญหา อุปสรรค หยุดงาน จำนวน ๖ แห่ง เนื่องจาก ๑. น้ำท่วมขังพื้นที่โครงการ จำนวน ๔ แห่ง ๒. ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการเก็บ น้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร จำนวน ๑ แห่ง ๓. เนื่องจากอุทยานแห่งชาติพุเตยยังไม่ อนุญาตให้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ หยุดงาน จำนวน ๑ แห่ง แนวทางการแก้ไข หากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจะเร่งรัด ดำเนินโครงการภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	งบประมาณ ตามสัญญา ๑๕๑,๑๖๓,๔๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๗ แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๓๗ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๐.๕๙ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๔,๑๖๘ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	เบิกจ่ายแล้ว ๔๐,๗๘๐,๘๐๗ บาท (ร้อยละ ๒๖.๙๘)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว ๗ แห่ง - แล้วเสร็จแห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ แห่ง - อื่นๆ อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑ แห่ง ๒. รอลงนาม.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	ปัญหา อุปสรรค ๑.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอ แนวทางการแก้ไข คาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

- ไม่มีการดำเนินโครงการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗-

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๕.๑ สนับสนุนอัตรากำลังในการปฏิบัติการกิจทั้งที่เป็นภารกิจเดิม และภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อรองรับภารกิจในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ/นักวิชาการแผนที่

๕.๒ ต้องการงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ เนื่องจากมีเครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ ชำรุดสึกหรอจากการใช้งาน

๕.๓ ด้านยานพาหนะและเครื่องจักร เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน มีสภาพอายุการใช้งานนาน และไม่รองรับกับเครื่องมือที่ได้รับเพิ่มเติมจากกรมทรัพยากรน้ำ และไม่เพียงพอต่อใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกพร้อมครนขนาดใหญ่ รถกระบะบริการ

๕.๔ ครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ต่างๆ

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๔,๕๒๒,๐๐๐	๓,๕๔๘,๔๓๗.๖๖	๗๘.๔๗
๒) งบดำเนินงาน	๑,๘๒๙,๕๐๐	๗๓๒,๒๐๐.๗๖	๔๐.๐๒
๓) งบลงทุน	๑๖๕,๖๓๐,๖๖๐	๙๑,๑๓๙,๑๘๘.๘๐	๕๕.๐๓
๔) งบรายจ่ายอื่น	๑,๒๗๖,๔๖๕	๗๒๗,๕๗๙	๕๗
รวม	๑๗๓,๒๕๘,๖๒๕	๙๖,๑๔๗,๔๐๖.๒๔	๕๕.๔๙

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๘๒๙,๕๐๐	ดำเนินงาน คจช.บริหาร สทภ.๘	
ผล	๗๓๒,๒๐๐.๗๖ (ร้อยละ ๔๐.๐๒)	ดำเนินงาน คจช.บริหาร สทภ.๘	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕,๒๒๖,๐๐๐	ดำเนินการ ๒๖ แห่ง	
ผล	๑,๒๑๗,๙๔๐ (ร้อยละ ๒๓.๓๑)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๘๔๐,๕๐๐	๕ แห่ง	
ผล	๘๔๐,๑๔๐ (ร้อยละ ๙๙.๙๖)	๑๒ แห่ง	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)				
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๒๖๘,๐๐๐	๒๔๑,๗๘๐	การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม	
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)				
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๔๖,๕๗๐	๒๖,๖๖๐	บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๖๕๕,๗๔๕	๒๔๔,๗๔๕	เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย	

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน			
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย			
๓) สายยางสูบลูกยาง ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด			
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง			

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๒๖,๑๕๐	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	๒๑๔,๓๙๔ (ร้อยละ ๙๔.๘๐)	<u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ เครื่อง ๑) บ้านพรุอ้ายเล ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ๒) บ้านปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ๓) บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ๔) บ้านโคกหรั่ง ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ๕) บ้านบาตัน ต.ลิตร อ.เมือง จ.ยะลา <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๖๑๗,๒๒๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑๕ เครื่อง ๑) ทำอากาศยานนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๒) ประตุน้ำบางไทร หมู่ที่ ๘ ต.บ้านใหม่ อ.ปาก พูน จ.นครศรีธรรมราช ๓) ชุมชนวังเนียง(ถนนไชยบุรี) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ. พัทลุง ๔) บ้านดอนเค็ด(ถนนไชยบุรี) ม.๖ ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง ๕) บ้านบ่อโพธิ์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๖) สวน ๗๒ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ่อทราย อ.เมือง จ.สงขลา ๗) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๙ ต. บ่อทราย อ.เมือง จ.สงขลา ๘) บ้านทุ่งใหญ่(ถ.สายเกาะถ้ำ-ชายทะเล) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙) บ้านบ่อโพธิ์(รอยต่อ ม. ๕ ท่านางหอม) ต.น้ำน้อย อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา	

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
		๑๐) บ้านหนองบัว ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๑๑) สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๑๒) บ้านบ่อปลิง ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๑๓) บ้านวังคุย (ต.กำแพงเพชร) ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ปริมาณการสูบน้ำ ๑,๗๒๙,๑๑๐ ลิบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาดลิตร น้ำดื่มบรรจุขวดขวด	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๘๔,๘๐๙,๑๖๐	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๙ แห่ง ครุฑเรือนได้รับประโยชน์ ๒,๖๒๐ ครุฑเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒,๒๙๒๐ ล้าน ลิบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒,๗๔๐ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๖๓,๕๔๑,๖๓๔ (ร้อยละ ๗๔.๙๒)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว ๙ แห่ง - แล้วเสร็จ ๒ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ แห่ง - หยุดงานแห่ง - อื่นๆแห่ง ๒. รอลงนาม.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ๑ แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗๔,๗๕๕,๐๐๐	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๓ แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๑,๐๕๐ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๐.๓๖๑๑ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๖,๕๐๐ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๒๕,๕๓๙,๔๗๔.๘๒ (ร้อยละ ๓๔.๑๖)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว ๓ แห่ง - แล้วเสร็จแห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ แห่ง - หยุคงานแห่ง - อื่นๆแห่ง ๒. รอลงนาม.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (กลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔) คชจ. การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑-๖๑๕๑

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๒,๐๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๗๔๓,๓๗๕.๐๐	๘๓.๓๐
๒) งบดำเนินงาน	๒,๖๒๓,๐๐๐.๐๐	๑,๘๔๘,๙๖๑.๕๑	๗๐.๔๙
๓) งบลงทุน	๓๑๔,๗๔๒,๔๐๓.๐๐	๑๔,๒๕๘,๐๕๐.๕๐	๔.๕๓
๔) งบรายจ่ายอื่น	๑,๖๑๒,๐๗๖.๐๐	๑,๐๔๓,๔๕๒.๖๔	๖๔.๗๓
รวม	๓๒๑,๐๗๐,๔๗๙.๐๐	๑๘,๘๙๓,๘๔๗.๖๕	๕.๘๘

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔๓๖,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณ ๒๑๘,๓๐๐ บาท	นิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่ม - โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน ๒๒ แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน ๓๓ แห่ง	รอสำนักงบประมาณจัดสรร จำนวน ๒๑๗,๗๐๐ บาท
ผล	๑๑๘,๘๘๐ บาท (ร้อยละ ๕๔.๔๖ ของงบประมาณที่ได้รับ)	ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๐ นิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำดื่มและดูแลบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่ชำรุด - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน ๒๒ แห่ง	-

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔,๔๒๒,๐๐๐ บาท	สำรวจออกแบบ จำนวน ๒๒ แห่ง	
ผล	๔๙๘,๔๐๓ บาท (ร้อยละ ๑๑.๒๗)	แล้วเสร็จ จำนวน ๔ แห่ง	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๕๑๒,๙๐๐ บาท	ควบคุมงาน จำนวน ๓๐ แห่ง	-
ผล	๑๐๔,๒๖๐ บาท (ร้อยละ ๖.๘๙)	แล้วเสร็จ จำนวน ๑ แห่ง	ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๗ แห่ง คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๙๑๐,๒๐๐ บาท	งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๙ แห่ง	-
ผล	- บาท (ร้อยละ ๐)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)				
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๒,๓๗๓,๗๐๐	๔๕๗,๐๐๐		รอกจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ๑,๙๑๖,๗๐๐ ล้านบาท
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)				
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๑๖๗,๐๐๐	๖๒,๕๙๐		รอกจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ๑๐๔,๔๑๐ ล้านบาท
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)				

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ

จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-		
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย	-		
๓) สายยางสูบลูกยาง ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด	-		
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง			

****** การช่วยเหลือพื้นที่ประสบน้ำท่วม/ภัยแล้ง**

- ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม

๑. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
๒. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว บ้านน้ำลอก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสน

ข่ง จังหวัดอุดรธานี

๓. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว บ้านนา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดฟิจิตร
๔. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว บ้านเนินโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดฟิจิตร
๕. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว และเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว บ้านเตร็ดกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรี

สำโรง จังหวัดสุโขทัย

๖. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านป้อม อำเภอศรีมาศ จ.สุโขทัย
๗. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว บ้านยางแขวนอยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
๘. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว บ้านหนองเขาควาย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

- ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง

๑. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว บ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลร่องเข้ม อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่
๒. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว บ้านกาศไต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลร่องวาง อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่
๓. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๔ ตำบลร่องเข้ม อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่
๔. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว บ้านท่าบัวลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

****** ปัญหาอุปสรรค**

๑. วัสดุ อุปกรณ์ เริ่มมีการชำรุด จากการใช้งานมาเป็นเวลานาน
๒. พื้นที่ดำเนินการที่รับผิดชอบ เป็นพื้นที่กว้างไกลและมีภูมิประเทศลาดชัน
๓. แหล่งน้ำดิบ มีไม่เพียงพอเกิดการแห้งขอดจากภัยแล้งและอยู่ไกลจากจุดบริการ

****** ข้อเสนอแนะ**

ต้องการวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานที่ทันสมัย สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔๔๔,๔๑๐.....บาท	พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ มี ๖ จังหวัด พื้นที่เป้าหมาย มีดังนี้ - จังหวัดน่าน ๔ แห่ง - จังหวัดแพร่ ๕ แห่ง - จังหวัดอุดรธานี ๘ แห่ง - จังหวัดสุโขทัย ๓ แห่ง - จังหวัดพิจิตร ๔ แห่ง - จังหวัดพิษณุโลก ๕ แห่ง	
ผล	๓๕๐,๕๙๕.๕๐.....บาท (ร้อยละ.....๗๘%.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ๑,๕๘๑,๔๖๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด๑๕๘,๘๕๐.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด๔,๒๔๔.....ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ๙๑๕,๗๖๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด๑,๐๐๐.....ขวด	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๐๔,๕๐๘,๖๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๑๒.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.... ๕,๖๖๒.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก..... ๒๔.๔๓๑.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.... ๑๑,๐๐๐...ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	
ผล	 ๒,๙๒๗,๓๕๗.๕๐.....บาท (ร้อยละ...๑.๔๓.....)	ผลการดำเนินงาน ๑๘.๘๐ % ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๑๒.....แห่ง - แล้วเสร็จ๒.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ๗.....แห่ง - หยุดงาน๓.....แห่ง - อื่นๆ-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....-.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง -.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)...แห่ง ๕. อื่นๆ-.....แห่ง	หยุดงาน ๓ โครงการ ๑. จังหวัดแพร่ ๒ แห่ง เนื่องจาก ติดปัญหาขออนุญาต ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๒. จังหวัดสุโขทัย ๑ แห่ง เนื่องจาก อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากเกษตรกรขอใช้น้ำ เพื่อทำการเกษตร

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑๐๒,๔๔๐,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๑๗.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์..... ๑,๕๕๗.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก..... ๑.๒๗.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.... ๓,๒๓๖...ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	
ผล	๓,๓๓๔,๓๗๐ บาท (ร้อยละ ๓.๒๕)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๖.....แห่ง - แล้วเสร็จ-.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ๖.....แห่ง - หยุดงาน๑.....แห่ง - อื่นๆแห่ง ๒. รอลงนาม.....๗..... แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ...๒.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)๑๓.....แห่ง ๕. อื่นๆ ...งานดำเนินการเอง...๒.....แห่ง	๑. หยุดงาน ๑ แห่ง เนื่องจาก ราษฎรขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร จึงขอหยุดงาน ๒. รอลงนาม ๗ แห่ง - ระบบกระจายน้ำ ๔ แห่ง ได้ ผู้ชนะ ๑ แห่ง วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๕ ยกเลิก ๓ แห่ง วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๕ (เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเดียว) ประกาศครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๕-๔ มี.ค.๖๕ คาดว่าได้รับจ้าง ๘ มี.ค.๖๕ - ระบบกระจายน้ำ น้ำพาง โมเดล ๓ แห่ง คาดว่าจะได้ผู้ รับจ้าง วันที่ ๙ มี.ค.๖๕

๑

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑-.....
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑-๖๑๙๑

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.....๑๐.....

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๒,๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๕,๑๙๐.๗๔	๘๒.๖๒
๒) งบดำเนินงาน	๑,๗๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๒,๗๔๘.๖๗	๗๒.๑๖
๓) งบลงทุน	๙๖,๗๗๓,๓๐๐.๐๐	๒,๗๓๒,๔๒๖.๑๙	๒.๘๒
๔) งบรายจ่ายอื่น	๑,๐๙๙,๙๒๐.๐๐	๕๗๔,๘๓๑.๙๙	๕๒.๒๖
รวม	๑๐๑,๙๑๕,๒๒๐.๐๐	๖,๔๖๕,๑๙๗.๕๑	๖.๓๔

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๒๑๖,๐๐๐.๐๐	สำรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จำนวน ๒๔ โครงการ	ไม่มี
ผล	๘๕๓,๔๕๖.๑๙ (ร้อยละ ๒๖.๕๔)	สำรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแล้วเสร็จ ๔ โครงการ	ไม่มี

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕๐๔,๓๐๐.๐๐	ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๖ โครงการ	สามารถเบิกจ่ายงบประมาณค่า ควบคุมงานได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ผล	๒๓๑,๕๒๐.๐๐ (ร้อยละ ๔๕.๙๑)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างหยุดงาน ๑ โครงการ	ได้ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติม ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๒๕/๑๐๗ ลว. ๑๑ ม.ค. ๖๕ เป็นเงิน ๑,๖๗๘,๗๐๐ บาท

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพพระบพพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ ท่วม-ดินถล่ม (สทท. ๑๐ เป็นเงิน ๒๙๔,๐๐๐ บาท)	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๗๐๖.๙๒ ร้อยละ ๖๗.๙๓	๑. ค่าตอบแทนผู้รู้ ประจำสถานีเตือน ภัย ๒. ค่าจ้างเหมาพนักงาน ปฏิบัติงาน EWS. ๓. คชจ.เดินทางไป ราชการ ซ่อมบำรุง สถานีเตือนภัย ๔. ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์งาน เตือนภัย	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรล่าช้า
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุนิยมวิทยา (สทท. ๑๐ เป็นเงิน ๔๗๕,๘๓๐ บาท)	๔๗๕,๘๓๐.๐๐	๑๑๐,๔๓๐.๐๐ ร้อยละ ๒๓.๒๑	๑. ค่าตอบแทนพนักงาน อ่านข้อมูลประจำ สถานี ๒. คชจ.เดินทางไป ราชการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลอุทก- อุตุนิยมวิทยา	งบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรไม่เพียงพอ ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ตามบันทึกที่ ทส ๐๖๒๕/๕๑๘ ลว.๒๕ ก.พ. ๖๕ เป็นเงิน ๑๔๙,๗๘๐ บาท
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่ง ข้อมูลสัญญาณภาพ (สทท. ๑๐ เป็นเงิน ๔,๑๙๐ บาท)	๔,๑๙๐.๐๐	๑,๑๘๙.๖๙ ร้อยละ ๒๘.๓๙	๑. ค่าไฟฟ้าสถานี CCTV ๒. ค่าซ่อมอุปกรณ์ สำนักงานที่ใช้ใน งาน CCTV	-
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย ลุ่มน้ำฯ (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุดผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน			
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย			
๓) สายยางสูบน้ำ ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด			
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง			

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๐๙,๑๐๐.๐๐	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) สนับสนุนให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและ อุทกภัย ๒๐ แห่ง	รองงบประมาณ งวดที่ ๒
ผล	๑๙๒,๗๘๕.๓๐ (ร้อยละ ๙๒.๒๐)	(ระบุดผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๒๔๙,๖๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด ๑๘๖,๐๐๐ ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวดขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๑๐๕,๖๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาดลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ๑,๒๗๐ ขวด	พื้นที่ดำเนินการ ๑. หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวเตย อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. หมู่ที่ ๕,๙,๑๔ และ ๑๕ ตำบล ท่าขนอน อำเภอกิ่วรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ดำเนินการ ๑. หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๒. ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนา สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓. ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๔. ตำบลไทรซิง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔๘,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๑ แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๐.๕๖๐๐ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๓,๗๓๕ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	-
ผล	- (ร้อยละ ๐)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๑.....แห่ง - แล้วเสร็จ-.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการแห่ง - ยุติงาน๑.....แห่ง - อื่นๆ-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....-.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง-.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จาก กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔๔,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๕.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๙๖๖ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๐.๑๗๔๘ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒,๓๐๕ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๑,๖๔๗,๔๕๐.๐๐ (ร้อยละ ๓.๗๔)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๕.....แห่ง - แล้วเสร็จ-.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ๕.....แห่ง - ยุติงาน-.....แห่ง - อื่นๆ-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)แห่ง ๕. อื่นๆแห่ง	

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	-	-	-
๒) งบดำเนินงาน	๑,๖๓๐,๕๐๐	๗๗๔,๙๕๙.๒๕	๔๗.๕๓
๓) งบลงทุน	๘๒,๗๖๙,๔๒๔	๑๙,๖๘๐,๙๘๖.๙๐	๒๓.๗๘
๔) งบรายจ่ายอื่น	๑,๖๗๙,๗๘๘	๖๗๔,๒๒๖.๖๓	๔๐.๑๔
รวม	๘๖,๐๗๙,๗๑๒	๒๑,๑๓๐,๑๖๖.๗๘	๒๔.๕๕

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐ โครงการ	-
ผล	๑,๔๓๖,๕๓๑.๔๐ บาท (ร้อยละ ๓๕.๗๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๖๗๒,๔๐๐ บาท	๑๑ โครงการ	-
ผล	๕๔,๗๔๐ บาท (ร้อยละ ๘.๑๔)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๐๑๒,๐๐๐ บาท	๒ โครงการ	-
ผล	-	แล้วเสร็จ ๒ โครงการ (กำลังเบิกจ่าย)	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุดผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คช.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้อง น้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	๒๗๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๓๐ ร้อยละ ๔๐.๓๘	- ดำเนินการจัดเก็บ ข้อมูลด้านการวัด ปริมาณน้ำแม่น้ำโขง ณ สถานีนครพนม สถานี มุกดาหาร	ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ ที่ทันสมัย (เครื่อง adcp/ กล้องสำรวจ)

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			และสถานีโขงเจียม (๔ ครั้ง/ เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๔๐ ครั้ง)	
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๒๓,๐๐๐	๒๑,๙๕๑ บาท ร้อยละ ๙๕.๔๔	- ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่มในพื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลฯ (๑ ครั้ง/เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไปตามแผน ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	๗๗,๘๐๐	๒๑,๑๓๕ บาท ร้อยละ ๒๗.๑๗	- ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.นครพนม จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลฯ (๒ ครั้ง/ เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๖ ครั้ง)	-
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๔๘,๒๗๐	๒๘,๒๕๑.๖๓ ร้อยละ ๕๘.๕๓	- ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลฯ (๑ ครั้ง/ เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง)	-
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	ไม่ได้รับงบประมาณ
๖) คชจ. ในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมิวิทยา	๙๓๖,๒๔๕	๒๗๓,๓๐๐บาท ร้อยละ ๒๙.๑๙	- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล แบ่งความรับผิดชอบทั้งหมด ๓ ศูนย์ ดังนี้ ๑.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา	-

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน <u>ที่ร่วมดำเนินการ</u> โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			มุกดาหาร (รับผิดชอบพื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร และ จ.นครพนม) ๒.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาโขงเจียม (รับผิดชอบพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลฯ) ๓.ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาอุบลราชธานี (รับผิดชอบพื้นที่ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลฯ) (ข้อมูลระดับน้ำ เก็บข้อมูลรายเดือน) (ข้อมูลปริมาณน้ำ ๑ ครั้ง / เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๑๒ ครั้ง)	
๗) คชจ. ในการบำรุงรักษาตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก	๙๒,๓๗๓	๑๑,๘๔๐ บาท ร้อยละ ๑๒.๘๒	- ดำเนินการตรวจสอบระบบวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลฯ (๑ ครั้ง/ เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง)	-

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ
จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุดผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-	-	-
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย	-	-	-
๓) สายยางสูบลม ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด	๑ ชุด	ต.ค. - พ.ย. ๖๔ ใช้เป็นท่อส่งน้ำ ของเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบาย น้ำในลำน้ำมูล ณ หาดทราย แก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ และ สูบน้ำท่วมขังในชุมชน ท่ากอไผ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบล	- เชื้อขั้วรถที่มีขนาดเล็กทำให้ น้ำรั่ว - ม้วนเก็บสายยาก ควรจัดหา เครื่องมือ ม้วนเก็บ สาย ที่มี ประสิทธิภาพช่วยทุ่นแรงการ ปฏิบัติงาน - ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ต้องการชนิดหนาที่ทนแรงดันได้ สูง ขณะส่งได้ไกล ๑.๕ กม.
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	๑ เครื่อง	ต.ค. - พ.ย. ๖๔ ใช้สูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำในลำน้ำมูล ณ หาดทรายแก้ว อ.พิบูลมังสา หาร จ.อุบลฯ และ สูบน้ำท่วม ขัง ในชุมชนท่ากอไผ่ อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลฯ	- ไม่สามารถสูบลมระยะไกล ได้ ต้องการเครื่องสูบน้ำชนิดที่ สามารถสูบน้ำได้ไกลประมาณ ๑.๕ กม. จำนวน ๒ เครื่อง - ชุดเครื่องมือ ช่วยในการติดตั้ง รื้อถอน ต้องการเครื่องมือที่ช่วย ผ่อนแรง และทำงานให้เร็ว เช่น บล็อกไฟฟ้าไร้สาย ฯลฯ

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน
(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	- การจัดสรรงบประมาณทั้งปี จะได้รับ ๘๗๓,๐๐๐ บาท - ได้รับงบประมาณแล้ว ๒๓๒,๑๐๐ บาท	- ปริมาณการสูบน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำแล้ง น้ำ ท่วม จำนวน ๑๐ แห่ง ได้ปริมาณน้ำ ๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ ๔,๘๐๐ ครัวเรือน จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน	- งบประมาณมีความล่าช้า จึงให้ จนท. ออกปฏิบัติงานตามคำ ขอรับการสนับสนุนก่อน เมื่อ ได้รับงบประมาณจึงเบิกจ่าย ย้อนหลัง - มีหลายพื้นที่ที่ต้องช่วยเหลือ ตนเอง เช่น ซื้อเครื่องสูบน้ำ หรือ ได้งบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพ แหล่งน้ำ - ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝน ค่อนข้างมาก และ แหล่งน้ำ สามารถเก็บน้ำได้
ผล	- เบิกจ่าย ๒๐๘,๗๑๕ บาท (ร้อยละ ๘๘.๙๒ ของ งบประมาณที่ได้รับ) - คงเหลือ ๒๓,๓๘๕ บาท (เกิน ไว้จ้างเหมาพนักงานช่วยงาน ธุรการ สบน. เดือน ก.พ. - มี.ค. ๖๕)	(ระบุผลการดำเนินงาน) การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง - ปริมาณการสูบน้ำ ๑๗๓,๖๐๐ ลบ.ม. การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม - ปริมาณการสูบน้ำ ๒,๙๒๖,๔๐๐ ลบ.ม. - น้ำดื่มบรรจุขวด ๖๐๐ ขวด	- ไม่ได้ใช้งบประมาณในไตรมาส ๒ ทำให้มีเงินค้างจ่ายค่าเดินทาง ไปปฏิบัติราชการของ จนท. จำนวน ๑๐๙,๘๐๐ บาท - ได้แจ้งให้ ศปว. ทราบเพื่อ หาทางแก้ไขแล้ว - เห็นควรจัดสรรงบฯ ตามพื้นที่ ที่มีภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วมตาม สภาพจริง ไม่ใช่จัดสรรงบฯ เท่ากันทั้ง ๔ ไตรมาส ทำให้ บริหารงบฯ ไม่ทัน

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕๓,๓๖๙,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๒.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๓๔๐.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๓.๑๔๙๗.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๔,๑๘๕.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	-

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ผล	๕๓,๓๑๓,๐๐๐ บาท (๙๙.๘๙ ร้อยละ)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๒.....แห่ง - แล้วเสร็จ๑.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ๑.....แห่ง - หยุตงาน-.....แห่ง - อื่นๆ-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....-.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง-.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)-.....แห่ง ๕. อื่นๆ-.....แห่ง	-

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน.....๗.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๔๕๘.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑.๖๑๖๙.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๔๐๘.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	
ผล	๖,๒๔๖,๑๕๑ บาท (ร้อยละ ๒๖.๘๒)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ๑. ลงนามเรียบร้อยแล้ว.....๗.....แห่ง - แล้วเสร็จ๒.....แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ๕.....แห่ง - หยุตงาน-.....แห่ง - อื่นๆ-.....แห่ง ๒. รอลงนาม.....-.....แห่ง ๓. ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง-.....แห่ง ๔. รายการใหม่ (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)-.....แห่ง ๕. อื่นๆ-.....แห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาค้อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)	-	-
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (กลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)	-	-
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)	-	-
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)	- ดำเนินงานร่วมกับศูนย์ป้องกันวิกฤต น้ำ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนิน โครงการ ซึ่งผู้รับผิดชอบ คือ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ และการตรวจ รับโครงการเป็นหน้าที่ของสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค	-
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (กลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)	-	-

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๕.๑ โครงสร้างอัตรากำลัง

๕.๒ เครื่องมือ อุปกรณ์

๕.๓ การจัดสรรงบประมาณ

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)	สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ผลการดำเนินการในการ ใช้งบประมาณ ๔๘ % (พัฒนาพื้นที่ น้ำตกบางเต้าแม่และคลองลาว)	ไม่มี
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๕.๑ งบประมาณค่าควบคุมงานไม่เพียงพอ

๕.๒ ขอให้กรมสนับสนุนพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

๕.๓

ขอขอบพระคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
โทรศัพท์ ๐๒-๒๗๑-๖๑๙๑

รายชื่อ

ผู้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ของ ทน.ผต.ทน. (นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์) และ ผต.ทน. (นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการประชุมทางไกล (VDO Conference)
ผ่านระบบ Zoom ของสำนักผู้ตรวจราชการ (Meeting ID ๖๖๒๒๗๑๖๑๙๑)
ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

หน่วยงาน : สทภ.๑

๑. นายธวัช รัตนกิจ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑)
๒. นายสมเดช วรรณก้อน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำวัง (สทภ.๑)
๓. นายภูดิท ภณณโชติ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง (สทภ.๑)
๔. นางสาววรรณอนงค์ อุซุโกศลการ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.๑)
๕. ว่าที่ ร.ท. สายรุ้ง กลุ่มเขียว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ เชียงใหม่ (สทภ.๑)
๖. นายมานพ ไทยหล่อ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส (สทภ.๑)
๗. นายทนต์ศักดิ์ นิรากรณ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานอุทกวิทยาอาวุโส (สทภ.๑)
๘. นายเสน่ห์ สุวรรณศิริ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๑)
๙. นายพงศ์เทพ แซ่เอ็ง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.๑)
๑๐. นายวีระชัย สีดาพรมมา	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๑)
๑๑. นางบุญยุนช เครือสาร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๑)
๑๒. นายโชคชัย กลมแป้น	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สทภ.๑)
๑๓. นายรณชัย ดวงผ่อง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.๑)
๑๔. นางสาวเจนจิรา คำบุญชู	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๑)
๑๕. นางสาวแสงดาว พรหมตัน	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.๑)

หน่วยงาน : สทภ.๒

๑. นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
๒. นางรภัทร ใจเพชร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.๒)
๓. นางกัลยา ไวกย	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.๒)
๔. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะวงษ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร จัดการลุ่มน้ำป่าสัก (สทภ.๒)
๕. นายยุทธพงษ์ สุขเพราะนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.๒)
๖. นายวัฒนา บุญสิงห์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.๒)
๗. นายสุวิรัตน์ พิพัฒน์กิจกุล	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.๒)

๘. นายยุทธนา ชมวงษ์
๙. นายกษิตศ โททอง
๑๐. นางนงนุช อานมณี
๑๑. นางสาววรรณิภา บุญฤทธิ์
๑๒. นายสำเริง ณรงค์เดชา
๑๓. นายสุทธวี วาณิชจรัสกิจ
๑๔. นายวันชัย ประภาโส
๑๕. นายภาสกร คำนึ่งเนตร
๑๖. นางพัชรพร มูลผล
๑๗. นางสาวจินตนา โนนอก
๑๘. นางสาวปัทมา สิงห์เลื่อน
๑๙. นางประนอม ชีรัมย์
๒๐. นางประภัสสร ศรีกันทอง
๒๑. นางสาวลักขณา สุตสวาท
๒๒. นางกาญจนา บุญสุริยพันธ์
๒๓. นายบุรุษรัตน์ นาวิก
๒๔. นางทิติยา สร้อยแสง
๒๕. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะวงษ์
๒๖. นายนิกร คงทน
๒๗. นางสาวรุ่งนภา สีลา
๒๘. นางวริษฐา พานทอง
๒๙. นางสาวณัฐธิดา อุบล

หน่วยงาน : สทภ.๓

๑. นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา
๒. นางทองเทียน วัฒนกันตง
๓. นายกษิภัก ภูมุลนาถนเดช
๔. นายวีระพันธ์ ระนาท
๕. นายศิวดล อุปพงษ์
๖. นายวิเชียร ทองเกษ

หน่วยงาน : สทภ.๔

๑. นายชูชาติ นารอง
๒. นายสุमित สีสา
๓. นายปัญญา สายรอด

- ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการพิเศษ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๒)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๒)

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.๓)
- ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.๓)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.๓)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สทภ.๓)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (หนองคาย) (สทภ.๓)

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (สทภ.๔)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำชีตอนบน (สทภ.๔)

๔. นายปิยภัทร รัตนพล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ กลุ่มน้ำชีตอนล่าง (สทภ.๔)
๕. นายธนภุช ฤๅเศศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.๔)
๖. นายเกียรติยศ ยศตื่นเทียน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ ขอนแก่น (สทภ.๔)
๗. นายจารุวัตร มะปะเต	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.๔)
๘. นายสัญญาญ เปี่ยมศรีสุข	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.๔)
๙. นายทรงเดช ทันแขก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.๔)
๑๐. นายสิทธิพร สุมมาตย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.๔)
๑๑. นายอัศวิน ทารคำตัน	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.๔)
๑๒. นายอรรถสิทธิ์ ไพศรี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.๔)
๑๓. นายอนุสิทธิ์ ลาสะอาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๔)
๑๔. นายจรัส ผิงงาม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๔)
๑๕. นายสนั่น บัวแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๔)
๑๖. นายชัยรัตน์ สุวัฒน์กุล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๔)
๑๗. นายนิเวก ภูนาแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๔)
๑๘. นายวิระพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๔)
๑๙. นายเรืองฤทธิ์ นิยมบริบูรณ์พร	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สทภ.๔)
๒๐. นางสาววิลาสินี ไสววรรณ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๔)
๒๑. นายสุขสันต์ สาวถี่	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๔)
๒๒. นายกวีวิทย์ ศิริณัฐพงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๔)
๒๓. นายอำนาจ ปัจธรรม	ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาชำนาญการ (สทภ.๔)
๒๔. นางสาววัฒนธิดา เทียงธรรม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน (สทภ.๔)
๒๕. นางพิชญ์ชรัตน์ ฉายประดิษฐ์	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (สทภ.๔)
๒๖. นางอุษาวดี ทันฉิมพลี	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สทภ.๔)
๒๗. นางสาวเฉลิมพร อุทัยชัย	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทภ.๔)
๒๘. นางสาวจิตรารัตน์ หอมสมบัติ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๔)
๒๙. นางสาวชัชฎาภา คำสวัสดิ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๔)
๓๐. นางสาวนุชนาถ วรารักษ์ประภักดิ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๔)

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

หน่วยงาน : สทภ.๕

๑. นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สทภ.๕)
๒. นายพีระพล เอี่ยมสอาด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.๕)
๓. นายโยธิน พงษ์ศิริ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิชา (สทภ.๕)
๔. นายยี ลากสาร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.๕)
๕. นายเผย บุรีแสง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (สทภ.๕)

๖. นางสาวจรรยาภรณ์ พรหมคุณ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล (สทภ.๕)
๗. นางสาวจินตนา ศิวเสน	ตำแหน่ง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำมูลตอนบน (สทภ.๕)
๘. นายนราวุฒิ นาคสิงห์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส (สทภ.๕)
๙. นายสุวิทย์ สุ่มมาตย์	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.๕)
๑๐. นางณิชานันท์ ประทุมเมศ	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (สทภ.๕)
๑๑. นางสาวลำไย อินธลาด	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (สทภ.๕)
๑๒. นางสาวจอมใจ นิยมสุข	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๕)
๑๓. นายสุวิทย์ ธงภักดิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๕)
๑๔. นายแสวง คะเรียมรัมย์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๕)
๑๕. นายวิณญา แก้วประดับ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๕)
๑๖. นายบัลลังก์ เพิ่มสำราญ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๕)
๑๗. นายพิทยา แก้วสุข	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๕)
๑๘. นายพิสิษฐ์ มุ่งดี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๕)
๑๙. นายทนต์ศักดิ์ อ่อนปาน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๕)
๒๐. ว่าที่ร้อยตรีสุวิจักขณ์ ไกรวิลาส	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๕)
๒๑. นายชาญชัย ทองทวี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๕)
๒๒. นายประเสริฐ ประจันตุม	ตำแหน่ง	ช่างฝีมือสนาม ข ๔ (สทภ.๕)
๒๓. นายสำฤทธิ์ มาศิริ	ตำแหน่ง	ช่างฝีมือสนาม ข ๔ (สทภ.๕)
๒๔. นายพงศธร ชอบทองหลาง	ตำแหน่ง	ช่างฝีมือสนาม ข ๔ (สทภ.๕)
๒๕. นายสนธิ ทิวกลาง	ตำแหน่ง	ช่างฝีมือสนาม ข ๔ (สทภ.๕)
๒๖. นายสำราญ ดีเกิด	ตำแหน่ง	ช่างฝีมือสนาม ข ๔ (สทภ.๕)

หน่วยงาน : สทภ.๖

๑. นายสุเมธ สายทอง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
๒. นางวริยา สจิริวัฒนากุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.๖)
๓. นางสาววันเพ็ญ อุโภคัย	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.๖)
๔. นางสาวศลิษา พานิชผล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก (สทภ.๖)
๕. นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สทภ.๖)
๖. นางสาวพรหมสิริณ จิโรจพันธุ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.๖)
๗. นางสาวปัตตาพร จำปาทอง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำปราจีนบุรี (สทภ.๖)
๘. นายสมหมาย ชันดี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (สทภ.๖)
๙. นางสาวสุพรทิพย์ เพ็ญศิริ	ตำแหน่ง	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำโดนเลสาป (สทภ.๖)
๑๐. นายอำนาจ ปัญโญ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (สทภ.๖)

๑๑. นายณัฐชากร อมรกุล	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหาร จัดการลุ่มน้ำบางปะกง (สทภ.๖)
๑๒. นายศุภักษร ผลเจริญ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทภ.๖)
๑๓. นางอรพิน ชัยสิทธิลาภ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๖)
๑๔. นางสาวอรนิษฐา มานะสร้าง	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๖)
๑๕. นางสาวนงนุช พรหมมาพงษ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๖)
๑๖. นายเตชสิทธิ์ สีหาปทุม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๖)
๑๗. นางสาวภาณุมาศ ธรรมมะ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๖)
๑๘. นายนิธย์ ทับสี่	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน (สทภ.๖)
๑๙. นายปริญญา วะระรักษ์เลิศ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๖)
๒๐. นางสาววรรณวิมล ศรีคล้อย	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๖)
๒๑. นางทิพย์รัตน์ คังคายะ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๖)
๒๒. นางสาวอริสรา บุญหนุน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.๖)
๒๓. นางสาวจรรยารัตน์ อังคสุวรรณ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.๖)
๒๔. นางสาวจริยากร สุจันทรา	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.๖)
๒๕. นายคำผล สีกาแก้ว	ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ข ๔ (สทภ.๖)
๒๖. นางสาวเอื้อมจิตร ชาระ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สทภ.๖)

หน่วยงาน : สทภ.๗

๑. นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
๒. ว่าที่ ร.ต.หญิง วราภรณ์ อ่อนไทรแก้ว	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.๗)
๓. นายวิชาเยล พัฒนาศัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (สทภ.๗)
๔. นายสมเดช ดั่งทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สทภ.๗)
๕. นางพัทธธิดา เมฆช้าง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำท่าจีน (สทภ.๗)
๖. นายบุญเกื้อ เกตุคำ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.๗)
๗. นายเรวัตร วังศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (สทภ.๗)
๘. นางประไพ สุวรรณประสม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนแผนงานและ ประเมินผล (สทภ.๗)
๙. นางสาวศรินวล เริ่มภักดี	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๗)
๑๐. นายเชตุ จันทร์ถิ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๗)
๑๑. นายมนตรี โกโค	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๗)
๑๒. นางสาวนิภาพรรณ สุพรรณอาสน์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๗)
๑๓. นางสาวทัศนีย์ พูลผล	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๗)
๑๔. นายวงศกร ทองลิ้ม	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทภ.๗)

๑๕. นางสาวนิตา แยมมณี	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทท.๗)
๑๖. นายสมชาย สิทธิสร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส (สทท.๗)
๑๗. นางสาวชญาดา สมจิตวรี	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทท.๗)
๑๘. นางสาวจิตาภา กาญจนเดชศิริ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทท.๗)
๑๙. นายสถาพร เผ่าจินดา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทท.๗)
๒๐. นายวิริยุทธ ยุทธสูงเนิน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทท.๗)
๒๑. นางสาวนฤมล จุงใจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทท.๗)
๒๒. นางสาวพงศธร รุ่งสมัย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ (สทท.๗)
๒๓. นางณิชาภัทร เฉวียงวาส	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทท.๗)
๒๔. นายเสรี เล็กวิไล	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทท.๗)
๒๕. นายรามเมศร์ เตโช	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทท.๗)
๒๖. นางสาวริสา ตันติธนาพร	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (สทท.๗)
๒๗. นางสาวสุนันท์ เงินประดับ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน (สทท.๗)
๒๘. นายธีระพงศ์ สามชูศรี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สทท.๗)
๒๙. นางสาวพิชาพัทธ์ ชมภูพันธ์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (สทท.๗)
๓๐. นางสาวอรุณ วงศ์วัฒนากิจ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (สทท.๗)
๓๑. นางสาวนฤมล ขาดีดี	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สทท.๗)
๓๒. นางสาวรสริน ชำนิธุระการ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (สทท.๗)

หน่วยงาน : สทท.๑๐

๑. นายสาธิต รัตนสิงห์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
๒. นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี (สทท.๑๐)
๓. นายสุวัช เลิศवासนา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สทท.๑๐)
๔. นายดุลยธรรม ทวีขันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทท.๑๐)

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

หน่วยงาน : สทท.๘

๑. นายสุทัศน์ น้อยเล็ก	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
๒. นายกิตติศักดิ์ ใจดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทท.๘)
๓. นายโสภณ สัสดีอำไพ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก (สทท.๘)
๔. นางกสิรินทร์ พลนาค	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สทท.๘)
๕. นายนราพงษ์ บุญช่วย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ ลุ่มน้ำปัตตานี (สทท.๘)
๖. นางจันทิรา สุขศิวานันท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทท.๘)

๗. นางวิมล โสมสง
๘. นายณัฐพงศ์ ริงสินธุชาติ
๙. นายพัฒนศักดิ์ แก้วชูแสง
๑๐. นายกันภัย เกื้อสง
๑๑. นายประภาส ชูเรือง

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.๘)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (สทภ.๘)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สงขลา (สทภ.๘)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๒ นครศรีธรรมราช (สทภ.๘)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๓ ยะลา (สทภ.๘)

หน่วยงาน : สทภ.๙

๑. นายนิมิตร โคตรบัว
๒. นางจิตติกา ตุ่มปัก
๓. นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์
๔. นายสิทธิชัย ปริญาขจร
๕. นายสุนัน บวบนา
๖. นายวรวิทย์ มิตรานนท์
๗. นายชัยณรงค์ กันกา
๘. นางวิภารัตน์ รัตนวงศ์ภิญโญ
๙. นางสาววิภาภรณ์ คุณาจันทร์

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ (สทภ.๙)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
และส่วนวิชาการ (สทภ.๙)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (สทภ.๙)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (พิษณุโลก) (สทภ.๙)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการ
ลุ่มน้ำยม (สทภ.๙)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา (แพร่) (สทภ.๙)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.๙)
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สทภ.๙)

หน่วยงาน : สทภ.๑๑

๑. นายอุทิศ คำมัน
๒. นายชลินศรี ไทยยิ่ง
๓. นายสุชน ชาวอุทัย

- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล (สทภ.๑๑)
- ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนส่วนอุทกวิทยา (สทภ.๑๑)
- ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน (สทภ.๑๑)

หนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ

➤ ทส ๐๖๒๑/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

➤ ทส ๐๖๒๑/ว ๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

➤ ทส ๐๖๒๑/๗๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเลื่อนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ /ว ๕๕

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙

ด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์) มีกำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ของสำนักผู้ตรวจราชการ (Meeting ID : ๖๖๒๒๗๓๖๑๙๑) ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ๓ ๕ ๗ ๘ และ ๙ รายละเอียดตามปฏิทินการตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๑)

ในการนี้ เพื่อให้การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานประเด็นการตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๒) และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบตอบรับ (เอกสารแนบ ๓) ส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Office Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ auraphan.sing@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม



ปฏิทินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

ผ่านการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ที่	วันเดือนปี	เวลา	หน่วยงาน ส่วนกลาง ในภูมิภาค	ผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ	ประเด็นการตรวจ
1	วันพุธที่ 2 มี.ค. 2565	09.30 น. - 11.00 น.	สทท.1	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (ทน.ผต.)	1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 2. การตรวจราชการใน 3 แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ
2	วันพุธที่ 2 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.00 น.	สทท.3	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (ทน.ผต.)	2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.3 แผนงานงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3	วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2565	09.30 น. - 11.00 น.	สทท.5	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (ทน.ผต.)	3. การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการ มอบหมายของผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี)
4	วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.00 น.	สทท.7	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (ทน.ผต.)	4. การติดตามข้อเสนอแนะของ ผต.ทส. 5. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมผลักดัน ชี้แจง
5	วันพุธที่ 9 มี.ค. 2565	09.30 น. - 11.00 น.	สทท.8	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (ทน.ผต.)	- ก่อนวันประชุมตรวจ หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้ สผต. ตาม แบบฟอร์ม - วันประชุมตรวจ หน่วยงานนำเสนอ หน่วยงานละ 20-30 นาที และผู้ตรวจราชการกรม ให้ความเห็น คำแนะนำ
6	วันพุธที่ 9 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.00 น.	สทท.9	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (ทน.ผต.)	ข้อเสนอแนะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ /ว ๒๖

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๓

ด้วยผู้ตรวจราชการกรม (นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา) มีกำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ของสำนักผู้ตรวจราชการ (Meeting ID : ๖๖๒๒๗๓๖๑๙๑) ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ๔ ๖ ๑๐ และ ๑๓ รายละเอียดตามปฏิทินการตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๑)

ในการนี้ เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม (นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานประเด็นการตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๒) และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบตอบรับ (เอกสารแนบ ๓) ส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Office Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ auraphan.sing@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา)
ผู้ตรวจราชการกรม



เอกสารแนบ ๑ - ๓

ปฏิทินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
 ผ่านการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ที่	วันเดือนปี	เวลา	หน่วยงาน ส่วนกลาง ในภูมิภาค	ผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ	ประเด็นการตรวจ
1	วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 2565	09.30 น. - 11.00 น.	สทท.2	นายเชาว์ สวัสดิ์สุทรา (มด.)	1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 2. การตรวจราชการใน 3 แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ 2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2	วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.00 น.	สทท.4	นายเชาว์ สวัสดิ์สุทรา (มด.)	2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.3 แผนงานงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3	วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2565	09.30 น. - 11.00 น.	สทท.6	นายเชาว์ สวัสดิ์สุทรา (มด.)	3. การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการ มอบหมายของผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี) 4. การติดตามข้อเสนอแนะของ มด.ทส. 5. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมผลักดัน ชี้แจง
4	วันอังคารที่ 8 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.00 น.	สทท.10	นายเชาว์ สวัสดิ์สุทรา (มด.)	- ก่อนวันประชุมตรวจ หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้ สทท. ตาม แบบฟอร์ม - วันประชุมตรวจ หน่วยงานนำเสนอ หน่วยงานละ 20-30 นาที และผู้ตรวจราชการกรม ให้ความเห็น ค้านแนะนำ
5	วันพฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 2565	09.30 น. - 11.00 น.	สทท.11	นายเชาว์ สวัสดิ์สุทรา (มด.)	ข้อเสนอแนะ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๗๖

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเลื่อนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑

ตามหนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ (สผต.) ที่ ทส ๐๖๒๑/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือ สผต. ที่ ทส ๐๖๒๑/ว ๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งกำหนดการตรวจราชการหน่วยงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ของสำนักผู้ตรวจราชการ (Meeting ID : ๖๖๒๒๗๑๖๑๙๑) นั้น

เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งให้ผู้ตรวจราชการกรม (นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา) ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ (รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งกระทรวงฯ ที่ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ในการนี้ เพื่อให้การตรวจราชการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักผู้ตรวจราชการ จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุสุมา แก้วทงศ์ โทรศัพท์ ๐๘-๕๙๑๑-๕๓๑๑ และนางสาวอรพรรณ ไทรแก้ว โทรศัพท์ ๐๘-๖๙๘๙-๘๔๐๔ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนิทัศน์ สุตติพงษ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ปฏิทินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ผ่านการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ที่	วันเดือนปี	เวลา	หน่วยงาน ส่วนกลาง ในภูมิภาค	ผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ	ประเด็นการตรวจ
1	วันพุธที่ 2 มี.ค. 2565	10.00 น. - 12.00 น.	สทท.1	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.) นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา (ผต.)	1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 2. การตรวจราชการใน 3 แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ 2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2.3 แผนงานงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 3. การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการ มอบหมายของผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี) 4. การติดตามข้อเสนอแนะของ ผต.ทส. 5. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมผลักดัน ชี้แจง - ก่อนวันประชุมตรวจ หน่วยงานจัดส่งข้อมูลให้ สผต. ตาม แบบฟอร์ม - วันประชุมตรวจ หน่วยงานนำเสนอ หน่วยงานละ 20-30 นาที และผู้ตรวจราชการกรม ให้ความเห็น คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
2	วันพุธที่ 2 มี.ค. 2565	10.00 น. - 12.00 น.	สทท.3	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.) นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา (ผต.)	
3	วันพุธที่ 2 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.30 น.	สทท.2	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.) นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา (ผต.)	
4	วันพุธที่ 2 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.30 น.	สทท.4	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.) นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา (ผต.)	
5	วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 2565	10.00 น. - 12.00 น.	สทท.5	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.)	
6	วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 2565	10.00 น. - 12.00 น.	สทท.7	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.)	
7	วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.30 น.	สทท.6	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.)	
8	วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.30 น.	สทท.10	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.)	
9	วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2565	10.00 น. - 12.00 น.	สทท.8	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.)	
10	วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2565	10.00 น. - 12.00 น.	สทท.9	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.)	
11	วันศุกร์ที่ 4 มี.ค. 2565	13.30 น. - 15.30 น.	สทท.11	นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ (หน.ผต.)	

สำเนา

คส. ๒.๑

คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ๕๘ /๒๕๖๕

เรื่อง ย้ายข้าราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างประเทศหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้ย้ายข้าราชการ จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม) จตุพร บุรุษพัฒน์

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

(นางสุพิชชา เลิศลักษณ์ปรีชา)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายละเอียดย่อยการย้ายข้าราชการ

๕๘

แบบท้ายคำสั่งการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่

/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ชื่อ/นามสกุล/ เลขประจำตัว ประชาชน	วุฒิ/สาขา/ สถานศึกษา	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม				ตำแหน่งและส่วนราชการที่ย้าย				ตั้งแต่วันที่	หมายเหตุ		
			ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ	เลขที่	เงินเดือน	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง ประเภท	ระดับ			เลขที่	เงินเดือน
๑	นายเชาว์ สวัสดิ์พิฑูรา	วศบ. (วิศวกรรมโยธา)	ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรม) กรมทรัพยากรน้ำ	อำนาจการ ประเภท	สูง	๗	๕๕,๑๒๐	ผู้อำนวยการสำนักงาน (ผู้อำนวยการ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ กรมทรัพยากรน้ำ	อำนาจการ ประเภท	สูง	๑๓๑๐	๕๕,๑๒๐	โดยให้ได้รับ อัตราเงินเดือน เป็นต้นไป ในตำแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้ง	
	๓๓๐๑ ๐๐๔๓๔ ๓๖ ๗													
	ผู้ มอบ		☐ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร.....ของ..... ☒ ยังไม่ผ่านการฝึกอบรม											
	หมายเหตุ	๑. ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเป็นตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ๒. ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งรายเดือน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓												

แผนการตรวจราชการ

กรมทรัพยากรน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการตรวจราชการ
กรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจราชการถือเป็นกลไกที่มีความสำคัญในระบบการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ให้องค์กรต่างๆ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้หลักการบริหาร บ้านเมืองและสังคมที่ดี นอกจากนี้การตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพยังสามารถช่วยให้ผู้บริหารได้มีโอกาส รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่มีให้บรรเทาเบาบางลง หรือหมดสิ้นไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้เชื่อมโยงนำนโยบายของผู้บริหารในส่วนกลางไปชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติส่วนกลางในภูมิภาค ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นได้รับทราบ พร้อมทั้งเป็นผู้สะท้อนปัญหาความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้ง ของประชาชนในพื้นที่ให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ได้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๙ วรรค ๓ กำหนดให้ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบและมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี และหมวด ๓ ข้อ ๑๗ กำหนดให้ผู้ตรวจราชการรายงานผลการตรวจราชการ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการ และเป็นเครื่องมือในการกำกับการ ปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ

๒.๒ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงานการตรวจราชการร่วมกับแผนการตรวจราชการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนประสานงานการปฏิบัติและชี้แนะให้แนวทางสำหรับ การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

๓. เป้าหมายการตรวจราชการ

๓.๑ หน่วยงานที่รับการตรวจราชการมีการปฏิบัติงานที่นำไปสู่เป้าหมาย ผลผลิต และตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ประหยัด และสนอง ความต้องการของประชาชน

๓.๒ หน่วยงานที่รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค

๓.๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำตามความเหมาะสม

๔. ขอบเขตการตรวจราชการ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๒ ข้อ ๑๒ กำหนดให้ผู้ตรวจราชการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๔.๑ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

๔.๒ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน

๔.๓ สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๔ สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๔.๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ

๔.๖ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนำ หรือปรึกษาหารือร่วมกัน

๕. ลักษณะการตรวจราชการ

๕.๑ ตรวจติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ และเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

๕.๒ ตรวจติดตามผลของแผนงาน งาน/โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน

๕.๓ การแนะนำให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทั้งในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความประพฤติของข้าราชการ ตลอดจนให้มีการประสานงานทุกหน่วยงานและทุกระดับ

๕.๔ ตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้รับการตรวจ

๕.๕ ตรวจสอบ สืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ขอความเป็นธรรมและ/หรือขอความช่วยเหลือ เพื่อคลี่คลายหรือแก้ไขความเดือดร้อน

๕.๖ กำกับให้มีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนสำคัญให้รายงานด้วยวาจาผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตามสมควร

๖. รูปแบบการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๖.๑ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ การตรวจราชการใน ๓ แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ คือ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๖.๓ การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

๖.๓.๑ เรื่องที่หน่วยงานผู้ปฏิบัติได้ร้องขอความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือประสานการปฏิบัติ ตามนโยบาย แผนงาน งาน/โครงการ ที่ดำเนินอยู่แต่มีปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนปกติ ควรได้รับการประสานหรือสนับสนุนจากหน่วยงานในระดับที่สูงกว่า

๖.๓.๒ เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ขอความเป็นธรรมและ/หรือขอความช่วยเหลือ เพื่อคลี่คลายหรือแก้ไขความเดือดร้อน

๖.๓.๓ เรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญ หรือสาธารณภัย อันจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาล หรือหน่วยงานต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขให้ทันเหตุการณ์

๖.๓.๔ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. เขตการตรวจราชการ

สืบเนื่องจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนด พื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ โดยกำหนดเป็นเขตตรวจราชการส่วนกลาง และเขตตรวจราชการ ที่ ๑ - ๑๘ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดเขตตรวจราชการตามคำสั่งข้างต้น รวมทั้งการบูรณาการ การตรวจราชการร่วมกัน จึงกำหนดความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้

ที่	ผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ	เขตตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค	หมายเหตุ
๑.	นายนิทัศน์ สุตดีพงษ์	เขตตรวจราชการที่ ๓, ๔, ๕, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๖ และ ๑๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑, ๓, ๕, ๗, ๘ และ ๙	ผู้ตรวจราชการกรม ลำดับที่ ๑ ทำหน้าที่ ตรวจราชการในเขต ตรวจราชการฯ และ หน่วยงานของผู้ตรวจ ราชการกรม ลำดับ ที่ ๒ จนกว่าจะมีคำสั่ง แต่งตั้ง
๒.	ว่าง	เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๖, ๘, ๙, ๑๒, ๑๔ และ ๑๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒, ๔, ๖, ๑๐ และ ๑๑	

๘. ระยะเวลาการดำเนินงานในการตรวจราชการ

๑ รอบปีงบประมาณ (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๙. การรายงานผลการตรวจราชการ

การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ ดังนี้

๙.๑ รายงานผลการตรวจราชการเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ที่ อธิบดีมอบหมายเห็นว่า มีปัญหาสำคัญให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ ต่อไป ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้ากลุ่มภารกิจให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน

๙.๒ จัดทำรายงานผลการตรวจราชการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงเรื่องที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และพยานหลักฐาน ข้อมูลสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ

/พร้อมทั้ง ...

พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยต้องมีความชัดเจน กะทัดรัดเข้าใจง่าย กรณีที่ได้แนะนำ
สั่งการด้วยวาจา ให้สรุปไว้ในรายงาน

๙.๓ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรายงาน หรือขอคำวินิจฉัยสั่งการจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจ
ให้รีบรายงานทางเครื่องมือสื่อสารหรือทางอื่นตามความเหมาะสม และเมื่อกลับจากราชการแล้วให้แสดง
รายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย

๑๐. หน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ

หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยรับการตรวจ
อำนวยความสะดวก ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ โดยเตรียมบุคคล สถานที่ เอกสาร ข้อมูลประกอบการตรวจ
ชี้แจง ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีบุคลากรสำนักผู้ตรวจราชการเป็นผู้ประสานงาน

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ ผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำได้รับทราบสถานภาพการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ
ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
ประกอบการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสม ณ ปัจจุบันและการพัฒนา ตลอดจนเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของแผนงาน งาน/โครงการ ให้ดีขึ้น

๑๑.๒ หน่วยงานระดับปฏิบัติในพื้นที่ได้รับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานจากการตรวจเยี่ยม

๑๑.๓ การตรวจราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

๑๑.๔ เกิดการบูรณาการร่วมกันในการตรวจราชการ โดยสามารถสร้างความร่วมมือประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑.๕ ผู้รับบริการหรือประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
กรมทรัพยากรน้ำ



(นายนิทัศน์ สุตดีพงษ์)

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้เสนอแผนการตรวจราชการ



(นายภาดล ถาวรฤชรัตน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รอบ ๑							รอบ ๒				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและแจ้งเวียนแผนฯ ให้หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำเพื่อทราบและเตรียมการ เพื่อรับการตรวจเมื่อแผนฯ ได้รับการอนุมัติ	↔		↔									
๒.	การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			↓									↑
๓.	การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๒. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				↓								↑
					↓								↑
					↓								↑

แผนปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รอบ ๑						รอบ ๒					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔.	การตรวจราชการตามแผนการดำเนินงาน และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา		←										→

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการปฏิบัติงาน
(นายนิทัศน์ สุทธิพงษ์)
ผู้ตรวจราชการกรม

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายชาติล ธารภักดิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

- หมายเหตุ
- การตรวจฯ ในลำดับที่ ๒ ใช้เวลาในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - การตรวจฯ ในลำดับที่ ๓ ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน ภาคละไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี ครั้งละไม่เกิน ๓ วัน หรือตามความจำเป็น
 - การตรวจฯ ในลำดับที่ ๔ ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน ๓ วัน ต่อครั้ง หรือตามความจำเป็น
