



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๒๕๖

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่าน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ ที่ ทส ๐๖๒๑/๔๔๗ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง ในการปฏิบัติงานตรวจราชการ และเป็นเครื่องมือในการกำกับ กระตุ้น เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนงาน งาน/โครงการของหน่วยงานภายในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนประสานงานการปฏิบัติและชี้แนะ ให้แนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยประชุมผ่านระบบการ ประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑ รวมถึงประเด็นที่หน่วยรับตรวจ ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค/ผู้แทน ผู้อำนวยการส่วน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการฯ (หนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ ที่ ทส ๐๖๒๑/ว ๒๓๕ และ ว ๒๓๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕)

๒.๒ สำนักผู้ตรวจราชการ ได้จัดทำสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๙๑๑.๔๕๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๖๑๘.๐๐๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๓ จำแนกเป็น

- งบบุคลากร เบิกจ่าย ๗๐.๔๕๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๗๓.๘๐๖๐ ล้านบาท)

- งบดำเนินงาน เบิกจ่าย ๔๙.๗๙๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๘ ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๕๖.๔๗๓๖ ล้านบาท)

- งบลงทุน เบิกจ่าย ๒,๔๔๕.๑๔๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๓ ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (๓,๗๑๔.๒๖๑๖ ล้านบาท)

- งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย ๕๒.๖๑๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๓ ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๖๖.๙๑๒๙ ล้านบาท)

เรื่องกลับ สผค.

วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๐๙.๐๐ น.

๒.๒.๒ การตรวจราชการ...

เรื่องกลับ กสน.

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๕๐ น.

๒.๒.๒ การตรวจราชการใน ๓ แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ

๑) ผลการดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี้

๑.๑) ผลผลิตที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ ดำเนินการโดย สทภ.๑ และ สทภ.๙ แผนการดำเนินงานรวม ๓๕๕ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๐ ทั้งนี้การดำเนินงานในส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑๒๐ แห่ง สทภ.๑ มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.๒) ผลผลิตที่ ๒ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ : ค่าสำรวจ ออกแบบ รวมทั้งสิ้น ๔๖๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% จำนวน ๓๙๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๐ ค่าควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น ๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% จำนวน ๑๕๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๐ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รวมทั้งสิ้น ๔๙ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๑

๑.๓) ผลผลิตที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย :

- การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำ แม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ดำเนินการโดย สทภ.๑ สทภ.๓ และ สทภ.๑๑ พบว่า หน่วยงานดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการวัดปริมาณน้ำได้ตามแผน เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ ณ สถานีตรวจวัดปริมาณแม่น้ำฯ

- การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม พบว่า โดยภาพรวมทุกหน่วยงานมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีฯ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามปกติทุกสถานี โดยมีเพียงบางสถานีที่มีอุปกรณ์บางชนิดชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ และอุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถจัดหาซื้อได้ในพื้นที่ ต้องเบิกจากหน่วยงานส่วนกลาง (สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา)

- การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง พบว่า โดยภาพรวมสามารถตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุฯ รวมทั้งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้ตามแผน

- การบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ พบว่า โดยภาพรวมสามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบบำรุงรักษาระบบฯ ได้ครบถ้วน ยกเว้นระบบ Server ที่สถานีโขง ซี-มูล ที่ชำรุดไม่สามารถดูข้อมูลได้ ทั้งนี้ หน่วยงานส่วนกลาง (ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ) ได้มีการขอรับสนับสนุนงบประมาณด้วยแล้ว

๒) ผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี้

๒.๑) การจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ดำเนินการโดย สอน. โดยปัจจุบันรายการรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน จำนวน ๒ คัน มีการส่งมอบให้ สทภ.๕ และ สทภ.๑๑ เพื่อใช้งานในพื้นที่แล้ว รายการสายยางสูบลมน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ มีการส่งมอบให้ สทภ.๒ สทภ.๖ และ สทภ.๗ หน่วยงานละ ๒ ชุด โดยใช้ประกอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง และเพิ่มระยะการส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปยังพื้นที่รับน้ำทางไกล

๒.๒) การบริหาร...

๒.๒) การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ดำเนินการโดย สทภ.๑-๑๑ และมีการช่วยเหลือประชาชนแล้ว ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	ปริมาณการสูบน้ำ			รถน้ำ	แจกน้ำดื่ม
		น้ำแล้ง (ลบ.ม.)	น้ำท่วม (ลบ.ม.)	รวม (ลบ.ม.)	แจกน้ำ (ลบ.ม.)	(ขวด)
๑	สทภ.๑	๙๑๘,๘๐๐	๗๒,๐๐๐	๙๙๐,๘๐๐	๓,๔๑๑,๗๙๘	๑๕,๖๒๐
๒	สทภ.๒	๒,๒๐๒,๑๒๐	๘,๔๐๗,๒๐๐	๑๐,๖๐๙,๓๒๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๕,๘๔๐
๓	สทภ.๓	๔,๖๑๑,๖๐๐	๔๕๓,๑๘๐	๕,๐๖๔,๗๘๐	๑๓๒,๐๐๐	-
๔	สทภ.๔	๒,๑๒๐,๖๖๐	๓,๘๗๓,๓๒๐	๕,๙๙๓,๙๘๐	-	-
๕	สทภ.๕	๑,๔๕๕,๐๐๐	๑,๙๙๐,๖๒๐	๓,๔๔๕,๖๒๐	-	๖๐๐
๖	สทภ.๖	๖,๒๑๔,๐๐๐	๑,๙๙๒,๒๐๐	๘,๒๐๖,๒๐๐	-	๑๓,๘๔๐
๗	สทภ.๗	๑๒,๙๖๐	๒๙,๕๘๐,๔๘๐	๒๙,๕๙๓,๔๔๐	-	-
๘	สทภ.๘	๗๐๖,๓๒๐	๑,๗๒๙,๑๑๐	๒,๔๓๕,๔๓๐	-	-
๙	สทภ.๙	๔,๑๒๒,๖๒๐	๙๘๔,๓๐๐	๕,๑๐๖,๙๒๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๓,๕๒๘
๑๐	สทภ.๑๐	๑,๓๐๘,๘๐๐	๑๐๕,๖๐๐	๑,๔๑๔,๔๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑,๒๗๐
๑๑	สทภ.๑๑	๑๗๓,๖๐๐	๒,๙๒๖,๔๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐
รวม		๒๓,๘๕๐,๔๘๐	๕๒,๑๑๔,๔๑๐	๗๕,๙๖๔,๘๙๐	๔,๓๐๓,๗๙๘	๖๑,๒๙๘

๓) ผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สรุปดังนี้

๓.๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ แผนงานตาม พ.ร.บ.จำนวน ๒๑๙ แห่ง โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย รวมจำนวน ๑๕ แห่ง (เนื่องจากได้รับงบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๔ แล้ว ๕ แห่ง ติดปัญหาที่ดิน ๑ แห่ง ที่ราชพัสดุ ๑ แห่ง หน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว ๕ แห่ง เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ ๑ แห่ง และน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ๒ แห่ง) เพื่อไปดำเนินการโครงการใหม่ที่มีความจำเป็น รวมจำนวน ๒๘ แห่ง ทำให้มีโครงการที่ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๑ แห่ง ส่วนโครงการที่เหลือ จำนวน ๑๑๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ มีจำนวน ๕ แห่ง ที่อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าพื้นที่ รวมถึงมีการหยุดงานเนื่องจากติดปัญหาขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ โดยสรุปผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จรายหน่วยงาน ณ วันตรวจราชการ ดังนี้

หน่วยงาน...

หน่วยงาน	จำนวนแผนตาม พ.ร.บ. (แห่ง)	จำนวนหลังโอน เปลี่ยนแปลงฯ	จำนวนแล้วเสร็จ (แห่ง)	หมายเหตุ
สทภ.๑	๕๓	๕๒	๓๒	
สทภ.๒	๒๔	๒๔	๑๐	
สทภ.๓	๔	๕	๒	
สทภ.๔	๑๖	๑๔	๖	
สทภ.๕	๑๓	๑๔	๒	
สทภ.๖	๒๖	๒๕	๘	
สทภ.๗	๒๓	๒๕	๑๗	
สทภ.๘	๑๒	๑๒	๑๑	
สทภ.๙	๒๙	๔๒	๒๒	ผูกพัน ๑ แห่ง
สทภ.๑๐	๖	๖	๑	
สทภ.๑๑	๙	๙	๘	
สพท.	๓	๓	๒	ผูกพัน ๓ แห่ง
สอท.	๑	๑	-	ผูกพัน ๑ แห่ง
รวม	๒๑๙	๒๓๒	๑๒๑	

๒.๒.๓ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมของ สทภ.๑ – ๑๑ สรุปดังนี้

๑) ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำ สายยางส่งน้ำ รถบรรทุก เป็นต้น ในการปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง บางส่วนชำรุด บางส่วนมีไม่เพียงพอ

๒) ยานพาหนะขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีสภาพเก่าและใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามไม่เพียงพอ เช่น งานสำรวจหรือติดต่อราชการในพื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดาร ห้างไกล หรือในงานปฐพีกลศาสตร์และวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ เป็นต้น

๓) ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจำซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ไม่มีอัตราทดแทน

๔) ความไม่ชัดเจนในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ ในช่วงต้นปีงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินการขออนุญาตล่าช้าออกไป

๒.๒.๔ ประเด็นที่ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน สรุปดังนี้

๑) ขอให้กรมพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการทดแทนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการแล้ว และกำลังเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ รวมถึงขอให้พิจารณาเพิ่มตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ เช่น ตำแหน่งนายท้ายเรือ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศหรือนักวิชาการแผนที่ ตำแหน่งด้านอุทกวิทยา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค เป็นต้น

๒) กรณี การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติและมีการตรวจสอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวก่อสร้าง เห็นควรให้กรมมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

๓) ขอให้หน่วยงาน...

๓) ขอให้หน่วยงานส่วนกลางพิจารณาจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคสนาม เช่น เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกพ่วงพร้อมแทรกขนาดใหญ่ รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นต้น เพื่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัยและภัยแล้งได้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยอาจพิจารณาจากจำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยร่วมด้วย

๔) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพิ่มเติม จึงขอให้หน่วยงานส่วนกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้รู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานีที่ชำรุด ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสนามประจำเดือน ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ในการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำ/ประสานงานผู้รู้หรือผู้นำชุมชนและเครือข่ายหมู่บ้านครอบคลุม เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามจะได้มีประสิทธิภาพ

๕) เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. จึงขอให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งปรับปรุงโครงสร้างและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อสร้างความชัดเจนและเข้าใจตรงกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่

๒.๒.๕ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

๑) ขอให้ สทท.๑ - ๑๑ เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) ขอให้ สทท.๑ - ๑๑ ตรวจสอบรายละเอียดการขยายสัญญาและการใช้สิทธิ์ค่าปรับ ๐% ให้ชัดเจน โดยให้เป็นไปตามระเบียบและตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๓) ขอให้ สทท.๑ - ๑๑ ที่มีรายการอุปกรณ์ของสถานีเตือนภัย หรือสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำชำรุดเสียหาย ขอให้รวบรวมข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อแจ้ง สวพ. ต่อไป

๔) ขอให้ สทท.๑ เร่งรัดการดำเนินงานโครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ ให้แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากระบบผลิตน้ำดื่มมีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่สูง

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รวมถึงการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เห็นควรแจ้งหน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้สำนักผู้ตรวจราชการต่อไป ดังนี้

๓.๑ สลก. กพร. พิจารณาดำเนินการตามข้อเท็จจริง ๒.๒.๔ ข้อ ๑) และ ๕)

๓.๒ สนผ. พิจารณาดำเนินการตามข้อเท็จจริง ๒.๒.๔ ข้อ ๒)

๓.๓ สอน. สบจ. พิจารณาดำเนินการตามข้อเท็จจริง ๒.๒.๔ ข้อ ๓)

๓.๔ สวพ. พิจารณาดำเนินการตามข้อเท็จจริง ๒.๒.๔ ข้อ ๔)

๓.๕ สทท.๑-๑๑ สพน. สอน. พิจารณาดำเนินการตามข้อเท็จจริง ๒.๒.๕ ข้อ ๑) - ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



สรุปผลการตรวจราชการ ทน.

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕
(นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ)
ผู้ตรวจราชการกรม
(นายภาณุ ธารวฤกษ์รัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๕
ผู้ตรวจราชการกรม
(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
กรมทรัพยากรน้ำ



ราชการของ ผต.กน.
ราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
การธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565



ผต.กน.
พ.ศ.2565

ประจำปี
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒

สรุปผลการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

	หน้า
ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ	๑
ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ	๒
การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ	๓
สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒	๔
ภาคผนวก	๑๖
ภาคผนวก ก OPPM การประชุมตรวจราชการฯ รอบที่ ๒	๑๗
ภาคผนวก ข สรุปประเด็นการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ วิทยุหน่วยงาน	๒๑
ภาคผนวก ค หนังสือเชิญประชุมการตรวจราชการ รอบที่ ๒	๙๐
ภาคผนวก ง แผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๙๓
ผู้ประสานงานตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ	๑๐๐

ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ



นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



นายพิชิต เอี่ยมพานิช
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



นายธีระชุน บุญสิทธิ
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒



ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ



นายนิทัศน์ สดุดีทอง
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

- เขตตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1, 3, 5, 7, 8 และ 9
- เขตตรวจราชการภาค ๑๖ (จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา)
เขตตรวจราชการเขต 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16 และ 17



ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ




นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ
ผู้ตรวจราชการกรม

- เขตตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2, 4, 6, 10 และ 11
- เขตตรวจราชการภาค ๑๖ (จังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา)
เขตตรวจราชการเขต 1, 3, ๕, ๗, ๑๒, 14 และ 15

การแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ

แผนที่แสดงจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑

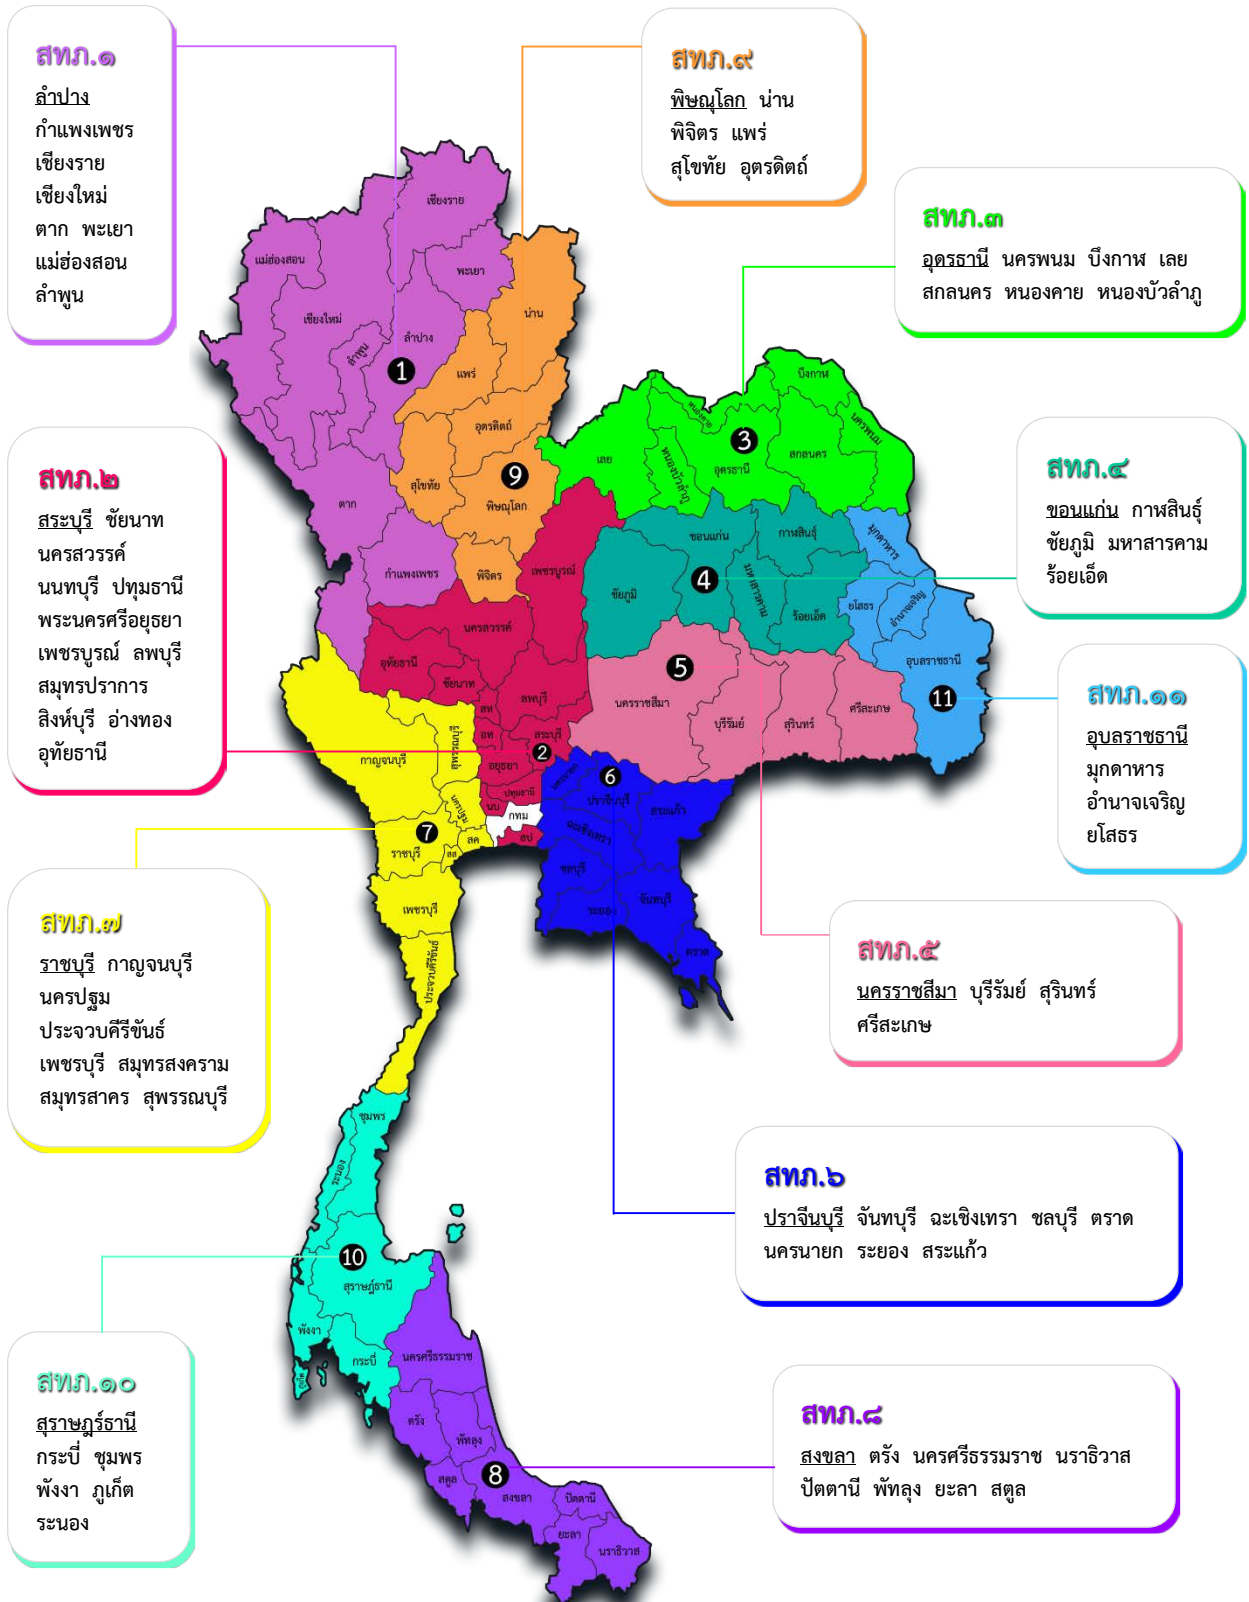



สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑-๑๑

กรมทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การตรวจราชการของกรมเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สรุปสาระสำคัญจากการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการกรม ดังนี้

๑. การประชุมตรวจราชการ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายนิทัศน์ สุกดีพงษ์) และผู้ตรวจราชการกรม (นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ) ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ โดยระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตรวจราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ๒ ๓ และ ๔
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ตรวจราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ๖ ๗ ๘ และ ๑๐
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตรวจราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ และ ๑๑

๒. รูปแบบการตรวจราชการ

การตรวจราชการเป็นการประเมินผล (Monitoring / Evaluation) การปฏิบัติราชการตามแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๔ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๓) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๔) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ปัญหา อุปสรรค และประเด็นที่หน่วยรับตรวจต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดันเพื่อสรุปประมวลผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ รายงานต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๓. สรุปผลการตรวจราชการ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓,๙๑๑.๔๕๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๖๑๘.๐๐๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๓ จำแนกเป็น


- งบบุคลากร เบิกจ่าย ๗๐.๔๕๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๗๓.๘๐๖๐ ล้านบาท)

- งบดำเนินงาน เบิกจ่าย ๔๙.๗๙๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๕๖.๔๗๓๖ ล้านบาท)

- งบลงทุน เบิกจ่าย ๒,๔๔๕.๑๔๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๓,๗๑๔.๒๖๑๖ ล้านบาท)

- งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย ๕๒.๖๑๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (๖๖.๙๑๒๙ ล้านบาท)

โดยเมื่อจำแนกเป็นรายหน่วยงาน สรุปผลการเบิกจ่ายได้ดังนี้

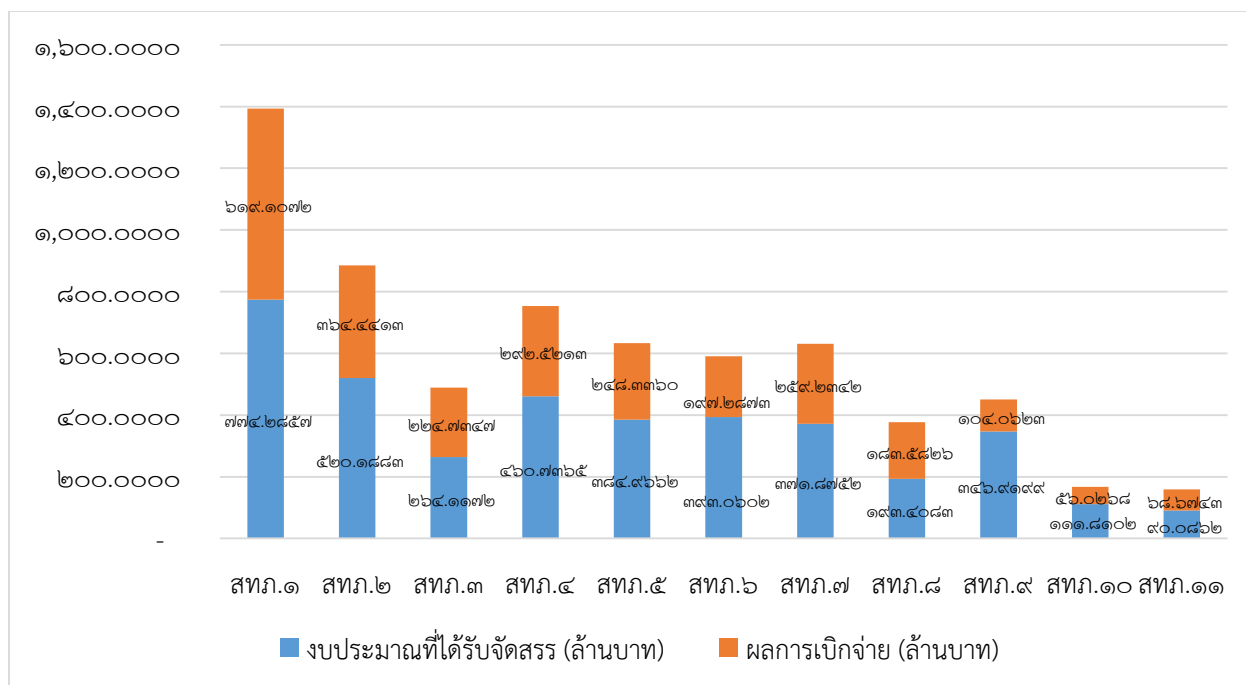

๓.๒ การตรวจราชการใน ๓ แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ

๑) ผลการดำเนินงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี้

๑.๑) ผลผลิตที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ :โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ดำเนินการโดย สทก.๑ และ สทก.๙ แผนการดำเนินงานรวม ๓๕๕ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๐ ทั้งนี้การดำเนินงานในส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑๒๐ แห่ง สทก.๑ มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.๒) ผลผลิตที่ ๒ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ : คำสำรวจออกแบบ รวมทั้งสิ้น ๔๖๓ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% จำนวน ๓๙๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๐ ค่าควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น ๒๐๖ รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% จำนวน ๑๕๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๐ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ รวมทั้งสิ้น ๔๙ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๑

๑.๓) ผลผลิตที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย :

- การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท่อน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ดำเนินการโดย สทก.๑ สทก.๓ และ สทก.๑๑ พบว่า หน่วยงาน

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านการวัดปริมาณน้ำได้ตามแผน เพื่อตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ ณ สถานีตรวจวัดปริมาณแม่น้ำฯ

- การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม พบว่า โดยภาพรวมทุกหน่วยงานมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีฯ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ตามปกติทุกสถานี โดยมีเพียงบางสถานีที่มีอุปกรณ์บางชนิดชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ และอุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถจัดหาซื้อได้ในพื้นที่ ต้องเบิกจากหน่วยงานส่วนกลาง (สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา)

- การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง พบว่า โดยภาพรวมสามารถตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุฯ รวมทั้งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้ตามแผน

- การบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ พบว่า โดยภาพรวมสามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบบำรุงรักษาระบบฯ ได้ครบถ้วน ยกเว้นระบบ Server ที่สถานีโขง ซี-มูล ที่ชำรุดไม่สามารถดูข้อมูลได้ ทั้งนี้หน่วยงานส่วนกลาง (ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ) ได้มีการขอรับสนับสนุนงบประมาณด้วยแล้ว

๒) ผลการดำเนินงาน แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปดังนี้


๒.๑) การจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ดำเนินการโดย สอน. โดยปัจจุบันรายการรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน จำนวน ๒ คัน มีการส่งมอบให้ สทก.๕ และ สทก.๑๑ เพื่อใช้งานในพื้นที่แล้ว รายการสายยางสูบล่งน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ มีการส่งมอบให้ สทก.๒ สทก.๖ และ สทก.๗ หน่วยงานละ ๒ ชุด โดยใช้ประกอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง และเพิ่มระยะการส่งน้ำจากแหล่งน้ำไปยังพื้นที่รับน้ำห่างไกล

๒.๒) การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ดำเนินการโดย สทก.๑-๑๑ และมีการช่วยเหลือประชาชนแล้ว ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	ปริมาณการสูบน้ำ			รถน้ำ	แจกน้ำดื่ม (ขวด)
		น้ำเลี้ยง (ลบ.ม.)	น้ำท่วม (ลบ.ม.)	รวม (ลบ.ม.)		
๑	สทภ.๑	๙๑๘,๘๐๐	๗๒,๐๐๐	๙๙๐,๘๐๐	๓,๔๑๑,๗๙๘	๑๕,๖๒๐
๒	สทภ.๒	๒,๒๐๒,๑๒๐	๘,๔๐๗,๒๐๐	๑๐,๖๐๙,๓๒๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๕,๘๔๐
๓	สทภ.๓	๔,๖๑๑,๖๐๐	๔๕๓,๑๘๐	๕,๐๖๔,๗๘๐	๑๓๒,๐๐๐	-
๔	สทภ.๔	๒,๑๒๐,๖๖๐	๓,๘๗๓,๓๒๐	๕,๙๙๓,๙๘๐	-	-
๕	สทภ.๕	๑,๔๕๙,๐๐๐	๑,๙๙๐,๖๒๐	๓,๔๔๙,๖๒๐	-	๖๐๐
๖	สทภ.๖	๖,๒๑๔,๐๐๐	๑,๙๙๒,๒๐๐	๘,๒๐๖,๒๐๐	-	๑๓,๘๔๐
๗	สทภ.๗	๑๒,๙๖๐	๒๙,๕๘๐,๔๘๐	๒๙,๕๙๓,๔๔๐	-	-
๘	สทภ.๘	๗๐๖,๓๒๐	๑,๗๒๙,๑๑๐	๒,๔๓๕,๔๓๐	-	-
๙	สทภ.๙	๔,๑๒๒,๖๒๐	๙๘๔,๓๐๐	๕,๑๐๖,๙๒๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๓,๕๒๘
๑๐	สทภ.๑๐	๑,๓๐๘,๘๐๐	๑๐๕,๖๐๐	๑,๔๑๔,๔๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑,๒๗๐
๑๑	สทภ.๑๑	๑๗๓,๖๐๐	๒,๙๒๖,๔๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	๖๐๐
รวม		๒๓,๘๕๐,๔๘๐	๕๒,๑๑๔,๔๑๐	๗๕,๙๖๔,๘๙๐	๔,๓๐๓,๗๙๘	๖๑,๒๙๘

๓) ผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สรุปดังนี้

๓.๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ แผนงานตาม พ.ร.บ.จำนวน ๒๑๙ แห่ง โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย รวมจำนวน ๑๕ แห่ง (เนื่องจากได้รับงบประมาณเหลือจ่าย ปี ๒๕๖๔ แล้ว ๕ แห่ง ติดปัญหาที่ที่ดิน ๑ แห่ง ที่ราชพัสดุ ๑ แห่ง หน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว ๕ แห่ง เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ ๑ แห่ง และน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ๒ แห่ง) เพื่อไปดำเนินการโครงการใหม่ที่มีความจำเป็น รวมจำนวน ๒๘ แห่ง ทำให้มีโครงการ ที่ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๓๒ แห่ง ผลการดำเนินงาน แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๑ แห่ง ส่วนโครงการที่เหลือ จำนวน ๑๑๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้ มีจำนวน ๕ แห่ง ที่อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าพื้นที่ รวมถึงมีการหยุดงานเนื่องจากติดปัญหาขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ โดยสรุปผลการดำเนินงานแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ แยกรายหน่วยงาน ณ วันตรวจราชการ ดังนี้

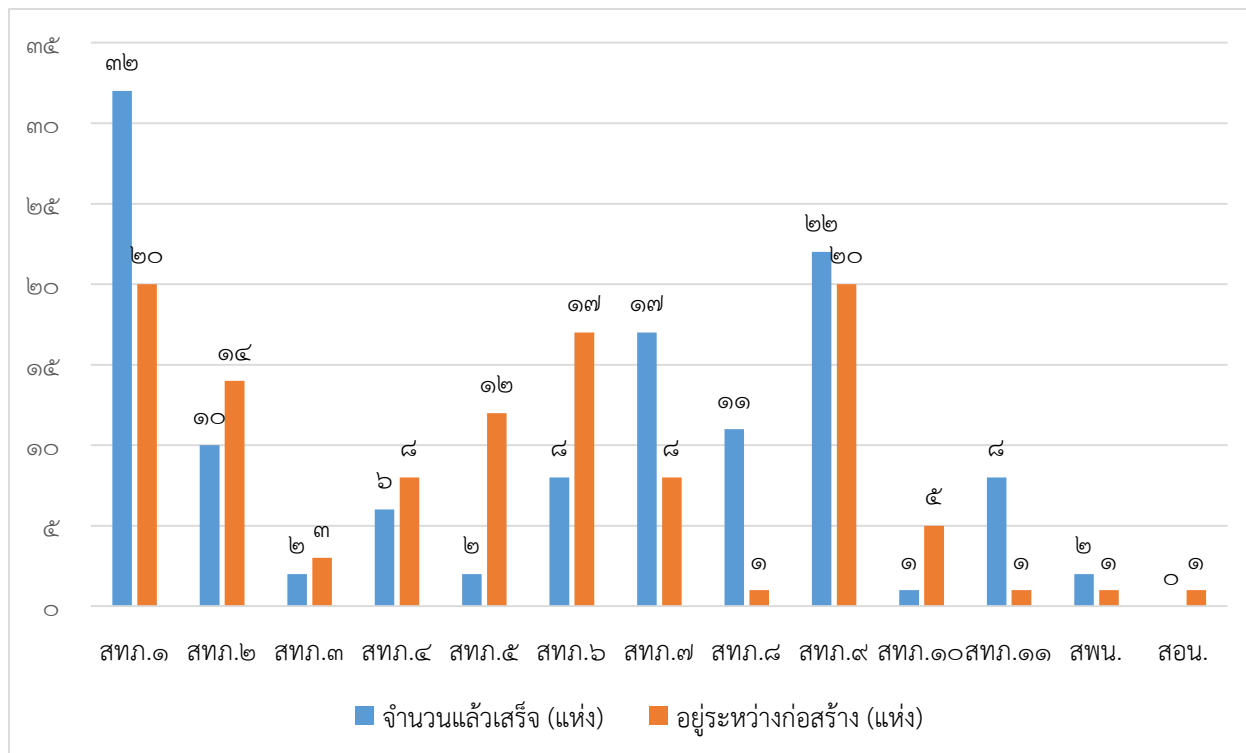

๔. ปัญหา อุปสรรค และประเด็นที่ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๔.๑ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมของ สทภ.๑ – ๑๑ สรุปดังนี้

๑) ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบน้ำ สายยางส่งน้ำ รถบรรทุก เป็นต้น ในการปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง บางส่วนชำรุด บางส่วนมีไม่เพียงพอ

๒) ยานพาหนะขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีสภาพเก่าและใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามไม่เพียงพอ เช่น งานสำรวจหรือติดต่อราชการในพื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หรือในงานปฐพีกลศาสตร์และวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ เป็นต้น

๓) ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจำซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ไม่มีอัตรามาทดแทน

๔) ความไม่ชัดเจนในเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ ในช่วงต้นปีงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินการขออนุญาตล่าช้าออกไป

๔.๒ ปัญหาอุปสรรค เฉพาะรายหน่วยงาน สรุปดังนี้

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค
๑	สทภ.๑	- การนิเทศติดตามผลการบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ มีพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่สูง อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน การคมนาคมลำบากและเสี่ยงอันตราย ประกอบกับหน่วยงานมีภารกิจอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องให้การช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัย ทำให้มีการจัดสรรบุคลากรเพื่อไปช่วยงานดังกล่าว จึงส่งผลให้การดำเนินงานนิเทศฯ ไม่เป็นไปตามแผน - การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ขาดแคลนเครื่องมือสำรวจ ได้แก่ เครื่องมือ Current Meter อะไหล่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเครื่องมือ ADCP และ GPS มีอายุการใช้งานมานานและขัดข้องบ่อย - การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยฯ ขาดบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคนิคการซ่อมบำรุง และอุปกรณ์บางชนิดที่ส่งซ่อมใช้เวลาซ่อมนาน ทำให้เครื่องมือเตือนภัยไม่สามารถทำงานได้
๒	สทภ.๒	- การเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีเตือนภัยฯ เกิดจากตำแหน่งที่ตั้งสถานีเตือนภัยฯ มีระดับความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของสถานีเตือนภัยฯ - ขาดบุคลากรในด้านการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา - โครงการอนุรักษ์ฯ และระบบกระจายน้ำ มีการหยุดงานเนื่องจากเหตุอุทกภัย มีการแก้ไขแบบแปลน และติดปัญหาการขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่เกษตรกรรม
๓	สทภ.๓	- การส่งข้อมูลของผู้รู้ประจำสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง ลำซำ เจ้าหน้าที่ สทภ. ต้องคอยติดตามผลการรายงานอยู่บ่อยครั้ง - การช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติน้ำ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ชำรุดขณะปฏิบัติงาน
๔	สทภ.๔	- บุคลากรและยานพาหนะด้านการสำรวจภูมิศาสตร์ไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม ไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษาได้อย่างเต็มศักยภาพ

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค
		- Server ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ชำรุด/ใช้งานไม่ได้ จำนวน ๔ สถานี ทำให้ข้อมูลจากสถานีสนามที่ตรวจวัดได้ ไม่สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์ของระบบโทรมาตรได้ ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามสถานการณ์แบบ Realtime ผ่านระบบดังกล่าวได้ - การก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฯ และระบบกระจายน้ำ บางแห่งล่าช้า เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลายฤดูฝน ทำให้น้ำท่วมบริเวณโครงการ และบริเวณรอบโครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถระบายน้ำออกจากแหล่งน้ำได้
๕	สทภ.๕	- อุปกรณ์บางชนิดในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยฯ ไม่สามารถจัดหาได้ในพื้นที่ ต้องขอเบิกจาก สวพ. ในการจัดซื้อให้ เช่น หน้าจอ PCL - Server ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ชำรุดไม่สามารถส่งข้อมูลในระบบประมวลผลส่วนกลางได้ - การก่อสร้างโครงการแหล่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง อยู่ระหว่างรอหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้
๖	สทภ.๖	- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผน จึงทำให้จัดเก็บข้อมูลได้เพียง ๑๘ ครั้ง จากเป้าหมาย ๓๐ ครั้ง
๗	สทภ.๗	- ขาดอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ภาคตะวันตก เช่น เรือ เสือชูชีพ เป็นต้น - การก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฯ มีการหยุดงาน ๒ แห่ง เนื่องจากปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์
๘	สทภ.๘	- โครงการนิเทศติดตามผลการบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ งบประมาณในการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ไม่เพียงพอต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในแผนงานอื่น รวมถึงพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและเสี่ยงอันตราย - ขาดแคลนบุคลากรด้านการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยฯ เนื่องจากสูงอายุและเกษียณอายุราชการ - การก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฯ และระบบกระจายน้ำ มีการหยุดงาน ๔ แห่งเนื่องจากน้ำท่วมโครงการ ๒ แห่ง และติดปัญหาการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ๒ แห่ง

ที่	หน่วยงาน	ปัญหาอุปสรรค
๙	สทท.๑๑	- การใช้เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเป็นอุปสรรคเนื่องจากเข้มงวดรัททอมีขนาดเล็กทำให้น้ำรั่ว และม้วนเก็บสายยากเนื่องจากไม่มีเครื่องทุ่นแรง - ได้รับงบประมาณล่าช้าในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ จึงให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามคำขอรับการสนับสนุนก่อน เมื่อได้รับงบประมาณจึงเบิกจ่ายย้อนหลัง

๔.๓ ประเด็นที่ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน สรุปดังนี้

๑) ขอให้กรมพิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานราชการทดแทนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการแล้ว และกำลังเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ รวมถึงขอให้พิจารณาเพิ่มตำแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะ เช่น ตำแหน่งนายท้ายเรือ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศหรือนักวิชาการแผนที่ ตำแหน่งด้านอุทกวิทยา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค เป็นต้น

๒) กรณี การขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติและมีการตรวจสอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวก่อสร้าง เห็นควรให้กรมมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ

๓) ขอให้หน่วยงานส่วนกลางพิจารณาจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ภาคสนาม เช่น เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกพร้อมเทรนขนาดใหญ่ รถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นต้น เพื่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อุทกภัยและภัยแล้งได้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยอาจพิจารณาจากจำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยร่วมด้วย

๔) เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพิ่มเติม จึงขอให้หน่วยงานส่วนกลางพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้รู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานีที่ชำรุด ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสนามประจำเดือน ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ในการติดตาม ฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำ/ประสานงานผู้รู้หรือผู้นำชุมชนและเครือข่ายหมู่บ้านครอบคลุม เพื่อการปฏิบัติงานภาคสนามจะได้มีประสิทธิภาพ

๕) เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการจัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. จึงขอให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งปรับปรุงโครงสร้างและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อสร้างความชัดเจนและเข้าใจตรงกันของหน่วยงานในระดับพื้นที่

๕. ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

๕.๑ ขอให้ สทภ.๑ - ๑๑ เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซึ่งจะต้องกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕.๒ ขอให้ สทภ.๑ - ๑๑ ตรวจสอบรายละเอียดการขยายสัญญาและการใช้สิทธิ ค่าปรับ ๐% ให้ชัดเจน โดยให้เป็นไปตามระเบียบและตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๕.๓ ขอให้ สทภ.๑ - ๑๑ ที่มีรายการอุปกรณ์ของสถานีเตือนภัย หรือสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำชำรุดเสียหาย ขอให้รวบรวมข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ เพื่อแจ้ง สวพ. ต่อไป

๕.๔ ขอให้ สทภ.๑ เร่งรัดการดำเนินงานโครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ ให้แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากระบบผลิตน้ำดื่มมีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่สูง

๖. ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรมทรัพยากรน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าวส่งให้กองตรวจราชการ สป.ทส. เรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
๑) เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่โครงการทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้	ให้ ทน. ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเร่งรัดผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกรอบสัญญา	ทน. โดย สทภ.๑-๑๑ ได้ปรับแผนงานโครงการที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม โดยเมื่อสามารถเข้าดำเนินการได้ มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างเพิ่มเครื่องจักรเครื่องมือให้สอดคล้องกับปริมาณงานและเร่งรัดผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะสัญญา

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
๒) โครงการบางแห่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาการอนุญาตของ ปม. และ อส	ให้ ปม. และ อส. เพื่อติดตามผลการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า และหากมีการจัดทำแผนงาน/โครงการในระยะต่อไป ควรยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเมื่อได้รับงบประมาณแล้วจะสามารถดำเนินการได้ทันที	ทน. ได้ดำเนินการประสาน ปม. และ อส. ในพื้นที่เพื่อติดตามผลการอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ได้เตรียมการเพื่อยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อได้รับงบประมาณแล้วให้สามารถดำเนินการได้ทันที โดย ทน. ได้แจ้ง สทก.๑-๑๑ ที่มีการจัดทำโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าให้มีการประสานกับ ปม. และ อส. ตามแนวทางขั้นตอนการดำเนินโครงการร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามเป้าหมาย ทส. หนึ่งเดียวกัน
	ควรใช้กลไกในรูปแบบคณะทำงาน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุก โดยเฉพาะการขอใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการ และควรตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ประเภทใดบ้าง เช่น ที่ราชพัสดุ พื้นที่ป่า ฯลฯ เพื่อขออนุญาตหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ให้ครอบคลุมครบถ้วน	ทน. ร่วมกับหน่วยงานของ ปม. และ อส. ในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ โดยใช้แนวทางขั้นตอนการดำเนินโครงการร่วมกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนี้ ๑) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ดำเนินการทำโครงการร่วมตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
		๒) ในเขตพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจสามารถจัดทำโครงการร่วมได้ จึงต้องดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ถ้าโครงการของกรมทรัพยากรน้ำมีเนื้อที่โครงการฯ ไม่เกิน ๒๐ ไร่ การอนุญาตเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ถ้าพื้นที่เกิน ๒๐ ไร่ การอนุญาตเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ๓) ในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ดำเนินการโครงการร่วมตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้ดำเนินการโครงการร่วมตามมาตรา ๕๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ ให้ดำเนินการโครงการร่วมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	ให้ สทภ. ๑ - ๑๑ สื่อสารประชาสัมพันธ์และรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภารกิจของหน่วยงาน และเป็นการผลักดันให้เกิดการบูรณาการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด	ทน. โดย สทภ.๑-๑๑ มีการนำเสนอแผนงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหน่วยงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด และเข้าร่วมเป็นกรรมการ/คณะทำงานในภารกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก่อนเข้าดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำทุกโครงการจะมีการจัดทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอ/นายก อบต. ในพื้นที่

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก OPPM การประชุมตรวจราชการฯ รอบที่ ๒

ภาคผนวก ข สรุปประเด็นการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รายงานหน่วยงาน

ภาคผนวก ค หนังสือเชิญประชุมการตรวจราชการ รอบที่ ๒

ภาคผนวก ง แผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาคผนวก ก

OPPM การประชุมตรวจราชการฯ รอบที่ ๒




สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประชุมตรวจราชการของ ผต.ทน. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สทภ. 1 2 3 และ 4

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ สูดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 2 3 และ 4 โดยมี ผู้บริหารของ สทภ. 1 - 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจราชการในรูปแบบประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตามประเด็นการตรวจราชการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 2) ด้านแผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ 4) ด้านแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5) ด้านประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน ทั้งนี้ หน.ผต. และ ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจ ต่อการปฏิบัติงานที่ยังคงค้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2565

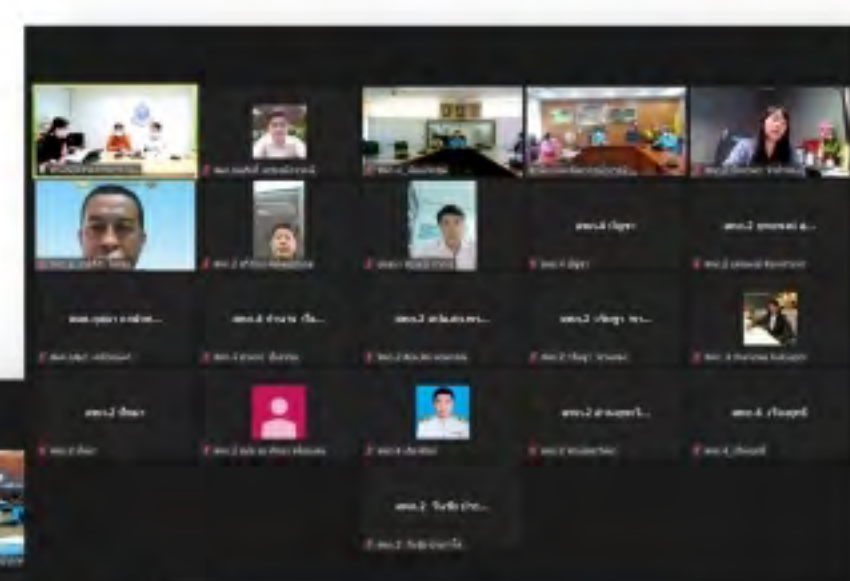



สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประชุมตรวจราชการของ ผต.ทน. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สทก. 5 6 7 9 และ 10

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ สูดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 6 7 9 และ 10 โดยมี ผู้บริหารของ สทก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมตรวจราชการในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขตามประเด็นการตรวจราชการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 2) ด้านแผนงานพื้นฐานฯ 3) แผนงานยุทธศาสตร์ 4) ด้านแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5) ด้านประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน ทั้งนี้ หน.ผต. และ ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานที่ยังคงค้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2565




มุ่งผลสัมฤทธิ์ igitบริการ ประสาน สามัคคี

สำนักผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ประชุมตรวจราชการของ ผต.ทน. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สทก. 8 และ 11

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ สูดิพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และ 11 โดยมี ผู้บริหารของ สทก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจราชการในรูปแบบประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตามประเด็นการตรวจราชการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 2) ด้านแผนงานพื้นฐานฯ 3) แผนงานยุทธศาสตร์ 4) ด้านแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5) ด้านประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน ทั้งนี้ หน.ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานที่ยังคงค้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2565

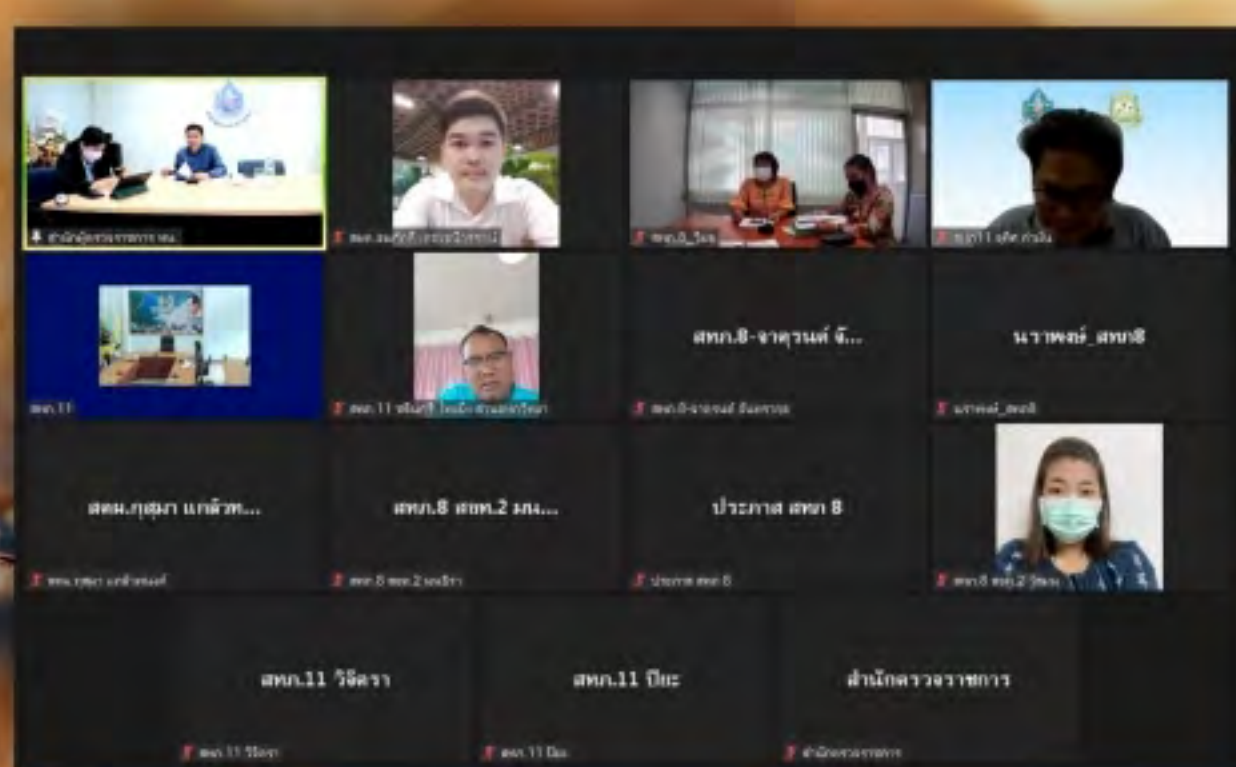

ภาคผนวก ข

สรุปประเด็นการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ
รายหน่วยงาน

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.๑...

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ...๙ กันยายน ๒๕๖๕.....

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑) งบบุคลากร	๑๓,๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๘๓,๗๑๑.๘๒	๙๙.๓๕%
๒) งบดำเนินงาน	๙,๔๘๓,๐๔๒.๐๐	๘,๙๙๕,๗๘๘.๒๑	๙๔.๘๖%
๓) งบลงทุน	๗๓๗,๒๘๗,๖๖๗.๐๐	๕๘๔,๖๗๐,๒๖๐.๕๘	๗๙.๓๐%
๔) งบรายจ่ายอื่น	๑๔,๐๔๔,๐๑๗.๐๐	๑๒,๐๕๗,๔๓๘.๐๔	๘๕.๘๕%
รวม	๗๗๔,๒๘๕,๗๒๖.๐๐	๖๑๙,๑๐๗,๑๙๘.๖๕	๗๙.๙๖%

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒,๕๕๐,๐๐๐ บาท	เป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ แห่ง	
ผล	เบิกจ่าย ๒,๒๐๙,๗๒๕ บาท (ร้อยละ ๘๖.๖๖)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘๐ แห่ง ส่วนอีก ๑๒๐ แห่ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยได้มีการยืมเงินราชการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายไว้ เรียบร้อยแล้ว	ปัญหาอุปสรรค ๑. ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-๑๙ ไม่สามารถเข้า ดำเนินการพื้นที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ได้ ๒. มีภารกิจงานอื่น ๆ ที่มีความจำเป็น เร่งด่วนต้องให้การช่วยเหลือ เช่น การ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและ อุทกภัย ต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ไป ปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ๓. จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ ส่วน ใหญ่เป็นลูกจ้างประจำอยู่ในวัยใกล้

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
			เกษียณอายุราชการและไม่มีตำแหน่ง ทดแทน ๔. พื้นที่ดำเนินงานเป็นพื้นที่สูงถิ่น ทุรกันดาร ห่างไกล สภาพพื้นที่เป็น ภูเขาสูงชัน การคมนาคมลำบากและ เสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเดิน ทางเข้าพื้นที่และการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

.....

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๙,๒๓๕,๐๐๐ บาท	จำนวน ๔๖ โครงการ	
ผล	เบิกจ่าย ๙,๐๗๖,๒๑๘.๓๔ บาท (ร้อยละ ๙๘.๒๘)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

.....

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๙,๒๓๕,๐๐๐ บาท	จำนวน ๓๓ โครงการ	
ผล	เบิกจ่าย ๓,๕๔๑,๑๖๐ บาท (ร้อยละ ๓๘.๓๔)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕,๕๕๒,๕๐๐ บาท	จำนวน ๑๔ โครงการ	
ผล	เบิกจ่าย ๔,๕๕๔,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๘๓.๐๓)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

.....

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	๒๒๐,๕๕๐	๒๑๙,๖๗๒	สำรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำ ณ สถานีตรวจวัดปริมาณแม่น้ำโขง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย - แผนการสำรวจ ๓๖ ครั้ง - ผลการดำเนินงาน ๓๔ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๕	ปัญหาอุปสรรค ขาดแคลนเครื่องมือสำรวจ ได้แก่ - เครื่องมือ Current Meter อะไหล่ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้ - เครื่องมือ ADCP และ GPS อายุการใช้งาน มานาน ชัดชองบ่อย ข้อเสนอแนะ ๑.ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ในการสำรวจ ๒.ประสาน จ.นท.สพ. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์มาทดแทน
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๕,๘๙๑,๖๐๐	๕,๘๙๑,๕๓๘.๐๕	ตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา สถานีเตือนภัยล่วงหน้าทั้งหมด ๖๔๗ สถานี ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน - แผนการซ่อมบำรุง ๔ ครั้งต่อปี - ผลการดำเนินงาน ๔ ครั้ง ปัจจุบันเครื่องมือเตือนภัยมีประสิทธิภาพในการทำงาน	ปัญหาอุปสรรค - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้รับจัดสรร เดือน ต.ค.-ก.ย. ๖๕ ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงาน ต้องปรับลดแผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับ - ขาดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะด้านเทคนิคการ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			และเชื่อมโยงข้อมูลได้ จำนวน ๕๖๘ สถานี คิด เป็นร้อยละ ๘๗.๗๙ และ เป็นตัวชี้วัดหลักของกรม ทรัพยากรน้ำ ความสำเร็จของการ ประกาศแจ้งเตือนภัย ล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำ ท่วม และน้ำป่าไหลหลาก	ซ่อมบำรุง - อุปกรณ์บางชนิดชำรุด ไม่ สามารถซ่อมได้และส่งซ่อม ใช้เวลาการส่งซ่อมนาน ทำให้ เครื่องมือเตือนภัยไม่ สามารถทำงานได้ ข้อเสนอแนะ - สนับสนุนด้านงบประมาณให้ เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และ แผนงานเพื่อสนับสนุนตัวชี้วัด หลักของกรมทรัพยากรน้ำ - สนับสนุนบุคลากรตาม กรอบพนักงานราชการที่มี ความรู้ด้านเทคนิคการซ่อม บำรุง - เน้นย้ำ ผู้รู้/ดูแลสถานีเตือน ภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในการตรวจวัดข้อมูลน้ำฝน จากกระบอกวัดน้ำฝน ธรรมดา กรณีสถานีที่ชำรุด หรือไม่สามารถลงพื้นที่ บำรุงรักษา เพื่อติดตาม ข้อมูลการรายงาน สถานการณ์น้ำ - ลำดับความสำคัญเร่งด่วน ของสถานีที่ชำรุด โดยจัดทำ แผนลงพื้นที่ซ่อมบำรุงรักษา เป็นลำดับแรก เพื่อให้สถานี เตือนภัยมีประสิทธิภาพใน การทำงานได้ตามปกติ - จัดฝึกอบรมซ้ำเสริมผู้รู้ เครือข่ายเฝ้าระวังเตือนภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ติดตามสถานการณ์น้ำ
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง	๑๕๗,๙๐๐	๑๕๗,๔๒๓.๙๖	ซ่อมบำรุงรักษาเครือข่าย สถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำ โขง และรายงานข้อมูล ระดับน้ำรายวันและราย เดือน จำนวน ๓ สถานี - แผนการสำรวจ จำนวน ๑๒ ครั้ง	

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			- ผลการดำเนินงาน จำนวน ๑๒ ครั้ง	
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและ ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๕๙๐,๒๔๐	๕๘๙,๖๙๔.๕๔	ซ่อมบำรุงรักษาระบบ ตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติ (สถานีโทรมาตร) และระบบส่งข้อมูล สัญญาณภาพ (CCTV) จำนวน ๘๕ สถานี เครื่องมือสามารถเชื่อมโยง ได้ ๖๗ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๒ - แผนการดำเนินงาน ๔ ครั้ง - ผลการดำเนินงาน ๔ ครั้ง	ปัญหาอุปสรรค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถซ่อมได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค ศปว. มาดำเนินการแก้ไข ข้อเสนอแนะ จัดหาอะไหล่อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สำรองและ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการ ซ่อมบำรุงสถานี
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)				

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และ
นำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน			
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย			
๓) สายยางสูบลม ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด			
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง			

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๔๓๓,๖๐๐ บาท	สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร ช่วยเหลือพื้นที่ ประสบภัย โดยเมื่อเกิดภัย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ทันที สูบน้ำ แจกจ่ายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค แจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวด บูรณะฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ฉีดล้างดินโคลนทำความสะอาดบ้านเรือน	
ผล	เบิกจ่าย ๙๘๔,๙๐๔ บาท (ร้อยละ ๖๘.๗๐)	ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในภาวะน้ำแล้งและน้ำ ท่วม จำนวน ๙๕๘,๗๙๐ คน <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๙๑๘,๘๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด ๓๓๖,๐๐๐ ลิตร ศูนย์บริการน้ำดื่มสะอาด ๓,๐๒๑,๗๔๘ ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ๘,๓๐๐ ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๗๒,๐๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด ๕๔,๐๐๐ ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ๗,๓๒๐ ขวด	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ได้รับเพิ่มเติมแห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จแห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแห่ง หยุดงานแห่ง อื่นๆ ระบุ.....แห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗๑๙,๖๙๗,๙๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๕๓.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๙,๕๘๘.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๕,๕๒.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๓๒,๓๐๑.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๕๖๙,๐๙๐,๒๖๗,๗๔๙ บาท (ร้อยละ ๗๙.๒๕)	(ระบุผลการดำเนินงานตามแผนและที่ <u>ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง๕.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม๔.....แห่ง (งบเหลือจ่าย) รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....๕๒.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๓๒.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๒๐..... แห่ง หยุดงานแห่ง อื่นๆ ระบุ.....-	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ <u>การร่วมดำเนินการกับ</u> หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอนวม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔) คชจ. การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ชื่อผู้ประสานงาน.....นางสาวเจนจิรา คำบุญชู.....

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....

เบอร์โทรศัพท์.....๐-๕๔๒๑-๘๖๐๒ ต่อ ๑๒๓.....

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๕) งบบุคลากร	๖,๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๖,๐๗๓,๒๙๐.๙๐	๙๘.๔๑
๖) งบดำเนินงาน	๖,๔๒๑,๑๙๐.๐๐	๕,๑๘๙,๑๗๐.๑๔	๘๐.๘๑
๗) งบลงทุน	๔๙๙,๑๗๓,๐๖๕.๔๘	๓๔๗,๒๑๐,๐๔๖.๒๑	๖๙.๕๖
๘) งบรายจ่ายอื่น	๘,๔๒๒,๔๕๐.๐๐	๕,๙๖๘,๘๑๖.๕๙	๗๐.๘๗
รวม	๕๒๐,๑๘๘,๓๐๕.๔๘	๓๖๔,๔๔๑,๓๒๓.๘๔	๗๐.๐๖

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	เบิกจ่ายบาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....
.....

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	..๖,๗๓๑,๐๐๐.๐๐...บาท	สำรวจและออกแบบโครงการทั้งหมด ๓๑ แห่ง	
ผล	เบิกจ่าย ..๕,๒๗๗,๗๙๙.๑๘...บาท (ร้อยละ...๗๘.๔๑....)	ดำเนินการแล้วทั้งหมด ๒๕ แห่ง คาดว่าจะดำเนินการ อีก ๖ โครงการ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....
.....

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	..๑,๕๔๔,๘๐๐....บาท	ดำเนินการควบคุมงานทั้งหมด ๒๔ แห่ง	
ผล	เบิกจ่าย ..๑,๓๔๔,๘๐๐.๐๐...บาท (ร้อยละ....๘๗.๐๕....)	ดำเนินการแล้วทั้งหมด ๒๔ แห่ง	เงินค่าควบคุมงานที่ขอโอน เปลี่ยนจากงบประมาณปี ๒๕๖๔ มางบประมาณปี ๒๕๖๕ ยังไม่ได้ ได้รับการจัดสรรจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....
.....

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	เบิกจ่าย.....บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....
.....

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัย น้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๑,๐๗๘,๘๐๐.๐๐	๙๙๔,๑๗๐ (๙๒.๑๖%)	- ติดตามตรวจสอบบำรุง รักษาสถานีเตือนภัย ล่วงหน้า (EWS) จาก สถานี ๑๑๗ สถานี โดย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ เป็นจำนวน ๙๒ สถานี คิด เป็นร้อยละ ๗๙ - ติดตาม ตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาสถานีเตือนภัย ล่วงหน้า (EWS) จำนวน ๑๑๗ สถานี เป็นประจำ	ในการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานี เตือนภัยล่วงหน้า (EWS) เกิด จากตำแหน่งที่ตั้ง สถานีเตือน ภัยล่วงหน้า มีระดับความแรง ของสัญญาณโทรศัพท์ที่ไม่ เพียงพอต่อการใช้งานและ ปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือ อื่น ๆ ที่เป็นตัวแปรของปัญหา ดังกล่าวทำให้ส่งผลกระทบต่อ การทำงานและประสิทธิภาพ ของการเตือนภัยของสถานี

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			ทุกเดือน - สรุปสถิติการแจ้งเตือนภัยทั้งหมด ๕๑ ครั้ง ระดับสีเขียว ๒๕ ครั้ง ระดับสีเหลือง ๒๕ ครั้ง ระดับสีแดง ๑ ครั้ง	
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๕๕๕,๒๐๐	๔๓๒,๒๔๘.๔๒ (๗๗.๘๕%)	ติดตามตรวจสอบบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จำนวน ๖๒ สถานี	ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการปรับปรุงโครงข่าย และระบบฐานข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถเข้าถึงระบบได้อย่างปกติ
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)				
๖) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา	๒๑๔,๒๕๐.๐๐	๑๘๘,๑๖๐.๐๐ (๘๗.๘๒%)	- ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำท่าของสถานีอุทกวิทยา จำนวน ๑๑ สถานีเป็นประจำทุกวัน - สํารวจจัดทำ Cross-section ลำนํ้าตามแผนประจำปี ได้จำนวน ๕ สถานี	ขาดแคลนบุคลากร/อัตรากำลัง/ความพร้อมของเครื่องมือและยานพาหนะ/งบประมาณ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานจริง ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่ ต้องการตำแหน่งพนักงานราชการเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุราชการไป (ต้องการบุคลากรในตำแหน่งนายช่างเทคนิค,นายท้ายเรือ) ให้เป็นไปตามปริมาณที่เพิ่มขึ้น

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-	-	-
๒) สายยางสูบน้ำ ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๖ ชุด	๒ ชุด	สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม	-
๓) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	-	-	-

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๖,๒๘๔,๑๐๐.๐๐.....บาท	สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๒ จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด ปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี	
ผล	เบิกจ่าย ..๔,๓๔๐,๗๒๕.๑๗.....บาท (ร้อยละ...๖๙.๐๗.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๒,๒๐๒,๑๒๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด ๑๓๒,๐๐๐..ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ๑๕,๘๔๐.....ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๘,๔๐๗,๒๐๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาดลิตร น้ำดื่มบรรจุขวดขวด	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	 ๒๔๖,๓๙๓,๐๐๐.๐๐.....บาท (แผนตามพ.ร.บ.) ๒๔๕,๒๔๙,๑๖๗.๓๐..... บาท (แผนตามสัญญา)	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๑๖.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์...๓,๗๔๐..... ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑๗.๕๐๑๔.....ล้าน ลบ. ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์...๑๔,๐๔๕.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	เบิกจ่าย ๑๔๗,๖๐๕,๖๕๑.๗๐ บาท (ร้อยละ...๕๙.๗๔ ตามพ.ร.บ.) (ร้อยละ...๖๐.๑๙.ตามสัญญา)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ได้รับเพิ่มเติมแห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๘.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๕.....แห่ง หยุดงาน๓.....แห่ง อื่นๆ ระบุ.....แห่ง	หยุดงานเนื่องจาก เหตุอุทกภัย และแก้ไขแบบแปลนและติด ปัญหาการขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่ เกษตรกรรม

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	 ๒๕๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐.....บาท (แผนตามพ.ร.บ.) ๒๕๘,๗๗๒,๐๐๐.๐๐..... บาท (แผนตามสัญญา)	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๘.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๓,๑๑๔..... ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑๓.๕๐๐๐.....ล้าน ลบ. ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๗,๕๘๐..... ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	เบิกจ่าย๑๙๒,๙๘๑,๘๑๔,๓๐ บาท (ร้อยละ ๗๔.๔๑ ตามพ.ร.บ.) (ร้อยละ ๗๔.๕๘ ตามสัญญา)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ได้รับเพิ่มเติมแห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๒.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๕.....แห่ง หยุดงาน๑.....แห่ง อื่นๆ ระบุ.....แห่ง	หยุดงานเนื่องจาก เหตุอุทกภัย และแก้ไขแบบแปลน

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ <u>การร่วมดำเนินการกับ</u> หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ชื่อผู้ประสานงาน .นางกัลยา ไวกยี่.....

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล.....

เบอร์โทรศัพท์ ..๐๘๙-๙๖๗๔๑๖๒.....

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค...๓.....

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๙) งบบุคลากร	๗,๐๒๕,๕๐๐.๐๐	๖,๒๖๔,๙๕๙.๐๐	๘๙.๑๗
๑๐) งบดำเนินงาน	๔,๖๖๗,๑๐๐.๐๐	๔,๒๙๙,๔๔๘.๓๑	๙๒.๑๒
๑๑) งบลงทุน	๒๔๖,๓๖๔,๒๐๐	๒๐๙,๓๕๑,๒๗๔.๙๖	๘๔.๙๘
๑๒) งบรายจ่ายอื่น	๖,๐๖๐,๓๘๑.๐๐	๔,๘๑๘,๙๘๓.๕๖	๗๙.๕๒
รวม	๒๖๔,๑๑๗,๑๘๑.๐๐	๒๒๔,๗๓๔,๖๖๕.๘๓	๘๕.๐๙

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาฯ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	เบิกจ่ายบาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....
.....

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗,๐๓๒,๐๐๐ บาท	๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๓๖ แห่ง	
ผล	เบิกจ่าย ๖,๓๙๒,๕๐๔ บาท (ร้อยละ ๙๐.๙๑)	๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖ แห่ง	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗๐๔,๓๐๐ บาท	๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๔ แห่ง	
ผล	เบิกจ่าย ๕๐๒,๖๒๐ บาท (ร้อยละ ๗๑.๓๖)	- โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ แล้วเสร็จ จำนวน ๒ แห่ง - โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ แห่ง	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๘๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ มีโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักมากกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๙ แห่ง เพื่อพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
ผล	เบิกจ่าย ๓,๘๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)	ผลการดำเนินงาน สามารถพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ จำนวน ๙ แห่ง ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงแข็งแรง	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	๔๐๗,๑๐๐.๐๐	๒๘๘,๘๗๗.๒๐	สทภ.๓ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๑,๐๐๗,๖๐๐.๐๐	๗๗๓,๘๒๗.๙๐	สทภ.๓ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	การประสานงานกับผู้รู้ล่าช้า เนื่องจากผู้รู้ไม่ได้พกพาโทรศัพท์ตลอดเวลา
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	๑,๐๗๙,๓๗๕.๐๐	๘๑๑,๗๙๒.๔๕	สทภ.๓ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	การส่งข้อมูลของผู้รู้ประจำสถานีล่าช้า เจ้าหน้าที่ต้องคอยติดตามผลการรายงานอยู่บ่อยครั้ง
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๑๐๙,๔๐๐.๐๐	๘๕,๑๘๑.๐๐	สทภ.๓ ได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่รวมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือน ภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)				

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	๑ คัน	ใช้ขนย้ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	
๒) สายยางสูบน้ำ ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๖ ชุด	๕๐ เมตร	ช่วยเหลือและแก้ปัญหาพื้นที่ภัยแล้งและอุทกภัย	ควรจัดงบประมาณเพิ่มเติมในงบประมาณถัดไป
๓) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	๑	ช่วยเหลือและแก้ปัญหาพื้นที่ภัยแล้งและอุทกภัย	ควรจัดงบประมาณเพิ่มเติมในงบประมาณถัดไป

หมายเหตุ (ถ้ามี)

ได้รับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒,๗๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท	สามารถบริหารจัดการน้ำในภาวะปกตินอกเขตชลประทานในเขตพื้นที่เกษตรน้ำฝน สามารถช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง อุทกภัย โดยช่วยเหลือ ๔ ด้าน ๑.สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง ๒.สูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมขัง ๓.แจกจ่ายน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค ๔.แจกน้ำขวดเพื่อการอุปโภค-บริโภค	เครื่องมือและอุปกรณ์บางชนิดเกิดการชำรุดขณะปฏิบัติงาน เช่น ยานพาหนะ บุคลากรน้อย หมายถึงเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ผล	เบิกจ่าย ๒,๓๕๖,๑๖๓.๗๖ บาท (ร้อยละ ๘๖.๒๙)	(ระบุผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๔,๖๑๑,๖๐๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด .. ๑๓๒,๐๐๐.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด-.....ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๔๕๓,๑๘๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด-.....ขวด	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑๑๔,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๔.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๑,๑๑๕..... ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑,๔๔๐.๐๐๐๐.....ล้าน ลบ. ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์..... ๕,๒๐๐.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	เบิกจ่าย ๙๖,๗๐๘,๗๕๓.๕๔ บาท (ร้อยละ ๘๔.๒๖)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง๑.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม๑.....แห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....๔.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๑.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๒.....แห่ง หยุดงานแห่ง อื่นๆ ระบุ.....๑.....แห่ง (อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง)	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒,๖๒๙,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๑..... แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๖๐..... ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....-.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๑๒๐..... ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	(ได้เพิ่มเติม หลังโอน เปลี่ยนแปลง)
ผล	เบิกจ่าย ๒,๖๐๔,๓๗๑.๙๔ บาท (ร้อยละ ๙๙.๐๖)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงแห่ง ได้รับเพิ่มเติม๑.....แห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....๑.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๑.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างแห่ง หยุดงานแห่ง อื่นๆ ระบุ.....แห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะ อุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำ บางปะกงและปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำหลักต้น

(หนังสือ สทท.๓ ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๒๗๘ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕)

๕.๑ เรื่องบุคลากร ตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องอายุราชการยังไม่ได้รับการจัดสรรทดแทน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ อัตรา

๕.๒ ขอรับการสนับสนุนงบรายจ่ายอื่น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐ บาท

๕.๓ ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่ ๑๐ ล้อ ติดตั้งเครน ๑ คัน และรถบรรทุกลากจูงขนาดบรรทุก ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน ๑ คัน

๕.๔ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารที่ทำการภายในส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ หนองคาย งบประมาณ ๑,๙๒๕,๗๕๙.๙๔ บาท

๕.๕ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงห้องประชุมและครัวของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ งบประมาณ ๓,๖๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวพิศุฒ...ไม้ด้า.....
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.....
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๔-๑๐๖๙๓๖๘.....

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค...๕

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่๙ กันยายน ๒๕๖๕.....

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
งบบุคลากร	๕,๙๓๗,๕๐๐.๐๐	๕,๕๗๕,๑๕๒.๐๐	๙๓.๙๐	มีแผนดำเนินการแล้ว
งบดำเนินงาน	๕,๖๕๗,๐๐๐.๐๐	๔,๙๑๗,๑๐๗.๑๓	๘๖.๙๒	มีแผนดำเนินการแล้ว
งบรายจ่ายอื่น	๓,๔๔๐,๒๘๑.๐๐	๒,๙๐๓,๑๓๑.๕๒	๘๔.๓๙	มีแผนดำเนินการแล้ว
งบลงทุน	๔๔๕,๗๐๑,๗๔๔.๘๐	๒๗๙,๑๒๕,๘๘๖.๒๐	๖๒.๖๓	
รวม	๑๖๐,๗๓๖,๕๒๕.๘๔	๒๙๒,๕๒๑,๒๗๖.๘๕	๖๓.๔๙	

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	-	-	-
ผล	-	-	-

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๙,๖๔๔,๐๐๐ บาท	๑. สำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๕๘ โครงการ ๒. สำรวจปฐพีกลศาสตร์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำ จำนวน ๖๑ แห่ง (โครงการเพิ่มเติม ๓ แห่ง) ๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๕๘ โครงการ	-

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
ผล	เบิกจ่าย ๗,๑๒๗,๕๙๓ บาท (ร้อยละ ๗๓.๙๑)	๑. สํารวจออกแบบ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ผลงานโดยรวมคิดเป็น ร้อยละ ๗๕ ๒. สํารวจปฐพีกลศาสตร์ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๐ แห่ง (คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ แห่ง) ๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ - ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗๘ แห่ง (ดำเนินการได้มากกว่าแผนที่กำหนด จำนวน ๑๒๐ แห่ง)	- บุคลากร/ยานพาหนะมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา : - ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (ขรก./พนักงานราชการ) ทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ - ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุก ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมเครน,รถบรรทุก และขับเคลื่อน ๔ ล้อ) ทดแทนยานพาหนะเดิมที่มีสภาพเก่าไม่พร้อมใช้งาน - เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบประชุมได้ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล และการแจกแบบสอบถามให้ประชาชนร่วมกรอกแบบสอบถาม ส่งผลให้สามารถดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้มากกว่าแผนที่กำหนด

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๖๗๐,๕๐๐ บาท (ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒ ครั้ง)	ควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ ดังนี้ - โครงการปี ๒๕๖๔ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ - โครงการปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ	-
ผล	เบิกจ่าย ๑,๖๗๐,๔๓๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการควบคุมงาน รวมทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ ดังนี้ - โครงการเงินกู้เงินกู้ยืมปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ โครงการ ผลงานรวม ร้อยละ ๘๒ - โครงการเงินกู้ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ โครงการ ผลงานรวม ร้อยละ ๙๙.๖ - โครงการงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ โครงการ ผลงานรวม ร้อยละ ๗๐	-

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗๕๑,๐๐๐ บาท	งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ	-
ผล	เบิกจ่าย ๗๑๘,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐ ตามวงเงิน สัญญาจ้าง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทั้ง ๒ โครงการ รวมวงเงินตามสัญญาจ้าง = ๗๑๘,๐๐๐ บาท (๑) บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเบ็ญ บ.คำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๑๙,๐๐๐ บาท (๒) บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่าลาด บ.ท่าลาด ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒๙๙,๐๐๐ บาท	-

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการ ดำเนินงานที่รวม ดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัด ปริมาณน้ำ การเคลื่อน ตัวของตะกอน และ ตะกอนท้องน้ำแม่น้ำ โขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษา ระบบเตือนภัยน้ำท่วม- ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๓๖๔,๘๐๐	๓๓๗,๖๘๐	- มีสถานีในความ รับผิดชอบ จำนวน ๓๒ สถานี ปัจจุบัน สถานีใช้งานได้ปกติ ๓๒ สถานี	- ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวม ๓๖๔,๘๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษา ระบบเตือนภัยได้อย่างเต็มศักยภาพ (ค่าตอบแทนผู้รู้ ๑๙๒,๐๐๐ บาท, ค่าล่วงเวลาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ๕๖,๗๒๐ บาท, ค่าวัสดุประจำสถานี ๖๑,๖๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณสำหรับการออกตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีสนาม จำนวน ๕๔,๔๘๐ บาท โดย ดำเนินการได้เพียง ๓ ครั้ง เท่านั้น ตามแผนงานที่ สวพ. กำหนด จะต้องออกบำรุงรักษาสถานีเดือนละ ๑ ครั้ง รวม ๑๒ ครั้ง/ปี/สถานี (เหตุผลความจำเป็นที่ควรต้อง ออกบำรุงรักษาสถานีสนามเป็นประจำทุกเดือน เนื่องจากต้องทำการรีเซ็ต/รีสตาร์ทอุปกรณ์ ทำความ สะอาดกระบอกวัดปริมาณน้ำฝน สอบเทียบอุปกรณ์ให้ ตรวจวัดค่าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ตรวจสอบ ความปลอดภัยของสถานีไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการถูก โจรกรรม/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ประจำ สถานี กำจัดวัชพืชบริเวณสถานีไม่ให้มด ปลวก หรือ สัตว์เลื้อยคลานเข้าไปทำรังในอุปกรณ์ จะทำให้อุปกรณ์ ได้รับความเสียหายหรือมีอายุการใช้งานสั้นลง และ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการ ดำเนินงานที่รวม ดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
				เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน)
๓) คชจ.การบำรุงรักษา เครือข่ายสถานีอุตุ- อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบ ตรวจวัดสภาพน้ำ ทางไกลอัตโนมัติและ ระบบส่งข้อมูล สัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๒๐๗,๗๖๐	๑๗๖,๐๘๖	- มีสถานีในความ รับผิดชอบ จำนวน ๑๘ สถานี (โทรมาตร ๑๗ สถานี และ CCTV ๑ สถานี) - สถานีโทรมาตร ชำรุด ๔ สถานี (อุปกรณ์ประมวลผล NRT ชำรุด ไม่ สามารถจัดซื้อทดแทน ได้เนื่องจากเป็น อุปกรณ์ที่มีราคาสูง)	- Server ระบบโทรมาตรใช้งานไม่ได้ ทำให้ข้อมูลจาก สถานีสนามที่ตรวจวัดได้ ไม่สามารถแสดงผลบนเว็บ ไซด์ของระบบโทรมาตร ทำให้ไม่สามารถติดตาม สถานการณ์แบบ Realtime ผ่านระบบดังกล่าวได้ (อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำแบบ Radar ที่สถานีสนาม สามารถทำงานได้ปกติ จำนวน ๑๓ สถานี โดยคิดเป็น ร้อยละของสถานีที่มีประสิทธิภาพในการทำงานได้ เท่ากับ ๗๖% จึงเป็นที่น่าเสียดาย หาก Server ยัง สามารถทำงานได้ปกติ จะทำให้สามารถติดตาม สถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) - สถานีติดตั้งปั๊มประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีอายุการใช้ งานเกิน ๖ ปี ควรได้รับการเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนที่ ชำรุดบางสถานี และปรับปรุงเปลี่ยนระบบ Server ใหม่ ทั้งหมด โดยหน่วยงานส่วนกลาง (ศปว.) ขอรับ สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมทั้งระบบโทร มาตร โขง-ชี-มูล รวม ๕๑ สถานี
๕) คชจ.ในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ เครือข่ายผู้รู้ประจำ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า ฯ (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และ
นำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-	-	-
๒) สายยางสูบลมน้ำ ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๖ ชุด	-	-	-
๓) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	-	-	-

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๘๓๒,๕๐๐ บาท	สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยและภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ รับผิดชอบสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔	-
ผล	เบิกจ่าย ๑,๔๘๓,๒๖๑.๙๙ บาท (ร้อยละ...๘๐.๙๔.....)	<u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ดำเนินการ ต.ค. ๖๔-๖ ก.ย.๖๕ ในพื้นที่ ๒ จังหวัด (ขอนแก่น และมหาสารคาม) จำนวนรวม ๒๔ แห่ง ปริมาณการสูบน้ำ๒,๑๒๐,๖๖๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด-.....ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ดำเนินการ ต.ค. ๖๔-๖ ก.ย.๖๕ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ และมหาสารคาม) จำนวนรวม ๑๖ แห่ง ปริมาณการสูบน้ำ๓,๘๗๓,๓๒๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด-.....ขวด	- ขาดบุคลากรด้านช่างฝีมือสนาม เครื่องมือเครื่องจักรชำรุด - ขาดงบประมาณในการ ดำเนินงาน

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	วงเงินตาม พ.ร.บ. ๑๓๑.๔๙๘๒ ล้านบาท	เป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u> จำนวน.....๑๑.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๒,๔๖๖.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๗,๘๐๓๖.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๗,๔๒๗.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	-
ผล	วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๒๒.๕๙๓๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๑.๐๑๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๙ (คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๑ ของวงเงินตาม พ.ร.บ.)	ผลการดำเนินงาน<u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u> ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง๓.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)๑.....แห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....๙.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๖.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๒.....แห่ง หยุดงาน๑.....แห่ง อื่นๆ ระบุ.....-.....แห่ง	ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลาย ฤดูฝน มีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม บริเวณโครงการ เกษตรกรระบาย น้ำลงแหล่งน้ำ อีกทั้งบริเวณรอบ โครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ทางการเกษตร ผู้รับจ้างจึงไม่ สามารถระบายน้ำออกจาก แหล่งน้ำได้

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	วงเงินตาม พ.ร.บ. ๑๖๕.๘๓๗๐ ล้านบาท	เป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u> จำนวน.....๕.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๑๑,๒๓๓.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑๑,๗๖๒๘๘.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๑๐,๙๙๑.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	-
ผล	วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑๖๔.๓๗๔๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๖.๑๖๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๒ (คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๖ ของวงเงินตาม พ.ร.บ.)	ผลการดำเนินงานตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง-.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)-.....แห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....๕.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ-.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๓.....แห่ง หยุดงาน๒.....แห่ง อื่นๆ ระบุ.....-.....แห่ง	ดำเนินการก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากเริ่มสัญญาในช่วงปลาย ฤดูฝน มีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม บริเวณโครงการ เกษตรกรระบาย น้ำลงแหล่งน้ำ อีกทั้งบริเวณรอบ โครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ทางการเกษตร ผู้รับจ้างจึงไม่ สามารถระบายน้ำออกจาก แหล่งน้ำได้

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับหน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)	-	-
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (กลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)	-	-
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)	-	-
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)	- ศปว.เป็นหน่วยงานดำเนินการ โดยได้ขอความ อนุเคราะห์ ผอ.สทท.๓,๔,๕ และ ๑๑ มอบหมาย ให้ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ การจ้าง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่และมีความชำนาญ การติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ	- มีแหล่งน้ำที่มีความ เหมาะสมในการติดตั้งเสาวัด ระดับน้ำ ในพื้นที่ สทท.๔ จำนวน ๑๑ แหล่งน้ำ อยู่ ระหว่างดำเนินการ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับหน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)	-	-

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๕.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพิ่มเติม จำนวนรวม ๑๙๙ สถานี อยู่ในพื้นที่ สทผ.๔ จำนวน ๘ สถานี ทั้งนี้ จากจำนวนสถานีที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้น แต่งบประมาณได้รับจัดสรรเท่าเดิมหรือลดลง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีมากขึ้น (ค่าตอบแทนผู้รู้/ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำสถานีที่ชำรุด/ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสนามประจำเดือน/ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ในการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำ/ประสานงานผู้รู้ ผู้นำชุมชน เครือข่ายหมู่บ้านครอบคลุม) จะส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาสถานีทำได้เพียงปีละ ๓ ครั้ง ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน การบำรุงรักษาสถานีสนามทำได้ไม่เต็มศักยภาพ เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากต้องปฏิบัติงานในสภาวะที่ทรัพยากรมีจำกัดแต่ต้องทำให้ได้มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย หรืออาจทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดประจำปี ไม่สัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวัง.....

๕.๒ บุคลากรและยานพาหนะในงานปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบวัสดุ มีไม่เพียงพอ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนดังนี้
.....(๑) ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (ข้าราชการ/พนักงานราชการ) เพื่อทดแทนอัตราที่จะเกษียณอายุราชการ
.....(๒) ขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุก ๓ ตัน ๖ ล้อ พร้อมเครน และรถบรรทุกขับเคลื่อน ๔ ล้อ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อทดแทนยานพาหนะเดิมที่มีสภาพเก่าไม่พร้อมใช้งาน.....

ชื่อผู้ประสานงานนายธนกร ฤๅษศรี.....
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล.....
เบอร์โทรศัพท์๐๘๙-๒๐๕๘๒๑๐.....

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.๕

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑๓) งบบุคลากร	๘,๔๙๘,๖๒๐.๖๕	๘,๔๙๘,๖๒๐.๖๕	๑๐๐.๐๐
๑๔) งบดำเนินงาน	๕,๔๕๘,๘๙๗.๒๖	๔,๙๙๕,๙๕๐.๒๒	๙๑.๕๒
๑๕) งบลงทุน	๓๖๖,๐๗๓,๑๔๕.๐๐	๒๓๒,๑๐๓,๑๔๕.๐๓	๖๓.๔๐
๑๖) งบรายจ่ายอื่น	๔,๙๓๕,๕๒๙.๐๐	๒,๗๓๘,๒๖๑.๓๘	๕๕.๔๘
รวม	๓๘๔,๙๖๖,๖๔๓.๙๑	๒๔๘,๓๓๕,๙๗๗.๒๘	๖๔.๕๑

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	เบิกจ่ายบาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๒๕ แห่ง	-
ผล	เบิกจ่าย ๔,๐๒๗,๒๐๖.๘๑ บาท (ร้อยละ ๘๑.๘๕)	ดำเนินงานได้ ร้อยละ ๘๑.๘๕	-

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๐๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท	๖ แห่ง	-
ผล	เบิกจ่าย ๘๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๘๐.๕๙)	ดำเนินงานได้ ร้อยละ ๘๐.๕๙	-

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๗๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท	๔ แห่ง	-
ผล	เบิกจ่าย ๑,๗๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินงานได้ ร้อยละ ๑๐๐	-

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุดผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๓๘๑,๖๐๐	๓๔๑,๓๘๐ (ร้อยละ ๘๙.๔๖)	ตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย จำนวน ๓๔ สถานี สามารถใช้การและส่งสัญญาณข้อมูลได้ ๓๓ สถานี	อุปกรณ์บางชนิดไม่สามารถจัดหาซื้อได้ในพื้นที่ ต้องขอเบิกจาก สวพ. ในการจัดซื้อให้ เช่น หน้าจอ PCL
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูล สัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๒๒๑,๔๘๐	๒๐๒,๑๙๕.๓๘ (ร้อยละ ๙๑.๒๙)	ตรวจสอบและ บำรุงรักษาสถานีโทร มาตร จำนวน ๑๘ สถานี อุปกรณ์ Unidata ระบบน็อน ชำระค่า ๑๗ สถานี ไม่ สามารถซ่อมแซมได้	ระบบเซิร์ฟเวอร์ โครงการโขง- ชี-มูล ชำรุดไม่สามารถดู ข้อมูลได้ ได้แจ้ง คปว. เพื่อขอ งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม แล้ว ตามบันทึก สทก.๕ ที่ ทส ๐๖๑๕/๔๕๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย ล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	สวพ.ดำเนินการ	-

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และ
นำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	๑	ใช้งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ ภัยแล้ง น้ำท่วม และงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู (งาน ดำเนินการเอง)	-
๒) สายยางสูบน้ำ ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๖ ชุด	๑	ใช้งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง	-
๓) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	๑	ใช้งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ ประสบอุทกภัย และภัยแล้ง	-

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม
๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒,๑๒๓,๐๓๗ บาท	ปริมาณการสูบน้ำ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ประชาชนได้รับ ประโยชน์ ๑๐,๐๐๐ ครัวเรือน ๓๐,๐๐๐ คน	-
ผล	เบิกจ่าย ๒,๑๒๓,๐๓๗ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	(ระบุผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๑,๔๕๙,๐๐๐.....ลบ. ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด-.....ขวด ประชาชนได้รับประโยชน์ ๔,๖๖๗ ครัวเรือน	งบประมาณบริหารจัดการ เครื่องจักรใหม่ จำนวน ๑,๒๖๕,๓๐๐ บาท ส่งคืนกรมฯ จำนวน ๙๔๙,๖๖๓ บาท เนื่องจากไม่มีการจ้างพนักงานขับ รถและเครื่องจักรกลต่างๆ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
		๑๗,๒๐๗ คน พื้นที่การเกษตร ๔,๘๐๐ ไร่ การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม ปริมาณการสูบน้ำ ๑,๙๙๐,๖๒๐.....ลบ. ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด-.....ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด๖๐๐.....ขวด ประชาชนได้รับประโยชน์ ๘,๗๔๒ครัวเรือน ๒๑,๘๘๗ คน	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๑๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) จำนวน.....๘..... แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๒,๑๔๗..... ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑๓.๙๒๘๘.....ล้าน ลบ. ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์...๑๐,๔๘๖..... ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	-
ผล	เบิกจ่าย ๑๓๐,๑๕๙,๑๙๒.๕๑ บาท (ร้อยละ ๖๐.๒๓)	(ระบุผลการดำเนินงานตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง-.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม๑.....แห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....๙.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๑.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๘..... แห่ง หยุดงาน-.....แห่ง อื่นๆ ระบุ.....-.....แห่ง	-

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๕..... แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๑,๙๐๓..... ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๔.๘๓๖๕.....ล้าน ลบ. ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๕,๔๗๐.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	-
ผล	เบิกจ่าย ๙๕,๓๖๕,๒๔๕.๗๔ บาท (ร้อยละ ๖๖.๒๓)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง-.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม-.....แห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....๕.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๑.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๔..... แห่ง หยุดงาน-.....แห่ง อื่นๆ ระบุ.....-.....แห่ง	-

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)	ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	-

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ชื่อผู้ประสานงาน ...นางสาววิลาสินี วัฒนาวงศ์ดอน.....

ตำแหน่ง ...นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....

เบอร์โทรศัพท์ ...๐๘๐-๔๖๔-๑๑๑๔.....

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.....๖.....

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ๙ กันยายน ๒๕๖๕.....

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๑๗) งบบุคลากร	๗,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๗,๒๙๒,๓๑๔.๐๐	๙๗.๖๓
๑๘) งบดำเนินงาน	๔,๑๐๒,๖๙๐.๐๐	๓,๖๐๘,๑๓๒.๘๙	๘๗.๙๕
๑๙) งบลงทุน	๓๗๘,๕๙๑,๕๑๙.๕๙	๑๘๔,๐๘๘,๗๑๗.๕๘	๔๘.๖๒
๒๐) งบรายจ่ายอื่น	๒,๘๙๗,๐๔๐.๐๐	๒,๒๙๘,๑๗๑.๘๖	๗๙.๓๓
รวม	๓๙๓,๐๖๐,๒๔๙.๕๙	๑๙๗,๒๘๗,๓๓๖.๓๓	๕๐.๑๙

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	-.....บาท	ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการนิเทศติดตาม ผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ในสถานศึกษา	
ผล	-.....บาท (ร้อยละ.....-.....)		

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔,๒๑๘,๐๐๐.....บาท	แผนสำรวจ ออกแบบ ๒๑ โครงการ	
ผล	๔,๐๖๔,๐๐๐.....บาท (ร้อยละ...๙๖.๓๕.....)	สำรวจ ออกแบบ แล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๑๑๘,๗๖๐.....บาท	แผนควบคุมงาน ๒๗ โครงการ	หมายเหตุ : งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๕ โครงการ งบกลาง พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒ โครงการ
ผล	๘๘๖,๑๐๐....บาท (ร้อยละ..๗๙.๒๐.....)	ควบคุมงานแล้วเสร็จ ๘ โครงการ	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓๕๔,๐๐๐.....บาท	ได้รับโอนจากส่วนกลาง ๑ โครงการ คือ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลอง ขวาง บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด	
ผล	๓๓๗,๔๖๒.๐๐.....บาท (ร้อยละ...๙๕.๓๓.....)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ : เงินคงเหลือ ๑๖,๕๓๘ บาท (แจ้งคืน กรมทรัพยากรน้ำแล้ว)

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ร่วม ดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัย น้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๖๓๒,๔๐๐	๕๘๑,๘๗๐	ตรวจสอบสถานีเตือนภัยฯ ให้ มีประสิทธิภาพพร้อมในการ แจ้งเตือน	งบประมาณไม่เพียงพอ
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยา แม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	๒๒๓,๔๔๐	๒๐๙,๖๓๐	สำรวจ จัดเก็บข้อมูลอุทก- อุตุนิยมวิทยา ไม่น้อยกว่า ๓๐ ครั้ง/ปี จำนวน ๑๓ สถานี (โดยเพิ่มความถี่ในการสำรวจ ข้อมูลช่วงฤดูฝน)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โดยจัดเก็บ ข้อมูลได้เพียง ๑๘ ครั้ง จากเป้าหมาย ๓๐ ครั้ง
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและ ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๒๕๐,๕๐๐	๒๒๒,๔๔๐	อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซ อ ม แ ช ม หั ง ร ะ บ บ กรุงเทพมหานคร สัญญา เลขที่ ทส ๐๖๐๑/๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
			ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานในส่วนสถานี แล้วเสร็จ ๑๐๐% วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีเข้า Server อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค(ทุกภาค) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ			

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-	ส่วนบริหารจัดการน้ำ ประสานกับสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ แจ้งว่าอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา ซึ่งยังไม่ได้ขออนุมัติเพื่อส่งมอบไปประจำการ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคใด	
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย	-	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ไม่ได้รับการจัดสรร	
๓) สายยางสูบน้ำ ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด	-	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ไม่ได้รับการจัดสรร	
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	-	ส่วนบริหารจัดการน้ำ ประสานกับสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ แจ้งว่ายกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๖๗๐,๔๐๐ บาท	บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ในพื้นที่รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด โดยการเตรียมความพร้อมดำเนินงาน ในพื้นที่เผชิญเหตุ รวมถึงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับ การอุปโภค-บริโภค และเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับการนำไปติดตั้งสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาสภาวะวิกฤตน้ำ ตามที่ได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆ โดยปัจจุบันดำเนินการ ช่วยเหลือแล้วจำนวน ๑๘ แห่ง (ภัยแล้งและอุทกภัย) ผู้ได้รับประโยชน์จำนวน ๒๔ หมู่บ้าน ๒๒,๕๑๖ ครัวเรือน ประชากร ๖๕,๓๔๔คน และพื้นที่เกษตร ๗,๒๘๒ ไร่ ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	
ผล	๑,๑๓๑,๔๔๗.๕๘ บาท (ร้อยละ ๗๑.๔๑) คงเหลือ ๕๓๘,๙๕๒.๔๒ บาท	<u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๖,๒๑๔,๐๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด - ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด - ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๑,๙๙๒,๒๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด - ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ๑๓,๘๔๐ ขวด	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๘๐,๒๒๖,๑๒๐.....บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) จำนวน.....๑๕.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๓,๑๔๗.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๗.๘๒.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๖,๗๖๕.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๑๕๐,๕๗๐,๖๑๑.....บาท (ร้อยละ.....๕๓.๗๓.....)	(ระบุผลการดำเนินงานตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง๑.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม-.....แห่ง รวมได้รับงบดำเนินการ๑๔..... แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๗.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๒.....แห่ง หยุดงาน๕.....แห่ง อื่นๆ ระบุแห่ง	หมายเหตุ : ยกเลิก ๑ โครงการ คือ อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ เขาบ่อทอง หมู่ที่ ๔,๕ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๙๒,๖๐๘,๕๐๐.....บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.) จำนวน.....๑๑.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๖๑๐.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑.๗๖.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๑,๔๗๒.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๒๘,๓๖๖,๘๘๐.....บาท (ร้อยละ.....๓๐.๖๓.....)	(ระบุผลการดำเนินงานตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง๑.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม๑.....แห่ง รวมได้รับงบดำเนินการ๑๑..... แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๑.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๙.....แห่ง หยุดงาน๑.....แห่ง อื่นๆ ระบุแห่ง	หมายเหตุ : โอนเปลี่ยนแปลง ๑ โครงการ จาก อนุรักษ์ฟื้นฟูสระ น้ำ รพช.ห้วยมาบไฟ พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการ อพ.สธ. หมู่ที่ ๔ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็น ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน โครงการ ท.ท.ร.พ. ๓.๗๓ พัน.ร.ร.จ.ปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)	ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำดำเนินการ	

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวอิสรา บุญหนุน.....

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ.....

เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๒๔๕๖๕๙๓.....

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๒๑) งบบุคลากร	๘,๓๑๐,๗๐๐.๐๐	๗,๖๐๔,๙๑๐.๑๙	๙๑.๕๑%
๒๒) งบดำเนินงาน	๓,๘๙๕,๔๕๐.๐๐	๓,๔๓๘,๑๒๗.๙๑	๘๘.๒๖%
๒๓) งบลงทุน	๓๕๐,๓๘๕,๑๐๐.๕๑	๒๔๑,๕๕๒,๙๓๕.๔๙	๖๘.๙๔%
๒๔) งบรายจ่ายอื่น	๙,๒๘๓,๙๐๓.๐๐	๖,๖๓๘,๒๖๔.๑๐	๗๑.๕๐%
รวม	๓๗๑,๘๗๕,๑๕๔	๒๕๙,๒๓๔,๒๓๗.๖๙	๖๙.๗๑%

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

-ไม่มีการดำเนินงาน-

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	เบิกจ่ายบาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๖,๔๓๐,๐๐๐ บาท	๑.ดำเนินการสำรวจออกแบบ จำนวน ๔๐ โครงการ ๒.เจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน ๒๕ โครงการ	
ผล	๔,๗๖๘,๖๙๐.๑๑ บาท (ร้อยละ๗๔.๑๖)	๑.ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จ จำนวน ๓๘ โครงการ ๒.ดำเนินการเจาะสำรวจแล้วเสร็จ ๒๗ โครงการ	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๒๐๘,๖๐๐ บาท	ดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ	
ผล	๘๑๖,๓๖๐ บาท (ร้อยละ ๖๗.๕๘)	แล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ โครงการ	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕๔๙,๙๙๘ บาท	ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ	
ผล	๕๔๙,๙๙๘ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

๓ รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การ เคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้อง น้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)				
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัย น้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๙๖๕,๒๐๐	๘๕๙,๔๒๒.๖๒ (๘๙.๐๔%)	ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานี เตือนภัยน้ำท่วม - ดิน ถล่ม (Early Warning) จำนวน ๑๐๔ สถานี สามารถใช้งานได้ คิด เป็นร้อยละ ๙๔.๒๓	- งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ สถานีเตือนภัยฯ - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๑๖๑,๒๘๐	๑๕๒,๗๐๐ (๙๔.๖๘%)	ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา สํารวจและ บันทึกข้อมูลอุทก - อุตุนิยมวิทยา (ปริมาณ ฝน, การระเหย, ความ เข้มแสงแดด, ความเร็ว และทิศทางลม จำนวน ๙ สถานี	- งบประมาณไม่เพียงพอ สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับ สถานีฯ - จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
๔) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุนิยมวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)				

๓ รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๕) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูล สัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๒๐๑,๐๐๐	๑๖๔,๘๐๔ (๘๑.๙๙%)	ตรวจสอบ และ บำรุงรักษาระบบ ตรวจวัดสภาพน้ำ ทางไกลอัตโนมัติ และ ระบบส่งข้อมูลสัญญาณ ภาพ จำนวน ๒๗ สถานี	-
๖) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย ล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)				
๗) คชจ. บำรุงรักษาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก	๔๒๗,๒๗๓	๓๔๘,๐๔๒ (๘๑.๔๖%)	ตรวจสอบพื้นที่ บำรุงรักษา และติดต่อ ประสานงานข้อมูล ระบบตรวจวัดปริมาณ น้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก จำนวน ๒๘ แหล่งน้ำ ๕๖ สถานี	- ขาดอุปกรณ์ในการ บำรุงรักษาสถานีฯ เช่น เรือ, เสื้อชูชีพ

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และ
นำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-	-	-
๒) สายยางสูบลมน้ำ ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๖ ชุด	๒ ชุด	ยังไม่ได้นำไปใช้ดำเนินงาน	ใช้ประกอบการติดตั้งเครื่องสูบลมน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว เพื่อเพิ่ม ระยะการส่งน้ำจากแหล่งน้ำไป ยังพื้นที่รับน้ำที่อยู่ห่างไกล
๓) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	-	-	-
๒) เรือดูดโคลน	-	๒ ชุด	ใช้ในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำบึงบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	-
๓) รถขุดตักไฮดรอลิก	-	๒ คัน	ใช้ในการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำบึงบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี	-

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗,๐๘๔,๖๕๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.	
ผล	๕,๐๘๙,๔๙๐.๔๘ บาท (ร้อยละ ๗๑.๙๘)	(ระบุผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๑๒,๙๖๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด - ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด - ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๒๙,๕๘๐,๔๘๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด - ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด - ขวด	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	งบประมาณ ตามสัญญา ๑๖๖,๓๑๗,๐๒๐.๘๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๑๖.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๑,๘๘๗.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑,๒๑..... ล้าน ลบ. ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๗,๙๖๐.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	เบิกจ่าย ๙๕,๙๕๑,๘๕๖.๔๖ บาท (ร้อยละ ๕๐.๑๘)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม...๒...แห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....๑๘.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ.....๑๒.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง.....๕..... แห่ง หยุดงาน...๒.....แห่ง อื่นๆ ระบุ.....แห่ง	ปัญหา อุปสรรค ๑.อยู่ระหว่างหยุดงาน ๒ โครงการ เนื่องจากปัญหาพื้นที่ อ้างสิทธิ์ แนวทางการแก้ไข ประสานหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อดำเนินการขออนุญาต

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑๕๐,๙๘๖,๔๘๑.๕๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๗.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๘๓๗.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๐.๕๕.....ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๔.๑๖๘.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	
ผล	เบิกจ่าย ๑๓๙,๔๖๕,๖๓๐.๗๑ บาท (ร้อยละ ๙๒.๓๗)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง-.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม-.....แห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....-.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๕.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๒.....แห่ง หยุดงาน-.....แห่ง อื่นๆ ระบุ.....-.....แห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

-ไม่มีการดำเนินงาน-

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑ สนับสนุนอัตรากำลังในการปฏิบัติการทั้งที่เป็นภารกิจเดิม และภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเครื่องกล รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อรองรับภารกิจในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ/นักวิชาการแผนที่
- ๕.๒ ต้องการงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะ เนื่องจากมีเครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ ชำรุดสึกหรอจากการใช้งาน
- ๕.๓ ด้านยานพาหนะและเครื่องจักร เพื่อทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน มีสภาพอายุการใช้งานนาน และไม่รองรับกับเครื่องมือที่ได้รับเพิ่มเติมจากกรมทรัพยากรน้ำ และไม่เพียงพอต่อใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกพร้อมเครนขนาดใหญ่ รถกระบะบริการ
- ๕.๔ ครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ต่างๆ

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวทัศนีย์ พูลผล.....
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.....
เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๓๔๔๘๘.....

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๒๕) งบบุคลากร	๘,๑๐๐,๕๐๐	๗,๗๙๘,๖๘๙.๖๖	๙๖.๒๗
๒๖) งบดำเนินงาน	๔,๗๔๗,๒๙๐	๓,๙๙๔,๗๗๘	๘๔.๑๕
๒๗) งบลงทุน	๑๗๖,๖๕๐,๖๖๐	๑๖๘,๒๓๙,๕๗๐	๙๕.๒๔
๒๘) งบรายจ่ายอื่น	๓,๙๐๙,๘๙๕	๓,๕๔๙,๕๓๐	๙๐.๗๘
รวม	๑๙๓,๔๐๘,๓๔๕	๑๘๓,๕๘๒,๕๖๙	๙๔.๙๒

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๖๖๕,๒๙๐	ดำเนินงาน คจช.บริหาร สทภ.๘	
ผล	๓,๐๖๗,๖๒๔ (ร้อยละ ๘๓.๖๙)	ดำเนินงาน คจช.บริหาร สทภ.๘	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๖,๑๒๖,๐๐๐	ดำเนินการ ๒๖ แห่ง	
ผล	๖,๐๕๑,๕๓๑ (ร้อยละ ๙๘.๗๘)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๐๔๐,๕๐๐	๕ แห่ง	
ผล	๑,๐๓๙,๖๘๐ (ร้อยละ ๙๙.๙๒)	๑๒ แห่ง	

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)				
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๑,๕๖๙,๔๐๐	๑,๔๐๕,๑๓๐ (ร้อยละ ๘๙.๕๓)	การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม	
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)				
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๑๒๐,๒๐๐	๙๘,๙๑๒ (ร้อยละ ๘๒.๒๙)	บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	๖๕๕,๗๔๕	๖๐๘,๖๖๐	เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย	

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน			
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย			
๓) สายยางสูบน้ำ ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด			
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง			

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๓๒๑,๓๕๐	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	๑,๒๘๐,๗๔๓ (ร้อยละ ๙๖.๙๓)	<u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ เครื่อง ๑) บ้านพรอ้ายเล ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ๒) บ้านปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ๓) บ้านห้วยน้ำเย็น ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ๔) บ้านโคกหรั่ง ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ๕) บ้านบาตัน ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๗๐๖,๓๒๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑๕ เครื่อง ๑) ทำอากาษยานนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง	

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
		จ.นครศรีธรรมราช ๒) ประตุระบายน้ำบางไทร หมู่ที่ ๘ ต.บ้านใหม่ อ.ปาก พั่น จ.นครศรีธรรมราช ๓) ชุมชนวังเนียง(ถนนไชยบุรี) ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ. พัทลุง ๔) บ้านดอนเค็ด(ถนนไชยบุรี) ม.๖ ต.เขาเจ็ยก อ.เมือง จ.พัทลุง ๕) บ้านบ่อโพธิ์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๖) สวน ๗๒ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ต.บ่อ่าง อ.เมือง จ.สงขลา ๗) กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๙ ต. บ่อ่าง อ.เมือง จ.สงขลา ๘) บ้านทุ่งใหญ่(ถ.สายเกาะถ้ำ-ชายทะเล) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙) บ้านบ่อโพธิ์(รอยต่อ ม. ๕ ท่านางหอม) ต.น้ำน้อย อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ๑๐) บ้านหนองบัว ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๑๑) สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ ต.คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา ๑๒) บ้านบ่อปลิง ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๑๓) บ้านวังคุย (ทต.กำแพงเพชร) ต.กำแพงเพชร อ.รัต ภูมิ จ.สงขลา ปริมาณการสูบน้ำ ๑,๗๒๙,๑๑๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาดลิตร น้ำดื่มบรรจุขวดขวด	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๘๔,๘๐๙,๑๖๐	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๙ แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๒,๖๒๐ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๒.๒๙๒๐ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒,๗๔๐ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๘๔,๘๐๙,๑๖๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	แล้วเสร็จ ๙ แห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗๔,๗๕๕,๐๐๐	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๓ แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๑,๐๕๐ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๐.๓๖๑๑ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๖,๔๐๐ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	๖๖,๔๑๙,๑๙๙ (ร้อยละ ๘๘.๘๕)	ลงนามเรียบร้อยแล้ว ๓ แห่ง - แล้วเสร็จ ๒ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ แห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (กลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (กลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค...๙.....

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๒๙) งบบุคลากร	๔,๑๘๖,๕๐๐.๐๐	๓,๘๓๐,๗๓๗.๐๐	๙๑.๕๐
๓๐) งบดำเนินงาน	๕,๓๐๑,๓๐๐.๐๐	๔,๖๔๗,๓๓๘.๗๑	๘๗.๖๖
๓๑) งบลงทุน	๓๓๐,๒๒๓,๔๑๘.๐๐	๘๙,๕๖๙,๘๙๗.๕๖	๒๗.๑๒
๓๒) งบรายจ่ายอื่น	๗,๒๐๘,๖๘๖.๐๐	๖,๐๑๔,๓๔๗.๐๙	๘๓.๔๓
รวม	๓๔๖,๙๑๙,๙๐๔.๐๐	๑๐๔,๐๖๒,๓๒๐.๓๖	๓๐.๐

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่ม ศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบ คุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔๓๖,๗๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งาน ตรวจสอบคุณภาพน้ำ รวมทั้งเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ของระบบผลิตน้ำดื่ม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ได้แก่ ๑) ระบบผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน ๒๒ แห่ง ๒) ระบบผลิตน้ำดื่ม ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย ภูเขา (ศคช.) จำนวน ๓๓ แห่ง	- งบประมาณในการเปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุด ไม่เพียงพอ ต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ใน แผนงานพื้นฐานฯ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ หรือ แผนบูรณาการฯ - พื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ภูเขา สูงชัน เป็นอุปสรรคต่อการ เดินทาง และเสี่ยงอันตราย - จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงาน
ผล	เบิกจ่าย ๔๓๖,๖๔๘.๐๐ บาท (ร้อยละ ๙๙.๙๙)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐%	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....-

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕,๐๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำรวจทั้งหมด ๓๑ โครงการ	
ผล	เบิกจ่าย ๔,๐๗๑,๙๒๐.๐๖ บาท (ร้อยละ ๘๑.๐๘)	(ระบุผลการดำเนินงาน) - ผลสำรวจ ๑๐๐ % ๒๑ โครงการ - ผลสำรวจ ๙๐% ๒ โครงการ - ยังไม่สำรวจ ๘ โครงการ	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๗๖๒,๙๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ แห่ง	
ผล	เบิกจ่าย ๙๕๐,๖๘๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๓.๙๓)	(ระบุผลการดำเนินงาน) โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % จำนวน ๗ แห่ง	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๙๑๐,๒๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) บำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๙ แห่ง	
ผล	เบิกจ่าย ๙๒๔,๕๘๕.๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๓.๖๕)	(ระบุผลการดำเนินงาน) แล้วเสร็จ จำนวน ๓ แห่ง	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงาน ที่ร่วมดำเนินการ โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๒,๓๗๓,๗๐๐.๐๐	๒,๑๓๔,๔๘๓.๐๐ ร้อยละ ๘๙.๙๒	ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีเตือนภัย น้ำท่วมดินถล่ม จำนวน ๒๕๙ สถานี	บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากสูงอายุและเกษียณอายุราชการ ควรเพิ่มบุคลากร
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)				
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๘๒๙.๔๙ ร้อยละ ๘๖.๗๒	ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จำนวน ๑๗ สถานี	งบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษาไม่เพียงพอ ควรเพิ่มงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)				

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-	-	-
๒) สายยางสูบลม ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๖ ชุด	-	-	-
๓) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	-	-	-

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๘๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) พื้นที่จังหวัดน่าน ๔ แห่ง จังหวัดแพร่ ๕ แห่ง จังหวัด อุดรดิตถ์ ๘ แห่ง จังหวัดพิจิตร ๔ แห่ง จังหวัดพิษณุโลก ๕ แห่ง และจังหวัดสุโขทัย ๓ แห่ง	
ผล	เบิกจ่าย ๒,๙๕๒,๖๔๙.๖๐ บาท (ร้อยละ ๗๗.๖๘)	(ระบุผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ๔,๑๒๒,๖๒๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด๑๖๐,๐๐๐..ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด๙,๕๒๘.....ขวด <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ๙๘๔,๓๐๐.....ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาดลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด๔,๐๐๐.....ขวด	การผลิตน้ำขวด ไม่สามารถผลิต ได้เนื่องจาก วัตถุประสงค์ของการ ใช้งบประมาณ ไม่ได้แจ้งว่าเพื่อ ผลิตน้ำบรรจุขวด (ประสาน ตรวจสอบภายใน) แต่ในเอกสารของ ศปว. ระบุว่า สามารถจัดหาได้ ดังนั้น ควร แก้ไขแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และระบุให้ชัดเจน ว่าสามารถ จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดได้หรือไม่

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๑๗,๙๗๘,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๑๒.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๕,๙๖๑.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๒๗.๓๓.....ล้าน ลบ. ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๑๑.๓๙๐.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	เบิกจ่าย ๔๓,๕๒๖,๐๐๓.๘๓ บาท (ร้อยละ ๒๑.๒๘)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง-.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม๒..... ..แห่ง รวมได้รับบฯ ดำเนินการ.....๑๔..... ..แห่ง ๒. แล้วเสร็จ ๕.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๖.....แห่ง หยุดงาน๓..... ..แห่ง อื่นๆ ระบุ.....-.....แห่ง	๒.แล้วเสร็จ ๕ แห่ง แต่ยังไม่ได้ เบิกจ่าย ๑ แห่ง ๓.หยุดงาน ๓ แห่ง เนื่องจากน้ำ ท่วมโครงการ ๑ แห่ง และติด ปัญหาการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ๒ แห่ง

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑๐๒,๔๔๐,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๑๗.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์.....๑,๕๕๗.....ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก.....๑.๒๗.....ล้าน ลบ. ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์.....๓,๒๓๖.....ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)-.....	
ผล	เบิกจ่าย ๔๐,๐๙๖,๗๐๘.๖๗ บาท (ร้อยละ ๓๙.๑๔%)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ๒.....แห่ง ได้รับเพิ่มเติม๑๓.....แห่ง รวมได้รับงบฯ ดำเนินการ.....๒๘.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ๑๗.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง๑๐..... แห่ง หยุดงาน๑.....แห่ง อื่นๆ ระบุ.....-.....แห่ง	๓ หยุดงาน ๑ โครงการ เนื่องจาก น้ำท่วมโครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)		
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

ชื่อผู้ประสานงาน.....นางสาวจิรัชยา จันทร์คำ
ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์.....๐๘๕-๐๘๕๘๐๘๒

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค.....๑๑.....

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๓๓) งบบุคลากร	๔,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๓๑,๗๓๙.๘๙	๘๙.๑๔
๓๔) งบดำเนินงาน	๓,๔๗๘,๗๐๐.๐๐	๓,๒๔๖,๗๑๐.๖๗	๙๓.๓๓
๓๕) งบลงทุน	๙๙,๘๔๑,๖๐๐.๐๐	๔๕,๒๖๐,๕๔๕.๓๗	๔๕.๓๓
๓๖) งบรายจ่ายอื่น	๓,๘๕๔,๘๗๐.๐๐	๓,๓๘๗,๘๔๔.๐๕	๘๗.๘๘
รวม	๑๑๑,๘๐๐,๑๗๐.๐๐	๕๖,๐๒๖,๘๓๙.๙๘	๕๐.๑๑

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๓,๗๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท	สำรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค ๑๐ จำนวน ๒๔ โครงการ	-
ผล	เบิกจ่าย ๓,๔๗๐,๘๐๓.๗๐ บาท (ร้อยละ ๙๓.๔๐)	สำรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ	-

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๗๐๔,๓๐๐.๐๐ บาท	ควบคุมงานโครงการ จำนวน ๖ โครงการ	สามารถเบิกจ่ายงบประมาณค่า ควบคุมงานได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ผล	เบิกจ่าย ๔๗๔,๓๘๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๗.๓๕)	ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ โครงการ	-

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัย น้ำท่วม-ดินถล่ม (สทก. ๑๐ เป็นเงิน ๑,๙๕๘,๓๐๐.๐๐ บาท)	๑,๙๕๘,๓๐๐.๐๐	๑,๗๐๖,๖๖๘.๙๒ ร้อยละ ๘๗.๑๕	๑. ค่าตอบแทนผู้รู้ ประจำสถานีเตือนภัย ๒. ค่าจ้างเหมา พนักงานปฏิบัติงาน EWS. ๓. คชจ.เดินทางไป ราชการ ซ่อมบำรุง สถานีเตือนภัย ๔. ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์งาน เตือนภัย	-
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยา (สทก. ๑๐ เป็นเงิน ๔๗๕,๘๓๐ บาท)	๔๗๕,๘๓๐.๐๐	๔๔๑,๓๙๐.๐๐ ร้อยละ ๙๒.๗๖	๑. ค่าตอบแทน พนักงาน อ่าน ข้อมูลประจำสถานี ๒. คชจ.เดินทางไป ราชการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา	-
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพ น้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่ง ข้อมูลสัญญาณภาพ (สทก. ๑๐ เป็นเงิน ๑๐,๘๔๐ บาท)	๑๐,๘๔๐.๐๐	๑๐,๗๐๑.๐๓ ร้อยละ ๙๘.๗๒	๑. ค่าไฟฟ้าสถานี CCTV ๒. ค่าซ่อมอุปกรณ์ สำนักงานที่ใช้ใน งาน CCTV	-
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือน ภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	-

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และนำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงานโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-		
๒) ครุภัณฑ์การเกษตร	๖ หน่วย	-		
๓) สายยางสูบน้ำ ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด	-		
๔) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	-		

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๒๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) สนับสนุนให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัย ๒๐ แห่ง	-
ผล	เบิกจ่าย ๑,๐๔๑,๖๘๓.๑๐ บาท (ร้อยละ ๘๕.๒๗)	(ระบุผลการดำเนินงาน) การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง ปริมาณการสูบน้ำ ๑,๓๐๘,๘๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาด ๔๖๘,๐๐๐ ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวดขวด ประโยชน์ที่ได้รับ -เพื่อการอุปโภคบริโภค ๑๐ หมู่บ้าน ๑๖๒ ครัวเรือน ประชากร ๗๓๐ คน - พื้นที่เกษตร ๓,๑๐๐ ไร่ การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม ปริมาณการสูบน้ำ ๑๐๕,๖๐๐ ลบ.ม. ปริมาณการแจกจ่ายน้ำสะอาดลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด ๑,๒๗๐ ขวด ประโยชน์ที่ได้รับ	-

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
		-เพื่อการอุปโภคบริโภค ๘ หมู่บ้าน ๓๕๐ครัวเรือน ประชากร ๑,๓๖๕ คน - พื้นที่เกษตร ๕๑๕ ไร่	

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔๘,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน ๑ แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๐ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๐.๕๖๐๐ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๓,๗๓๕ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	-
ผล	เบิกจ่าย ๑๘,๗๓๒,๐๗๖.๗๒ บาท (ร้อยละ ๓๘.๒๕)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง..... -.....แห่ง - ได้รับเพิ่มเติม-.....แห่ง - รวมได้รับงบประมาณดำเนินการ๑.แห่ง ๒. แล้วเสร็จ.....-.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง.....๑.....แห่ง - หยุดงาน.....-.....แห่ง ๔. อื่นๆแห่ง	-

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สนับสนุนน้ำเพื่อการปศุสัตว์และการเกษตรกรรม ระยะที่ ๑
หมู่ที่ ๙ ตำบลมะลวน อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๔๔,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) จำนวน.....๕.....แห่ง ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๙๖๖ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๐.๑๗๔๘ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๒,๓๐๕ ไร่ ประโยชน์อื่น (ระบุ)	
ผล	เบิกจ่าย ๒๒,๕๘๓,๒๘๔.๙๕ บาท (ร้อยละ ๕๑.๒๕)	(ระบุผลการดำเนินงาน <u>ตามแผนและที่ได้รับเพิ่มเติม</u>) ๑. มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง.....-.....แห่ง - ได้รับเพิ่มเติม-.....แห่ง - รวมได้รับงบดำเนินการ-.....แห่ง ๒. แล้วเสร็จ.....๑.....แห่ง ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง.....๔.....แห่ง - หยุตงาน.....-.....แห่ง ๔. อื่นๆแห่ง	

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ เป้าหมาย ๒๑๙ แห่ง (excel)

๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านบางฝนตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบรือ อำเภอลำทะลุ จังหวัดชุมพร

๒. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนพื้นที่ สปก. แปลง ๘๓ ช่วง ๒

ตำบลหงส์เจริญ อำเภอลำทะลุ จังหวัดชุมพร

๓. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มังคุด

หมู่ที่ ๘ ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๔. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยทุ่งฟ้า

บ้านนาปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๕. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำแหล่งน้ำห้วยโคก สนับสนุนพื้นที่ สปก.

หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับ หน่วยงานส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและ ระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลเขาชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๘,๐๘๔,๕๐๐ บาท)	-	-
๒) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) (๒๘,๗๑๖,๕๐๐ บาท)		
๓) คชจ.การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและ อำเภอบางสะพาน) (๓๖,๗๘๐,๘๐๐ บาท)		
๔) คชจ.การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)		
๕) คชจ. การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำบางปะกงและ ปราจีนบุรี) (๒๒,๔๑๔,๐๐๐ บาท)		

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

๕.๑ ขอให้กรมสนับสนุนพนักงานราชการในตำแหน่งช่างเทคนิค

๕.๒

๕.๓

ประเด็นการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยรับตรวจ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการส่วนที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง ขอความร่วมมือจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

๑. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
๓๗) งบบุคลากร	-	-	-
๓๘) งบดำเนินงาน	๓,๒๖๐,๙๕๐.๐๐	๒,๔๖๔,๓๒๐.๓๖	๗๕.๕๗
๓๙) งบลงทุน	๘๓,๙๖๙,๔๒๔.๐๐	๖๓,๙๗๔,๓๘๑.๓๑	๗๖.๑๙
๔๐) งบรายจ่ายอื่น	๒,๘๕๕,๘๖๘.๐๐	๒,๒๓๕,๖๒๘.๘๓	๗๘.๒๘
รวม	๙๐,๐๘๖,๒๔๒.๐๐	๖๘,๖๗๔,๓๓๐.๕๐	๗๖.๒๓

๒. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๒.๑ ผลผลิตที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพพลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน)	
ผล	เบิกจ่าย.....บาท (ร้อยละ.....)	(ระบุผลการดำเนินงาน)	

๒.๒ ผลผลิตที่ ๒ : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- ค่าสำรวจออกแบบ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท	ทั้งหมด ๓๙ โครงการ	-
ผล	เบิกจ่าย ๔,๖๑๖,๔๐๙.๘๔ บาท (ร้อยละ ๙๑.๙๖)	ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ๒๗ โครงการ	-

- ค่าควบคุมงาน

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๘๗๒,๔๐๐ บาท	ทั้งหมด ๑๑ โครงการ	-
ผล	๘๕๓,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๙๗.๘๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ	-

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

.....

- บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท	ทั้งหมด ๒ โครงการ	
ผล	เบิกจ่าย ๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ	

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

.....

๒.๓ ผลผลิตที่ ๓ : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์ และเตือนภัย

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอน ท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว (๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท)	๔๘๖,๖๕๐	๓๓๓,๑๖๐ ร้อยละ ๖๘.๔๖	- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ด้านการวัดปริมาณน้ำแม่น้ำ โขง ณ สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานี โขงเจียม (๔ ครั้ง/เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๔๐ ครั้ง)	ขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ ทันสมัย (เครื่อง adcp/ กล้องสำรวจ)
๒) คชจ.การบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ ท่วม-ดินถล่ม (๒๐,๓๒๘,๘๐๐ บาท)	๑๑๘,๐๐๐	๘๘,๐๗๑ ร้อยละ ๗๔.๖๔	- ดำเนินการตรวจสอบและ บำรุงรักษาสถานีเตือนภัยน้ำ ท่วม - ดินถล่มในพื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลฯ (๑ ครั้ง/เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๑ ครั้ง)	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ และ การจัดสรรงบประมาณ จากส่วนกลางไม่เป็นไป ตามแผน ทำให้การ ดำเนินงานขาดความ ต่อเนื่อง

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๓) คชจ.การบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่น้ำโขง (๘๐๓,๐๐๐ บาท)	๑๕๑,๖๐๐	๙๖,๙๔๐ ร้อยละ ๖๓.๙๔	- ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่น้ำโขงในพื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.นครพนม จ.อำนาจเจริญและ จ.อุบลฯ (๒ ครั้ง/เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๖ ครั้ง)	-
๔) คชจ.บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ (๔,๐๐๒,๒๐๐ บาท)	๑๒๓,๖๐๐	๙๓,๕๐๙.๕๘ ร้อยละ ๗๕.๖๖	ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญและ จ.อุบลฯ (๑ ครั้ง/เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง)	
๕) คชจ.ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท)	-	-	-	ไม่ได้รับงบประมาณ
๖) คชจ.ในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา	๙๓๖,๒๔๕	๗๓๔,๓๘๐ ร้อยละ ๗๘.๔๔	- ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลข้อมูล แบ่งความรับผิดชอบทั้งหมด ๓ ศูนย์ ดังนี้ ๑. ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา มุกดาหาร (รับผิดชอบพื้นที่ จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร และ จ.นครพนม) ๒. ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาโขงเจียม (รับผิดชอบพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลฯ) ๓. ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาอุบลราชธานี (รับผิดชอบพื้นที่ จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลฯ) (ข้อมูลระดับน้ำเก็บข้อมูลรายวัน) (ข้อมูลปริมาณน้ำ ๑ ครั้ง/เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๑๒ ครั้ง)	-

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ระบุผลการดำเนินงานที่ ร่วมดำเนินการโดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๗) คชจ.ในการบำรุงรักษาตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก	๘๒,๓๗๓	๕๘,๔๑๖ ร้อยละ ๖๓.๒๔	- ดำเนินการตรวจสอบ ระบบวัดปริมาณน้ำเก็บกัก ในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ใน พื้นที่ จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลฯ (๑ครั้ง/เดือน) (ดำเนินการแล้ว ๒ ครั้ง)	-

๓. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๑ โครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ : หน่วยงานได้รับครุภัณฑ์รายการต่างๆ จำนวนเท่าไร และ
นำไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งอย่างไร

	แผน (รวม)	จำนวนที่ได้รับ	ระบุผลการดำเนินงาน โดยสังเขป	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ๖ คัน ๖ ล้อ ติดตั้งเครน	๒ คัน	-		
๒) สายยางสูบน้ำ ๑๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	๖ ชุด	-		
๓) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ เครื่อง	๑ ชุด	ต.ค.-พ.ย.๖๔ ใช้เป็นท่อส่งน้ำ ของเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบาย น้ำในลำน้ำมูล ณ หาดทรายแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ และ สูบน้ำท่วมขังในชุมชน ทำกอไผ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ	- เชื้อชาติรถที่มีขนาดเล็กทำให้น้ำรั่ว - ม้วนเก็บสายยากควรจัดหา เครื่องมือม้วนเก็บสายที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทุ่นแรงการปฏิบัติงานต้องการ ชนิดหนาที่ทนแรงดันได้สูง ขณะส่งได้ ไกล ๑.๕ กม.
๔) เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๒ นิ้ว	๖ ชุด	๑ ชุด	ต.ค.-พ.ย.๖๔ ใช้สูบน้ำ เพื่อเร่ง ระบายน้ำในลำน้ำมูล ณ หาด ทรายแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ และสูบน้ำท่วมขังใน ชุมชน ทำกอไผ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ	- ไม่สามารถสูบน้ำระยะไกลได้ ต้องการเครื่องสูบน้ำชนิดที่สามารถ สูบน้ำได้ไกลประมาณ ๑.๕ กม. จำนวน ๒ เครื่อง - ชุดเครื่องมือ ช่วยในการติดตั้งเรือ ถอน ต้องการเครื่องมือที่ช่วยผ่อนแรง และทำงานให้เร็ว เช่น บล็อกไฟฟ้า สาย ฯลฯ

หมายเหตุ (ถ้ามี)

.....

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

(งบประมาณรวม ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	-การจัดสรรงบประมาณทั้งปี จะได้ ๘๗๓,๐๐๐ บาท -ได้รับงบประมาณแล้ว ๒๓๒,๑๐๐ บาท	เป้าหมายการดำเนินงาน -ปริมาณการสูบน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำแล้ง น้ำท่วม จำนวน ๑๐ แห่ง ได้ปริมาณน้ำ ๕๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ ๔,๘๐๐ ครัวเรือน จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน	- งบประมาณมีความล่าช้า จึงให้ จนท. ออกปฏิบัติงานตามคำ ขอรับการสนับสนุนก่อน เมื่อ ได้รับงบประมาณจึงเบิกจ่าย ย้อนหลัง - มีหลายพื้นที่ที่ต้องช่วยเหลือ ตนเอง เช่น ชื้อเครื่องสูบน้ำ หรือ ได้งบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพ แหล่งน้ำ - ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝน ค่อนข้างมาก และแหล่งน้ำ สามารถเก็บน้ำได้
ผล	- เบิกจ่าย ๒๐๘,๗๑๕ บาท (ร้อยละ๘๘.๙๒ ของ งบประมาณที่ได้รับ) -คงเหลือ ๒๓,๓๘๑ บาท (เกิน ไว้จ้างเหมาพนักงานช่วยงาน ธุรการ สบ.น.เดือน ก.พ.-มี.ค. ๖๕)	(ระบุผลการดำเนินงาน) <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำแล้ง</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๑๗๓,๖๐๐ ลบ.ม. <u>การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย น้ำท่วม</u> ปริมาณการสูบน้ำ ๒,๙๒๖,๔๐๐ ลบ.ม. น้ำดื่มบรรจุขวด ๖๐๐ ขวด	- ไม่ได้รับงบประมาณในไตรมาส ๒ ทำให้มีเงินค้างจ่ายค่าเดินทาง ไปปฏิบัติราชการของ จนท. จำนวน ๑๐๙,๘๐๐ บาท - ได้แจ้งให้ ศวป.ทราบเพื่อหาทาง แก้ไขแล้ว - เห็นควรจัดสรรงบฯ ตามพื้นที่ ที่มีภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมตาม สภาพจริง ไม่ใช่จัดสรรงบฯ เท่ากันทั้ง ๔ ไตรมาส ทำให้ บริหารงบฯ ไม่ทัน

๔. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๔.๑ โครงการที่ ๑ : โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๕๓,๓๖๙,๐๐๐ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน) จำนวน ๒ แห่ง - ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๔๐ ครัวเรือน - ปริมาณน้ำเก็บกัก ๓.๑๔๙๗ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๔,๑๘๕ ไร่	
ผล	๓๔,๘๒๗,๐๗๖.๔๗ บาท (๖๕.๒๖ ร้อยละ)	(ระบุผลการดำเนินงาน) ลงนามเรียบร้อยแล้ว ๒ แห่ง - แล้วเสร็จ ๑ แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ แห่ง	

๔.๒ โครงการที่ ๒ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

	การใช้งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน	ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
แผน	๒๓,๒๘๖,๐๒๔ บาท	(ระบุเป้าหมายการดำเนินงาน <u>ตาม พ.ร.บ.</u>) - จำนวน ๗ แห่ง - คริวเรือนได้รับประโยชน์ ๔๕๘ คริวเรือน - ปริมาณน้ำเก็บกัก ๑.๖๑๖๙ ล้าน ลบ.ม. - พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๔๐๘ ไร่	
ผล	เบิก ๒๓,๒๑๑,๖๗๕ บาท (ร้อยละ ๙๙.๖๘)	(ระบุผลการดำเนินงาน) - แล้วเสร็จ ๗ แห่ง	- หมายเหตุ คงเหลือจากการ หักคืนค่าดอกเบี้ย ๗๔,๓๔๙ บาท สลาย PO วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๕

หมายเหตุ : โปรดแนบรายชื่อโครงการ และรายละเอียดโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการแหล่งน้ำ (excel)

๔.๓ โครงการที่ ๓ : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

รายการ (ตาม พ.ร.บ. ๒๕๖๕)	ระบุ การร่วมดำเนินการกับหน่วยงาน ส่วนกลาง	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑) คชจ.การพัฒนาบรรทัดวัดปริมาณน้ำเก็บกักใน แหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ ที่ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ (๓๔,๘๘๘,๗๐๐ บาท)	- ดำเนินการร่วมกับศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ ซึ่งผู้รับผิดชอบ คือ ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ และการตรวจรับโครงการเป็นหน้าที่ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑	-

๕. ประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน

- ๕.๑
- ๕.๒
- ๕.๓
- ๕.๔

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวจิรัฐติกา คำผิง
ตำแหน่ง จ้างเหมาฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๐๗๓๒ ๒๐๐๙

ภาคผนวก ค

หนังสือเชิญประชุมการตรวจราชการ รอบที่ ๒



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ /ว ๒๓๕

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙

ด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์) มีกำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ของสำนักผู้ตรวจราชการ (Meeting ID : ๖๖๒๒๗๑๖๑๙๑) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ๓ ๕ ๗ ๘ และ ๙ รายละเอียดตามกำหนดการตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๑)

ในการนี้ เพื่อให้การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานประเด็นการตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๒) และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบตอบรับ (เอกสารแนบ ๓) ส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Office Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ispt.dwr0621@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม



เอกสารแนบ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/ว ๒๓๗

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๐
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑

ด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ) มีกำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ของสำนักผู้ตรวจราชการ (Meeting ID : ๖๖๒๒๗๑๖๑๙๑) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒ ๔ ๖ ๑๐ และ ๙ รายละเอียดตามปฏิทินการตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๑)

ในการนี้ เพื่อให้การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ) เป็นไปตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอเชิญท่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานประเด็นการตรวจราชการ (เอกสารแนบ ๒) และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามแบบตอบรับ (เอกสารแนบ ๓) ส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Office Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ispt.dwr0621@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ)

ผู้ตรวจราชการกรม



เอกสารแนบ

ภาคผนวก ง

แผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**แผนการตรวจราชการ
กรมทรัพยากรน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจราชการถือเป็นกลไกที่มีความสำคัญในระบบการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้หลักการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี นอกจากนี้การตรวจราชการที่มีประสิทธิภาพยังสามารถช่วยให้ผู้บริหารได้มีโอกาสรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน และปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาคือข้อขัดข้องที่มีให้บรรเทาเบาบางลง หรือหมดสิ้นไปในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้เชื่อมโยงนโยบายของผู้บริหารในส่วนกลางไปชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติส่วนกลางในภูมิภาค ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นได้รับทราบ พร้อมทั้งเป็นผู้สะท้อนปัญหาความต้องการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งของประชาชนในพื้นที่ให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ภารกิจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ได้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๙ วรรค ๓ กำหนดให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบและมีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรม ในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี และหมวด ๓ ข้อ ๑๗ กำหนดให้ผู้ตรวจราชการรายงานผลการตรวจราชการ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการในแต่ละคราว

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการ และเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ

๒.๒ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงานการตรวจราชการร่วมกับแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนประสานงานการปฏิบัติและชี้แนะให้แนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

๓. เป้าหมายการตรวจราชการ

๓.๑ หน่วยงานที่รับการตรวจราชการมีการปฏิบัติงานที่นำไปสู่เป้าหมาย ผลผลิต และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเป็นธรรม โปร่งใส ประหยัด และสนองความต้องการของประชาชน

๓.๒ หน่วยงานที่รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค

๓.๓ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำตามความเหมาะสม

๔. ขอบเขตการตรวจราชการ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๒ ข้อ ๑๒ กำหนดให้ผู้ตรวจราชการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๔.๑ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

๔.๒ สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน

๔.๓ สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้แจง ให้ถ้อยคำ หรือส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๔ สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๔.๕ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ

๔.๖ เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนำ หรือปรึกษาหารือร่วมกัน

๕. ลักษณะการตรวจราชการ

๕.๑ ตรวจติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการ และเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

๕.๒ ตรวจติดตามผลของแผนงาน งาน/โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน

๕.๓ การแนะนำให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องทั้งในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และความประพฤติของข้าราชการ ตลอดจนให้มีการประสานงานทุกหน่วยงานและทุกระดับ

๕.๔ ตรวจเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้รับการตรวจ

๕.๕ ตรวจสอบ สืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง กรณีเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ขอความเป็นธรรมและ/หรือขอความช่วยเหลือ เพื่อคลี่คลายหรือแก้ไขความเดือดร้อน

๕.๖ กำกับให้มีการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนสำคัญให้รายงานด้วยวาจาผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตามสมควร

๖. รูปแบบการตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๖.๑ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ การตรวจราชการใน ๓ แผนงานของกรมทรัพยากรน้ำ คือ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

๖.๓ การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

๖.๓.๑ เรื่องที่หน่วยงานผู้ปฏิบัติได้ร้องขอความช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือประสานการปฏิบัติ ตามนโยบาย แผนงาน งาน/โครงการ ที่ดำเนินอยู่แต่มีปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถแก้ไขได้ตามขั้นตอนปกติ ควรได้รับการประสานหรือสนับสนุนจากหน่วยงานในระดับที่สูงกว่า

๖.๓.๒ เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ขอความเป็นธรรมและ/หรือขอความช่วยเหลือ เพื่อคลี่คลายหรือแก้ไขความเดือดร้อน

๖.๓.๓ เรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญ หรือสาธารณภัย อันจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาล หรือหน่วยงานต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขให้ทันเหตุการณ์

๖.๓.๔ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. เขตการตรวจราชการ

สืบเนื่องจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ โดยกำหนดเป็นเขตตรวจราชการส่วนกลาง และเขตตรวจราชการที่ ๑ - ๑๘ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดเขตตรวจราชการตามคำสั่งข้างต้น รวมทั้งการบูรณาการ การตรวจราชการร่วมกัน จึงกำหนดความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ดังนี้

ที่	ผู้ตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ	เขตตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานส่วนกลาง ในภูมิภาค	หมายเหตุ
๑.	นายนิทัศน์ สุตดีพงษ์	เขตตรวจราชการที่ ๓, ๔, ๕, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๕, ๑๖ และ ๑๗	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑, ๓, ๕, ๗, ๘ และ ๙	ผู้ตรวจราชการกรม ลำดับที่ ๑ ทำหน้าที่ตรวจราชการในเขตตรวจราชการฯ และ
๒.	ว่าง	เขตตรวจราชการที่ ๑, ๒, ๖, ๘, ๙, ๑๒, ๑๔ และ ๑๘	สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒, ๔, ๖, ๑๐ และ ๑๑	หน่วยงานของผู้ตรวจราชการกรม ลำดับที่ ๒ จนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้ง

๘. ระยะเวลาการดำเนินงานในการตรวจราชการ

๑ รอบปีงบประมาณ (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๙. การรายงานผลการตรวจราชการ

การรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ ดังนี้

๙.๑ รายงานผลการตรวจราชการเสนอต่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย และในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเห็นว่า มีปัญหาสำคัญให้สรุปรายงานเสนอหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการต่อไป ในกรณีที่ไม่มีหัวหน้ากลุ่มภารกิจให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน

๙.๒ จัดทำรายงานผลการตรวจราชการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงเรื่องที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และพยานหลักฐาน ข้อมูลสรุปให้เห็นถึงสภาพตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ

/พร้อมทั้ง ...

พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยต้องมีความชัดเจน กะทัดรัดเข้าใจง่าย กรณีที่ได้แนะนำ
สั่งการด้วยวาจา ให้สรุปไว้ในรายงาน

๙.๓ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรายงาน หรือขอคำวินิจฉัยสั่งการจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจ
ให้รีบรายงานทางเครื่องมือสื่อสารหรือทางอื่นตามความเหมาะสม และเมื่อกลับจากราชการแล้วให้แสดง
รายละเอียดดังกล่าวไว้ในรายงานผลการตรวจราชการด้วย

๑๐. หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ

หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งในส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยรับการตรวจ
อำนวยความสะดวก ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ โดยเตรียมบุคคล สถานที่ เอกสาร ข้อมูลประกอบการตรวจ
ชี้แจง ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีบุคลากรสำนักผู้ตรวจราชการเป็นผู้ประสานงาน

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๑.๑ ผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำได้รับทราบสถานภาพการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ
ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
ประกอบการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสม ณ ปัจจุบันและการพัฒนา ตลอดจนเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของแผนงาน งาน/โครงการ ให้ดีขึ้น

๑๑.๒ หน่วยงานระดับปฏิบัติในพื้นที่ได้รับคำปรึกษา ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจราชการ มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานจากการตรวจเยี่ยม

๑๑.๓ การตรวจราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

๑๑.๔ เกิดการบูรณาการร่วมกันในการตรวจราชการ โดยสามารถสร้างความร่วมมือประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๑.๕ ผู้รับบริการหรือประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
กรมทรัพยากรน้ำ



(นายนิทัศน์ สุตติพงษ์)

ผู้ตรวจราชการกรม

ผู้เสนอแผนการตรวจราชการ



(นายภาคล ถาวรฤทธิรัตน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ผู้อนุมัติ

แผนปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รอบ ๑						รอบ ๒					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	จัดทำแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารและแจ้งเวียนแผนฯ ให้หน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน้ำเพื่อทราบและเตรียมการ เพื่อรับการตรวจ เมื่อแผนฯ ได้รับการอนุมัติ	←→											
๒.	การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			←									→
๓.	การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย												
	๑. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				←								→
	๒. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม				←								→
	๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				←								→

แผนปฏิบัติงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รอบ ๑						รอบ ๒					
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔.	การตรวจราชการตามเหตุการณ์ สถานการณ์ และการมอบหมายของผู้บังคับบัญชา		←										→

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการปฏิบัติงาน

(นายนิทัศน์ สุตดีพงษ์)

ผู้ตรวจราชการกรม

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายภาดล ถาวรฤชรัตน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

หมายเหตุ

- การตรวจฯ ในลำดับที่ ๒ ใช้เวลาในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การตรวจฯ ในลำดับที่ ๓ ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน ภาคละไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี ครั้งละไม่เกิน ๓ วัน หรือตามความจำเป็น
- การตรวจฯ ในลำดับที่ ๔ ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน ๓ วัน ต่อครั้ง หรือตามความจำเป็น

ผู้ประสานงานตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ



นางสาวกุสุมา แก้วทงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



นายชนศักดิ์ เดชะอนิวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป



นางสาววัลยา พงษ์ไพบูลย์
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
