



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑
ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๗๕ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ๗ ๘ ๑๐ และ ๑๑

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ

๒. ข้อเท็จจริง

หน.ผต. (นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สทน.๖ และมีการลงพื้นที่ โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ (นายประสิทธิ์ พัวทวี) ในฐานะคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้านเทคนิควิศวกรรม (AE) มาบูรณาการการทำงานร่วมกับการตรวจราชการในครั้งนี้ สำหรับ สทน.๗ ๘ ๑๐ และ ๑๑ ได้ตรวจราชการ VDO Conference ผ่านระบบ Zoom สามารถสรุปรายงานผลการตรวจราชการ ได้ดังนี้

๒.๑ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

สทน.	จำนวนโครงการ ที่ขอเงินฯ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณ คงเหลือ(ล้านบาท)	คาดว่า จะแล้วเสร็จ
๖	๔	๒	๒**	๖๕.๖๕๒๕	มี.ค. และ มิ.ย. ๖๗
๗	๑๑	๙	๒**	๔๐.๐๓๐๙	มี.ค. ๖๗ ๑ โครงการ
๘	๘	๗	๑	๑๐.๓๐๔๘	ก.ค.๖๗
๑๐	๔	๓	๑	๔.๔๘๘๐	มี.ค. ๖๗
๑๑	๑๐	๙	๑	๑๗.๗๙๓๐	มี.ค. ๖๗

หมายเหตุ ** โครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีมีอุปสรรคทำให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงาน

จากตารางข้างต้นจกเห็นได้ว่า สทน.๑๐ และ ๑๑ โครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับ สทน.๘ ที่เหลืออีก ๑ โครงการ ตามการรายงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม แต่ ผอ.สทน.๘ ได้รายงานผ่านการประชุมว่า จะเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนเมษายน หรืออย่างช้าสุดตามการรายงาน สำหรับ สทน.๖ และ สทน.๗ จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม สทน.๗ ๑ โครงการ โดยที่เหลือ สทน.๗ ๑ โครงการ มีรายละเอียดของอุปสรรคแต่ละโครงการ ดังนี้

สทน.๖ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฝ. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖ และยังไม่มีการเบิกจ่าย (๔๒.๖๗๓๓ ล้านบาท) อยู่ระหว่างหยุดงานเนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน ทั้งนี้ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

สทน.๗ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๒ และยังไม่มีการเบิกจ่าย (๔๖๐๐๐ ล้านบาท) หยุดงานเนื่องจากขออนุญาตสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) และปัจจุบัน

ทราบฯ...

ทราบว่าได้เข้าวาระการประชุมของกรมป่าไม้แล้วและอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากกรมป่าไม้ นอกจากนี้ สทน.๗ รายงานเพิ่มเติมว่า ไม่สามารถติดต่อประสานผู้รับจ้างได้ อันอาจทำให้เงินตกปับในโครงการดังกล่าวได้

๒.๒ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

๒.๒.๑ ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) และผลการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา

สทน.	จำนวน สถานี	มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงข้อมูลได้		สถานีชำรุด/ เสื่อมสภาพ		ผลการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	แผน	ผล
๖	๖๗	๕๙	๘๘	๒	๒.๙๘	๒๕	๒๕
๗	๑๐๖	๑๐๐	๙๔	๖	๖	๑๐๖	๔๘
๘	๒๑๕	๑๗๘	๘๒.๗๙	๓๗	๓.๒๕	๒๑๕	๑๐๓
๑๐	๒๕๘	๑๓๙	๕๓.๘๘	๑๑๙	๑๒.๔๐	๒๕๘	๑๑๖
๑๑	๖	๕	๘๓.๓๓	๑	๑๖.๖๗	๖	๕

กวพ. ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเบิกจ่ายจากรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (๘ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗) ในงวดแรก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม จำนวน ๙,๑๘๓,๓๐๐ บาท แบ่งเป็นรายการใช้จ่ายตามแผนงาน ประกอบด้วย

- (๑) ค่าตอบแทนผู้รู้ ๕,๘๕๓,๐๐๐ บาท
- (๒) ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร ๒,๐๐๙,๑๓๙ บาท
- (๓) ค่าบำรุงรักษาระบบเตือนภัยและตรวจสอบสถานี ๒๓๒,๑๖๑ บาท
- (๔) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท

สามารถจ่ายได้ทุกรายการ โดยรายการเบิกจ่ายส่วนใหญ่ (รายการที่ (๑) – (๒) และ (๔)) เป็นค่า Fixed Cost ของงบประมาณที่ได้รับ จากรายการใช้จ่ายตามแผนงานดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า รายการค่าบำรุงรักษาระบบฯ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๒ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดแรก และจากตารางข้างต้นแม้จำนวนสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพจะอยู่ที่ร้อยละที่ยอมรับได้ แต่หากสถานีไม่ได้รับการบำรุงรักษาได้เต็มตามศักยภาพหรือตามรอบที่ควรจะเป็น ก็จะทำให้การชำรุดของอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้ง การเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์ไม่ทำงาน แม้จะได้แจ้งให้ กวพ. ทราบแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของสถานีระบบเตือนภัยชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน ๔๘ สถานี ตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒.๒ ประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก และผลการบำรุงรักษา

สทน.	จำนวน แหล่งน้ำที่มี สถานีตรวจวัด	มีประสิทธิภาพรายงาน การตรวจวัดฯ ได้		*อุปกรณ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถรายงานฯ ได้		ผลการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา		หมายเหตุ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	แผน	ผล	
๖	๑๗	๑๗	๑๐๐	—	—	—	—	อยู่ในระยะประกันของบริษัท
๗	๒๘	๑๙	๖๘	๙	๓๒	๒๘	๑๔	
๘	ไม่มีระบบฯ							
๑๐								
๑๑	๖	๔	๖๖.๖๗	๒	๓๓.๓๓	๖	๔	

๒.๒.๓ ประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

สทน.	รายการระบบ	มีประสิทธิภาพ รายงานฯ ได้		*สถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถรายงานฯ ได้	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๖	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	๓๐	๙๓.๗๕	๒	๖.๒๕
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๒	๑๐๐		

สทน.๗

สทน.	รายการระบบ	มีประสิทธิภาพ รายงานฯ ได้		*สถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถรายงานฯ ได้	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๗	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	๑๕	๕๖	๑๒	๔๔
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๑๐	๖๖	๕	๓๔
๘	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	—	—	๑๑	๑๐๐
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	—	—	๔	๑๐๐
๑๐	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	๑	๑๐๐	—	—
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	ไม่มี			
๑๑	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	—	—	๔	๑๐๐
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๑	๑๐๐	—	—

จากตารางที่แสดงประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในข้อ ๒.๒.๒ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในข้อ ๒.๒.๓ เห็นได้ว่า จำนวนของสถานีที่มีประสิทธิภาพรายงานฯ ได้ กับสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถรายงานการตรวจวัดฯ มีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน หรือบาง สทน. มีสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพทั้งหมด เช่น สทน.๘ สถานีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ชำรุดทั้งหมด เช่นเดียวกับ สทน.๑๑ สถานีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายโครงข่ายซี มูล ชำรุดทั้งหมดเช่นกัน เนื่องจากงบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบฯ ไม่สอดคล้องกับจำนวนสถานี ทำให้ไม่สามารถบำรุงรักษาได้เต็มตามศักยภาพและตามรอบที่ควรจะเป็น แม้จะได้แจ้งให้ กวป. ทราบแล้ว ทั้งนี้ **รายละเอียดของสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๑ สถานี ตามลำดับ ตามเอกสารแนบ ๒ และ ๓**

๒.๒.๔ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สทน.๑ – ๑๑ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือพื้นที่วิกฤติน้ำ โดยในช่วง ๒ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ณ วันตรวจราชการ) ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สรุปได้ดังนี้

สทน.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		ปริมาณ แจกจ่ายน้ำ (ลบ.ม./ขวด)	ศูนย์ผลิต และบริกน้ำ (ลบ.ม.)	ประโยชน์ที่ได้รับ			สถานะ ข้อมูล (๑ ต.ค.๖๖ ถึงวันตรวจ)
	ภัยแล้ง	ระบาย น้ำท่วม			ครัวเรือน	ประชาชน (คน)	พื้นที่ การเกษตร(ไร่)	
๖	๔,๘๕๕,๔๐๐	๘๓๗,๔๒๐	—	—	๓,๑๑๒	๘,๓๓๒	๑๕,๘๑๒	๒๓ก.พ.๖๗
๗	๑๑๑,๗๘๐	๒,๕๕๙,๔๘๐	—	—	๒,๕๙๗	๗,๖๑๕	๕,๓๖๔	๒๗ก.พ.๖๗
๘	๘๔๒,๔๐๐	๑,๔๕๕,๕๗๐	๔,๒๐๐ ขวด	—	๗,๘๓๑	๓๒,๐๐๙	๖๖,๓๔๐	๒๙ก.พ.๖๗
๑๐	๔๕๔,๖๐๐	—	๑,๐๐๐ ลิตร	—	๒,๑๑๐	๕,๕๕๖	๑๘,๐๕๐	๒๙ก.พ.๖๗
๑๑	๑๒๒,๔๖๐	๑,๕๘๔,๐๐๐	—	—	๑,๑๙๗	๔,๓๗๔	๑๐	๒๘ก.พ.๖๗

๒.๓ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน

ตามนโยบายของ รมว.ทส. ที่ต้องการให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับพื้นที่ เพื่อลดปริมาณเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่กรมหรือกระทรวง ดังนั้น ผด.ทน. จึงได้กำหนดไว้ในประเด็นการตรวจฯ ซึ่งจากรายงานและติดตามฐานข้อมูลในระบบ E – petition (นับเฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ) ปรากฏว่า ทั้ง ๕ สทน. ไม่มีเรื่องร้องเรียนในระบบ E – petition มีแต่เรื่องร้องเรียนในพื้นที่ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย สทน. ๖ จำนวน ๑ เรื่อง สทน.๗ จำนวน ๓ เรื่อง และ สทน.๑๐ จำนวน ๑ เรื่อง ทั้งนี้ **รายละเอียดการดำเนินการของเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการของ สทน.๖ ๗ และ ๑๐ ตามเอกสารแนบ ๔** โดยได้เน้นย้ำข้อสั่งการของ รมว.ทส. ที่ประสงค์ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับพื้นที่ รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

ที่ อทน. ...

ที่ อท. ได้เห็นชอบมอบหมาย สำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Focal Point) เพื่อทำหน้าที่ประสานติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่องรอยเรียนค่าง และเมื่อหน่วยงานได้รับข้อสั่งการของผู้บริหาร ให้สำเนาเรื่องแจ้งสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อทราบ/ดำเนินการ อีกทางหนึ่งด้วย ตามหนังสือกลุ่มตรวจราชการ ที่ ทส ๐๖๒๑/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗

๒.๔ การเตรียมความพร้อมในการรองรับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ทั้ง ๕ สท. ได้เตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง และมีความพร้อมด้านแบบแปลนเพื่อการบริหารสัญญาจ้าง หากได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

๒.๕ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

(๑) **โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่** จ.ชลบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และได้ให้**ข้อเสนอแนะปรับแก้ไขก่อนการตรวจรับ** ประกอบด้วย ๑) จัดทำ Construction Joint ทางน้ำล้น ๒) ปรับหน้าดินบริเวณที่ทิ้งดินให้ได้ระดับ ๓) ทาสีรั้วรอบบริเวณแผงโซล่าเซลล์ และ ๔) ทำความสะอาดหินทิ้งบริเวณท้ายน้ำ นอกจากนี้ยังมี**ข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการต่อ ๆ ไป** เช่น ๑) การติดตั้ง Staff gauge ควรอยู่ในจุดที่มองเห็นและอ่านค่าได้ง่าย ๒) การใส่ท่อเพื่อช่วยการบริหารจัดการน้ำควรคำนึงถึงขนาดท่อและรูปแบบโครงสร้าง และ ๓) ในการออกแบบควรพิจารณาเพิ่มฝาปิดสายไฟของแผงโซล่าเซลล์ **ตามเอกสารแนบ ๕**

(๒) **โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฝ.** จ.ชลบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ และได้ให้**ข้อเสนอแนะ** ประกอบด้วย ๑) ปรับแต่งดินทิ้งให้ได้ระดับเรียบร้อยสามารถใช้ประโยชน์ได้ และ ๒) ควรวางแผนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยให้จัดส่งแผนปฏิบัติงานฉบับใหม่ พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ หน.ผด.ทุกเดือน เพื่อกำกับ ติดตาม **ตามเอกสารแนบ ๖**

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ หน.ผด. และ ผชช. ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สท. รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามมีข้อค้นพบอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดย หน.ผด. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	สท.	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ หน.ผด.
๑.	ทั้ง ๕ สท.	จำนวนของสถานีเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลได้ควรมีมากกว่าร้อยละ ๙๐ หรือได้ครบทุกสถานี แต่จากการตรวจพบว่า มีเพียง สท.๗ ที่มีสถานีเชื่อมโยงข้อมูลได้ร้อยละ ๙๔ และที่น่าเป็นห่วง คือ สท.๑๐ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้เพียงร้อยละ ๕๓.๘๘ ดังนั้น กวพ. ต้องตรวจสอบทั้ง ๑๑ สท. และจัดลำดับการแก้ไขซ่อมบำรุงโดยเร่งด่วน	๑.๑ กวพ. ต้องนำรายละเอียดของสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน ๔๘ สถานี ตามเอกสารแนบ ๑ ไปพิจารณาดำเนินการจัดลำดับการแก้ไขซ่อมบำรุง โดยเร่งด่วน หากงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอ ควรพิจารณาหาแนวทางร่วมกับ กยผ. หากงบประมาณในส่วนอื่นมาแก้ไขปัญหานี้ มีเช่นนั้นหากเกิดสถานการณ์เลวร้ายในพื้นที่ที่สถานีเตือนภัยชำรุดตั้งอยู่ หน. มีอาจปฏิเสธข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการได้ ๑.๒ หากมองถึงรายการใช้จ่ายตามแผนงานการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม รายการส่วนใหญ่จะเป็นค่าตอบแทนผู้รู้ ซึ่งเป็นค่า Fixed Cost เห็นควรที่ กวพ. จักได้หารือกับ กยผ. ถึงความเป็นไปได้ที่จะนำค่าตอบแทนผู้รู้ เป็นรายการใหม่แยกออกจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัย


ลำดับ

ลำดับ	สทน.	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ทน.ผต.
๒.	ทั้ง ๕ สทน.	จำนวนของสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก และระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถรายงานฯ ได้ มีจำนวนมากหรือบาง สทน. ชำรุดทั้งหมด เช่น สทน.๘ สทน.๑๑ หากเป็นเช่นนี้การรายงานข้อมูลด้านน้ำของ ทน. จะขาดความน่าเชื่อถือ	กวป. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ต้องนำรายละเอียดของสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ ตามเอกสารแนบ ๒ และ ๓ ไปพิจารณาดำเนินการจัดลำดับการแก้ไขซ่อมบำรุงโดยเร่งด่วน หากงบประมาณประจำปีไม่เพียงพอ ควรพิจารณาหาแนวทางร่วมกับ กยผ. หากงบประมาณในส่วนอื่นมาแก้ไขปัญหานี้เรื่องนี้ มีเช่นนั้นการรายงานข้อมูลด้านน้ำของ ทน. จะขาดความน่าเชื่อถือ และมีอาจปฏิเสธข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการน้ำได้
๓.	สทน.๖	- รถบรรทุกเครนที่ สทน.๖ มีอยู่ไม่สามารถยกเครื่องสูบน้ำขนาด ๒๔ นิ้ว ได้ - รถบรรทุกที่ใช้เติม CNG หาสถานที่เติมได้ยากไม่สะดวกในการใช้ จึงประสงค์จะขอรับการจัดการรถบรรทุกดังกล่าว	กพน.๒ ควรรับประเด็นอุปสรรคของ สทน.๖ ไปพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไข และเพื่อให้การแก้ไขเรื่องดังกล่าวเป็นระบบควรมีหนังสือแจ้งเวียนสอบถามทุก สทน. เพื่อนำมาประมวลแก้ไขในภาพรวมต่อไป
๔.	สทน.๖	การลงพื้นที่ตรวจติดตามในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฟ.	สทน.๖ ดำเนินการในข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่ ทน.ผต. และ ผชช. ให้ไว้ตามข้อ ๒.๕ (๑) และ (๒)
๕.	สทน.๑๑	การปรับโครงสร้างใหม่ของ ทน. มีผลกระทบต่อ สทน.๑๑ และเสนอขอให้พิจารณาในประเด็น - ควรปรับตำแหน่ง ผอ.ส่วนอำนวยการ ให้เป็นระดับ ขพ. - ในส่วนอำนวยการมีแต่พนักงานราชการ ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ตำแหน่งของข้าราชการ ทำให้ต้องยืมข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในส่วนอนุรักษ์ฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนอำนวยการ ทำให้ส่วนอนุรักษ์ฯ ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน	ในประเด็นการปรับโครงสร้างใหม่ของ ทน. มีผลกระทบต่ออัตรากำลังของ ทน. เห็นควรที่ สลก.จะได้มีหนังสือแจ้งเวียนสอบถามทุกหน่วยงาน และรวบรวมผลกระทบดังกล่าวมาแก้ไขในภาพรวมโดยด่วน และสืบเนื่องเรื่องอัตรากำลังของ สทน.๑๑ ที่มอบให้ สลก.หาแนวทางสนับสนุนบุคลากรให้กับ สทน.๑๑ ในคราวรายงานการตรวจราชการรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ยังไม่มีผลการดำเนินการในเชิงรูปธรรม เห็นควรสั่งการให้ สลก. เร่งดำเนินการทั้ง ๒ ประเด็นโดยเร่งด่วน

ในการนี้ ทน.ผต. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ ทน.ผต. เพื่อจักได้สรุปนำเสนอ อทท. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ


(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เอกสารแนบ ๑
รายละเอียดของสถานีระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning)
ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน ๔๔ สถานี

สทพ.	ลำดับ	พิกัด ที่ตั้งของสถานี	พื้นที่ตั้งของสถานี				ปีงบประมาณที่ ตรวจสอบพบชำรุด	การดำเนินการ
			บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		
สทพ.๖	๑.	๒๐๗๙๔๑ E ๑๕๐๙๒๕๘ N	บ้านปัทริม	คลองทับจันทร์	อรัญประเทศ	สระแก้ว	๖๗	- ตรวจสอบพบแผงวงจรชำรุด รอสงอุปกรณ์ให้ กวพ. เพื่อส่งให้บริษัทฯ ซ่อม
	๒.	๘๔๖๖๔๑ E ๑๔๕๐๓๔๙ N	ปะตงล่าง	ทรายขาว	สอยดาว	จันทบุรี	๖๗	มีปัญหาเรื่องการส่งสัญญาณขัดข้องบ่อยเนื่องจากสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่แม่เสถียรหน้าจอเสีย/อุปกรณ์ชำรุดไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ชำรุด
สทพ.๗	๑	บ้านป่าผาก (เปลี่ยน ชื่อเป็นบ้านปางม่)	บ้านปางม่	ป่าเต็ง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	๖๖	ไฟเมนหลักชำรุด
	๒	E ๕๕๘๗๒๒ N ๑๓๙๙๗๑๗	บ้านแร่เนิน	เขาใหญ่	ชะอำ	เพชรบุรี	๖๖	
		E ๖๐๐๒๓๖ N ๑๔๑๙๑๑๗						
	๓	บ้านวังเหรา	บ้านวังเหรา	องค์พระ	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	๖๗	เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน/แบตเตอรี่/ลำโพง และกระบอกวัดปริมาณน้ำฝน ธรรมดาชำรุด
		E ๕๕๗๕๒๕ N ๑๖๓๓๔๕๙						
	๔	บ้านโป่งช้าง E๕๕๐๑๐๗ N๑๖๒๐๗๙๗	บ้านโป่งช้าง	หนองปรือ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	๖๗	ไฟเหลือียง/แบตเตอรี่ และกระบอกวัด ปริมาณน้ำฝนธรรมดา ชำรุด
	๕	บ้านห้วยรวก E๕๖๖๕๓๑ N๑๖๒๐๕๘๓	บ้านห้วยรวก	หนองฝ้าย	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	๖๗	เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน/ไฟเขียว/ไฟเหลือง และกระบอกวัดปริมาณน้ำฝนธรรมดาชำรุด
	๖	บ้านช่องกลม E๕๔๐๐๕๓ N๑๒๒๙๕๗๔	บ้านช่องกลม	ช้างแรก	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	๖๖	ต้อยกเครื่องใหม่ทั้งชุด

สทพ.น.	ลำดับ	พิกัดที่ตั้งของสถานี	พื้นที่ตั้งของสถานี				ปีงบประมาณที่ตรวจสอบพบข้อรุ้	การดำเนินการรายละเอียด
			บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		
สทพ.๘	๑	๖๗๙๖๖๖E ๗๕๐๗๑๖N	บ้านชานา	คลองทราย	นาทวี	สงขลา	๖๕	ทั้ง ๗ สถานีได้แจ้ง กวพ. ด้วยแล้ว
	๒	๖๘๑๖๗๒E ๗๗๒๔๕๓N	บ้านปากช่อง	จะโหนด	จะนะ	สงขลา	๖๕	
	๓	๖๖๙๗๕๙E ๗๘๔๗๗๔N	บ้านท่าจีน	ทต.น้ำน้อย	หาดใหญ่	สงขลา	๖๖	
	๔	๖๖๙๔๙๑E ๗๔๗๑๒๕N	บ้านท่าไต้	เขามะลิยรรดิ	สะเดา	สงขลา	๖๖	
	๕	๗๐๑๖๓๕E ๗๕๘๘๘๖N	บ้านชะ	สะกอม	เทพา	สงขลา	๖๖	
	๖	๖๓๗๔๖๖E ๗๔๔๗๘๘N	บ้านบาริ	ป่าตึงเบฮาร์	สะเดา	สงขลา	๖๗	
	๗	๖๑๘๒๘๑E ๘๑๖๖๘๗N	บ้านโคกแมว	โคกม่วง	เขายะยสิน	พัทลุง	๖๖	
สทพ.๑๐ (จำนวนทุก วิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ ธานี)	๑.	๔๔๗๑๑๔๘E ๑๐๘๕๕๒๑๖N	ท่าตึน/ม.๗	พะโต๊ะ	พะโต๊ะ	ชุมพร	๖๖	ข้ารุดไม่สามารรถซ่อมได้ และได้แจ้ง กวพ. ด้วยแล้ว ตามหนังสือ ทส ๐๖๒๕/๓๓๕๓ ถว. ๒๗ ต.ค. ๖๖
	๒.	๔๔๘๘๐๙E ๑๑๖๘๑๒๕N	บ้านทิง/ม.๕	หินแก้ว	ท่าชะ	ชุมพร	๖๖	
	๓.	๔๔๖๐๔๔E ๑๑๑๔๐๕๓ N	ฉาแมร/ม.๑๐	ตะโก	ทุ่งตะโก	ชุมพร	๖๖	
	๔.	๔๔๒๑๒๗E ๑๑๐๘๖๗๘N	ห้วยเหมือง/ม.๑๓	นาขา	ทลิ่งสวน	ชุมพร	๖๖	
	๕.	๔๔๘๒๘๐E ๑๑๐๔๗๑๑N	หินช้างสี/ม.๑๓	วังตะกอก	ทลิ่งสวน	ชุมพร	๖๖	

สทพ.น.	ลำดับ	พิกัด ที่ตั้งของสถานี	พื้นที่ตั้งของสถานี				ปีงบประมาณที่ ตรวจสอบพบชำรุด	การดำเนินการ รายละเอียด
			บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		
สทพ.๑๐ (ส่วนยุทธ วิทยาที่๒ พังงา)	๖.	๔๘๙๗๐๗E ๑๑๖๔๘๓๑N	นิคมฝั่ง๑/ม.๑๐	จ.ป.ร.	กระบี่บุรี	ระนอง	๖๕	เครื่องชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้
	๗.	๔๘๕๖๕๒E ๑๑๗๗๓๐๘N	วังแตง/ม.๗	จ.ป.ร.	กระบี่บุรี	ระนอง	๖๕	
	๘.	๔๘๓๕๕๑E ๑๑๓๒๗๑๓N	บางพรวด/ม.๑	ลำเลียง	กระบี่บุรี	ระนอง	๖๕	
	๙.	๔๗๘๐๔๔E ๑๑๔๐๔๖๐N	ลำเลียง/ม.๑	ลำเลียง	กระบี่บุรี	ระนอง	๖๕	
	๑๐.	๔๗๑๓๒๔E ๑๑๐๗๗๕๗N	บางใหญ่/ม.๔	บางพระเหนือ	ละอุ่น	ระนอง	๖๕	
	๑๑.	๔๖๖๓๘๓E ๑๑๐๐๐๔๘N	หาดส้มแป้น/ม.๓	หาดส้มแป้น	เมืองระนอง	ระนอง	๖๕	
	๑๒.	๔๕๘๙๔๔E ๑๐๙๔๘๓๘N	พรุ้ง/ม.๓	บางรี้น	เมืองระนอง	ระนอง	๖๕	
	๑๓.	๔๕๖๔๒๔E ๑๐๗๕๒๖๓N	ห้วยน้ำใส/ม.๔	ราชกรูด	เมืองระนอง	ระนอง	๖๕	
	๑๔.	๔๕๐๕๘๐E ๑๐๖๕๒๘๘N	คลองข้อง/ม.๖	ราชกรูด	เมืองระนอง	ระนอง	๖๕	
	๑๕.	๔๕๗๒๒๗E ๑๐๖๖๑๔๕N	หินขาว/ม.๙	กะเปอร์	กะเปอร์	ระนอง	๖๕	
	๑๖.	๔๓๙๔๗๖E ๑๐๒๐๓๔๙N	บางซอຍ/ม.๗	คุระ	คุระบุรี	พังงา	๖๕	
	๑๗.	๔๓๒๖๖๒E ๙๗๖๗๘๙N	บางอี/ม.๔	โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา	๖๕	
	๑๘.	๔๔๔๒๑๔E ๙๗๕๙๘๓N	ท่าหิน/ม.๒	รมณีย์	กะปง	พังงา	๖๕	

สทพ.น.	ลำดับ	พิกัด ที่ตั้งของสถานี	พื้นที่ตั้งของสถานี					การดำเนินการ	
			บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปีงบประมาณที่ ตรวจสอบพบชำรุด	รายละเอียด	
	๑๙.	๔๕๓๔๒๑E ๘๖๗๑๖๗N	ช้างชีเอ/ม.๔	เมธ	กะปง	พังงา	๖๕	เครื่องชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้	
	๒๐.	๔๓๙๘๓๔E ๘๕๗๙๕๖N	บางกุ่ม/ม.๑	กะปง	กะปง	พังงา	๖๕		
	๒๑.	๔๒๐๐๔๔E ๘๖๑๓๓๓N	ทุ่งขมิ้น/ม.๔	คีกรัก	ตะกั่วป่า	พังงา	๖๕		
	๒๒.	๔๔๒๔๖๖E ๘๓๕๙๒๐N	สวนพริก/ม.๒	ตากแดด	เมืองพังงา	พังงา	๖๕		
	๒๓.	๔๓๗๙๖๑E ๘๐๖๕๘๔N	หาดทรายเปลือก หอย/ม.๗	คลองเคียน	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	๖๕		
	๒๔.	๔๗๐๑๑๘E ๘๔๘๒๔๒N	บางยิงวัว/ม.๓	เขาค้อ	ปลายพระยา	กระบี่	๖๕		
	๒๕.	๔๘๔๑๐๖E ๘๔๖๖๘๘N	น้ำซำ/ม.๑๑	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	๖๕		
	๒๖.	๔๖๕๑๐๖E ๘๒๑๙๑๒N	คลองแรด/ม.๕	แหลมสัก	อ่าวลึก	กระบี่	๖๖		
	๒๗.	๔๘๗๔๓๓E ๘๑๘๑๔๒N	ช่องไม้ดำ/ม.๕	คลองหิน	อ่าวลึก	กระบี่	๖๖		
	๒๘.	๔๙๖๕๑๘E ๘๑๘๕๕๗N	ต้นหาร/ม.๗	หน้าเขา	เขาพนม	กระบี่	๖๖		
	๒๙.	๕๓๗๖๘๙E ๘๗๗๔๑๔N	ภูฟ้า/ม.๙	ลำทับ	ลำทับ	กระบี่	๖๕		
	๓๐.	๕๒๓๑๓๗E ๘๗๕๔๘๐N	หน้าถ้ำ/ม.๗	คลองอมเหนือ	คลองท่อม	กระบี่	๖๕		

สถาน.	ลำดับ	พิกัดที่ตั้งของสถานี	พื้นที่ตั้งของสถานี				การดำเนินการ	
			บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	งบประมาณที่ตรวจสอบพบชำรุด	รายละเอียด
สถาน.๑๐ (ส่วนอุทกวิทยาที่ ๒ พังงา)	๓๑.	๔๓๐๑๕๗E ๘๘๖๐๐๙N	ท่าเรือ/ม.๓	ศรีสุนทร	กลาง	ภูเก็ต	๖๕	
	๓๒.	๔๒๖๑๙๓E ๘๘๓๒๒๒N	บางโจ/ม.๔	ศรีสุนทร	กลาง	ภูเก็ต	๖๕	
สถาน.๑๑	๑	๑๔.๔๗๖๕E ๑๐๔.๑๔๗๙N	๓๑๓ ม.๕	ดงรัก	ภูสิงห์	ศรีสะเกษ	๖๗	ได้แจ้งตัวช่วยจากให้ทางกวพ.ไปตรวจสอบสถานีว่าจะซ่อมบำรุงได้หรือไม่อย่างไรหรือให้เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด

รายละเอียดของอุปกรณ์ชำรุด/เสื่อมสภาพของระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ที่ไม่สามารถรายงานการตรวจวัดฯ ได้ จำนวน ๑๑ แหล่งน้ำ

สทพ.	ลำดับ	ชื่อแหล่งน้ำ	พื้นที่ตั้งของสถานี				ปีงบประมาณที่ ตรวจสอบพบชำรุด	การดำเนินการ รายละเอียด
			บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		
สทพ.๗	๑.	บึงหนองอ้อยน้อย	หมู่ที่ ๗	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	๖๖	เสาติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำชำรุด และได้แจ้งผลการสำรวจการชำรุดเสียหาย ตามหนังสือ ทส ๐๖๑๗/๓๐๙๖ ลง ๒๔ มิ.ย. ๖๖
	๒.	อ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล	หมู่ที่ ๖	ห้วยกระเจา	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	๖๕	แผ่นวัดระดับน้ำชำรุด และได้แจ้งผ่านการประชุมติดตามการดำเนินงานรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
	๓.	อ่างเก็บน้ำบ้านประตูด่าน	หมู่ที่ ๑๔	บ้านเก่า	เมือง	กาญจนบุรี	๖๕	เสาติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ชำรุด
	๔.	บึงกาจับ	หมู่ที่ ๓	ชำแระ	โพธาราม	ราชบุรี	๖๕	เสาติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ชำรุด
	๕.	อ่างเก็บน้ำบ้านวังหิน	หมู่ที่ ๕	ยางม่วงลัดใต้	หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	๖๕	เสาติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ชำรุด
	๖.	อ่างเก็บน้ำโพธาราม	หมู่ที่ ๖	หนองหญ้าปล้อง	หนองหญ้าปล้อง	เพชรบุรี	๖๕	เสาติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ชำรุด
	๗.	อ่างเก็บน้ำตะมะาะน้อย	หมู่ที่ ๓	ป่าเต็ง	แม่กระจาน	เพชรบุรี	๖๕	เสาติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ ชำรุด
	๘.	อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	หมู่ที่ ๘	สามพระยา	ชะอำ	เพชรบุรี	๖๖	เสาติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำชำรุด
	๙.	อ่างเก็บน้ำห้วยเก่าต่อ	หมู่ที่ ๑๒	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	๖๕	ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการชำรุด
สทพ.๑๑	๑.	สถานีกุดเสียม		ตาตทอง	เมือง	ยโสธร	๖๖	เสาระดับชำรุด และได้แจ้งผลการสำรวจการชำรุดเสียหาย ตามหนังสือ ทส ๐๖๒๖/
	๒.	สถานีหนองขอน		หนองขอน	เมือง	อุบลราชธานี	๖๖	๑๖๒๓ ลง ๑๖ มิ.ย. ๖๖

หมายเหตุ ลำดับที่ ๔ - ๙ ของ สทพ.๗ ได้แจ้งผ่านการประชุมติดตามการดำเนินงานรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กๆ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายละเอียดของสถานีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ
ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน สถานี

สทพ.	รายการระบบ	ลำดับ	ชื่อสถานี	ปีงบประมาณ	รายละเอียด	การดำเนินการ
		๑.	สถานีบ้านช่องมะเฟือง	๖๗	เนื่องจากหน้าจอประมวลผลเสีย	
สทพ.๖	๑. ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	๒.	สถานีบ้านบางขนาก	๖๗	หน้าจอรระดับน้ำอัตโนมัติ ERROR ไม่ส่งสัญญาณระดับน้ำ	ได้แจ้งทาง line ให้ กวป. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗
		๑.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่ท่าแหลอม	๖๕		
สทพ.๗	๑. ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	๒.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน	๖๕		ได้แจ้งผ่านการประชุมติดตามการดำเนินงานรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กลงๆ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
		๓.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานบุญรัตน์ประชาชนวัดน้	๖๕		
		๔.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานหลวงพ่องเป็น	๖๕		
		๕.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (ทางหลวง ๓๕๖)	๖๕		
		๖.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานข้ามบางแม่หม้าย-บางเลน	๖๕		
		๗.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานวัดพระรูป	๖๕		
		๘.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (ทางหลวง ๓๓๖๕)	๖๕		
		๙.	สถานีช่วยกระเสียวที่สะพานข้ามหัวกระเสียว	๖๕		ได้แจ้งผ่านการประชุมติดตามการดำเนินงานรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กลงๆ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

สพ.น.	รายการระบบ	ลำดับ	ชื่อสถานี	ปีงบประมาณ ที่ตรวจสรุปพบข้อรุ้ต	รายละเอียด	การดำเนินการ		
สพ.น.๗	๑. ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลๆ	๑๐.	สถานีวัดสถานีวาม	๖๕	ทั้ง ๑๑ สถานีของระบบสิ่งข้อมูลสัญญาณภาพ อุปกรณ์ประกอบสถานีข้อรุ้ต	ได้แจ้งผ่านการประชุมติดตามการดำเนินงานรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ๆ ครึ่งที่ ๒/๖๗		
		๑๑.	สถานีวัดสถานีวัญ	๖๕				
		๑๒.	สถานีโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา	๖๕				
		๑.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่ท่าฉลอม	๖๕				
	๒. ระบบสิ่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๒.	สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน	๖๕				
๓.		สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (ทางหลวง ๓๔๖)	๖๕					
๔.		สถานีแม่น้ำท่าจีนที่สะพานวัดพระรูป	๖๕					
๕.		สถานี รรอนุบาลบางสะพาน	๖๕					
สพ.น.๘	๑. ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลๆ	๑.	คลองอยู่ตะเภาบน	๖๓	ทั้ง ๑๑ สถานีของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลๆ อุปกรณ์ประกอบสถานีข้อรุ้ต	ทั้ง ๑๑ สถานีของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลๆ ได้แจ้ง กวป. ด้วยแล้ว		
		๒.	คลองอยู่ตะเภาล่าง	๖๓				
		๓.	คลองรั้วภูมิ	๖๓				
		๔.	คลองตะโหนด (ท่าเขียด)	๖๓				
		๕.	คลองนาท่อม	๖๓				
		๖.	คลองท่าแนะ	๖๓				
		๗.	ปากทะเลสาบสงขลา	๖๓				
		๘.	ปากกรอ	๖๓				
		๙.	ลำปำ	๖๓				
		๑๐.	บางแก้ว	๖๓				
		๑๑.	บ้านเขาพระ	๖๓				
		๒. ระบบสิ่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๑.	คลองอยู่ตะเภาล่าง			๖๓	ทั้ง ๔ สถานีของระบบสิ่งข้อมูลสัญญาณภาพ ได้แจ้ง กวป. ด้วยแล้ว
			๒.	คลองตะโหนด (ท่าเขียด)			๖๓	
๓.	คลองนาท่อม		๖๓					
๔.	สะพานข้ามคลองท่าแค		๖๓					

สทพ.	รายการระบบ	ลำดับ	ชื่อสถานที่	ปีงบประมาณ ที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด	รายละเอียด	การดำเนินการ
สทพ.๑๑	๑. ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	๑.	สถานีอุบลราชธานี	๖๕	เป็นระบบเครือข่ายเครื่องการวัดของ ซี มูล ไม่สามารถเชื่อมโย่งข้อมูลได้	ทั้ง ๔ สถานีของระบบตรวจวัดสภาพ น้ำทางไกลฯ ได้แจ้ง กวป. ด้วยแล้ว
		๒.	สถานีแก่งสะพือ	๖๕		
		๓.	สถานีเขื่อนใหม่ (ลำเซบาย)	๖๕		
		๔.	สถานีลำเซบาย/ลำเซบก	๖๕		

รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุกข้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สทณ.	ลำดับ	ปีงบประมาณ	ประเภท/รายละเอียดเรื่องร้องเรียน	ผลการดำเนินการ
สทณ.๖	๑.	๒๕๖๗	ประเภท ๒ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับประสานจากนางฐิติมา ฉายแสง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านปลายเวศ ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย สทณ.๖ ร่วมกับการจัดการจัดสรรน้ำใต้ดินพื้นที่ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบสภาพและตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๗ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (นายวัชรกร จันจิตรเพ็ชร) และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ผลการตรวจสอบพบว่าระบบประปามีสภาพชำรุดหลายจุด จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา พบว่า ค่าพารามิเตอร์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด หากทำการปรับปรุงซ่อมแซม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและประมาณราคาศำปรับปรุงซ่อมแซม (พิจารณาติดตั้ง Solacell ประกอบระบบประปา เพื่อลดการค่าไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ) โดย สทณ.๖ ดำเนินงานร่วมกับกองการจัดสรรน้ำเมื่อแล้วเสร็จจะจัดส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจรเพื่อใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป พร้อมกันนี้จะให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งฝึกอบรมการควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงต่อไป
				☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย สทณ.๗ อยู่ระหว่างเข้าพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบ เพื่อจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ประมาณราคาศำก่อสร้าง พร้อมจัดทำรายงานความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
				☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย สทณ.๗ อยู่ระหว่างเข้าพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบ เพื่อจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ประมาณราคาศำก่อสร้าง พร้อมจัดทำรายงานความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
สทณ.๗	๑.	๒๕๖๗	ประเภท ๗ ข้อหาหรือข้อสมมุติฐานของผู้แทนราษฎรนายเอกษ์ อยู่ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคภูมิใจไทย กรณีการร้องเรียนจาก คุณสุริยาพร ใจหลัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านวังข้าวสาร ตำบลกลัดหลวง อำเภอยาย่าง จังหวัดเพชรบุรี ประสงค์ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย สทณ.๗ อยู่ระหว่างเข้าพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบ เพื่อจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ประมาณราคาศำก่อสร้าง พร้อมจัดทำรายงานความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗
	๒.	๒๕๖๗	ประเภท ๗ สนง.กปร. ส่งหนังสือถึง ทน. ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้แนวทางการช่วยเหลือ กรณีนางสาวปริมพร ชญาสายชล นະธี ราษฎรบ้านไทยประจัน ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขอพระราชทานก่อสร้างฝายชะลอน้ำหลังวัดไทยประจัน เพื่อแก้ไขปัญหาดินขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย สทณ.๗ อยู่ระหว่างเข้าพื้นที่สำรวจเพื่อการออกแบบ เพื่อจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง ประมาณราคาศำก่อสร้าง พร้อมจัดทำรายงานความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

สพ.น.	ลำดับ	ปีงบประมาณ	ประเภท/รายละเอียดเรื่องเรียน	ผลการดำเนินการ
- สพ.น.๗	๓.	๒๕๖๗	ประเภท ๗ สนง.กปร. ส่งหนังสือถึง ทน. ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้แนวทางการช่วยเหลือ กรณีนายพะเยาว์ จันทร์ช่วงราษฎร์บ้านวังข้าวสาร ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝาย จำนวน ๒ แห่ง บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยผาก เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ และเนื่องจากเป็นพื้นที่เดียวกับข้อหาหรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายฤกษ์ อยู่ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี พรรคภูมิใจไทย กรณีการเรียนจากคุณสุริยาพร ใจหลัก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านวังข้าวสาร ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (เรื่องลำดับที่ ๑) คาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
สพ.น.๑๐	๑.	๒๕๖๗	ประเภท ๓ กรณีผู้ใช้งานว่า คนรักปากจั่น ทำหนังสือ ร้องเรียนไปยัง กรมว.ทส. ว่าพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล จ.ป.ร. กับตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง มีการขุดทรายในคลองบริเวณสะพานโรงช้าง ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสองตำบล ทำให้ทางน้ำเปลี่ยนไป มีการพังทลายของตลิ่ง น้ำในคลองขุ่นไม่สามารถนำน้ำไปใช้ได้ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไข ตรวจสอบโดย สพ.น. ๑๐ ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการ ตามหนังสือ ที่ ทส๐๑๐๐/๒๓๖ ลงวันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๗	☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดย สพ.น.๑๐ ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง พิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ที่มีการร้องเรียนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่เพื่อหาข้อสรุป ประกอบด้วย สอน.๓ (ชุมพร) กนก. ทสจ.ระนอง กรมเจ้าท่า ปลัดอำเภอ ตำรวจสอบสวนกลาง ผู้ใหญ่บ้าน (ชาติแต่กมที่ดิน) และได้มีข้อสรุปให้กรมที่ดินดำเนินการวัดพื้นที่ที่มีปัญหาแล้วนำข้อมูลไปเปรียบเทียบที่ดินของนิคมฯ ในส่วนที่ขุดลอกอยู่ในลำรางสาธารณะนอกเขตพื้นที่ของนิคมฯ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ลำน้ำสาธารณะและลำน้ำรางแตงมาบรรจบกัน ทำให้เกิดกองดินในช่วงน้ำท่วม และเกิดดินกองระหว่างตัวหมู่ดหลักกับลำน้ำสาธารณะ ซึ่งในส่วนของดินกองดังกล่าวต้องพิสูจน์ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะหรือไม่ ทั้งนี้ ทสจ.ระนอง รับเป็นต้นเรื่องและประสานข้อมูลต่อไป

หมายเหตุ กองตรวจราชการ สป.ทส. ได้จัดกลุ่มเรื่องเรียนเป็น ๗ ประเภท ดังนี้

ประเภทที่	กลุ่มเรื่องเรียน
๑	เรื่องหน่วยงานสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ หรือปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
๒	เรื่องหน่วยงานสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ หรือปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ - ๙๐ วัน หรือมากกว่านั้น
๓	เรื่องหน่วยงานจะต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นถึงจะแก้ไขปัญหาก็ได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกัน
๔	เรื่องหน่วยงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาร้องเรียนต่อไป
๕	เรื่องหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีความชัดเจนเรื่องนโยบายหรือข้อระเบียบและกฎหมาย หากจะแก้ไขปัญหาร้องเรียนนี้ ต้องมีการทบทวนนโยบายหรือแก้ไขระเบียบและกฎหมายเท่านั้น
๖	บัตรสนเท่ห์
๗	อื่นๆ

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ ต.พุดตาลอง อ.สตึก จ.ชลบุรี

ข้อเสนอแนะปรับแก้ไขก่อนการตรวจรับ

๑) จัดทำ Construction Joint ทางน้ำล้น



๒) ปรับหน้าดินบริเวณที่ทิ้งดินให้ได้ระดับ



๓) ทาสีรั้วรอบบริเวณแผงโซล่าเซลล์




๔) ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณท้ายน้ำ



ข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการต่อ ๆ ไป

๑) การติดตั้ง Staff gauge ควรอยู่ในจุดที่มองเห็น
และอ่านค่าได้ง่าย

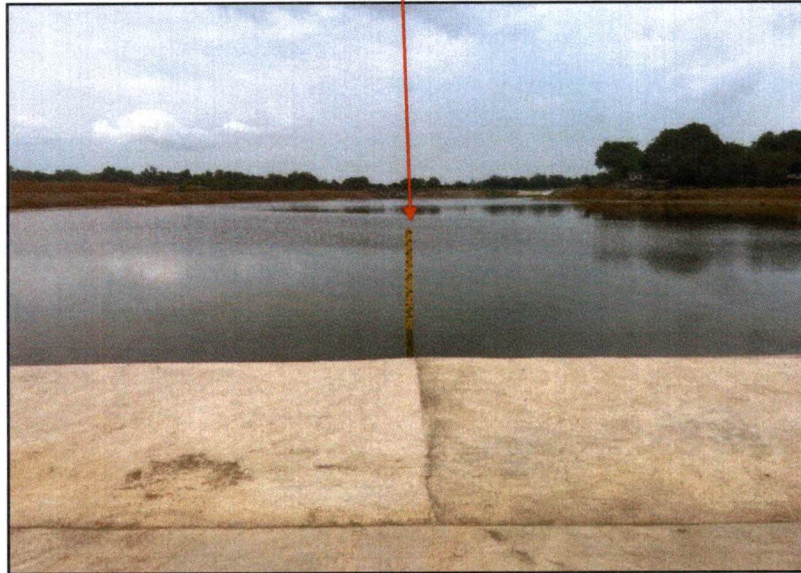

๒) การใส่ท่อเพื่อช่วยการบริหารจัดการน้ำ
ควรคำนึงถึงขนาดท่อและรูปแบบโครงสร้าง




๓) ในการออกแบบควรพิจารณาเพิ่มฝาปิดสายไฟ
ของแผงโซลาร์เซลล์



(๒) โครงการอนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำศูนย์ฝึก สอ.รฟ. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

๑) ปรับแต่งดินทิ้งให้ได้ระดับเรียบร้อย
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

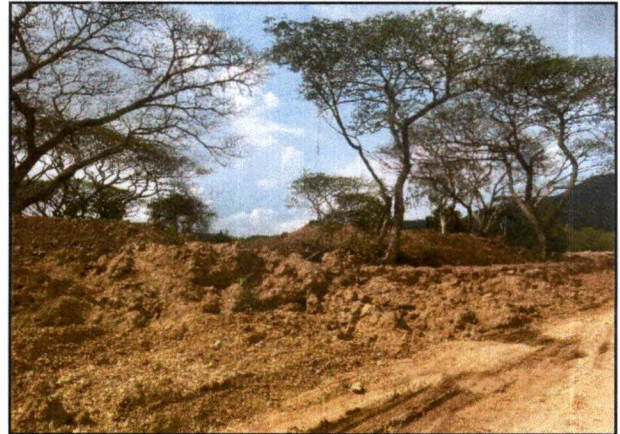

๒) ควรวางแผนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๘๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ ๙

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ โดยนายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบตรวจราชการ สทน.๑ สทน.๒ สทน.๓ สทน.๔ สทน.๕ และ สทน.๙

๒. ข้อเท็จจริง

ผู้ตรวจราชการกรม นายไกรวัล ไทยपाल ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานรับตรวจ ได้แก่ สทน.๑ สทน.๒ สทน.๓ สทน.๔ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานรับตรวจ ได้แก่ สทน.๕ และในวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ประชุมตรวจราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๙ และลงพื้นที่ตรวจราชการฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่ สทน.๙ จำนวน ๔ โครงการ โดยการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็นการตรวจราชการ จำนวน ๕ ประเด็น สรุปผลการตรวจราชการฯ ดังนี้

๒.๑ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปี

สทน.	จำนวนโครงการ ที่ขอกันเงินฯ	แล้วเสร็จ (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณ คงเหลือ(ล้านบาท)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ
๑	๑๗	๑๑	๖	๗๘.๐๙๑๘	มี.ค. และ พ.ค. ๖๗
๒	๒	๒	-	-	-
๓	๑๒	๙	๓	๒๙.๖๓๘๙	เม.ย. ๖๗
๔	๑๐	๕	๕	๑๓.๑๘๙๓	มี.ค. ๖๗
๕	๒	๒	-	-	-
๙	๕๒	๑๖	๓๖	๙๗.๕๕๐๒	พ.ค. - ก.ค.๖๗

สรุปข้อมูลตามตาราง และจากการประชุมการตรวจราชการฯ ดังกล่าวพบว่ามีบางโครงการฯ ที่ล่าช้ากว่าแผนฯ ได้แก่

สทน.๑ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบ้านแม่ลอบ จ.ลำพูน (ผลงาน ๑%) รอกเอกสารจากกรมป่าไม้ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลำพูน (ผลงาน ๓๐%) ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว (เดิมติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า) และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งม่านพร้อมระบบกระจายน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน (ผลงาน ๔๕%) ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว (เดิมติดปัญหาการขออนุญาตกรมเจ้าท่า) คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน / พฤษภาคม ๒๕๖๗

สทน.๓ โครงการที่กั้นไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือจำนวน ๓ โครงการ ปัจจุบันแล้วเสร็จอีก ๑ โครงการ อยู่ระหว่างตรวจรับและรอเบิกจ่าย อีก ๒ โครงการ ผลงาน ๘๐ , ๘๑ % คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

สทน.๔ โครงการที่กั้นไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือจำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และมีโครงการฯ ที่บอกเลิกสัญญาจ้าง ๓ โครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างหยุดงาน/และไม่เข้าดำเนินการโครงการฯ สทน.๔ ได้ดำเนินการแจ้งคู่สัญญาตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน จ.ขอนแก่น ผลงาน ๓๒% (๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นกุดศรีภูมิ จ.ชัยภูมิ ผลงาน ๓% (๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว จ.ร้อยเอ็ด ผลงาน ๐ % สทน.๔ ได้มีหนังสือเรียน อทท.แล้ว เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๗ และคุณภาพน้ำ ๒๕๖๗ และอยู่ระหว่างสรรหาผู้รับจ้างรายใหม่

สทน.๕ โครงการที่กั้นไว้เบิกเหลื่อมปี คงเหลือจำนวน ๓๖ โครงการ (โครงการฯ ส่วนใหญ่ เป็นการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค ๓๐ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕ แห่ง อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ยอดเบิกจ่ายยังไม่ขึ้นในระบบ GFMS) และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ แห่ง ผลงาน ๙๘%) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ/โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๓ โครงการ มีโครงการฯ ผลงานต่ำกว่าแผน เช่น โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองปลาหมอ จ.สุโขทัย ผลงาน ๐ % เดิมติดปัญหาพื้นที่ป่าโซน C ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานได้แล้ว และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยน้ำพร้าว (ฝายหลวงประชารัฐ) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่ ผลงาน ๑๒ % ปัจจุบันอยู่ระหว่าง รท.ทส. ลงนามอนุมัติใช้พื้นที่ป่าไม้

๒.๒ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๒.๑ ประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning) และผล

การตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา

สทน.	จำนวนสถานี	มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลได้		สถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ		ผลการตรวจสอบซ่อมแซม บำรุงรักษา		คำชี้แจง
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	แผน	ผล	
๑	๗๑๑	๕๖๖	๘๐.๐๐	๑๔๕	๒๐.๐๐	๗๑๑	๒๒๖	
๒	๑๒๒	๑๐๕	๘๖.๐๐	๑๗	๑๔.๐๐	๑๒๒	๘๐	
๓	๑๒๕	๘๒	๖๕.๖๐	๒๐	๑๖.๐๐	๑๒๕	๑๐๗	
๔	๔๗	๔๕	๙๕.๗๔	๒	๔.๓๐	๔๗	๔๗	
๕	๓๗	๓๗	๑๐๐.๐๐	-	-	๓๗	๓๗	
๙	๒๖๓	๑๙๕	๗๔.๑๔	๖๘	๒๕.๘๕	๒๖๓	๗๐	

จากตารางข้างต้น จำนวนสถานีภัยล่วงหน้า (Early Warning) มีสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพของ สทน.๕ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๕ สทน.๑ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ สทน.๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ และ สทน.๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สทน. ๑-๑๑ ได้รับประมาณในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาไม่สอดคล้องกับจำนวนสถานีที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ ทำให้มีสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ สะสมจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำข้อมูลจำนวนสถานีที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ เพื่อให้ กพว.รวบรวมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเพื่อจำนวนสถานีภัยล่วงหน้า (Early Warning) สามารถใช้งานได้เพิ่มมากขึ้นต่อไป (เอกสาร ๑)

๒.๒.๒ ประสิทธิภาพ ...

**๒.๒.๒ ประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก และ
ผลการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา**

สท.น.	จำนวน แหล่งน้ำที่มี สถานีตรวจวัด	มีประสิทธิภาพรายงาน การตรวจวัดฯ ได้		*อุปกรณ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถรายงานฯ ได้		ผลการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา		คำชี้แจง
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	แผน	ผล	
๑	๒๓	๒๒	๙๖.๐๐	๑	๔.๐๐	๒๓	๒๓	
๒	๓๕	๓๕	๑๐๐	-	-	-	-	อยู่ในระยะประกันของ บริษัท
๓	๓๒	๓๒	๑๐๐	-	-	๓๒	๓๒	
๔	๒๙	๑๙	๖๕.๕๐	๑๐	๓๔.๕๐	๒๙	๑๙	
๕	๒๗	๒๗	๑๐๐	-	-	๒๗	๑๓	
๙	๗	๗	๑๐๐	-	-	๗	๗	

**๒.๒.๓ ประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูล
สัญญาณภาพ**

สท.น.	รายการระบบ	มีประสิทธิภาพ รายงานฯ ได้		สถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถรายงานฯ ได้	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	๗๑	๘๖.๐๐	๑๒	๑๔.๐๐
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๑	๒๐.๐๐	๔	๘๐.๐๐
๒	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	๓๑	๕๓.๐๐	๑	๓.๑๒
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๑	๒๕.๐๐	๓	๗๕.๐๐
๓	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	๓	๓๗.๕๐	๕	๘๓.๓๔
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๔	๕๗.๑๔	๓	๖๐.๐๐
๔	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	-	-	๑๗	๑๐๐
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๑	๑๐๐	-	-
๕	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	-	-	๑๗	๑๐๐
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	-	-	๒	๑๐๐
๙	- ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ	-	-	๗	๑๐๐
	- ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	๙	๙๐.๐๐	๑	๑๐.๐๐

จากตารางในข้อ ๒.๒.๒ แสดงประสิทธิภาพของระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก มีอุปกรณ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ สท.น.๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๐ และ สท.น.๑ คิดเป็นร้อยละ ๔ และตารางในข้อ ๒.๒.๓ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จะเห็นได้ว่าจำนวนของสถานีที่มีประสิทธิภาพสามารถรายงานผลได้ กับสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถรายงานการตรวจวัดฯ มีจำนวนแตกต่างกัน เช่น สท.น.๔ สท.น.๕ สท.น.๙ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ ชำรุด/เสื่อมสภาพทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบเครือข่ายโครงข่ายซี มูล เนื่องจากงบประมาณค่าบำรุงรักษาระบบฯ ไม่สอดคล้องกับจำนวนสถานี ทำให้ไม่สามารถบำรุงรักษาได้เต็มตามศักยภาพและตามรอบที่ควรจะเป็น หน่วยงานข้างต้นได้แจ้ง กวป. ทราบด้วยแล้ว (เอกสาร ๒)

๒.๒.๔ การช่วย ...

๒.๒.๔ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

สท.๑ - ๑๑ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือพื้นที่วิกฤติน้ำ โดยในช่วง ๒ ไตรมาสแรกของ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ณ วันตรวกราชการ) หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สรุปได้ดังนี้

สท.น.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		ปริมาณ แจกจ่ายน้ำ (ลบ.ม./ขวด)	ศูนย์ผลิต และบริกน้ำ (ลบ.ม.)	ประโยชน์ที่ได้รับ			สถานะ ข้อมูล (๑ ต.ค.๖๖ ถึงวันตรวจ)
	ภัยแล้ง	ระบาย น้ำท่วม			ครัวเรือน	ประชาชน (คน)	พื้นที่ การเกษตร (ไร่)	
๑	๒,๒๖๖,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	๑๐๘	๕๕๕๙.๙๓	๓๐,๑๕๔	๑๑๔,๓๖๓	๕,๒๐๐	๑๑ มี.ค.๖๗
๒	๘,๒๑๘,๒๖๐	๑,๒๔๙,๕๖๐	๒๕,๐๐๐	๕,๖๓๙	๓๐,๑๕๔	๑๓,๗๙๑	๑๘,๙๐๐	๑๑ มี.ค.๖๗
๓	๗๑๓,๒๓๒	๑,๑๘๕,๓๓๖	-	-	๘,๓๖๖	๒๓,๕๑๘	๒,๙๔๐	๑๑ มี.ค.๖๗
๔	๑,๕๙๘,๔๐๐	๒,๓๗๙,๖๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๒๖,๒๐๘	๔๗,๔๙๘	-	๑๑ มี.ค.๖๗
๕	๘๖๘,๖๐๐	๑,๗๐๐,๔๐๐	๒๘๙,๐๐๐	-	๙,๕๒๘	๓๐,๒๕๔	-	๑๑ มี.ค.๖๗
๙	๒,๘๓๙,๑๔๐	๗๙๙,๙๘๐	-	-	๗,๙๙๘	๒๐,๕๓๑	๒๗,๒๗๗	๑๘ มี.ค.๖๗

๒.๓ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน

ตามที่ ผต.ทส. ได้กำหนดการตรวจเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ไว้ใน แผนการตรวจราชการของ ผต.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งเป็นนโยบายของ รมว.ทส. ที่ต้องการ ให้องค์กรดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับพื้นที่ เพื่อลดปริมาณเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่กรมหรือ กระทรวง ดังนั้น ผต.ทส. จึงได้กำหนดไว้ในประเด็นการตรวจฯ ซึ่งจากรายงานและติดตามฐานข้อมูลในระบบ E – petition (นับเฉพาะเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ) สรุปได้ดังนี้

สท.น.	แหล่งเรื่องร้องเรียน/ปีงบประมาณ (จำนวน/ปีที่ได้รับเรื่อง)			สถานะเรื่องร้องเรียน (จำนวน)	
	E – petition	หนังสือถึง หน่วยงาน	ในพื้นที่	*อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้
๑	-	๘	๑/๒๕๖๔ ๑/๒๕๖๖	๒	-
๔	-	๒๑	๒๑/๒๕๖๗	๑๐	-
๙	-	๑	๑/๒๕๖๖	๑	-

หมายเหตุ - สท.๒ สท.๓ และ สท.๕ (ไม่มีเรื่องร้องเรียน และปิดเรื่องร้องเรียนแล้ว)

ทั้งนี้ กตร. ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของ รมว.ทส. ที่ประสงค์ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับ พื้นที่รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ อท. ได้เห็นชอบมอบหมาย สำนักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Focal Point) เพื่อทำหน้าที่ประสานติดตามความก้าวหน้าของผลการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนค้าง และเมื่อหน่วยงานได้รับข้อสั่งการของผู้บริหาร ให้สำเนาเรื่องแจ้ง สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อทราบ/ดำเนินการ อีกทางหนึ่งด้วย ตามหนังสือกลุ่มตรวจราชการ ที่ ทส ๐๖๒๑/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๗

๒.๔ การเตรียม ...

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๒.๔ การเตรียมความพร้อมในการรองรับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ทั้ง ๖ สทน. ได้เตรียมความพร้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการแบบบูรณาการงานก่อสร้างและราคากลาง และมีความพร้อมด้านแบบแปลนเพื่อการบริหารสัญญาจ้าง หน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

๒.๕ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

(๑) **โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพางโมเดล บ้านน้ำพาง หมู่ที่ ๔ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน ผลงาน ๑๐๐ %** (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยมีแนวคิดร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าหัวโล้นให้เป็นระบบเกษตรเชิงนิเวศให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑๐๓ ครัวเรือน พื้นที่เกษตร ๗๐๐ ไร่ มีปริมาณน้ำดิบเก็บกัก ๔๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมีการวางระบบเพื่อสูบน้ำมาจากลำน้ำพางมาเก็บกักไว้ในแหล่งน้ำก่อนสูบขึ้นโดยระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ประโยชน์ในแปลงเกษตร โครงการน้ำพางโมเดลประกอบด้วย ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้วในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ **ได้มีข้อเสนอแนะ** (๑) ให้ผู้เกี่ยวข้องมีการทดสอบระบบในทุกจุดให้ใช้งานได้ ๑๐๐% และจัดให้มีตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้ดูแลระบบพร้อมกับฝึกความชำนาญในการใช้งาน ให้สามารถดูแลและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้ด้วยตนเองโดยมี สทน.๔ เป็นพี่เลี้ยง และส่งเสริมสร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็ง โดยจัดหาหน่วยงานด้านการเกษตรส่งเสริมและให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำและชุมชนในด้านการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกจากข้าวโพด เป็นพืชชนิดอื่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์

(๒) **โครงการอนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้างพร้อมระบบส่งน้ำ ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ผลงาน ๑๐๐ %** (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) สทน.๔ ได้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำและจัดทำระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๗๐๐ ครัวเรือน พื้นที่เกษตร ๒,๐๐๐ ไร่ ปริมาตรอ่างเก็บน้ำเดิมมีความจุ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อติดตั้งระบบกระจายน้ำสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตร ประชาชนปลูกม่วง มะนาว และทำนาข้าว และโครงการดังกล่าวยังได้สนับสนุนน้ำจากโครงการฯ ผ่านระบบส่งต่อให้กับสถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน สำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ เพื่อเพาะชำกล้าไม้อีกด้วย ประชาชนได้ขอให้หน่วยงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำได้มากขึ้น เนื่องจากเดิม สทน.๔ ได้ดำเนินการขุดลอกได้ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ **ได้มีข้อเสนอแนะ** ให้ สทน.๔ สำรวจความเหมาะสมและออกแบบเพื่อวางโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

(๓) **โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สะเนียน โครงการที่ ๑ บ้านสมุนใหม่ ม.๑๖ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน และโครงการที่ ๒ บ้านจะบ้ายา หมู่ที่ ๑๐ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ผลงาน ๑๐๐ %** (โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) สทน.๔ ดำเนินการจัดสร้างระบบผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการไปแล้ว ๑๘๕ แห่ง โครงการดังกล่าวสามารถช่วยให้เด็กนักเรียน ครู และชุมชนข้างเคียงมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภคน้ำอย่างเพียงพอ **ได้มีข้อเสนอแนะ** ให้ส่วนบริหารจัดการน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนไส้กรองน้ำเป็นประจำ เช่น อาจเปลี่ยนทุก ๖ เดือน และควรมีการตรวจคุณภาพน้ำดื่มเป็นประจำ เพื่อให้มีน้ำดื่มในโรงเรียนมีคุณภาพ สะอาดและถูกสุขอนามัย

ภาพประกอบ ...

ภาพประกอบการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (เอกสาร ๓)

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ผต. ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สทน. รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตาม มีข้อค้นพบอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและต้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดย ผต. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	สทน.	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ผต.
๑.	ทุกหน่วย ยกเว้น สทน.๕	ร้อยละของจำนวนของสถานีเตือนภัย น้ำท่วม - ดินถล่ม ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง ข้อมูลได้มีอัตราลดลง แต่ในทางตรงกันข้าม ร้อยละของสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพมีอัตรา เพิ่มขึ้น เช่น สทน.๔ มีอัตราชำรุด ร้อยละ ๒๕.๘๕ สทน.๑ มีอัตราชำรุด ร้อยละ ๒๐ และ สทน.๓ มีอัตราชำรุด ร้อยละ ๑๖ ซึ่งถือว่าแต่ละหน่วยงานมีอัตราของสถานี ที่ชำรุด ค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าสถานีที่ชำรุด จะสามารถใช้ผู้รู้ประจำสถานี ในการ รายงานปริมาณน้ำฝนแทนระบบอัตโนมัติ ได้ก็ตาม	๑.๑ กวพ. ต้องนำรายละเอียดของสถานี ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน ๒๕๒ สถานี ตามเอกสารแนบ ๑ ไปพิจารณา ดำเนินการจัดลำดับการแก้ไขซ่อมบำรุง โดยเร่งด่วน หากงบประมาณประจำปี ไม่เพียงพอ ควรพิจารณาหาแนวทาง ร่วมกับ กยผ. จัดหางบประมาณใน ส่วนอื่นมาแก้ไขปัญหานี้ เพื่อให้สถานีฯ สามารถใช้งานได้ ๑๐๐% (สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลได้แบบ Real time) เพื่อ ใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนภัยสำหรับ รองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น แบบฉับพลัน ๑.๒ สำหรับช่วงระยะเวลาที่ สถานีชำรุด รองรับปริมาณในการซ่อมแซมนั้น ให้ส่วน อุทกวิทยาของแต่ละหน่วยงาน ติดตาม สถานการณ์ปริมาณน้ำฝนจากผู้รู้ประจำ สถานีฯ อย่างใกล้ชิดและให้มีการ จดบันทึกปริมาณน้ำฝนไว้เป็นฐานข้อมูล หากมีสถานการณ์ฝนตกและมีปริมาณ น้ำฝนเกินกำหนดให้เร่งรัดแจ้ง กวพ. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้เป็น ข้อมูลในการแจ้งเตือนภัยและส่งข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับ สถานการณ์
๒.	ทุกหน่วย	จำนวนของสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกัก ในแหล่งน้ำขนาดเล็กของ สทน.๔ สทน.๑ และ มีชำรุด ร้อยละ ๓๔.๕๐ และร้อยละ ๔ และ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพที่ชำรุด/ เสื่อมสภาพไม่สามารถรายงานผลได้ฯ	กวพ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ต้อง นำรายละเอียดของสถานีชำรุด/ เสื่อมสภาพ ตามเอกสารแนบ ๒ และ ๓ ไปพิจารณาดำเนินการจัดลำดับการแก้ไข ซ่อมบำรุงโดยเร่งด่วน หากงบประมาณ ประจำปีไม่เพียงพอ ควรพิจารณา

ลำดับ	สทน.	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ผต.
		มีจำนวนมาก หรือชำรุดทั้งหมด เช่น สทน.๔ สทน.๕ และ สทน.๙ ส่งผลให้ข้อมูลในระบบ Error หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้	หาแนวทางร่วมกับ กยผ. จัดหางบประมาณในส่วนอื่นมาแก้ไขปัญหา เพื่อให้ข้อมูลในระบบฯ มีความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำได้
๓.	สทน.๒ สทน.๙	- สทน.๒ และ สทน.๙ มีรถบรรทุกที่ใช้เติม CNG หาสถานที่เติมเชื้อเพลิงได้ยาก ไม่สะดวกในการใช้งาน - สทน.๙ ขาดแคลนยานพาหนะสำหรับใช้ในการกึ่งที่ต้องปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงหรือเชิงเขา ซึ่งต้องใช้รถที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ เช่น รถโฟวิล เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๓.๑ เห็นควรให้ กพท.๒ รับประเด็นอุปสรรคของ สทน.๒ และสทน.๙ ไปพิจารณาดำเนินการหาแนวทางแก้ไข และเพื่อให้การแก้ไขเรื่องดังกล่าวเป็นระบบควรมีหนังสือแจ้งเวียนสอบถามทุก สทน.ที่ประสบปัญหานี้ เพื่อนำมาประมวลแก้ไขในภาพรวมพร้อมกันต่อไป ๓.๒ ควรให้ สลก.สำรวจและจัดหา ยานพาหนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยจัดทำประมาณการและตั้งเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป
๔.	ทุกหน่วย	เนื่องจากปัจจุบัน มีหน่วยตรวจสอบหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานงบประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต้องการให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แสดงผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ การดูแลบำรุงรักษาโครงการให้เกิดประโยชน์ คุ่มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ โดยให้จัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมาก : สทน.๙ และหลายหน่วยงาน มีงบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำกัด ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว	เห็นควรให้ กยผ. จัดสรร “งบดำเนินงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่นๆ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ให้กับ “ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน” ของ สทน. ๑ - ๑๑ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถติดตามผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างครอบคลุมภารกิจ โดยสามารถสนองตอบความต้องการของหน่วยตรวจสอบต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ และหน่วยงาน สทน.๑-๑๑ ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้อีกด้วย
๕.	ทุกหน่วย	สทน. ๕ และ สทน. ๙ แจ้งปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในหน่วยงานเนื่องจากข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ หรือโอนย้าย ปัจจุบันยังไม่มีการบรรจุในตำแหน่งที่ว่าง เช่น สทน.๕ : ผอ.ส่วน	ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สลก.) เร่งรัดพิจารณาการเลื่อนระดับข้าราชการดับ ผอ.ส่วน นายช่างโยธาอาวุโส เรียกบรรจุข้าราชการที่อยู่ในบัญชีท. หรือจัดหาอัตรากำลัง

ลำดับ	สทน.	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ผต.
		อำนวยการ , ผอ.ส่วนการจัดสรรน้ำ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สทน.๙ : นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เจ้าพนักงานอุทกวิทยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการไม่มีพนักงานราชการมาทดแทน ซึ่งยังขาดความชัดเจนว่าจะได้อัตราตำแหน่งคืนหน่วยงานหรือไม่	หรืองบประมาณสำหรับการบรรจุพนักงานในอัตราดังกล่าวหรือจ้างลูกจ้าง TOR ให้และหน่วยงานที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในลักษณะเดียวกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖	สทน.๙	การลงพื้นที่โครงการฯ สทน.๙ ผต.ทน. มีสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในโครงการฯ ๓ แห่ง (๖.๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพางโมเดล บ้านน้ำพาง หมู่ที่ ๔ ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน (๖.๒) โครงการอนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้างพร้อมระบบส่งน้ำ ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุดรธานี	ให้ สทน.๙ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (๖.๑.๑) ให้ผู้เกี่ยวข้องและบริษัทคู่สัญญาดำเนินการทดสอบระบบในทุกจุดให้ใช้งานได้ ๑๐๐% ทั้งนี้ โครงการภายใต้ น้ำพางโมเดล ม.๔ ม.๔ และ ม.๙ ยังอยู่ในระยะประกันสัญญา เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเร็วต่อไป และจัดให้มีตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้ดูแลระบบพร้อมกับฝึกความชำนาญในการใช้งาน ให้สามารถดูแลและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้ด้วยตนเองโดยมี สทน.๙ เป็นพี่เลี้ยง (๖.๑.๒) ส่งเสริมสร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็ง โดยจัดหาหน่วยงานด้านการเกษตรส่งเสริมและให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำและชุมชนในด้านการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดิน เพื่อให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่ปลูกจากข้าวโพด เป็นพืชชนิดอื่นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน (๖.๒.๑) เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้างยังขาดลอกไม่เต็มพื้นที่อ่างฯ ขอให้ สทน.๙ สำรวจความเหมาะสมและออกแบบเพื่อวางโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้น

ลำดับ	สทท.	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ผต.
		(๖.๓) โครงการจัดการระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน โครงการที่ ๑ บ้านสมุนใหม่ ม.๑๖ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน และโครงการที่ ๒ บ้านจะบ้ายา หมู่ที่ ๑๐ ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน	(๖.๓.๑) ให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ สทท.๙ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเปลี่ยนไส้กรองน้ำในระบบผลิตน้ำดื่มเป็นประจำ เช่น อาจเปลี่ยนทุก ๖ เดือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสมและควรมีการตรวจคุณภาพน้ำดื่มเป็นประจำ เพื่อให้ น้ำดื่มในโรงเรียนมีคุณภาพสะอาดและถูกสุขอนามัยสำหรับนักเรียน ครู และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงที่ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภค

ในการนี้ ผต.ทท. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ ผต.ทท. เพื่อจกได้สรุปนำเรียน อทท. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นายไกรวัล ไทยपाल)

ผู้ตรวจราชการกรม
