



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 3439
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖
14-53

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 01966
วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา 14.31 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ
ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๗๖ วันที่ ๗

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑
เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ


๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ

๒. ข้อเท็จจริง

หน.ผต. (นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) และ ผต. (นายไกรวัล ไทยपाल) ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย VDO Conference ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ได้ดังนี้

๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

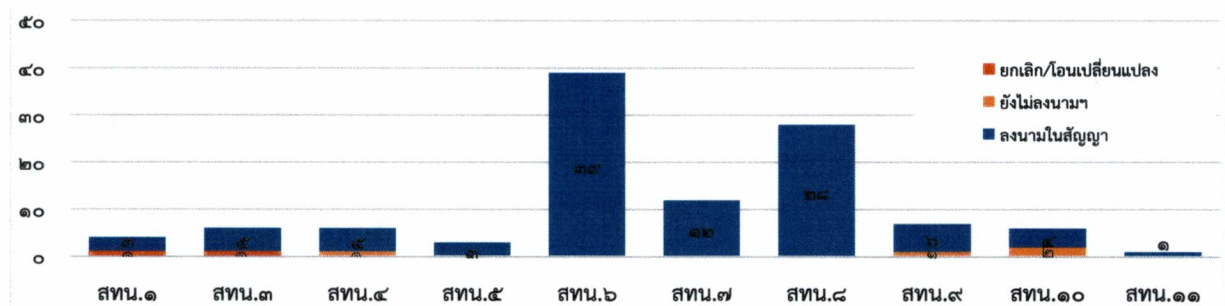


จากแผนภาพจกเห็นได้ว่า สทน.๕ ๖ ๗ ๘ และ ๑๑ ได้มีการลงนามในสัญญาได้ครบทุกโครงการ สำหรับ สทน.๔ ๙ และ ๑๐ มีโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจำนวน ๑ ๑ และ ๒ โครงการตามลำดับ โดยของ สทน.๔ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว จ.ร้อยเอ็ด ได้ผู้รับจ้างและคาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ สทน.๙ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพวงสะตือ จ.อุดรดิตถ์ ขอบริบวงเงินเพิ่มอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ สทน.๑๐ จำนวน ๒ โครงการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยลึก จ.กระบี่ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการประกวดราคา และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบนนายแจ่ม จ.กระบี่ อยู่ในขั้นตอนรออุทธรณ์การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๗ วันทำการ สำหรับการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงอย่างละ ๑ แห่งของ สทน.๑ และ ๓ โดย สทน.๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยยะอุ พบว่าได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่สามารถทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพได้ตามแบบแปลนของ กพน.๑ สทน. ๓ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยบังพวน จ.หนองคาย อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเอกสารแนบ ๑ และจากการตรวจฯ ได้รับรายงานเพิ่มเติมจาก สทน.๖ มีโครงการที่แล้วเสร็จจำนวน ๒๕ โครงการ จากทั้งหมด ๓๙ โครงการ

เรื่องกลับ กลบ
วันที่ 11 เม.ย. ๖๖
เวลา 9.58

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

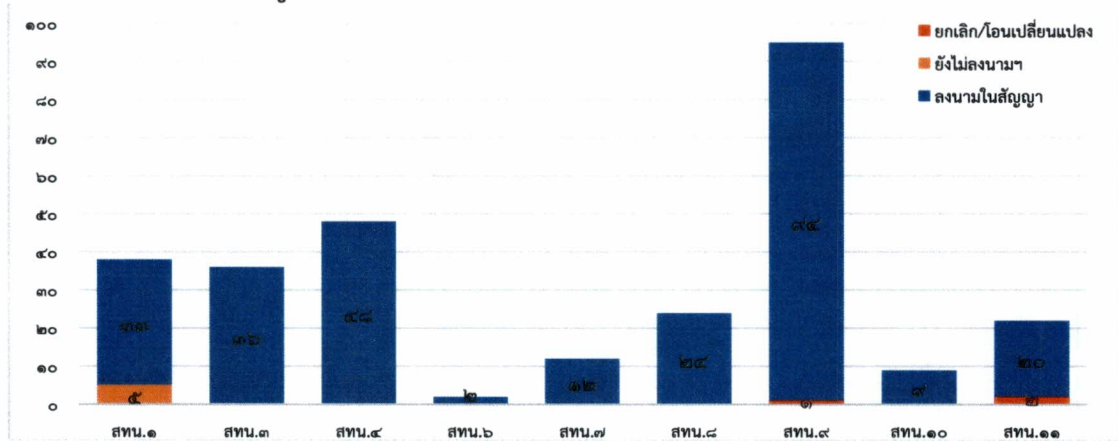


จากแผนภาพจกเห็นได้ว่า สท.๓ ๔ ๖ ๗ ๘ และ ๑๐ ได้มีการลงนามในสัญญาครบทุกโครงการ สำหรับ สท.๑ มีโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ๕ โครงการ โดยมี ๒ โครงการมีผู้ยื่นอุทธรณ์ต้องส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ที่เหลืออีก ๓ โครงการคาดว่าจะลงนามในสัญญาช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒ โครงการ และกลางเดือนเมษายนอีก ๑ โครงการ โดยมีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ๑ และ ๒ โครงการของ สท.๙ และ ๑๑ **รายละเอียดเอกสารแนบ ๒** และจากการตรวจ ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า มีโครงการแล้วเสร็จจำนวน ๑๐ โครงการ เป็นของ สท.๓ จำนวน ๓ โครงการ สท.๔ จำนวน ๔ โครงการ และ สท.๖ ๗ และ ๘ แห่งละ ๑ โครงการ

๒.๓ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ


ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีการดำเนินการในพื้นที่ของ สท. ๑ จำนวน ๗ โครงการ ซึ่งเป็นงานทำเอง โดยขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด และมีการดำเนินการใน สท. ๓ ๔ ๖ ๗ และ ๑๑ จำนวน ๓ ๒ ๑ ๓ และ ๑ โครงการ ตามลำดับ ขณะนี้ทั้งหมดอยู่ระหว่างพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๔ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

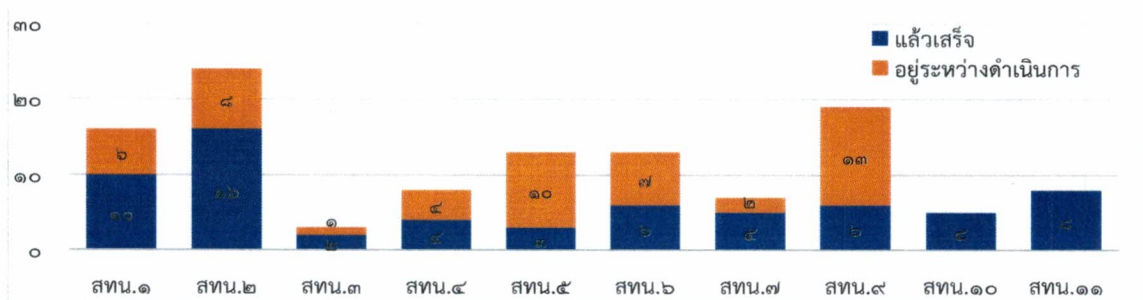


จากแผนภาพ สท.๑๐ และ ๑๑ ได้ดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปีแล้วเสร็จทั้งหมด สำหรับ สท. ที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการได้รายงานผลและคาดว่าจะแล้วเสร็จส่วนใหญ่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ (สท.๒ ๖ ๗ และ ๙ อย่างละ ๑ โครงการ) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ (สท.๔) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ (สท.๖ และ ๙) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ (สท.๖) เดือนกันยายน จำนวน ๕ โครงการ (สท.๖ และ ๙) และยังไม่สามารถคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่าเขากะปืด) จ.บุรีรัมย์ **รายละเอียดเอกสารแนบ ๓**

๒.๕ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑ มติ ครม. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕)

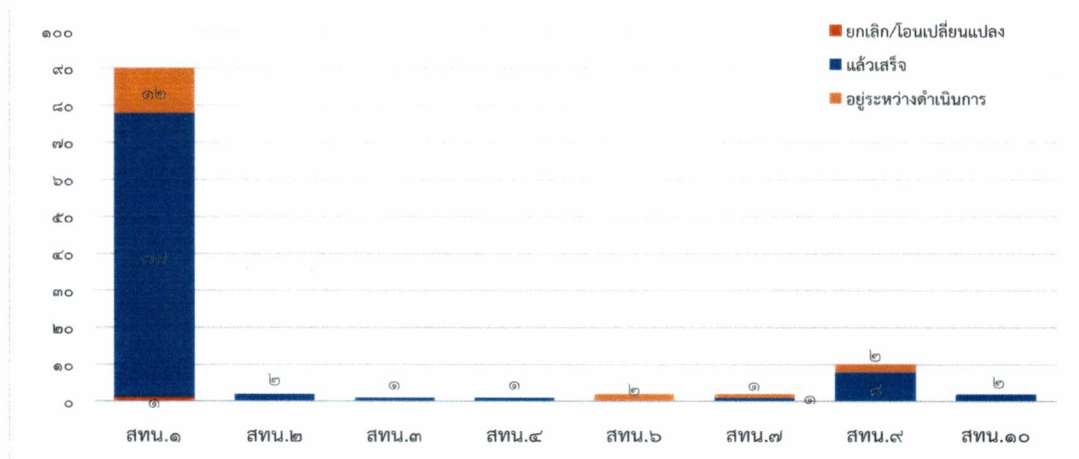

จากแผนภาพ สทน.๒ ๓ ๔ และ ๑๐ ได้ดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) แล้วเสร็จทั้งหมด สำหรับ สทน.๑ ๖ ๗ และ ๙ ที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการได้รายงานผลและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และล่าสุดที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหิน จ.ฉะเชิงเทรา ของ สทน.๖ ที่ขณะตรวจฯ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๓ รายละเอียดเอกสารแนบ ๔

๒.๖ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒ มติ ครม. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)

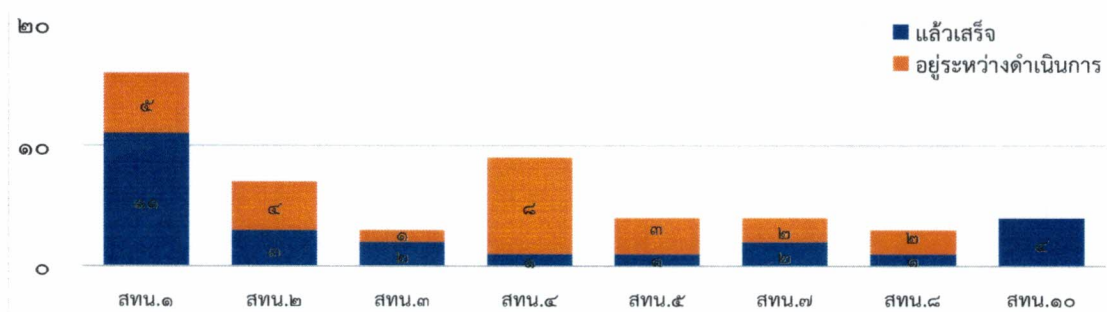


จากแผนภาพมีเพียง สทน. ๑๐ ได้ดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) แล้วเสร็จทั้งหมด โครงการที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๒๕ โครงการ นั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ เดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เดือนละ ๑ โครงการ และยังไม่สามารถคาดว่าจะแล้วเสร็จได้จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

สทน. ๑ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำแม่น้ำปิง บ้านเกาะสามสิบ จ.กำแพงเพชร เนื่องจากการแก้ไขแบบและคาดว่าจะแจ้งเข้าดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

สทน. ๔ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหุ้ม จ.ขอนแก่น และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผาก พร้อมระบบกระจายน้ำ จ.มหาสารคาม อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา รายละเอียดเอกสารแนบ ๕

๒.๗ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓ มติ ครม. ๖ กันยายน ๒๕๖๕)



จากแผนภาพ...

จากแผนภาพ สทน. ๑ มีโครงการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ อีก ๒ โครงการ หยุดงานและแก้ไขแบบ คาดว่าจะแจ้งเข้าดำเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ในส่วนของสทน. ๑๑ มีโครงการแล้วเสร็จ ๔ โครงการ อีก ๒ โครงการจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ สำหรับในส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการของ สทน.๒ และ ๓ คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม ๒๕๖๖ สทน.๔ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย ๑ โครงการ อีก ๒ โครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม และกรกฎาคม ๒๕๖๖ และ ๑ โครงการ รอลงนามในสัญญา (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปากเลิงเปลือย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ขอนแก่น) สทน.๘ ตามสัญญาแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เช่นเดียวกับ สทน.๙ ตามสัญญาแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ๒๕๖๖

๒.๘ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

สทน.๑ - ๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม สำหรับไตรมาสที่ ๑ - ๒ โดยได้จัดทำแผนการบำรุงรักษา แต่เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น สทน.๑ ลดลงร้อยละ ๑๗ สทน.๔ ลดลงร้อยละ ๑๒ เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถบำรุงรักษาสถานีได้เต็มตามศักยภาพตามที่ควรจะเป็น หรือไม่สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพได้ครบทุกสถานี โดยปกติตามแผนฯ ควรออกไปดูแลบำรุงรักษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี/จำนวนสถานีที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของชุดอุปกรณ์/แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แต่จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงทุกปี ทำให้ออกไปปฏิบัติงานได้เพียง ๔ ครั้ง หรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่จำนวนสถานี เมื่อสถานีไม่ได้รับการบำรุงรักษาตามรอบที่ควรจะเป็น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการชำรุดของอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้ง การเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์ไม่ทำงาน ส่งผลให้การเตือนภัยไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานีที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ และสถานีที่ต้องติดตามข้อมูลจากผู้รู้ประจำสถานีแทน เนื่องจากสถานีชำรุด/เสื่อมสภาพ แสดงได้ดังนี้

สทน.	จำนวน สถานีเตือนภัย (สถานี)	มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง ข้อมูลได้ (สถานี)		ติดตามข้อมูลจากผู้รู้ ประจำสถานี (สถานี)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑	๖๔๗	๔๒๖	๖๖	๒๒๑	๓๔
๒	๑๑๗	๑๑๑	๙๕	๖	๕
๓	๙๖	๙๔	๙๘	๒	๒
๔	๓๒	๓๑	๙๙	๑	๑
๕	๓๗	๓๔	๙๒	๓	๘
๖	๖๗	๕๒	๗๗	๑๕	๒๒
๗	๑๐๔	๗๗	๗๔	๒๗	๒๖
๘	๑๙๗	๑๖๕	๘๓	๓๒	๑๗
๙	๒๖๔	๑๘๖	๗๐	๗๘	๓๐
๑๐	๑๓๖	๑๒๑	๘๙	๑๕	๑๑
๑๑	๖	๖	๑๐๐	-	-

๒.๙ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สทน.๑ - ๑๑ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วมส่วนหน้า ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภาวะน้ำแล้ง และภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตน้ำ โดยในช่วง ๒ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖) ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ สรุปลงได้ดังนี้

ปริมาณ...

สทน.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		ปริมาณ แจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	น้ำดื่ม (ขวด)	ประโยชน์ที่ได้รับ	
	ภัยแล้ง	ระบายน้ำท่วม			ประชาชน (ครัวเรือน)	ภัยแล้ง
๑	๒๘๗,๕๐๐	๑๐,๔๖๒,๐๐๐	๑,๖๔๘,๙๔๖	๑๒,๖๐๐	๓๕๖,๐๒๑	๔,๗๐๐
๒	๖๒,๕๑๐	-	๗๒,๐๐๐	๑,๒๐๐	๓,๐๙๙	-
๓	๖,๖๐๔,๗๐๐	๑,๑๗๓,๕๐๐	๓๐,๐๐๐		๑๒,๓๐๑	๘,๕๕๓
๔	๖๑,๐๐๐	๒,๘๙๖,๕๐๐	-	๘๐๐	๗,๓๘๒	-
๕	๓๕๘,๙๙๐	๓,๔๔๔,๕๐๐	๑๘,๐๐๐	๗,๖๐๐	๑๐,๗๔๐	-
๖	๕,๒๕๘,๐๐๐	-	-	๒๑,๐๔๘	๒,๓๘๐	๗,๓๗๐
๗	๗๙,๕๖๐	๑๓,๘๙๑,๓๘๐	-	-	๗,๕๙๓	๘๓,๔๒๒
๘	-	๖๓๐,๐๐๖	-	-	๒,๕๒๒	๑,๘๔๐
๙	๑,๒๗๖,๒๖๐	๒,๙๖๔,๙๐๐	๑๒๐,๗๐๐	๑,๘๘๒	๑๒,๑๗๖	๕,๓๐๐
๑๐	๒๕๔,๖๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	๑๘๖	๖,๘๒๐
๑๑	๓๒,๐๐๐	-	-	-	๖๖๔	๓๐
รวม	๑๔,๒๗๕,๑๒๐	๓๕,๖๔๖,๗๘๖	๑,๙๖๑,๖๔๖	๔๕,๑๓๐	๔๑๕,๐๖๔	๑๑๘,๐๓๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ หน.ผต. และ ผต. ได้รับการรายงานและขอค้นพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและเร่งด่วน จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ อทน. ได้พิจารณาสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ หน.ผต. และ ผต. เพื่อจกได้นำเรียน อทน. สรุปได้ดังนี้

สทน.	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ของ หน.ผต. และ ผต.
ทั้ง ๑๑ สทน.	งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม ได้รับจัดสรรลดลง ส่งผลกระทบให้การซ่อมแซม/บำรุงรักษาสถานีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ อุปกรณ์บางชนิดชำรุดไม่สามารถซ่อมเองได้ต้องส่งไปที่ กวพ. การซ่อมใช้เวลานานหรือมีงบประมาณซ่อมแซมไม่เพียงพอ เพราะมีจำนวนมากทำให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลลดลง ซึ่งเห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้จากรายงานในข้อ ๒.๘ อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดหลักของ ทน. ความสำเร็จของการประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์น้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ด้วย	อทน. ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาระงับด่วนโดยสั่งการให้ กยผ. เสนอจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เพื่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสาธารณชน
ทั้ง ๑๑ สทน.	- การเร่งบรรจุบุคลากรทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง - การพิจารณาตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะด้านเทคนิคการซ่อมบำรุง ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ตลอดจนความรู้/ความสามารถ	อทน. ต้องสั่งการ/กำชับเป็นการเร่งด่วนให้ สลก. โดยส่วนบริหารบุคคลดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดโดยเร็ว รวมทั้งต้องวิเคราะห์ได้ถึงตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผต.(นายไกรวัลฯ) จกได้ติดตามในเรื่องนี้อีกทางหนึ่งด้วย

สทน.

สทน.	ปัญหาอุปสรรค	ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ของ ทน.ผต. และ ผต.
๗	ขาดรถครนเพื่อการเคลื่อนย้ายรถดูดโคลนสะเทินน้ำ สะเทินบก (ได้รับจัดสรรมา ๒ ลำ) เมื่อต้องใช้งานต้อง จัดจ้างรถมาดำเนินการ	ในการจัดหาเครื่องกลเพื่อนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ต้องมีการวิเคราะห์ให้ครบวงจรของ การปฏิบัติงาน ควรมอบให้ กพน.๒ รับเรื่องนี้ไป ดำเนินการต่อไป
		งานในส่วนของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมี ความสำคัญกับ ทน. ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ แต่ งบประมาณมิได้รับการจัดสรรไว้ตาม พ.ร.บ. แต่ ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายปี งบประมาณ ทำให้การดำเนินการต้องเร่งรัดและ ขาดประสิทธิภาพ เห็นเป็นการสมควรที่ ททน. ต้องแก้ไขเร่งด่วน โดยสั่งการให้ กยผ. และ กอน. เสนอจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องและสัมพันธ์ กับโครงการอนุรักษ์ และระบบกระจายน้ำในแต่ ละปีด้วย

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ




(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม



(นายไกวล์ ไทยपाल)
ผู้ตรวจราชการกรม

กยผ. รับ กอน และ กพน.๒
ดำเนินการทบทวนโครงการ และ.คท
เสนอให้ กยผ. ทน. และ กพน.๒



๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖
(นายภาตล ถาวรฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดของโครงการที่ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง หรือยังไม่ลงนามในสัญญา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สท.น.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				งบประมาณ	ประเภทโครงการ		คำชี้แจง ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง หรือยังไม่ ลงนามในสัญญา	คาดว่าจะดำเนินการ ได้
		บ้าน/ หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ยกเลิก/โอน เปลี่ยนแปลง	ยังไม่ลง นามใน สัญญา		
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ฝายน้ำล้นห้วยยะอุ	ห้วยยะ อุ	ตำบลแม่ละ เมา	แม่สอด	ตาก	๓,๘๖๖,๐๐๐	✓		สท.น.๑ ได้ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้างโครงการ พบว่าได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยจนไม่สามารถ ทำการซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ได้ ตามแบบแปลนของ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๑	
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ฝายน้ำล้นห้วยบังพวน	แก่งน้อย	พระธาตุบัง พวน	เมือง หนองคาย	หนองคาย	๖,๗๑๘๕	✓		อยู่ระหว่างขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง	เมษายน ๒๕๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง สระแก้ว		ในเมือง	เมือง ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	๔,๑๑๓๗		✓	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ขั้นตอนรออุทธรณ์การ ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา ๗ วันทำการ)	
๕	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ฝายน้ำล้นพงสะตือ	พง สะตือ	บ้านแก่ง	ศรีอน	อุดรดิตถ์	๔,๙๕๐๐		✓	ขอปรับปรุงเงินเพิ่ม เนื่องจาก โครงการเสียหายเพิ่มเติม จาก ก อุ ท ก ก ย (ขอเพิ่ม ๕.๐๔๘๐ ล้าน บาท) อนุมัติงบประมาณ	พฤษภาคม ๒๕๖๖

สทพ.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				งบประมาณ	ประเภทโครงการ		คำชี้แจง ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง หรือยังไม่ ลงนามในสัญญา	คาดว่าจะดำเนินการ ได้
		บ้าน/ หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ยกเลิก/โอน เปลี่ยนแปลง	ยังไม่ลง นามใน สัญญา		
									โอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ๒๕๖๖ เหลือ จ่าย แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอ จัดสรรงบประมาณ	
๑๐	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง น้ำห้วยลึก	๕	ศรีวัง	ปลาย พระยา	กระบี่	๔,๕๒๓๐		✓	อยู่ระหว่างอุทธรณ์ผลการ ประกาศราคา	หากทราบผลการ อุทธรณ์จะดำเนินการ ได้ ภายใน เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๑๐	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง น้ำบนนายเข้ม	๖	ลำทับ	ลำทับ	กระบี่	๗,๐๓๕๗		✓	ประกาศครั้งที่ ๒ ไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา อยู่ระหว่าง ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยเชิญผู้รับจ้างมาเสนอ ราคาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง และลงนามสัญญาได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดของโครงการย่อยเล็ก/โอนเปลี่ยนแปลง หรือยังไม่ลงนามในสัญญา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สทพ.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				งบประมาณ	ประเภทโครงการ		คำชี้แจง	คาดว่าจะดำเนินการได้
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		ยกเลิก/โอน	ยังไม่ลงนามในสัญญา		
							ยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง	ยังไม่มีลงนามในสัญญา		คาดว่าจะดำเนินการได้
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถ่านแฉะว สนิสนุมาชลแปลงใหญ่	หมู่ที่ ๑, ๒ ๓, ๔, ๑๐, ๑๑, ๑๒	เกาะคา, ท่าผา	เกาะคา	ลำปาง	๗๙,๘๐๐,๐๐๐		✓	รอยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๖	คาดว่าจะลงนามสัญญาได้วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ถ่านแฉะว สนิสนุมาชลแปลงใหญ่	ปาง หมู่ที่ ๑	ศรีวิชัย	ลี้	ลำพูน	๑๐,๐๔๓,๐๐๐		✓	อยู่ระหว่างตรวจเอกสารการยื่นเสนอราคา/ประกาศผู้ชนะ	คาดว่าจะลงนามสัญญาได้วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๖
๑	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำทางของขัดห่าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สะแกเคหรือ หมู่ที่ ๓	วังประจบ	เมืองตาก	ตาก	๑๕,๐๐๐,๐๐๐		✓	มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ส่งเรื่องให้ กรม ป ญ ชี ก ล ำ ง พิจารณา	-
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งม่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ	แม่ของ หมู่ที่ ๕	แม่นาแดง	ปาย	แม่ฮ่องสอน	๓๕,๓๘๙,๐๐๐		✓	รอ พ ้น ะ ยะ เ ว ล ำ อุทธรณ์/เรียกผลงานสัญญา	คาดว่าจะลงนามสัญญาได้วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖
๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่เสด พร้อมระบบกระจายน้ำ	ป่าฝาง หมู่ที่ ๕	วังทรายค้ำ	วังเหนือ	ลำปาง	๓๐,๕๙๐,๐๐๐		✓	มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ส่งเรื่องให้ กรม ป ญ ชี ก ล ำ ง พิจารณา	-
๙	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเคือ	เวียงต่ง หมู่ที่ ๑	วังธง	เมืองแพร่	แพร่	๘,๙๐๐,๐๐๐		✓	ได้รับงบประมาณโอน เบิกลียนแปลงปี ๒๕๖๕	-
๑๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ฝิ่ง/หมู่ที่ ๔	งานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	๕,๔๗๒,๘๐๐		✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ	
๑๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	หมู่ที่ ๑๐	หนองแก้ว	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	๖๔๙,๓๐๐		✓	อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ	

รายละเอียดของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ซึ่งเป็นโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ขอเงินเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

สทพ.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ร้อยละ ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด			
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังนงแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	วังตะกู หมู่ที่ ๑๑	วังทอง	พราหมณ์	กำแพงเพชร	๙๐%	๗,๔๐๑,๗๐๐	แจ้งสงวนสิทธิ์การปรับปรุง / คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน มี.ค. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานสง อาทิตย์ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอม ก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	๘๕%	๙,๙๒๒,๔๐๐	อยู่ระหว่างขอย่อย ระยะเวลา/คาดว่าจะแล้ว เสร็จต้นเดือน มี.ย ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านผละและปี ระยะ ๒	ผละปี หมู่ที่ ๘	แม่ศึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	๘๐%	๘,๓๓๕,๒๐๐	อยู่ระหว่างขอย่อย ระยะเวลา /คาดว่าจะแล้ว เสร็จต้นเดือน มี.ย. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้ง(บ้านทุ่งดิน ดำ)	ทุ่งดินดำ หมู่ที่ ๖	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	๖๐%	๗,๙๑๒,๐๐๐	หยุดงาน ๑๑ พ.ค. ๖๕/ แก้ไขแบบแปลน/ติด ปัญหาการขออนุญาตใช้ พื้นที่ป่าไม้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ มี.ย. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง-ศรี ศรีรักษ์ (บ้านครองราษฎร์)	ครองราษฎร์ หมู่ที่ ๙	เขียงทอง	วังเจ้า	ตาก	๘๕%	๓,๕๔๗,๗๐๐	หยุดงาน/ขออนุญาตชุด ท่อลอดถนน/แก้ไขแบบ แปลน คาดว่าจะแล้วเสร็จ มี.ค. ๖๖

สทท.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ร้อยละ ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด			
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านหนองปลาไหล)	หนองปลาไหล หมู่ที่ ๘	เขื่องทอง	วังเจ้า	ตาก	๗๔%	๗,๐๗๖,๘๐๐	หยุดงาน/ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. ๖๖
๒	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบริเวณทางน้ำเชื่อมต่อบึงใหญ่		วังเก้เหนือ	หันคา	ชัยนาท	๔๐	๑๘,๔๗๕๒	เมษายน ๒๕๖๖
๒	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา)	หมู่ที่ ๖, ๗	ทับกฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	๙๙	๑,๒๘๘๓	เมษายน ๒๕๖๖
๒	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ (สนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์)		นครสวรรค์ ออก	เมือง นครสวรรค์	นครสวรรค์	๗๕	๖,๒๘๘๑	มีนาคม ๒๕๖๖
๒	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแก้มลิง หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อคลองน้ำขุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ ๒	บ้านโคก	เมือง เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	๘๙	๙,๒๑๗๘	เมษายน ๒๕๖๖
๒	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบริเวณวังเชื่อมต่อกลองเตตะโก เชื่อมต่อแม่น้ำป่าสัก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	๗๕	๒๔,๑๔๘๑	เมษายน ๒๕๖๖
๒	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยน้ำยาเชื่อมต่อกห้วยช้อย		ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	๔๑	๑๖,๑๓๐๐	เมษายน ๒๕๖๖
๒	อนุรักษ์พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อกพื้นที่สาธารณประโยชน์ ๓๓๘ ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		เขาแหลม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	๙๘	๔,๔๗๗๔	เมษายน ๒๕๖๖
๒	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาน้อย(ฝายพระเทพ), อ่างเก็บน้ำอ้อมเม่น, อ่างเก็บน้ำหนองกรด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		ดัดัง	พัฒนานิคม	ลพบุรี	๖๐	๒๒,๓๒๐๓	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๓	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำถ้ำหมากหมาง	บ้านเนิน	ท่าลี่	กุมภวาปี	อุดรธานี	๘๐%	๑,๐๓๙๐	เมษายน ๒๕๖๖

สทพ.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ร้อยละผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด			
		สวรค์ หมู่ที่ ๘						
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอี้อยพร้อมระบบกระจายน้ำ	สีฐาน	ดงลิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	๑๗.๐๐%	๒๕.๖๙๒๖	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๘ มิ.ย. ๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูช่วยฟื้นฟ้พร้อมระบบกระจายน้ำ	สงแดง	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	๙๘.๗๐%	๑.๖๗๗๖	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๒๒ เม.ย.๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ๒ ตำบล (ตำบลลาดพัฒนา, ตำบลแก้ง)		ลาดพัฒนา, แก้ง	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	๗๙.๐๐%	๑๓.๑๖๑๓	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๒๒ เม.ย.๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจิว ระยะที่ ๒		ธงธานี	จัวชัยบุรี	ร้อยเอ็ด	๖๕.๐๐%	๑๘.๓๖๑๓	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๒๓ เม.ย.๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสำโรง (ช่วง๒)		บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	๙๗%	๒.๔๑๗๐	เมษายน ๒๕๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองที่ค่ายพร้อมระบบอ่าง	หนองทัพค่าย	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	๙๖%	๖.๕๗๙๕	เมษายน ๒๕๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูถนนเกษตรแปลงใหญ่							
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกาบ	นารุดพัฒนา หมู่ที่ ๕	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	๘๒%	๙.๔๗๕๑	เมษายน ๒๕๖๖
๔	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกวังวน หมู่ที่ ๔	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	๘๘%	๑๖.๘๗๓๙	เมษายน ๒๕๖๖
๔	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน หมู่ที่ ๖,๘,๙	ทัพใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	๘๕%	๙.๐๕๙๔	มีนาคม ๒๕๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่าเขากระปือด)		ลำน้ำร่อง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	๐	๑๕.๐๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าพื้นที่
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน)		ลำน้ำร่อง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	๘๐%	๑.๖๓๕๘	
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่		คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	๙๒.๘๖%	๕.๐๓๒๑	มีนาคม ๒๕๖๖
๕	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงศาลาตบัสันโครงการ	โนนแดง หมู่ที่ ๔	คูขาด	คง	นครราชสีมา	๘๙%	๖.๔๔๖๖	เมษายน ๒๕๖๖

สทท.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ร้อยละ ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด			
	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
๖	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนวังหั่ว ๒	หมู่ที่ ๙	วังหั่ว	แมลง	ระยอง	๙๘	๘,๗๘๙๕	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
๖	อนุรักษ์พันธุคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงทุ่งกะปาว	หมู่ที่ ๔	ประณีต	เขาสึง	ตราด	๓๘	๓๒,๒๗๓๔	กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖	อนุรักษ์พันธุอ่างเก็บน้ำคลองบางฝู ช่วง ๓	หมู่ที่ ๑๓	ลำน้ำห่อน	บ้านฉาง	ระยอง	๖๓	๒๕,๖๒๒๘	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๖	อนุรักษ์พันธุอ่างเก็บน้ำเขามันเทศ	หมู่ที่ ๑๓	ทุ่งพระยา	สามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	๑๓	๔๒,๕๖๘๐	กันยายน ๒๕๖๖
๖	อนุรักษ์พันธุหนองบรีอ ช่วง ๒	หมู่ที่ ๘	ย่านรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	๔๐	๑๖,๖๒๒๗	สิงหาคม ๒๕๖๖
๖	อนุรักษ์พันธุแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ ๙	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	๒	๙,๗๔๙๕	กันยายน ๒๕๖๖
๖	อนุรักษ์พันธุแหล่งน้ำบ้านหนองโพรงสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ ๒	สามชัย	นายายอาม	จันทบุรี	๑๕	๖,๓๘๘๐	กันยายน ๒๕๖๖
๗	อนุรักษ์พันธุแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองดอนหงษ์	๑,๒	คอมมะนาว	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	๔๕	๒๙,๐๓๐๔	ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
๗	อนุรักษ์พันธุแหล่งน้ำในพื้นที่แนวกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรณีหมู่บ้านตะเพินคี ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย	๕	วังยาว	คำนช้าง	สุพรรณบุรี	๕๗	๘,๒๖๙๐	ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
๙	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยคิระ	คิระ หมู่ที่ ๖	ศรีภูมิ	ท่าวังผา	น่าน	๙๐.๐๐%	๐.๓๒๐๔	- หยุดงาน - คาดแล้วเสร็จ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๙	อนุรักษ์พันธุแหล่งน้ำฝ่ายเสริมระบบนิเวศห้วยกอกพร้อมระบบกระจายน้ำห้วยทบศอกสนับสนุนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในสมเด็จพระ	ผาสุก หมู่ที่ ๓	ภูฟ้า	บ่อเกลือ	น่าน	๓๔.๒๐%	๒,๗๖๗๖	- หยุดงาน - คาดแล้วเสร็จ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

สทท.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ร้อยละ ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด			
	กนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
๙	อนุรักษ์พื้นที่ปลูกองุ่นหัวช้าง	ไม่ขอตอน ม.๓	ไม่ขอตอน	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	๘๙%	๐.๘๐๐๘	- หยุดงาน - คาดแล้วเสร็จ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๙	ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลห้วยมน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดอย่างมีส่วนร่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ธรรมวงศ์ หมู่ที่ ๖, ธรรมวงศ์ หมู่ที่ ๗	ห้วยมน	น้ำปาด	อุดรดิต์	๙๘%	๑.๙๙๓๑	- หยุดงาน เนื่องจากอยู่ ระหว่างการขออนุญาต ทำถนนทางหลวง - คาด แล้วเสร็จ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖
๙	อนุรักษ์พื้นที่ปลูกห้วยเหี้ย	ปางเคาะ หมู่ที่ ๑๑	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	๑%	๔.๓๕๐๐	- ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติแม่ป่าน - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
๙	อนุรักษ์พื้นที่ปลูกเหลียงน้ำสะเยียบมดเคิล		สะเยียบ	สอง	แพร่	๕.๑๒%	๘๔.๔๕๑๒	- ขออนุญาตใช้พื้นที่ - ได้รับอนุญาตให้เข้า ดำเนินการ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๙	อนุรักษ์พื้นที่ปลูกหัวแม่ป่าน (เอนฟลอยด์ล้านปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	น้ำพร้าว หมู่ที่ ๖	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	๑.๐๐%	๓.๕๙๕๐	- ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติป่าบ่อแก้ว แม่ ลี น แม่ สูง - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
๙	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทาง	น้ำปุ่น หมู่ ที่ ๑	น้ำทาง	แม่จริม	น่าน	๙๑.๕๐%	๔.๓๖๗๖	- หยุดงาน - คาดแล้วเสร็จ เดือน

สทพ.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินงานโครงการ				ร้อยละ ผลการดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด			
	โมเดล							มีนาคม ๒๕๖๖
๙	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำทางหมู่ที่ ๕	น้ำทาง	แม่จริม	น่าน	๙๕.๐๐%	๔.๔๙๘๓	- หยุดงาน - คาดแล้วเสร็จ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๙	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำดวงหมู่ที่ ๙	น้ำทาง	แม่จริม	น่าน	๙๒.๑๐%	๖.๖๗๒๔	- หยุดงาน - คาดแล้วเสร็จ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖
๙	อนุรักษ์พื้นที่ปลูกของเชื่อมหนองกระเช้-หนองแม่ระวิง		สารจิตตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	๖๓.๑๐%	๓๖.๖๘๓๗	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดแล้วเสร็จ เดือน กันยายน ๒๕๖๗
๙	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตี๋ย	เวียงตึงหมู่ที่ ๑	วังธง	เมืองแพร่	แพร่	๖๐.๐๐%	๓.๒๔๓๙	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดแล้วเสร็จ เดือน เมษายน ๒๕๖๖
๙	ปรับปรุงพื้นที่หนองหอนตรา	บุง หมู่ที่ ๒	บ้านบุง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	๘๔.๑๘%	๒.๘๒๑๗	** งานทำเอ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑ มติ ครม. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

สทน.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ผลการดำเนินงาน		คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/ หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ	ห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๓	วัง ตะแบก	พราน กระต่าย	กำแพงเพชร	๕๑	๑๗,๒๔๕,๓๗๖	หยุดงาน/เนื่องจากติด ปัญหา พืช ผ ล ท ำ ง การเกษตร คาดว่าจะ แล้วเสร็จ เม.ย. ๖๖
๑	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองเรียบลาดยาง	ทุ่งลาน ควาย หมู่ ที่ ๙	วังมะม ลุง	คลองข ลุง	กำแพงเพชร	๓๐		คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. ๖๖
๑	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ตำบลคลองลานพัฒนา	คลองน้ำ ไหล, คลองใหญ่ ใต้, คลอง หัวแหวน หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๒, ๗, ๑๓	คลอง ลาน พัฒนา	คลอง ลาน	กำแพงเพชร	๔๗	๗,๐๔๕,๓๕๘	หยุดงาน/เนื่องจากติด ปัญหา พืช ผ ล ท ำ ง การเกษตร คาดว่าจะ แล้วเสร็จ เม.ย. ๖๖
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายแม่แร่ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สบ.สนุน เกษตรแปลงใหญ่บ้านห้วยไคร้	ห้วยไคร้ หมู่ที่ ๒	ห้วยไคร้	แม่สาย	เชียงราย	๕๐	๕,๑๖๔,๐๗๑	หยุดงาน/เนื่องจากติด ปัญหา พืช ผ ล ท ำ ง การเกษตร คาดว่าจะแจ้ง เข้า เม.ย. ๖๖
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสันป่าสัก พร้อม ระบบกระจายน้ำ	ป่าสัก หมู่ ที่ ๒	ป่าจั่ว	เวียงป่า เป้า	เชียงราย	๘๐	๕,๐๐๒,๑๖๖	หยุดงาน/ติดพื้นที่ การเกษตรอยู่ระหว่างรอ การเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าจะแจ้งเข้า เม.ย. ๖๖

สทพ.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินงานโครงการ				ผลการดำเนินงาน		คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่เลา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ ๑ หัวเวียง	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	๘๒	๑๗,๖๑๗,๕๘๗	คาดว่าจะแล้วเสร็จ มี.ค. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระวัดคอยธาตุ	หมู่ที่ ๑๐ นาโง้ง	ทุ่งกระเซาะ	บ้านตาก	ตาก	๕๕	๑,๓๐๐,๔๔๐	หยุดงาน / น้ำท่วมพื้นที่ไม่สามารถลำเลียงวัสดุได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพัฒนาโครงการหลวงเลอตอ		แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	๒		หยุดงาน/ขออนุญาตพื้นที่ คาดว่าจะแจ้งเข้า เม.ย. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองจิก	หมู่ที่ ๕, ๖	วังหมื่น	สามเงา	ตาก	๑๐		แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ โครงการภายในเดือน ก.พ. ๖๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. ๖๖
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ตึก พร้อมระบบกระจายน้ำ	นาโป่ง หมู่ที่ ๖	นาโป่ง	เถิน	ลำปาง			ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ขอเปลี่ยนแปลงที่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สันติสนุนโรงพยาบาลเมืองปาน		เมืองปาน	เมืองปาน	ลำปาง	๔๕	๖,๑๕๕,๐๒๔	หยุดงาน/น้องเก็บแบบก่อสร้าง ป๋อสูบนํ้า คาดว่าจะแจ้งเข้า มี.ค. ๖๖
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหิน	หมู่ที่ ๑	ลาดกระทิง	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	๗	๐	กรกฎาคม ๒๕๖๖
๖	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองน้ำรู	หมู่ที่ ๑๒	นาดี	นาดี	ปราจีนบุรี	๑๐	๐	เมษายน ๒๕๖๖
๗	ปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยลัดตะเพินพร้อมบ่อน้ำการกักเซาะ	หนองออน หมู่ที่ ๓	หนองปรือ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	๓๐	๖,๑๗๘๖	ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖
๙	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สันติสนุนโครงการถ้ำทอดองค์	แกลง หมู่ที่ ๘	ภูคา	ปัว	น่าน	๙๗.๐๐	๐,๔๖๒๐	เมษายน ๒๕๖๖

สทพ.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินงานโครงการ				ผลการดำเนินงาน		คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
	ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศตช.)							
๙	ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลห้วยมุ่น ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาดอย่างมีส่วนร่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	มณีก้าว หมู่ที่ ๘	ห้วยมุ่น	น้ำปาด	อุดรดิตถ์	๙๘.๐๐	๒.๖๒๙๔	อยู่ระหว่างขออนุมัติยุบตัน เพื่อลดต้นทุนจากกรมทางหลวง

รายละเอียดของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒ นติ ครม. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สพ.น.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ผลการดำเนินงาน		คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำแม่สีบึงบ้านเกาะสามสิบ	เกาะสามสิบ	แสนตอ	ขามเฒ่าลี้ขบุรี	กำแพงเพชร	๕๐	๕๒๗,๗๐๘	หยุดงาน/แก้ไขแบบแปลนเนื่องปริมาณงานขาดแคลน คาดว่าจะแจ้งเข้า เม.ย. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่รูปแบบโครงการหลวงสบเมย (บ้านหือฮือ)	หือฮือ	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	๙๓	๑๐,๓๔๒,๐๕๔	ขยายระยะเวลา/สิ้นสุดสัญญาใหม่ ๓๐ เม.ย. ๖๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านเออม	เอ่อม	บ้านเอ่อม	เมืองลำปาง	ลำปาง	๗๐	๒,๓๓๕,๓๓๒	คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. ๖๖
๑	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายแม่ปายัน ระยะ ๒	จำตอง	ร่องเคาะ	วังเหนือ	ลำปาง	๓๑		ขยายระยะเวลา/สิ้นสุดสัญญาใหม่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ คาดว่าเริ่มสร้างพค.๖๖
๒	อนุรักษ์พื้นที่สาธารณะบ้านสันตะลุง		ท่ามะนาว	ชัยบาดาล	ลพบุรี	๐	-	มิถุนายน ๒๕๖๖
๒	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านช้างทะเล		บางลี่	ท่าวัง	ลพบุรี	๕	-	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำโคกนันทรี		ลำพญา	มวกเหล็ก	สระบุรี	๒	-	เมษายน ๒๕๖๖
๒	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำลำคลองหนองบึง		บ้านใหม่	บ้านไร่	อุทัยธานี	๘๕	๒,๘๘๕๐	เมษายน ๒๕๖๖
๓	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำฝายนายอำเภอพร้อมระบบกระจายน้ำ	สามคม หมู่ที่ ๑	สามคม	ภูเรือ	เลย	๖๒%	๐.๘๒๓๕	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองท่าม สัน	ดอนเชียง หมู่ ๑	คำแมด	ข้าสูง	ขอนแก่น	-	-	- รอลงนามในสัญญา

สทพ.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินงานโครงการ				ผลการดำเนินงาน		คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
	สนับสนุนทุนหมู่บ้านคำแมด หมู่ที่ ๔	ที่ ๔						
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดรูเข้ พร้อมระบบกระจายน้ำ	๔,๙,๑๐, ๑๒,๑๕	ตลาดแร่่ง	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	๕๒.๕๐%	๒.๓๔๙๕	- คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๑๘ ก.ค. ๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขวง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองแขวง	กุดชุม	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	๓๖.๐๐%	-	- คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๕ ก.ย. ๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองมูก พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพธิ์มี	นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	๖๒.๕๐%	๒.๗๕๓๒	- คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๒๙ พ.ค. ๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผาก พร้อมระบบกระจายน้ำ	ห้วยน้ำพัฒนา	นาทอง	เขียวยืน	มหาสารคาม	-	-	- รอลงนามในสัญญา
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกงพร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองกง หมู่ที่ ๘	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	๙๐.๐๐%	๔.๓๗๖๓	- คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๒๕ พ.ค. ๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไฮพร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ ๖	โพธิ์ทอง	โพมทอง	ร้อยเอ็ด	๓๒.๐๐%	๒.๑๔๔๘	- คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๗ มิ.ย. ๖๖
๔	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนหินกองวิทยาการพร้อมระบบกระจายน้ำ		หินกอง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	๖๐.๐๐%	๒.๔๓๒๖	- คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๕ มิ.ย. ๖๖
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำธารวังธรรมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		พลสงคราม	โนนสูง	นครราชสีมา	๗๕	๑๒.๒๐๓๙	เมษายน ๒๕๖๖
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูบ่อน้ำทิพย์พร้อมระบบกระจายน้ำ		จันทึก	ปากช่อง	นครราชสีมา	๖๕	๑๒.๒๖๕๘	เมษายน ๒๕๖๖
๕	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงคงโคก	หตุบ่อก	เมืองคง	ราษีไศล	ศรีสะเกษ	๗๐	๒.๐๙๔๖	เมษายน ๒๕๖๖
๗	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโป่งแย้ สนับสนุนสิทธิการตนเอง ปลูกสร้างเครื่องในโครงการจัดพัฒนาที่ดิน	โป่งแย้	ไร่ใหม่พัฒนา	ชะอำ	เพชรบุรี	๑๑	๔.๕๓๓๙	ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
๗	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำขอนแก่น		รางบัว	จอมบึง	ราชบุรี	๑๖	๗.๐๒๘๔	ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
๘	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองบ้านอีเยะ		บาระเหนือ	บาเจาะ	นราธิวาส	๙๐	๗.๙๓๑๘	สัญญาแล้วเสร็จ ๑๙ เม.ย.๖๖
๘	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำทะเลหารลิแตช่วง ๔	นิบง	กาบัง	กาบัง	ยะลา	๙๗	๗.๘๘๕๘	สัญญาแล้วเสร็จ ๑๙ เม.ย.๖๖

รายละเอียดของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลางปี ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓ มติ ครม. ๖ กันยายน ๒๕๖๕

สพท.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน		คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
๑	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ ๓	ห้วยลึก	เมือง เขื่องราย	เขื่องราย	๔๕	๑,๔๘๐,๔๐๐	หยุดงานแม่โขงแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ มี.ค. ๖๖
๑	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ ๒๐	ห้วยลึก	เมือง เขื่องราย	เขื่องราย	๖๕	๓,๐๗๔,๒๐๐	หยุดงานแม่โขงแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จ มี.ค. ๖๖
๒	อนุรักษ์พื้นที่หนองบัว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ ๑	จักรสีห์	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	๗๕	๘,๖๕๗,๕๗	พฤษภาคม ๒๕๖๖
๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและกำจัดวัชพืชนองน้ำ จุน	๑๑	อากาศ	อากาศ	อากาศ อำนาจ	๖๒%	๐.๐๗๕๐	กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองปากเลิงเป็ล้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	พื้นที่ ๘	พระบุ	พระยืน	ขอนแก่น	-	-	- รอลงนามในสัญญา
๔	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองโปร่งคลอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยหลิม หมู่ที่ ๑๐	นาข่า	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	๑๐๐.๐๐%	๑.๗๑๓๓ (๕๘.๕๓ %)	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย เงินงวดสุดท้าย - คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๓๐ มี.ค. ๖๖
๔	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองกุงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ	โคกม่วง	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	๗๕.๐๐%	๔.๕๓๓๖ (๖๕.๐๙ %)	- คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๑๖ ก.ค. ๖๖
๔	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองคูขาดพร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองท่ม	ป่าสังข์	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	๘๕.๐๐%	๔.๑๗๐๓ (๘๔.๘๕%)	- คาดว่าจะแล้วเสร็จ ๒๙ พ.ค. ๖๖
๘	อนุรักษ์พื้นที่ระบบโครงสร้างแหล่งน้ำพระชะเมา จังหวัดยะลา-ปัตตานี ช่วง ๒		ท่าธง	รามิน	ยะลา	๕๔	๑๐.๐๖๗๘	สัญญาแล้วเสร็จ ๒๗ มี.ย.๖๖

สทพ.	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินงานโครงการ				ผลการดำเนินงาน		คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		บ้าน/หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	
๙	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เส้น		นาพูน	วังชิ้น	แพร่	๕๐	๗,๙๒๒๓	(ตามสัญญา ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖)
๙	อนุรักษ์พื้นที่ป่าเบญจพรรณ ช่วง ๒	คลองอุดมหมู่ที่ ๔	คลองอุดม	คลองอุดม	พิจิตร	๗.๕๓	๐	(ตามสัญญา ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖)
๑๑	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำห้วยวังวิน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่	สร้างถ่อในหมู่ที่ ๓,๑๓	สร้างถ่อน้อย	ห้วยตะพาน	อำนาจเจริญ	๘๐	๒๑,๔๗๕๖๕๙๓๐	๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๑	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปูน ช่วง ๒	ปาก้าวหมู่ที่ ๔,๘	โนนสมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	๒๕	๒,๒๔๖๒๕๐	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖
