


ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี

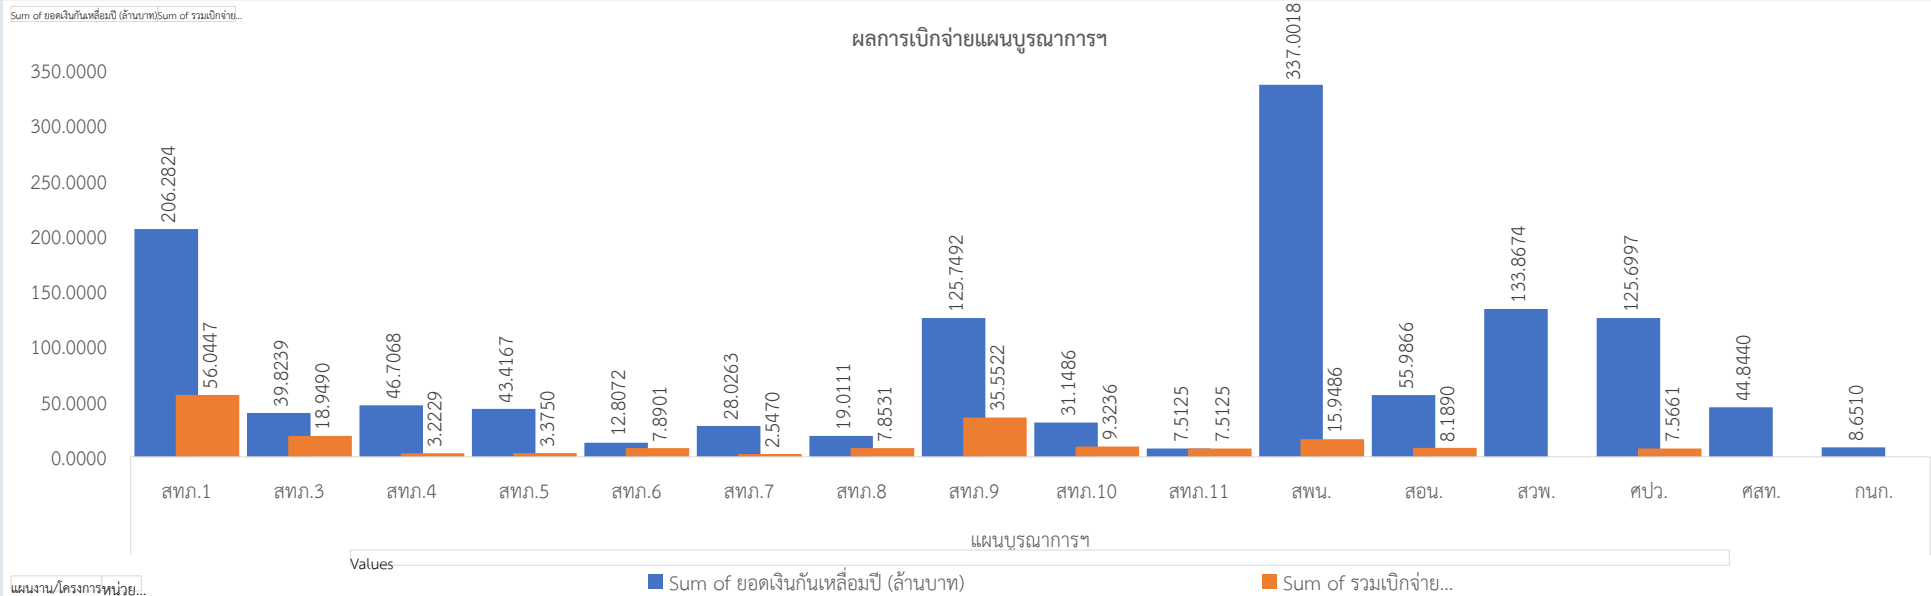

แผนงาน/โครงการหน่วย...


ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

แผนบูรณาการฯ																	
หน่วยงาน	รวม	สทภ.1	สทภ.3	สทภ.4	สทภ.5	สทภ.6	สทภ.7	สทภ.8	สทภ.9	สทภ.10	สทภ.11	สพน.	สอน.	สวพ.	ศปว.	ศสท.	กนก.
จำนวน (คก.)	129	38	11	8	9	5	5	4	19	2	2	12	4	2	6	1	1
แล้วเสร็จ (คก.)	30	7	6	2	1	3	1	2	5	1	2	0	0	0	0	0	0
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	99	31	5	6	8	2	4	2	14	1	0	12	4	2	6	1	1
ยอดเงินที่เหลือปี	1,266.5351	206.2824	39.8239	46.7068	43.4167	12.8072	28.0263	19.0111	125.7492	31.1486	7.5125	337.0018	55.9866	133.8674	125.6997	44.8440	8.6510
รวมเบิกจ่ายปี 2564	183.9738	56.0447	18.9490	3.2229	3.3750	7.8901	2.5470	7.8531	35.5522	9.3236	7.5125	15.9486	8.1890	0.0000	7.5661	0.0000	0.0000
ยอดเงินคงเหลือ	1,082.5613	150.2377	20.8749	43.4839	40.0417	4.9171	25.4792	11.1580	90.1970	21.8250	0.0000	321.0532	47.7976	133.8674	118.1336	44.8440	8.6510
ลดค่างาน	0.7439	0.0346	0.0974	0.0000	0.0047	0.5130	0.0000	0.0000	0.0942	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงิน	15%	27%	48%	7%	8%	62%	9%	41%	28%	30%	100%	5%	15%	0%	6%	0%	0%

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

Sum of ยอดเงินกันเหลื่อมปี (ล้านบาท)Sum of รวมเบิกจ่าย...

ผลการเบิกจ่ายแผนพื้นฐาน

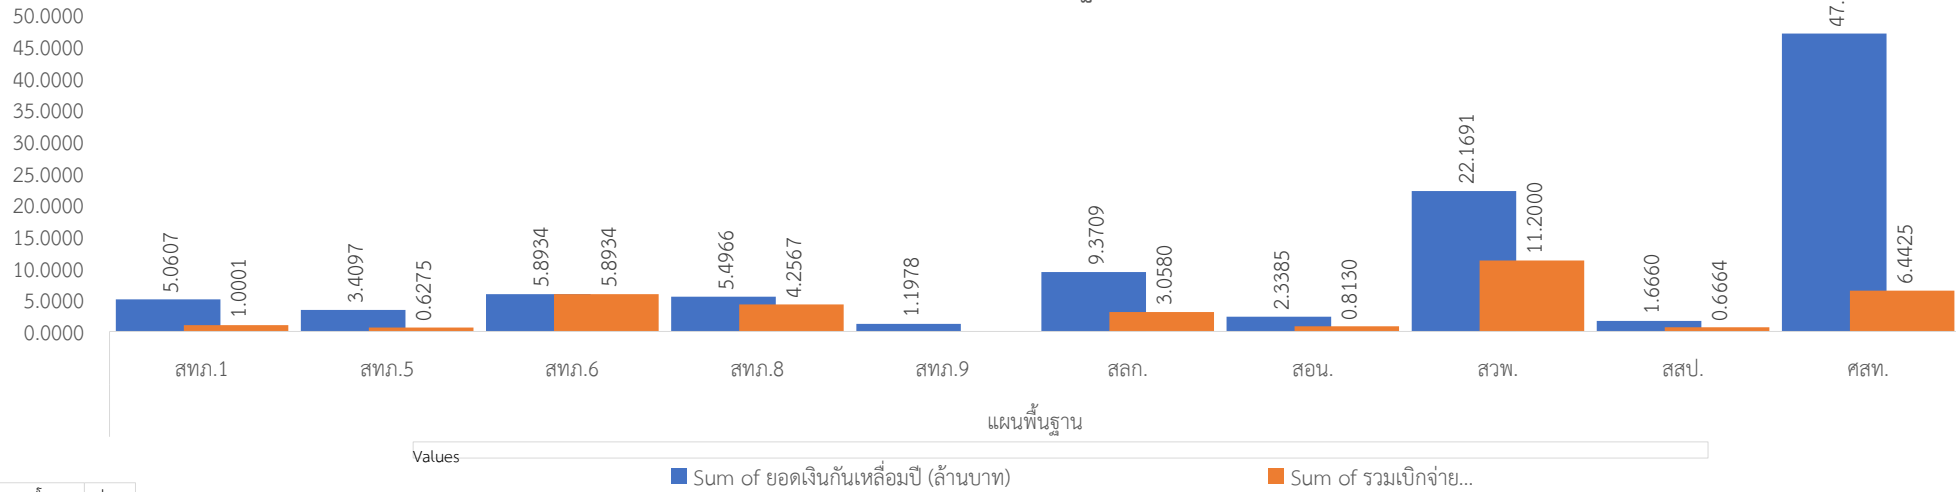

แผนงาน/โครงการหน่วย...

ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

แผนพื้นฐาน		สทภ.1	สทภ.5	สทภ.6	สทภ.8	สทภ.9	สอน.	สสป.	สลก.	สวพ.	ศสท.
หน่วยงาน	รวม										
จำนวน (คก.)	29	1	1	4	3	1	1	1	11	2	4
แล้วเสร็จ (คก.)	15	0	0	4	2	0	0	0	9	0	0
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	14	1	1	0	1	1	1	1	2	2	4
ยอดเงินกันเหลื่อมปี	103.6316	5.0607	3.4097	5.8934	5.4966	1.1978	2.3385	1.6660	9.3709	22.1691	47.0288
รวมเบิกจ่ายปี 2564	33.9576	1.0001	0.6275	5.8934	4.2567	0.0000	0.8130	0.6664	3.0580	11.2000	6.4425
ยอดเงินกันคงเหลือ	69.6740	4.0606	2.7823	0.0000	1.2399	1.1978	1.5255	0.9996	6.3129	10.9691	40.5863
ลดค้างงาน	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0153	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่าย เงินกัน	33%	20%	18%	100%	77%	0%	35%	40%	33%	51%	14%

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	39	211.3431	57.0448	154.2983	0.0346	0.0000	27%	83%	7	32	
1	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำ	ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 1	แม่แฝก	สันทราย	เชียงใหม่	1	6.2971	3.9370	2.3601			63%	93%		1	
2	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำน้ำแวน ระยะ 2	ผาขาว หมู่ที่ 3	ทุ่งผาสุข	เชียงคำ	พะเยา	1	4.5640		4.5640			0%	64%		1	
3	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นแม่สะมาต	ป่าปู หมู่ที่ 2	ผาบ่อง	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1	0.4625		0.4625			0%	90%		1	
4	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นทุ่งปรังเรียน ระยะ 2		บ้านเอื้อม	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	11.5000		11.5000			0%	10%		1	ขยายระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดสัญญาใหม่ 21 มกราคม 2564
5	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะ 2		แม่งอน	ฝาง	เชียงใหม่	1	5.3847	4.3956	0.9891			82%	97%		1	
6	สทท.1	ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นแม่ตืน พร้อมมระบบกระจายน้ำ	แม่แนต หมู่ที่ 8	แม่ตืน	ลี้	ลำพูน	1	0.4904	0.4904	0.0000			100%	100%	1		
7	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ เดินตามรอยเท้าพ่อ ภายในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37		รอบเวียง	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	11.6533		11.6533			0%	52%		1	
8	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว	ฮ้างดำ หมู่ที่ 3	ป่าจี้	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	18.2945	5.0000	13.2945			27%	85%		1	
9	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยดั่ง	ป่าจี้ หมู่ที่ 3	ป่าไผ่	ลี้	ลำพูน	1	1.5283	1.5283	0.0000			100%	100%	1		
10	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำ	วังตะกู หมู่ที่ 11	วังควง	พวานกระต่า	กำแพงเพชร	1	0.2340		0.2340			0%	98%		1	
11	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองกอง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หนองกอง หมู่ที่ 1	นาบ่อคำ	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	1	16.9150	7.6515	9.2635			45%	45%		1	
12	สทท.1	ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองแขยง	ลี้กงาม หมู่ที่ 1	ลี้กงาม	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.5700	4.5373	0.0328	0.0328		99%	100%	1		แก้ไขแบบแปลนค่างานลดลง 32,760 บาท

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
13	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านสุขสวรรค์)	สุขสวรรค์ หมู่ที่ 1	คลองลานพัฒนา	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	2.4800	2.4800	0.0000			100%	100%	1		
14	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นแม่น้ำมะ	สันตันธง หมู่ที่ 2	ศรีดอนมูล	เชียงแสน	เชียงราย	1	11.2998		11.2998			0%	87%		1	
15	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง		แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	10.3529	9.3504	1.0025			90%	92%		1	
16	สทท.1	ก่อสร้างระบบการกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา	ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 1	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	5.1699		5.1699			0%	71%		1	แจ้งหยุดงานแก้ไขแบบแปลน
17	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว	ฮ้างดำ หมู่ที่ 3	ป่าจั่ว	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	2.8024		2.8024			0%	86%		1	
18	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่หลอด	แม่หลอดเหนือ หมู่ที่ 1	สบเปิง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	3.0032		3.0032			0%	95%		1	ขยายระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดสัญญาใหม่ 4 มค. 64
19	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองเขียว	ใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	2.1000		2.1000			0%	95%		1	ขยายระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดสัญญาใหม่ 4 มค. 64
20	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นแม่เอ็น	แสนตอ หมู่ที่ 11	ร่องเคาะ	วังเหนือ	ลำปาง	1	15.4327		15.4327			0%	90%		1	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
21	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยบวกหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัวเหนือ	เมืองตาก	ตาก	1	0.0831		0.0831			0%	98%		1	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
22	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศรีรักษ์ (บ้านผาผึ้ง)	ผาผึ้ง หมู่ที่ 6	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	20.3770		20.3770			0%	15%		1	เนื่องจากอุทยานฯ ขอแก้ไขแนวท่อส่งน้ำใหม่จึงทำให้ต้องแก้แบบใหม่ และจัดทำโครงการร่วมกับอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า คาดว่าจะสามารถเข้าดำเนินการได้ในวันที่ 15 มิ.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
23	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านศรีคีรีรักษ์) ระยะ 2	ศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 9	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	1.0257	1.0238	0.0019	0.0019		100%	100%	1		แก้ไขแบบแปลนค่างานลด 1,592 บาท อยู่ระหว่างขยายระยะเวลา (เนื่องจากติดโควิด)
24	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงสบเมย (บ้านห้วยน้ำใส) ระยะ 2	ห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	2.4605		2.4605			0%	95%		1	อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
25	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวัดธาราพิทยชัยประดิษฐ์ บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยชมพู หมู่ที่ 8	แม่แตง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	8.4069		8.4069			0%	65%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
26	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตการเกษตรบ้านปางเพื่อง ตำบลปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	ปางเพื่อง	ปึงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	6.4056	4.3547	2.0509			68%	85%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
27	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	ห้วยงูใน หมู่ที่ 5,	สันทราย	ฝาง	เชียงใหม่	1	2.4727	1.7948	0.6779			73%	99%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
28	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโป่งลิบ บ้านโป่งลิบใน บ้านท่าสะแล ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	โป่งลิบ,โป่งลิบใน	เวียง	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.9322	3.2712	0.6609			83%	99%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
29	สทก.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแม่มาวหนองบัว บ้านห้วยนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	แม่มาวหนองบัว	ม่อนปิ่น	ฝาง	เชียงใหม่	1	3.7740	2.5923	1.1817			69%	99%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ค่วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
30	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองสละ บ้านเชียงหมั่น หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	เชียงหมั่น หมู่ที่ 5	ศรีดงเย็น	ไชยปราการ	เชียงใหม่	1	1.1834	1.1834	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
31	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระทุ่งโป่ง บ้านขอเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ขอเหนือ หมู่ที่ 9	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.7106		1.7106			0%	100%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
32	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้านม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	ม่วง หมู่ที่ 8	บ้านขอ	เมืองปาน	ลำปาง	1	1.0451		1.0451			0%	100%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
33	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระบ้านสบลี้ บ้านสบลี้ หมู่ที่ 6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง	สบลี้ หมู่ที่ 6	แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.7000		4.7000			0%	98%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
34	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองก้าเกาะ บ้านท่าไม้ ตำบลแม่ปู อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง	ท่าไม้	แม่ปู	แม่พริก	ลำปาง	1	3.5646	1.9559	1.6087			55%	100%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563					ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														จำนวน (โครง การ)
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
35	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บน้ำแปลงหญ้า บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะเคาะ จังหวัดลำปาง	ต้นผึ้ง หมู่ที่ 5	ใหม่พัฒนา	กะเคาะ	ลำปาง	1	2.0345		2.0345			0%	100%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63 อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย
36	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง		แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลำปาง	1	4.1735		4.1735			0%	30%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 5 แล้ว จำนวนรวม 18 รายการ งบม. 81.0000 ลบ.ถ้วนที่สุด ทส 0604.3/758 ลว. 13 เม.ย. 63
37	สทท.1	โครงการพัฒนาชุมชนลุ่มน้ำแม่ละอุป (โครงการพลิกฟื้นผืนป่า) บ้านแม่ละอุป หมู่ที่ 3 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	บ้านแม่ละอุป	แจ่มหลวง	กัลยาณิวัฒนา	เชียงใหม่	1	0.4980	0.4980	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 13 แล้ว จำนวน 18 รายการ งบม. 0.4993 ลบ. * ถ้วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/1411 ลว 10 ก.ค. 63
38	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากหนองครกหลวง บ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ตำบลวิเชตนคร อำเภोज้าห่ม จังหวัดลำปาง		วิเชตนคร	แจ้ห่ม	ลำปาง	1	3.9000		3.9000			0%	15%		1	
39	สทท.1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 6 (แม่สะเรียง) พร้อมถนนภายในสำนักงานและรั้วบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านภาต อำเภอมแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	ท่าข้าม หมู่ที่ 1	บ้านภาต	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	5.0607	1.0001	4.0606			20%	80%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	11	39.8239	18.9490	20.8749	0.0974	0.1098	48%	79%	6	5	
1	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านน้ำหมัน สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	น้ำหมัน หมู่ที่ 1	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	5.8756	1.2027	4.6729			20%	54%		1	
2	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกกจาน สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	กกจาน หมู่ที่ 7	กกสะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	2.5791		2.5791			0%	68%		1	
3	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านนาดี พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	นาดี หมู่ที่ 1	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3899	2.3709	0.0190	0.0190	0.1004	99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
4	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านโพศาลวิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	โพธิ์โพศาล หมู่ที่ 1	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.0328	2.0270	0.0058	0.0058		100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
5	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	หนองเค็ม หมู่ที่ 1	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.3980	2.3618	0.0362	0.0362	0.0094	98%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือในปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
6	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านม่วง พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา	ม่วง หมู่ที่ 5,10	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	7.1422	4.4986	2.6436			63%	99%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
7	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านบอน สหราษฎร์อุทิศ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	บอน หมู่ที่ 3	นาโพธิ์	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	2.2058	2.2058	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
8	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคี สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	แก้งท่าลับ หมู่ที่ 3	อุ้มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	1.9200	1.9024	0.0176	0.0176		99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
9	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์เรียนรู้คนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในพระตำริบ้านห้วยเตย	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหัว	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.9785		1.9785			0%	32%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
10	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย (วัดพัชรกิตติยาภิราม)	ห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหัว	เมืองหนองบัว	หนองบัวลำภู	1	1.7900	1.7712	0.0188	0.0188		99%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63
11	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำหมันสนับสนุนโครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมากแข้ง หมู่ที่ 3	กอกะทอน	ด่านซ้าย	เลย	1	9.5120	0.6086	8.9034			6%	12%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 4 แล้ว จำนวนรวม 10 รายการ งบม. 38.5000 ลบ.ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/747 ลว 9 เม.ย. 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	8	46.7068	3.2229	43.4839	0.0000	0.0616	7%	74%	2	6	
1	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูผุดแคน พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมากยาง	สามขา	โพนทราย	ร้อยเอ็ด	1	10.3955		10.3955			0%	49%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
2	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคกกลาง พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	หนองศาลา	หนองสังข์	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	1	5.6030		5.6030			0%	54%		1	แจ้งเร่งรัดงานแล้ว 3 ครั้ง
3	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพง	แพง หมู่ที่ 11	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.2189		5.2189			0%	67%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
4	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง	หมู่ที่ 6, 7, 8, 9	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	5.8217		5.8217			0%	78%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
5	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยแอ่	จอมศรี หมู่ที่ 2	หนองเขียด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	14.0555		14.0555			0%	58%		1	อยู่ระหว่างการระบายน้ำออก จากพื้นที่ก่อสร้าง
6	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคา พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 1	สาวแห	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	1	2.3277		2.3277			0%	89%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์
7	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) กอง พลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี)	ค่ายเปรมติณสูลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	2.2000	2.1692	0.0308		0.0308	99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
8	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 2) กอง พลทหารม้าที่ 3 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี)	ค่ายเปรมติณสุ ลานนท์		น้ำพอง	ขอนแก่น	1	1.0845	1.0537	0.0308		0.0308	97%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	10	46.8264	4.0024	42.8239	0.0047	0.0000	9%	65%	1	9	
1	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเล็ง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	จัว หมู่ที่ 10	คูขาด	คง	นครราชสีมา	1	2.3786	2.3738	0.0047	0.0047		100%	100%	1		ลดค่างาน 4,734.96 บาท
2	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	กระเจา หมู่ที่ 7	ลำดวน	กระสัง	บุรีรัมย์	1	0.2882		0.2882			0%	97%		1	ขาดสภาพคล่อง
3	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทำนบเสียว (ช่วง 3) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.-สธ.)	ตะเคียน หมู่ที่ 14	สวาย	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.3050		4.3050			0%	70%		1	ขาดสภาพคล่อง
4	สทท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโกรกรักฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	ดอนพัฒนา หมู่ที่ 1	คงอิจาน	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	1	14.9718	1.0012	13.9707			7%	41%		1	เร่งรัดงานรอบที่ 2 / สูบน้ำแห้งแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ
5	สทท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบุมะค่า	บุมะค่า	มาบตะโกเอ	ครบุรี	นครราชสีมา	1	2.9556		2.9556			0%	87%		1	แจ้งเข้างานเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ค. 64
6	สทท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อมระบบส่งน้ำ	หมู่ที่ 4,6	ตั้งใจ	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	12.5644		12.5644			0%	51%		1	งานล่าช้าเนื่องจากคนงานน้อย
7	สทท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่	โนนสง่า หมู่ที่ 2	กุดพิमान	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	4.2243		4.2243			0%	73%		1	แจ้งเข้างานเมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 งดค่าปรับ
8	สทท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	หนองพลวง หมู่ที่ 1	พันชนะ	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	1.2288		1.2288			0%	93%		1	แจ้งเข้างานวันที่ 25 พ.ย.2563 เหลืองานบดอัดหินคลุก

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สทท.5	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และ จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ เพื่อบริหารจัดการ โครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็น ระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		หนองบัวศาล	เมืองนครราช	นครราชสีมา	1	0.5000		0.5000			0%	0%		1	มทส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี /อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
10	สทท.5	ก่อสร้างอาคารห้องประชุมจุได้จำนวน 100 คน เลขที่ 47 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		หนองบัวศาล	เมืองนครราช	นครราชสีมา	1	3.4097	0.6275	2.7823			18%	40%		1	แรงงานมีน้อย สิ้นสุดสัญญา 16 ธ.ค.63 แจ้งสงวนสิทธิ์ครั้งที่ 3

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	9	18.7006	13.7835	4.9171	0.5130	0.0131	74%	98%	7	2	
1	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูศูนย์วิจัยกรมปศุสัตว์ พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	ลาดตะเคียน	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0009	2.2595	0.7415			75%	93%		1	อยู่ระหว่างการปรับ (ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 63)
2	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระประปาโรงพยาบาล กบินทร์บุรี พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 8	กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7579	1.7579	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 3	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.6626		3.6626			0%	85%		1	อยู่ระหว่างการปรับ (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 63)
4	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบ กระจายน้ำ	หมู่ที่ 4	เขาไม้แก้ว	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	3.0382	2.5252	0.5130	0.5130		83%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหลังต้น น้ำภูไท	หมู่ที่ 13	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	1	1.3475	1.3475	0.0000			100%	100%	1		
6	สทท.6	ก่อสร้างอาคารบ้านพักส่วนบริหาร จัดการน้ำ บ้านไผ่เสวก ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	ไผ่เสวก	บางแก้ว	เมืองฉะเชิงเท	ฉะเชิงเทรา	1	3.8666	3.8666	0.0000		0.0131	100%	100%	1		
7	สทท.6	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลองเวฬุ หมู่ที่ 4 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	หมู่ที่ 4	วังสรรพรส	ขลุง	จันทบุรี	1	1.8808	1.8808	0.0000			100%	100%	1		
8	สทท.6	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าบ้านนายาว (อ่าง เก็บน้ำวรารูธ) หมู่ที่ 15 ตำบลท่า กระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		
9	สทท.6	ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าบ้านคลองเตย (อ่างเก็บน้ำจตุพร) หมู่ที่ 21 ตำบล ท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		ท่ากระดาน	สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	0.0730	0.0730	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	5	28.0263	2.5470	25.4792	0.0000	0.0000	9%	69%	1	4	
1	สทท.7	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองข่อย ช่วง 2	หมู่ที่ 9	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	9.4787		9.4787			0%	80%		1	- แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนิน ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 63 ปัจจุบัน ดำเนินงานปูแผ่นดินเหนียว สังเคราะห์ (GCL) งานบดอัด และงานโครงสร้าง
2	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงห้วยเขย่ง ช่วง 3	ไร่ หมู่ที่ 6	ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	2.5470	2.5470	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยตาเมือง	โป่งเกตุบน หมู่ที่	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	3.2206		3.2206			0%	98%		1	อยู่ระหว่างรอการตรวจรับงาน
4	สทท.7	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองเจ๊กสี		โพพระ	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	1	9.7900		9.7900			0%	0%		1	อยู่ระหว่างรอสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาเพชรบุรีอนุญาตให้ ใช้พื้นที่
5	สทท.7	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การทำ นาอย่างอัจฉริยะ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี		นางบวช	เดิมบางนาง	สุพรรณบุรี	1	2.9900		2.9900			0%	65%		1	- อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้างที่ตั้งแผงโซล่าเซลล์ และก่อสร้างโรงสูบน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	7	24.5077	12.1098	12.3980	0.0153	0.0000	49%	80%	4	3	
1	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำโพธิ์ทอง		กะลวอเหนือ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	4.1605	4.1605	0.0000			100%	100%	1		
2	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นคลอง บ่วงช้าง	โคกวา หมู่ที่ 7	นาโหนด	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	2.7430		2.7430			0%	95%		1	
3	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำคลอง สะพานดำ		ยูโป	เมือง	ยะลา	1	3.6926	3.6926	0.0000			100%	100%	1		* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 1 แล้ว จำนวน 11 รายการ งปม. 80.0000 ลบ. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/705 ลว 2 เม.ย. 63
4	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองลาด	หนองลาด	นาไม้ไผ่	ทุ่งสง	นครศรีธรรมร	1	8.4150		8.4150			0%	6%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 2 แล้ว จำนวน 1 รายการ งปม. 4.9850 ลบ. ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/723 ลว 3 เม.ย. 63
5	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำฟาร์ม ตัวอย่าง ช่วง 2 บ้านรอตันบาตู ตำบล กะลวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส		กะลวอ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	2.5900	1.3654	1.2246			53%	60%		1	สัญญาเก่าเลขที่ 63/2563 สัญญาใหม่เลขที่ 1/2564
6	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 1-2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	หมู่ที่ 6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	1.3176	1.3023	0.0153	0.0153		99%	100%	1		
7	สทท.8	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านก่อนส่ง มอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น บ้านบ่อจิก หมู่ที่ 9 ตำบลบาง จาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	บ่อจิก หมู่ที่ 9	บางจาก	เมืองนครศรีธรรม	นครศรีธรรมร	1	1.5890	1.5890	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	20	126.9470	35.5522	91.3948	0.0942	0.0000	28%	68%	5	15	
1	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร		วัดขวาง	โพทะเล	พิจิตร	1	12.6509	1.7357	10.9152			14%	69%		1	1) ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการมี ปริมาณน้ำมาก ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซง (สนง.ใหญ่) อส. 410/2563 ลว 20 ต.ค. 2563 2) หยุดงาน ตามหนังสือ ทส 0624.3/1536 ลว 9 พ.ย. 2563 3) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซง (สนง.ใหญ่) อส. 485/2563 ลว 3 ธ.ค. 2563
2	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร วัดบาง คลาน-แม่น้ำยม		บางคลาน	โพทะเล	พิจิตร	1	8.1113		8.1113			0%	73%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ โครงการ ตามหนังสือ ทส 0624.3/1470 ลว 15 ต.ค. 2563 2) แจ้งเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัท แอล.พี.พี.ซี วิล คอนสตรัคชั่น จำกัด LCC. พทล.2563/023 ลว 27 พ.ย. 2563
3	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจรเข้- หนองแม่ระวีง		สารจิตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	5.1198	5.1198	0.0000			100%	8%	1		โครงการผูกพันใหม่ งบปี 2563 เบิกจ่ายหมดแล้ว 24/12/20

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
4	สทภ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำครกกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำบัว	เวียงสา	น่าน	1	4.6291	1.7868	2.8424			39%	72%		1	1) อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากประชาชนขอใช้น้ำเพื่อ การเกษตร ตามหนังสือ ทส 0624.3/1452 ลว 14 ต.ค. 2563
5	สทภ.9	ปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ		ย่านยาว	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	12.0745	12.0736	0.0009	0.0015		100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
6	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	น้ำแพะ หมู่ที่ 6	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.8930		1.8930			0%	70%		1	
7	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	ศรีบุญเรือง หมู่ที่	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	2.2196		2.2196			0%	62%		1	
8	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	ปางปุก หมู่ที่ 2	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	1.6351		1.6351			0%	94%		1	
9	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	เขตวัน หมู่ที่ 1	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	2.1670		2.1670			0%	73%		1	
10	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	น้ำลีใต้ หมู่ที่ 8	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	1.7283		1.7283			0%	83%		1	
11	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวง	นาเลา หมู่ที่ 3	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.4262	1.4262	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
12	สทภ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบ กระจายน้ำสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ หลวงแม่จริม	ก้อ หมู่ที่ 3	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	8.5335	1.3623	7.1713			16%	62%		1	
13	สทภ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชื่อมต่อ โครงข่ายน้ำบึงน้อย-บึงน้ำด้วน	หมู่ที่ 1,2	ไร่ฮ้อย	พิชัย	อุดรดิตถ์	1	21.1410	5.4353	15.7057			26%	75%		1	
14	สทภ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจระเข้		สารจิตร	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	23.1762		23.1762			0%	0%		1	1) ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน/ ค่าปรับเกินงบประมาณ 2) ผู้รับจ้างขอปรับแผนปฏิบัติ งานก่อสร้าง ตามหนังสือ บริษัทกฤษฎาการ คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ KRD/63/045 ลง 2 ธ.ค. 63
15	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	โป่งคำ หมู่ที่ 5	ดู่พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.5952		1.5952			0%	100%		1	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
16	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	แทน 3	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	2.0845	1.9918	0.0927	0.0927		96%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
17	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวง	ละบ้ายา	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.3101	0.3101	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายงวดสุดท้าย
18	สทภ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อน ช่วยเหลือ เกษตรกร ภาคนี้ออนล่าง กองทัพอากาศที่ 3		อรัญญิก	เมือง	พิษณุโลก	1	7.0980	1.9752	5.1228			28%	60%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งบม. 17.6000 ลบ. ด่วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลง. 13 เม.ย.63

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
19	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ พิชณุโลก		หนองกะท้าว	นครไทย	พิษณุโลก	1	8.1560	2.3355	5.8205			29%	55%		1	* ได้อนุมัติเหลือจ่าย ครั้งที่ 6 จำนวนรวม 2 รายการ งบม. 17.6000 ลบ. ส่วนที่สุด ทส 0604.3/759 ลว. 13 เม.ย.63
20	สทท.9	ปรับปรุงอาคารที่จอดรถจากอาคารบังคับน้ำตงเศรษฐกิจ ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร		ย่านยาว	เมือง	พิจิตร	1	1.1978		1.1978			0%	4%		1	* ได้อนุมัติ ครั้งที่ 14 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบม. 1.1978 ลบ. ส่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/1838 ลว 2 ก.ย. 63 - เลขที่สัญญา สทท.9 15/2564 ลว 2 พ.ย. 2563

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	2	31.1486	9.3236	21.8250	0.0000	0.0000	30%	57%	1	1	
1	สทภ.10	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองบางริน	หมู่ที่ 2	บางริน	เมืองระนอง	ระนอง	1	21.8250		21.8250			0%	13%		1	1.บริหารสัญญา มีหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างแล้ว 2 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ย. 2563 2.แก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 แก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้าง มีค่างาน และระยะเวลาเพิ่ม เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ก.พ. 2564
2	สทภ.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคุดด้วน		สวนขัน, ละอ	ช้างกลาง,ฉะ	นครศรีธรรมร	1	9.3236	9.3236	0.0000			100%	100%	1		โครงการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	2	7.5125	7.5125	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไหล่ทุ้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไหล่ทุ้งพัฒนาหมู่	ไหล่ทุ้ง	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1	4.5561	4.5561	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.11	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง	หมู่ที่ 8	เหล่าหมี	ดอนตาล	มุกดาหาร	1	2.9564	2.9564	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	12	337.0018	15.9486	321.0532	0.0000	0.0000	5%	29%	0	12	
1	สพน.	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง		บ้านโคก	โคกโพธิ์ชัย	ขอนแก่น	1	14.4726		14.4726			0%	56%		1	
2	สพน.	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วย หนองหาร		ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1	22.7260		22.7260			0%	43%		1	
3	สพน.	ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย	ทุ่งมั่ง	หนองลาด	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1	75.6500	12.0636	63.5864			16%	27%		1	
4	สพน.	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโกรงเกรง คลองโกรงเกรง พร้อมระบบกระจาย น้ำ		ท่าพ้อ	เมืองพิจิตร	พิจิตร	1	37.3252		37.3252			0%	24%		1	
5	สพน.	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจั่ว พร้อม ระบบกระจายน้ำ		ไผ่ล้อม	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	1	47.4300		47.4300			0%	20%		1	
6	สพน.	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ		ท่าบ่อสงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1	45.6336		45.6336			0%	25%		1	
7	สพน.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝนในตำบลอ่างทอง, ตำบล น้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขต พะเยาไทย กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	23.3100	3.8850	19.4250			17%	48%		1	
8	สพน.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	23.3815		23.3815			0%	24%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สพน.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	20.1788		20.1788			0%	24%		1	
10	สพน.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาการ สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียง ภาค ตะวันตก และภาคใต้ กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	20.3940		20.3940			0%	24%		1	
11	สพน.	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง จังหวัดขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.5000		3.5000			0%	15%		1	
12	สพน.	โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพิ่ม ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ จังหวัดนครพนม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.0000		3.0000			0%	15%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	5	58.3251	9.0020	49.3231	0.0000	0.0000	15%	19%	0	5	
1	สอน.	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง)		มะเฟื่อง,บ้าน	พุทไธสง	บุรีรัมย์	1	8.6753		8.6753			0%	5%		1	
2	สอน.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สํารวจออกแบบและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำ ระบบกระจายน้ำภายในพื้นที่ อุทยานไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.7388	2.7025	7.0363			28%	13%		1	
3	สอน.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และจัดทำระบบการบริหารงาน อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการนำ ร่องพื้นที่ลุ่มน้ำน่านฝั่งตะวันออกตอน ใต้ (อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.6000	1.9200	7.6800			20%	37%		1	
4	สอน.	ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสม สํารวจออกแบบและ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำหนองหาร จังหวัด สกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	27.9725	3.5665	24.4060			13%	12%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
5	สอน.	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 450 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.3385	0.8130	1.5255			35%	30%		1	สพน. กันเงิน 1.0265 ลบ. เบิก 0.7390 ลบ. คงเหลือ 0.7390 ลบ. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 25 ธค. 63 สทภ.7 กันเงิน 1.3120 ลบ. เบิก 0.5255 ลบ. คงเหลือ 0.7865 ลบ. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ธค. 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	4	156.0364	11.2000	144.8364	0.0000	0.0000	7%	10%	0	4	
1	สวพ.	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสถานีอุทกวิทยาเพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	30.5924		30.5924			0%	10%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
2	สวพ.	โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	103.2750		103.2750			0%	10%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
3	สวพ.	โครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.2000	11.2000	8.0000			58%	10%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง
4	สวพ.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	2.9691		2.9691			0%	10%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	6	125.6997	7.5661	118.1336	0.0000	0.0000	6%	73%	0	6	
1	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	49.8381		49.8381			0%	80%		1	
2	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตรน้ำฝน ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	18.5972		18.5972			0%	54%		1	
3	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	9.9025		9.9025			0%	73%		1	
4	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	21.6374		21.6374			0%	71%		1	
5	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.9291	3.8027	9.1265			29%	80%		1	

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
6	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมิน ศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	12.7955	3.7634	9.0321			29%	80%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	5	91.8728	6.4425	85.4303	0.0000	0.0000	7%	84%	0	5	
1	ศสท.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ DWR Data Cleansing กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	44.8440		44.8440			0%	22%		1	* ได้อนุมัติใช้เหลือจ่ายแล้ว จำนวนรวม 4 รายการ งบม. 92.4068 ลบ. * ด่วนที่สุด นร 0718/14158 ลว. 23 มี.ย.63
2	ศสท.	โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	7.2000	4.9500	2.2500			69%	100%		1	
3	ศสท.	โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.4725	1.4925	3.9800			27%	100%		1	
4	ศสท.	โครงการดาต้าเลคทรัพยากรน้ำ (DWR Data Lake)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	19.3869		19.3869			0%	100%		1	
5	ศสท.	โครงการระบบและบริหารภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	14.9694		14.9694			0%	100%		1	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	1	8.6510	0.0000	8.6510	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
1	กนก.	โครงการศึกษาและยกร่างอนุบัญญัติ ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ในส่วนที่อยู่ใน หน้าที่และอำนาจ และภารกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ (หมวด 4 การ จัดสรรน้ำและการใช้น้ำ)		ยุโป	เมือง	ยะลา	1	8.6510		8.6510			0%	0%		1	* ได้อนุมัติครั้งที่ 9 แล้ว จำนวน 1 รายการ งบม. 10.1776 ลบ. * ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/12292 ลว. 27 พ.ค.63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	1	1.6660	0.6664	0.9996	0.0000	0.0000	40%	100%	0	1	
1	สสป.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	1.6660	0.6664	0.9996			40%	100%		1	เสนอเรื่องเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ไปที่สำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 23 ธ.ค 63

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	หน่วย งาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลื่อมปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	11	9.3709	3.0580	6.3129	0.0000	0.0000	33%	90%	9	2	
1	สลก.	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	3.2258	2.8221	0.4037			87%	87%		1	* พรบ.โอนคืน จำนวน 4,008,200 บาท ทส 0604.3/ว835 ลว 23 เม.ย. 63
2	สลก.	ลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง อาคารกรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพฯ	1	5.9092	0.0000	5.9092			0%	0%		1	
3	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 63 ซม. x สูง 90 ซม.					1	0.0252	0.0252	0.0000			100%	100%	1		
4	สลก.	ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาด กว้าง 160 ซม. x ลึก 80 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ข้าง ขนาด กว้าง 120 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 76 ซม. ตู้ลิ้นชัก ขนาด กว้าง 40 ซม. x ลึก 48 ซม. x สูง 52 ซม.					1	0.0236	0.0236	0.0000			100%	100%	1		
5	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 65 ซม. x ลึก 62 ซม. x สูง 115 ซม.					1	0.0049	0.0049	0.0000			100%	100%	1		
6	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 62 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 93 ซม.					1	0.1134	0.1134	0.0000			100%	100%	1		
7	สลก.	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง 68 ซม. x ลึก 76 ซม. x สูง 120 ซม.					1	0.0140	0.0140	0.0000			100%	100%	1		
8	สลก.	เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0100	0.0100	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2563						ยอดเงินกัน เหลือปี (ล้านบาท)	รวม เบิกจ่าย ปี 2564 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	%ผล เบิกจ่าย ทั้งหมด	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ	ยังไม่ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (โครง การ)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
9	สลก.	พาร์ทิชั่นจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แบบทึบล้วน ขนาด 100 ซม. x 160 ซม. จำนวน 4 แผ่น เสาพาร์ทิชั่น ขนาด กว้าง 5.5 ซม. x 160 ซม. จำนวน 2 ต้น ขาที่ พาร์ทิชั่น จำนวน 6 อัน					1	0.0198	0.0198	0.0000			100%	100%	1		
10	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 66 ซม. x ลึก 64 ซม. x สูง 127 ซม.					1	0.0200	0.0200	0.0000			100%	100%	1		
11	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด กว้าง 64 ซม. x ลึก 78 ซม. x สูง 115-121 ซม.					1	0.0050	0.0050	0.0000			100%	100%	1		
